

Harmonogram stavby "Hořovičky - kanalizace a ČOV"

Popis	Rok						2026																																																																					
	Měsíc						Zaří		Říjen		Listopad		Prosinec		Leden		Únor		Březen		Duben		Květen		Červen		Červenec		Srpen		Zaří		Říjen		Listopad		Prosinec																																							
	Týden						36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.
	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání (kalendářní dny)	Rezerva (kalendářní dny)	Množství	Etapa -PSV - Dokončovací práce na objektech																																																								Etapa - zkoušky a revize													
						Etapa -HSV																																																																						
"Hořovický - kanalizace a ČOV"																																																																												
Stavební práce																																																																												
Přípravné práce																																																																												
SO 01.1 - Příprava území - příprava území pro výstavbu ČOV																																																																												
SO 01.2 - Zdrůžená nádrže bioreaktorů - výstavba nádrží a nadzemní části ČOV včetně stavební																																																																												
SO 01.3 - Propojovací potrubí v areálu - zhotovení propojovacího potrubí v areálu																																																																												
SO 01.4 - Přípojka NN - zhotovení přípojky NN																																																																												
SO 01.5 - Optokem - výstavba optického okna ČOV																																																																												
SO 01.6 - Terénní a sadové úprav - zhotovení terénních a sadových úprav																																																																												
SO 01.7 - Zpevněné plochy - výstavba zpevněných ploch okolo ČOV																																																																												
SO 01.8 - Přijezdová komunikace - výstavba příjezdové komunikace																																																																												
SO 01.9 - Vodovodní přípojka - zhotovení vodovodní přípojky																																																																												
Zemní práce (skrývka, výkop) SO 02 - Splašková kanalizace																																																																												
Trubní vedení - montáže a obsypy, SO 02 - Splašková kanalizace																																																																												
Zásypy - SO 02 - Splašková kanalizace																																																																												
Zemní práce (skrývka, výkop) SO 03 - Splašková kanalizace - veřejná část přípojek																																																																												
Trubní vedení - montáže a obsypy, SO 03 - Splašková kanalizace - veřejná část přípojek																																																																												
Zásypy - SO 03 - Splašková kanalizace - veřejná část přípojek																																																																												
Zemní práce (skrývka, výkop) SO 04 - Splašková kanalizace - soukromá část přípojek																																																																												
Trubní vedení - montáže a obsypy, SO 04 - Splašková kanalizace - soukromá část přípojek																																																																												
Zásypy - SO 04 - Splašková kanalizace - soukromá část přípojek																																																																												
Osazení technologie - PS 01 - PS OS - ČOV																																																																												
Kanalizace SO 02 a Kanalizace SO 03 - Opravy komunikací																																																																												
Dokončovací práce, Zkoušky a revize																																																																												
VRN																																																																												
Finanční harmonogram																																																																												
Finanční plnění po měsíci v Kč bez DPH																																																																												
Celkové finanční plnění v Kč bez DPH																																																																												

Cena celkem bez DPH: 73 942 665,31


Předpokládaný začátek výstavby: 1.9.2021



Uzlové body:

C.	Popis
1.	Příprava území pro výstavbu ČOV
2.	Vybudování Budovy a nádrží ČOV
3.	Kompletní osazení technologie ČOV
4.	Dokončení celé ČOV
5.	Dokončení spávkové kanalizace včetně přípojek
6.	Finální dokončení oprav veškerých dotčených povrchů

Harmonogram kontrol a zkoušek

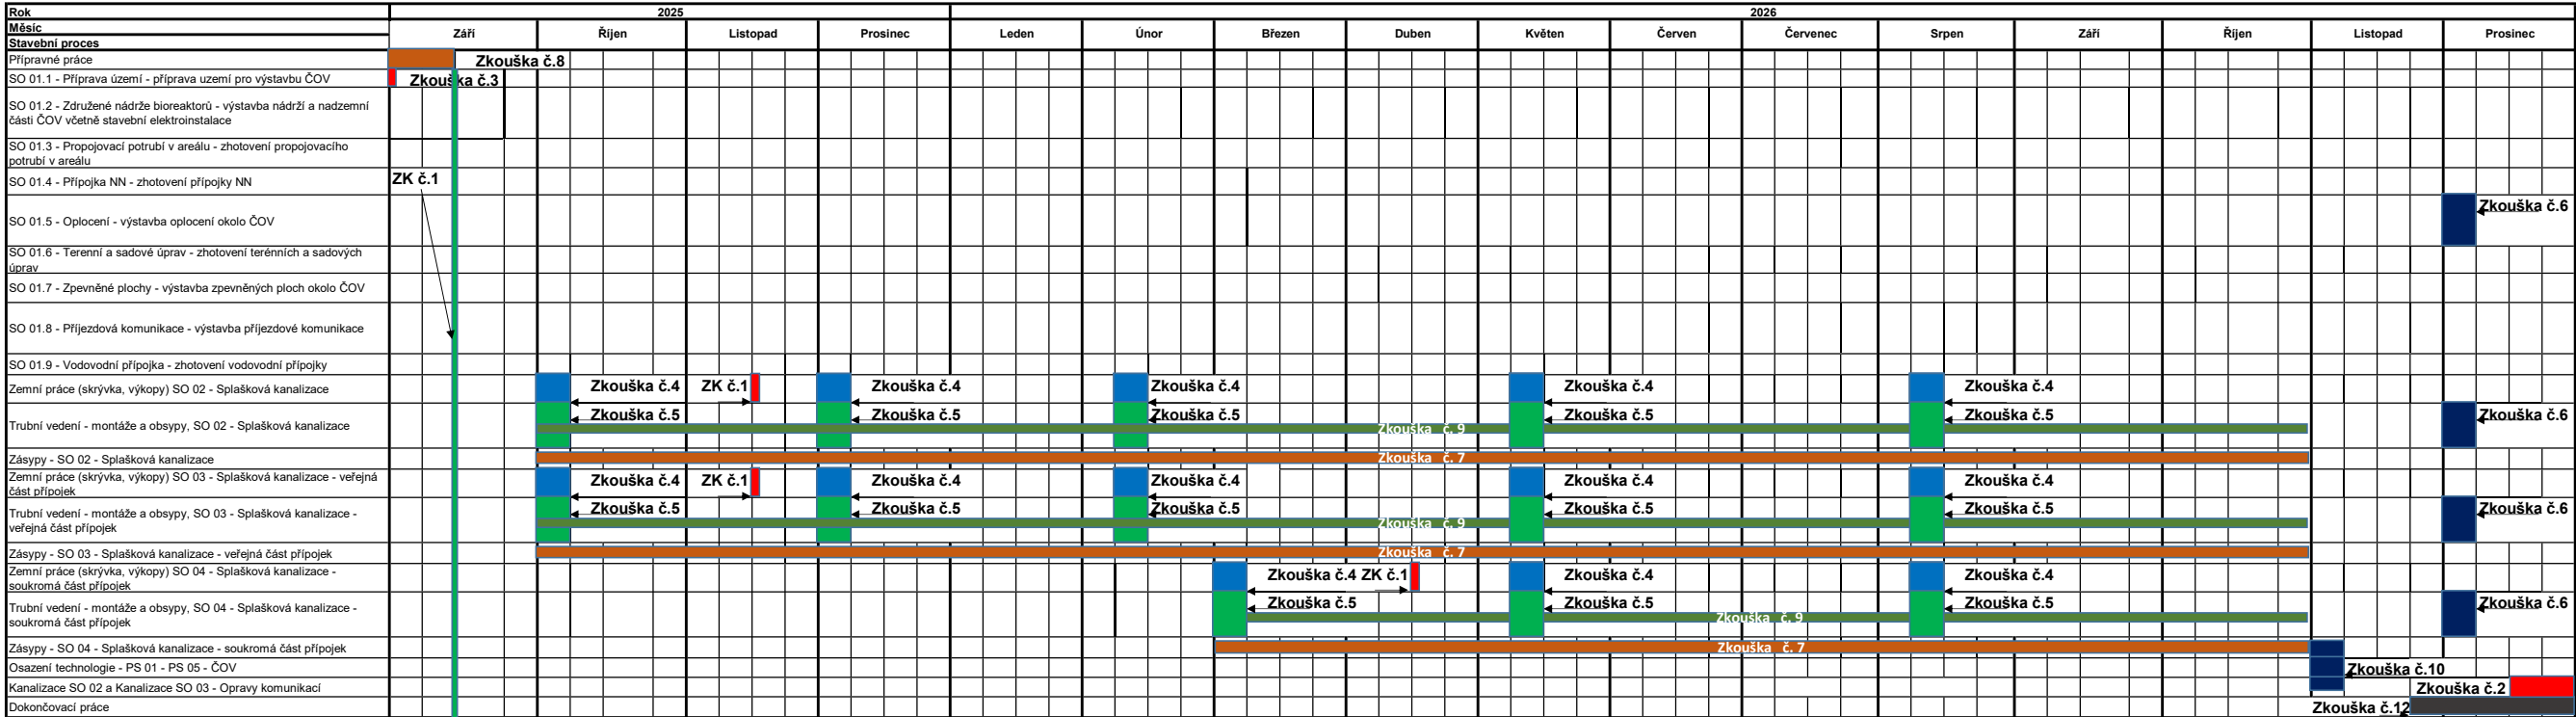

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ČINNOSTÍ A ZKOUŠEK

Číslo zkoušky	Konstrukce nebo technologická část	Záměr kontroly	Požadované doklady o kontrole	Kontrolní předpis/norma	Způsob kontroly	Kontrolu provede	Počet kontrol	Termín provedení kontroly
1	Vytyčování trasy	Kontrola souladu dle PD	<i>Doklad od geodeta, zápis ve stavebním deníku</i>	PD	Vizuální kontrola	Zhotovitel	3	1.9.2025, 1.11.2025 a 14.4.2026
2	Provedení povrchu	Zkoušky únosnosti povrchu pláně,	<i>Zápis ve stavebním deníku a protokol zkušební</i>	ČSN 72 1006	Provedení zkoušky	Zhotovitel, TDI	1	XII.26
3	Dopravní inženýrská opatření	Kontrola zda je kompletní a správně osazeno	<i>Zápis ve stavebním deníku</i>	ČSN EN 12899	Vizuální kontrola	Zhotovitel	1	1.9.2025 - 15.9.2025
4	Zemní práce	Kontrola provedení pažení	<i>Zápis ve stavebním deníku</i>	ČSN 73 3050	Vizuální kontrola	Zhotovitel, TDI	90	01.10.2025, 1.12.2025, 7.2.2026, 1.3.2026, 7.5.2026, 7.8.2026
5	Potrubí	Kontrola provedení ložné vrstvy potrubí	<i>Zápis ve stavebním deníku</i>	ČSN 75 5401	Vizuální kontrola	Zhotovitel, TDI	90	01.10.2025, 1.12.2025, 7.2.2026, 1.3.2026, 7.5.2026, 7.8.2026
6	Vizuální zkouška		<i>Zápis ve stavebním deníku, samostatný protokol</i>	ČSN 75 5911	Provedení zkoušky	Zhotovitel, TDI	4	XII.26
7	Zásyp potrubí	Kontrola provedení obsypu potrubí	<i>Zápis ve stavebním deníku</i>	ČSN 73 6133	Vizuální kontrola	Zhotovitel, TDI	90	1.10.2025 - 30.10.2026
		Hutnicí zkoušky zásypu	<i>Zápis ve stavebním deníku a protokol zkušební</i>	ČSN 72 1006	Provedení zkoušky	Zhotovitel, TDI	5	Každých 420m
8	Vytyčování ostatních inženýrských sítí	Kontrola souladu dle PD, kontrola křížení	<i>Zápis ve stavebním deníku, zápis příslušného správce</i>	ČSN 73 6005	Vizuální kontrola	Zhotovitel	1	1.9.2025 - 14.9.2025
9	Uložení výstražné fólie	Kontrola uložení výstražné fólie na obsyp	<i>Zápis ve stavebním deníku</i>	ČSN 75 5401	Vizuální kontrola	Zhotovitel, TDI	100	1.10.2025 - 30.10.2026
10	Funkčnost a ovladatelnost armatur a	Kontrola funkčnosti a ovladatelnosti	<i>Zápis ve stavebním deníku</i>	ČSN EN 736 - 3	Vizuální a mechanická	Zhotovitel, TDI	3	01.11.2026
12	Geodetické zaměření	Geodetické zaměření polohového a	<i>Geodetické zaměření</i>	ČSN 73 0401	Zaměření polohy a	Zhotovitel	1	XII.26

Použité normy a zkratky:

PD - projektová dokumentace
 ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 ČSN EN 13422 (737031) - Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení - Kužely a válce
 ČSN 73 6133 (736133) - Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
 ČSN EN 12056-1 až 5 - Navrhování vodovodního potrubí
 ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a tlakového potrubí
 ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin
 ČSN EN 736 - 3 - Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů
 ČSN 73 0401 - Názvosloví v geodézii a kartografii
