


PLÁN BOZP

PODLE §15 ZÁKONA 309/2006 Sb., v platném znění a NV. č. 591/2006 Sb., v platném znění

NÁZEV PROJEKTU

**25003 – MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ,
MŠ A ZUŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362**

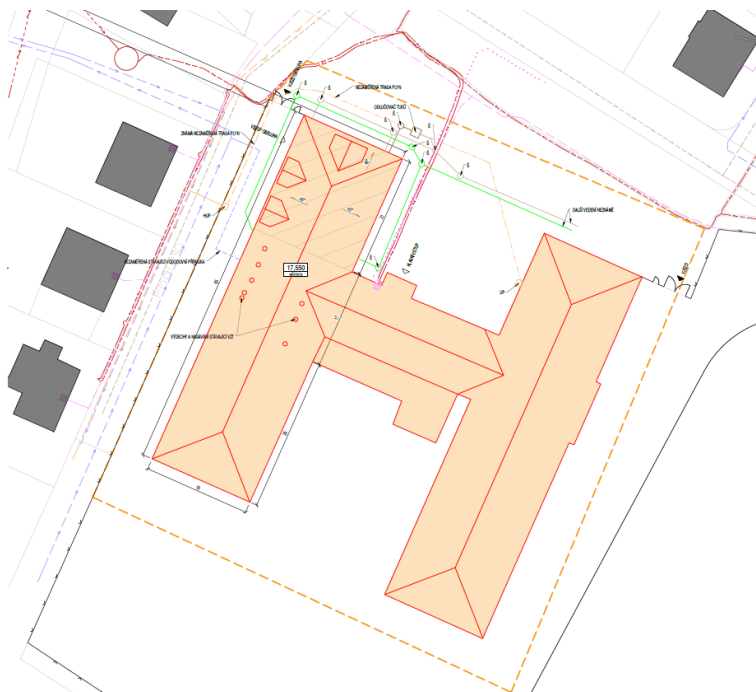

	Funkce:	Datum
	Jméno, příjmení	
ZPRACOVAL	koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby, zpracovatel plánu BOZP	11. 04. 2025
	CRDR s.r.o. Jana Masaryka 108/10 120 00 Praha 2, Vinohrady IČ: 285 00 679 Ing. Lenka MISAŘ BENDÁKOVÁ – koordinátor BOZP KARO/291/KOO/2022	
SCHVÁLIL	zadavatel stavby (stavebník)	11. 04. 2025
	Městys Lomnice nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice u Tišnova IČ: 00280577	
ODSOUHLASIL	zhotovitel stavby	viz kapitola „Seznámení s plánem BOZP a odsouhlasení plánu BOZP“
PLATNOST OD	11. 04. 2025	
INTERVAL REVIZÍ	Dle potřeby – průběžně; Plán BOZP se aktualizuje přinejmenším při přechodu mezi nejdůležitějšími hlavními fázemi průběhu stavby. Všechny změny v organizaci staveniště nebo posuny v časovém plánu stavby se musí do Plánu BOZP zpracovat – bude probíhat v části realizace stavby a formou zápisů Koordinátora BOZP k plnění Plánu BOZP.	

V čase realizace stavby, zajistí koordinátor BOZP pro realizaci stavby seznámení a odsouhlasení Plánu BOZP před zahájením stavebních prací každého nového zhotovitele a jiné osoby (OSVČ); v době jeho nepřítomnosti na staveništi zajistí toto seznámení hlavní zhotovitel stavby.

STAVEBNĚ TECHNICKÁ KONCEPCE – OBSAH PLÁNU BOZP

I.	ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
II.	SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY
III.	OBSAH PLÁNU DLE ČÁSTI II. PÍSMENE C PŘÍLOHY Č. 591/2006 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
IV.	OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ
V.	ROZDĚLOVNÍK PLÁNU BOZP

PŘÍLOHY PLÁNU BOZP

1.	SOUPIS PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
2.	TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN
3.	RIZIKA A OPATŘENÍ

OBECNÉ INFORMACE SEZNAM REVIZÍ

Č. REVIZE	POPIS ZMĚNY	PODPIS / DATUM ZMĚNY
1		
2		
3		

I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE


ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE dle II. A) NV č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
1		
ÚDAJE O STAVBĚ		
a) základní údaje o zadavateli stavby a o druhu stavby:	Městys Lomnice nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice u Tišnova IČ: 00280577 Modernizace školní kuchyně	
b) název stavby:	25003 – MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ, MŠ A ZUŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362	
c) místo stavby:	Tišnovská 362, 67923 Lomnice	
d) charakter stavby:	MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ, MŠ A ZUŠ LOMNICE	
e) účel užívání stavby:	Občanská vybavenost – ZŠ, MŠ, ZUŠ, kuchyňský provoz	
f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace, členění stavby):	Předpokládané zahájení realizace stavby 2025 Předpokládané dokončení stavby 2025 Předklad realizace stavby: 4 měsíce Členění stavby je dle PD: Projekt je členěn na stavební část a technologické vybavení.	
g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky se s ohledem na současný stav nemění.	
2		
ODŮVODNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU S UVEDENÍM ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A SOUPIS DOKUMENTŮ SLOUŽÍCÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU		
Dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., budou prováděny následující práce:		
☐	1.	Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
☐	2.	Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.
☐	3.	Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy.
☐	4.	Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.
☐	5.	Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
☒	6.	Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení.
☐	7.	Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají doзору orgánů státní báňské správy.
☐	8.	Potápěčské práce.
☐	9.	Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
☐	10.	Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.
☒	11.	Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Plán BOZP


25003 – MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ, MŠ A ZUŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

Soupis právních předpisů – Příloha č. 1	
Soupis dokumentů sloužící jako podklad pro zpracování plánu	
PTZ_souhrna Podklady pro jednotlivé stavební profese Výkresová dokumentace	
3	
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	
a – jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno a sídlo/adresa místa bydliště	
Proiectura Dana s.r.o. U tunelu 152, 251 66 Senohraby Zastoupena: Ing. Michalem NEČASEM IČ: 17219787	
b – jméno hlavního projektanta včetně čísla autorizace	
Ing. Petr LORENZ CSc., ČKAIT – 0009143, Autorizovaný inženýr – IP00	
4	
KOORDINÁTOR BOZP – zpracovatel Plánu BOZP	
CRDR s.r.o. Jana Masaryka 108/10 120 00 Praha 2, Vinohrady IČ: 285 00 679 Ing. Lenka MISAŘ BENDÁKOVÁ KARO/291/KOO/2022 koordinátor BOZP	PODPIS KOORDINÁTORA BOZP 

II. SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY

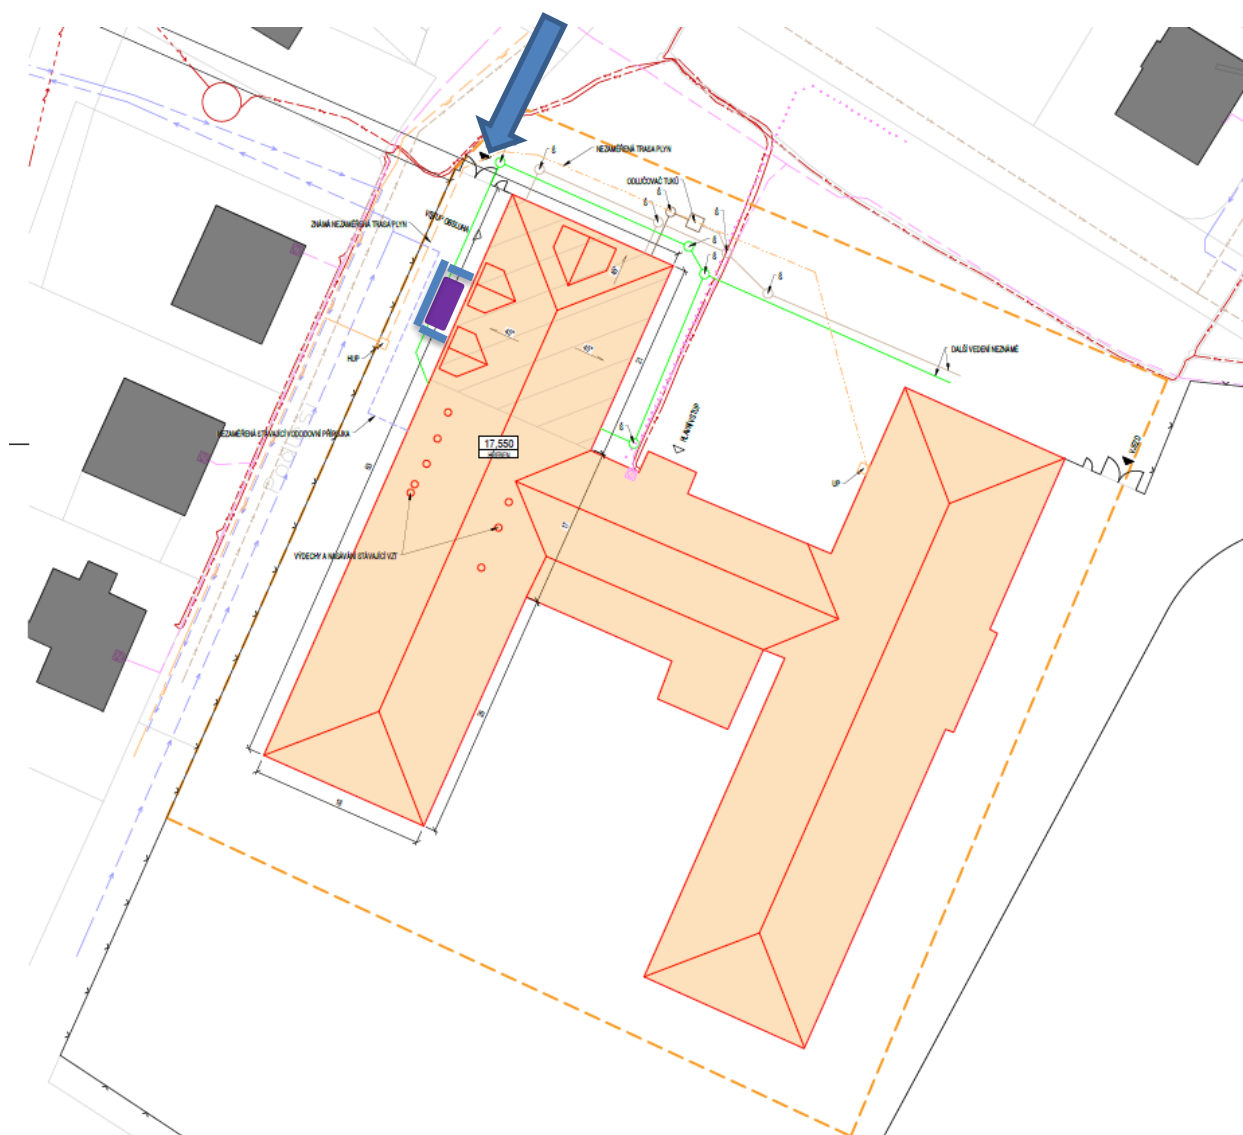

LEGENDA:

-  HRANICE PARCEL DLE KN
- 511/30 ČÍSLA PARCEL
-  SOUSEDNÍ OBJEKTY
-  ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
-  ŘEŠENÝ OBJEKT
-  ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU
-  OPLOCENÍ STAVAJÍCÍ - KOVOVÉ
-  VSTUP DO AREÁLU
-  VSTUP DO OBJEKTU

-  Zařízení staveniště – bude zřízeno ve stávajících prostorech školy
-  Hlavní vjezd a výjezd ze stavby je na/z ulice Podlesí
-  Mezideponie – neuvažuje se, bude přistaven stavební kontejner
-  Oplocení

Situační výkres je součástí projektové dokumentace stavby a je součástí Plánu BOZP.

Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých, byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora, a

- jednotlivá vyjádření dotčených orgánů
(jednotlivá vyjádření a stavební povolení jsou k dispozici u **hlavního zhotovitele stavby**)
- další podmínky viz schválená projektová dokumentace stavby s příslušnými dotčenými stanovisky.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY

Jedná se o projektovou dokumentaci, která navazuje na předchozí projekční stupeň:

„Studie proveditelnosti modernizace školní kuchyně ZŠ, ZUŠ, MŠ, Lomnice 362“, jejímž cílem bylo při přípravě pokrmů uspořít min. 30% primární energie na vybraných technologických uzlech. Na základě schválené dotace je rozpracováno technické řešení do podrobnosti této dokumentace.

Technicky dochází k výměně technologií a částečné dispoziční úpravě, na stávajícím půdorysu stravovacího provozu. Technické řešení se proti studii změnilo, bez negativního vlivu na prokázané úspory primárních energií.

Z důvodu zlepšení světelných podmínek v kuchyni (přirozené osvětlení) a rovněž zajištění nečisté cesty do umývárny nádobí (pro příjem a mytí transportních nádob), byla změněna dnešní orientace výdeje. Nově je umožněn příjem jídlonosičů nebo termoportů mimo prostory varny (tedy výrobního zázemí kde se manipuluje s potravinami). Sklad chlazených potravin je nyní před vstupem do varny (m.č.13). Z těchto prostor je také přístupná nově zřízená denní místnost zaměstnanců (m.č. 14). Dále se vstupuje do výrobních prostor varny (m.č. 15), kde jsou zřízeny tyto pracovní úseky:

- PÚ PŘÍPRAVY TĚST
- PÚ PŘÍPRAVY MASA
- PÚ PŘÍPRAVY ZELENINY, STUDENÉ KUCHYNĚ A KRÁJENÍ VAŘENÉHO MASA
- VÝDDEJ JÍDEL

Výdej jídel je s obsluhou – teplá jídla, výdej nápojů a salátů bude bezobslužný. Z varny je také přístupný denní sklad (m.č.16).

Mytí nádobí je stavebně oddělené, centrální, zřízeno v místnosti 12. Jsou zde zřízeny tyto pracovní úseky:

- PÚ MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ
- PÚ MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ

Mytí stolního nádobí umožňuje také mytí jídelnosáčů a v mytí provozního nádobí se mohou sanitovat víceporcové transportní obaly.

Výdej jídelnosáčů, bude probíhat z ohřevného vozíku (1.2.03), jejich kompletace bude probíhat na pojízdném stole (1.3.05).

V rámci technologie budou provedeny také podlahy a žlaby, které jsou v havarijním technickém stavu a vzhledem k umístění technologie nevyhovujících rozměrů. Veškeré vybavení bude nové, plnění podmínky výzvy, jediná výjimka je univerzální kuchyňský robot, který zůstává stávající.

Částečně zůstává dispozice beze změn (na požadavek uživatele, schváleno také KHS). Jedná se o kancelář, sociální zázemí personálu, vybrané sklady a hrubá přípravná.

Prostory, dotčené rekonstrukcí, budou kompletně nové, vč. rozvodů médií, povrchů a nuceného větrání.

Veškeré stavební práce, které se týkají bourání, zdění, demontáže, montáže a manipulace s objemnými břemeny budou probíhat v rámci letních prázdnin nebo s vyloučením provozu v dotčeném prostoru (uzavřením celých jednotlivých pater). Dokončovací práce drobného charakteru, již mohou probíhat za provozu školy se stanovenými opatřeními, které budou stanoveny Koordinátorem BOZP, který bude určen zadavatelem stavby pro realizační fázi.

III. OBSAH PLÁNU DLE ČÁSTI II. PÍSMENE C PŘÍLOHY Č. 591/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1. **ČÁST II PÍSMENO C, Odstavec 1** (základní informace o rozhodnutích) – rozhodnutí budou trvale uložena v buňce/kanceláři stavbyvedoucího hlavního zhotovitele stavby.
2. **POSTUPY NA STAVENIŠTI ŘEŠÍCÍ A SPECIFIKUJÍCÍ JEDNOTLIVÁ OPATŘENÍ** (ČÁST II PÍSMENO C, Odstavec 2)

1) **ZAJIŠTĚNÍ OPLOCENÍ, OHRAZENÍ STAVBY, VSTUPŮ A VÝJEZDŮ NA STAVENIŠTĚ, PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ A MANIPULACI S MATERIÁLEM** (podle bodu a)

Stavba bude v blízkosti vstupu/vjezdu na staveniště opatřena štítkem „**Stavba povolena**“, kopií „**Oznámení o zahájení prací na OIP**“ (prostor oplocení u kontejneru a vstup do ZŠ) a u vstupu/vjezdu zákazovou tabulí „**zákaz vstupu na staveniště**“, dále „**nebezpečí úrazu**“ a „**používej OOPP**“ (v provedení dle NV č. 375/2017 Sb.) a to minimálně v rozsahu uvedeném níže:

	Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám na staveniště z důvodu bezpečnosti. Na všech vstupech na staveniště, včetně vjezdu na staveniště, nebo do prostor možného ohrožení vlivem stavební činnosti; dále pak dle potřeby na oplocení/zabezpečení stavby.
---	---

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ OZNAČENÍ

	Příkaz k používání příslušných OOPP dle rizikovosti prováděných prací. Na všech vstupech na staveniště, včetně vjezdu na staveniště, nebo do prostor možného ohrožení vlivem stavební činnosti; dále pak dle rizikovosti prováděných prací.
	Informace o rizikových činnostech na stavbě. Na všech vstupech na staveniště, včetně vjezdu na staveniště, nebo do prostor možného ohrožení vlivem stavební činnosti; dále pak dle rizikovosti prováděných prací.

POZNÁMKA: Další bezpečnostní tabulky budou umístěny dle provádění rizikových prací na jednotlivých pracovištích.

Bezpečnostní tabulky a instalované prostředky pro krátkodobé zabezpečení staveniště dodá a udržuje zhotovitel, jemuž bylo předáno staveniště, až do zpětného předání zadavateli prací. Zodpovědnou osobou je určený vedoucí zaměstnanec.

ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ PROTI VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB

V rámci dotčeného území, na němž bude stavba realizována/v jeho blízkosti jsou prostory školy a místní komunikace.

Vzhledem k výše uvedeným místním podmínkám v rámci dotčeného území a vzhledem k rozsahu realizovaných stavebních prací a s nimi spojenými riziky, je tímto Plánem BOZP stanoveno následující zabezpečení obvodu staveniště proti vstupu nepovolaných osob:

Stavba nebude oplocena ze všech stran souvislým oplocením vysokým nejméně 1,8 m. Oplocení bude pouze kolem stavebního kontejneru, na vstupu do objektu (v prostoru dotčeném stavbou) budou instalovány výše uvedené bezpečnostní tabulky.

Oplocení bude dočasné, na konci stavby bude demontováno. Hlavní zhotovitel stavby odpovídá za kompletnost, stabilitu, pevnost a nepoškozenost oplocení po celou dobu

výstavby. Všem zhotovitelům stavby je přísně zakázáno jakékoliv zasahování do oplocení stavby (rozebírání jednotlivých dílu oplocení).

Zabezpečení staveniště musí být průběžně kontrolováno hlavním zhotovitelem stavby a koordinátorem BOZP ve fázi realizace stavby.

Zázemí pro vedení stavby a sociální zařízení pro účastníky výstavby se doporučuje umístit v prostoru stávajícího školního zařízení. Konkrétní umístění zařízení skládek materiálu a zařízení staveniště bude upřesněno před zahájením stavby na základě dohody mezi zadavatelem stavby, hlavním zhotovitelem stavby, to vše za účasti Koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby.

Zhotovitel zabezpečí úklid veřejné komunikace (kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), pokud bude vyjíždějícími vozidly znečištěna a zabezpečí vybavení pracovníků výstražnými vestami, před výjezdem na komunikaci z prostoru staveniště bude zpevněná plocha využita jako plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby.

Oznámení o zahájení stavby, bude také vyvěšeno při vstupu do prostoru zařízení staveniště.

1. Za vyvěšení informačních a bezpečnostních tabulek zodpovídá zhotovitel, jemuž bylo staveniště předáno.
2. Na všech vstupech na stavbu bude vyvěšeno Oznámením o zahájení prací, Stavebním povolením a bezpečnostní tabulky pro stavbu dle Plánu BOZP.

Staveniště musí být po celou dobu výstavby zabezpečeno proti nežádoucímu vstupu osob a po ukončení stavebních prací musí být rizikový prostor uzamčen (zabezpečen).

VSTUPY DO STAVBY MUSÍ BÝT UZAVŘENY PO CELOU DOBU VÝSTAVBY, NELZE JE V PRŮBĚHU STAVBY PONECHAT OTEVŘENÉ!

PŘED SAMOSTATNÝMI STAVEBNÍMI PRACEMI MUSÍ BÝT PROVEDENA TATO OPATŘENÍ:

- označení vjezdů/výjezdů na/ze staveniště, okolí stavby dle odsouhlaseného DIO,
- zhotovitel stavby před započatím prací provede vymezení prostoru stavby oplocením, vyvěšení informačních a bezpečnostních tabulek na přístupech do stavby a dopravních značek,
- odpojení všech dotčených médií, které budou podléhat rekonstrukci, v dotčeném rekonstruovaném prostoru se zápisem do SD.
- zadavatel stavby provede vyklizení rekonstruovaného objektu.

2) ZAJIŠTĚNÍ OSVĚTLENÍ STAVENIŠŤ A PRACOVÍŠŤ (podle bodu b)

Osvětlení staveniště bude sestávat z:

Osvětlení staveniště se nebude zřizovat, připojení bude ze stávajícího objektu.

Umístění hlavního rozvaděče bude upřesněno v nákresu Plánu BOZP pro realizaci stavby.

Po zajištění funkčního rozvodu uvnitř stavby, budou pro prováděné práce sloužit nové rozvody.

Veškeré staveništní osvětlení bude napájeno ze staveništního rozvaděče, který bude zajištěn proti neoprávněné manipulaci uzamčením a dále tlačítkem TOTAL STOP. Na každém staveništním rozvaděči musí být umístěn kontakt na zodpovědnou osobu pro případ nahlášení poruchy.

Samostatné rozvody zhotovitelů ze staveništních rozvaděčů bude za pomoci vyvěšených podružných kabelů s minimální odolností IP44 a budou pod platnými elektro-revizemi.

Montážní práce v noci jsou zakázány.

STANOVENÍ OCHRANNÝCH A KONTROLOVANÝCH PÁSEM A OPATŘENÍ PROTI JEJICH POŠKOZENÍ (podle bodu c)

Veškeré práce budou prováděny uvnitř objektu a v rámci příjezdu do stavby se bude jezdit po již zhotovených stávajících komunikacích.

3) ŘEŠENÍ OPATŘENÍ PŘI NEBEZPEČÍ VÝBUCHU NEBO POŽÁRU (podle bodu d)

Staveniště není klasifikováno, jako pracoviště, kde je prostředí s nebezpečím výbuchu dle NV č. 406/2004 Sb. Hlavní pohotovostní čísla jsou uvedena v Traumaplánu – Příloha č. 2.

Hlavní zhotovitel stavby je povinen na staveništi provést zajištění požární ochrany a případně za tímto účelem zpracovat potřebnou dokumentaci požární ochrany a řídit se pokyny uvedenými v této dokumentaci. Na staveništi musí být v rámci zařízení staveniště umístěna důležitá telefonní čísla (požárně poplachová směrnice).

Dále pro zajištění požární ochrany v průběhu realizace stavby bude v zařízení staveniště (v kanceláři stavbyvedoucího) umístěn jeden hasicí přístroj. Hasicí přístroj bude s minimální hasicí schopností 34A/183B/C hasivo prášek. Za splnění této povinnosti odpovídá hlavní zhotovitel stavby.

V případě provádění prací ohrožujících požární ochranu (zejména prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru – zejména svařování, řezání pálení a natavování živců v dosahu hořlavých, nebo částečně hořlavých konstrukcí) je povinností každé dotčeného zhotovitele zajistit podmínky dle vyhlášení č. 87/2000 Sb.

4) ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE NA STAVENIŠTI, VČETNĚ PODJÍŽDĚNÍ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ A DALŠÍCH MÉDIÍ (PLYN, PÁRA, VODA aj.), PROZATÍMNÍ ROZVODY ELEKTŘINY PO STAVENIŠTI, ČERPÁNÍ VODY, NOČNÍ OSVĚTLENÍ (podle bodu e), OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K UMÍSTĚNÍ A ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, VČETNĚ SITUAČNÍHO VÝKRESU ŠIRŠÍCH VZTAHŮ STAVENIŠTĚ, ŘEŠENÍ SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVY OSOB A MATERIÁLU podle bodů g)

Stávající objekt je situován na pozemku Tišnovská 362, 67923 Lomnice. Stávající přístup je zajištěn jak pěším, tak příjezdem pro auta spolu s parkováním.

S čerpáním vody se neuvažuje.

Umístění staveniště je řešeno v části III, odstavci 2) – situace tohoto Plánu BOZP.

Veškeré práce budou prováděny uvnitř objektu a v rámci příjezdu do stavby se bude jezdit po již zhotovených stávajících komunikacích.

Staveništní rozvod elektrické energie:

- bude ze stávajícího objektu, v rekonstruované části bude instalován elektrický rozvaděč (antoníček), s pohotovostním tlačítkem (total stop), zabezpečením proti neoprávněnému odemčení a informací o odpovědné osobě. Přesné místo pro napojení bude součástí zápisu o předání a převzetí staveniště.

Svislá doprava materiálu je za pomoci:

- auta s hydraulickou rukou.

Vodorovná doprava materiálu je za pomoci:

- nákladních automobilů,
- ručně vedených vozíků,
- stavební mechanizací k tomu určené.

5) POSOUZENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ NA STAVBU, ZEJMÉNA OTŘESŮ OD DOPRAVY, NEBEZPEČÍ POVODNĚ, SESUVU ZEMINY (podle bodu f)

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí a v blízkosti stavby se nenachází žádný vodní tok. Není potřeba zpracovávat protipovodňový plán.

6) POSTUPY PRO ZEMNÍ PRÁCE ŘEŠÍCÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ (podle bodu h). POSTUPY PRO BETONÁŘSKÉ PRÁCE ŘEŠÍCÍ ZPŮSOB DOPRAVY BETONOVÉ SMĚSI (podle bodu j). POSTUPY PRO MONTÁŽNÍ PRÁCE (podle bodu l). POSTUPY PRO BOURACÍ A REKONSTRUKČNÍ PRÁCE (podle bodu m)

BOURACÍ PRÁCE (bod m)

Bude provedeno vybourání stávajících podlah, obkladů, otvorů ve stěnách, stropech, tras pro technologii – přesná specifikace dle PD. Dále budou provedeny prostupy ve zdech, stropech, viz PD, případně další stupeň PD.

PROVÁDĚNÍ PRACÍ:

Samostatné bourací práce budou prováděny ručně nebo za pomoci náradí určeného pro bourací práce uvnitř budov.

Před zahájením samostatných bouracích prací bude provedeno vyznačení a vymezení dotčených sítí, jejich zaznačení a dále odpojení všech dotčených médií se zápisem odpovědné osoby do SD (stavebního deníku).

Během prašných prací bude prováděno zkrápění dotčeného místa.

Veškeré prováděné práce budou probíhat ze země nebo z mobilního lešení.

Odbouraný materiál bude z pracoviště odklizen za pomoci koleček, přímo do připraveného kontejneru. Před zahájením prací bude Koordinátorovi BOZP předložen technologický postup.

Před bouracími pracemi na konstrukcích vždy nejdříve provést statické zajištění konstrukce pomocí navržených zámečnických výrobků.

Pracovníci musí být řádně vybaveni příslušnými OOPP – pracovní obuv, pracovní oděv, výstražná reflexní vesta (při pohybu na venkovním prostranství mimo vymezený prostor stavby nebo kolem nákladního automobilu), ochrany hlavy, ochrana dýchacích cest (během

prováděných bouracích prací), ochrana očí a ochrana uší (během prováděných bouracích prací).

Během bouracích prací se bude pracoviště pravidelně zkrápět.

NEJVÝZNACNĚJŠÍ RIZIKA A JEJICH OPATŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI	
Sesutí, zborcení technické konstrukce (DSK)	- Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací. - Používat zařízení v souladu s návodem od výrobce.
Pád stěny	- Provádění prací dle vypracované projektové dokumentace a dle technologického postupu. - Vymezení rizikového pracoviště, dohled, označení nebezpečného prostoru, stanovené signály.
Prašnost	- Organizace práce. - Skrápění. - Nevstupovat do ohroženého prostoru. - Používat přípravků k tomu určených. - Plachtování vybouraného materiálu.
Pád, zranění, zavalení pracovníka	- Organizace práce. - Používat přípravků k tomu určených. - Postupovat dle odsouhlaseného TP. - Pracovat ze stabilních pracovních ploch, které jsou k tomu určeny. - Zabezpečení pracoviště. - Zákaz vstupu do bourané části objektu. - Nepracovat osamoceně. - Používat předepsané OOPP. - Stanovit signály pro případ mimořádné události. - V případě mimořádné události, postupovat dle pokynů, které musí být součástí Technologického postupu zhotovitele.
Poškození očí, dýchacích cest, poškrábání	- Postupovat dle TP. - Používat při práci minimálně: ochranu očí, ochranu dýchacích cest a dále OOPP na stavenišť.
Úraz elektrickým proudem	- Odpojení veškeré technologie od médií, před samostatným zahájením prací.

Tento postup bude ještě upřesněn v TP od zhotovitele, který bude provádět tyto práce.

Pracovní činnosti budou prováděny za pomoci (dle návodu od výrobce)

a) ručního nářadí, pomocných přípravků

Zhotovitelé při provádění prací zajistí především:

- *dodržení Technologického postupu,*
- *používání OOPP, bezpečnostních pomůcek a přípravků stanovených v technologickém postupu.*

ZEMNÍ PRÁCE (bod h)

Nebudou prováděny

POSTUPY PRO BETONÁŘSKÉ PRÁCE (bod J)**Podkladní beton, betonová mazanina**

Doprava a uložení betonové směsi je řešena za pomoci suchého betonu, který bude na místo dopraven stavebními kolečky.

NEJVÝZNAČNĚJŠÍ RIZIKA A JEJICH OPATŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI	
Přenášení, převážení materiálu	Organizace práce. Zajištění převážených konstrukčních dílů, které budou řádně svázané a zajištěné proti pádu/sesnutí. Používání předepsaných OOPP.

Pracovní činnosti budou prováděny za pomoci (dle návodu od výrobce)

a) ruční nářadí – stanovené přípravky, pomůcky dle TP

Zhotovitelé při provádění prací zajistí především:

- *dodržení pracovních postupů dle návodu výrobce.*

V případě aplikace samonivelační epoxidové betonové stěrky bude probíhat dle návodu od výrobce. Tyto práce budou prováděny ručně za pomoci souvisejícího pracovního nářadí. Během broušení stávající stěrky budou pracovníci používat zejména ochranu dýchacích cest a ochranu očí a dále OOPP na základě stanovených rizikových činností.

Pracovní činnosti budou prováděny za pomoci:

NEJVÝZNAČNĚJŠÍ RIZIKA A JEJICH OPATŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI	
Prašnost	- Organizace práce. - Větrání dotčených prostor, používání technologie při broušení s odtahem. - Nevstupovat do ohroženého prostoru. - Používat přípravků k tomu určených.
Poškození očí, dýchacích cest, poškrábání	- Postupovat dle TP, návodu od výrobce. - Používat při práci minimálně: ochranu očí, ochranu dýchacích cest a dále OOPP na stavenišť.
Úraz elektrickým proudem	- Odpojení veškeré technologie od médií, před samostatným zahájením prací.

Tento postup bude ještě upřesněn v TP od zhotovitele, který bude provádět tyto práce.

Pracovní činnosti budou prováděny za pomoci (dle návodu od výrobce)

a) ručního nářadí, pomocných přípravků dle TP a nářadí dle návodu od výrobce

Zhotovitelé při provádění prací zajistí především:

- *dodržení Technologického postupu, návodu od výrobce*
- *používání OOPP, bezpečnostních pomůcek a přípravků stanovených v technologickém postupu (zejména ochrana očí, ochrana dýchacích cest).*


MONTÁŽNÍ PRÁCE (bod I)

a) DEMONTÁŽ A MONTÁŽ TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ UVNITŘ OBJEKTU

Bude prováděno primárně z mobilního lešení nebo ze země.

Na pracovišti se budou pohybovat pouze osoby, které budou seznámeny s TP o prováděných pracích a budou řádně vybaveni za pomoci OOPP – Ochrana hlavy, pracovní oděv, pracovní obuv.

Napojení technologických rozvodů bude do stávajících šachet a svodů. Dále se budou technologické rozvody zavěšovat na strop kuchyně, a to bude prováděno z mobilních lešení (DSK). Toto mobilní lešení bude řádně označeno příslušnou informativní tabulkou, ta bude obsahovat (Název firmy, jméno odpovědného vedoucí za DSK, typ lešení, maximální zatížení, poslední pravidelné kontrola DSK).

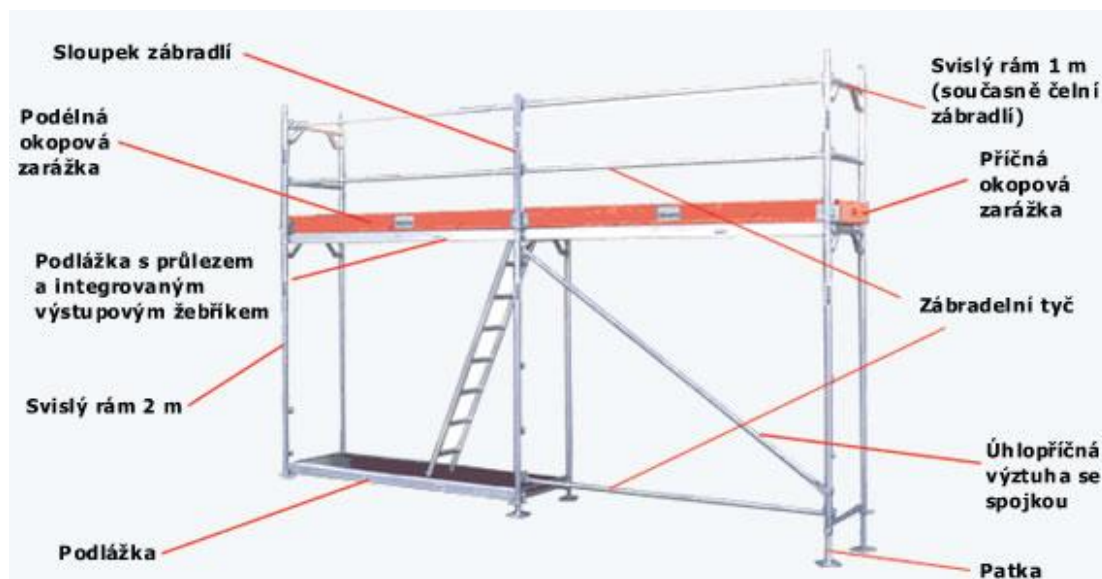

ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ:

- Práce bude prováděna z mobilních lešení nebo ze země.

Pracovní činnosti budou prováděny za pomoci:

- ručního nářadí, pomocných přípravků
- pracovních strojů – lešení

Zhotovitelé při provádění prací zajistí především:

- dodržení pracovních postupů dle návodu výrobce,
- používání montážních a bezpečnostních pomůcek a přípravků stanovených v technologickém postupu.

NEJVÝZNAČNĚJŠÍ RIZIKA A JEJICH OPATŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI	
Sesutí, zborcení technické konstrukce (DSK)	- Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací. - Používat zařízení v souladu s návodem od výrobce.
Přenášení těžkých KCE dílů, montážní práce	- Organizace práce. - Vyznačení nebezpečných prostor.

	- Nevstupovat do ohroženého prostoru. - Dohled během prováděných prací.
Poškrábání, pohmoždění	- Používání OOPP – zejména pracovní obuv, pracovní rukavice a dále dle vypracovaných rizik a opatření zhotovitele.

Pracovní činnosti budou prováděny za pomoci (dle návodu od výrobce)

- a) ručního nářadí, pomocných přípravků
- b) pracovních strojů – lešení

Zhotovitelé při provádění prací zajistí především:

- dodržení pracovních postupů dle návodu výrobce,
- používání montážních a bezpečnostních pomůcek a přípravků stanovených v technologickém postupu.


b) MONTÁŽNÍ SVÍTIDEL, MONTÁŽ PODHLEDŮ, MONTÁŽ ROZVODŮ, MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bude prováděno primárně z mobilního lešení nebo ze země.

Na pracovišti se budou pohybovat pouze osoby, které budou seznámeny s TP o prováděných pracích a budou řádně vybaveny za pomoci OOPP – Ochrana hlavy, pracovní oděv, pracovní obuv.

Napojení technologických rozvodů bude do stávajících šachet a svodů.

V rámci rekonstrukce proběhne montáž navržených podhledů a součásti podhledu budou namontované nová svítidla ve všech řešených prostorech. Rozsah prací je podrobně uveden ve výkresové dokumentaci a bude popsán ve samostatných dílcích částech - tyto prvky se budou zavěšovat na strop a to bude prováděno z mobilních lešení (DSK). Toto mobilní lešení bude řádně označeno příslušnou informativní tabulkou, ta bude obsahovat (Název firmy, jméno odpovědného vedoucí za DSK, typ lešení, maximální zatížení, poslední pravidelná kontrola DSK).

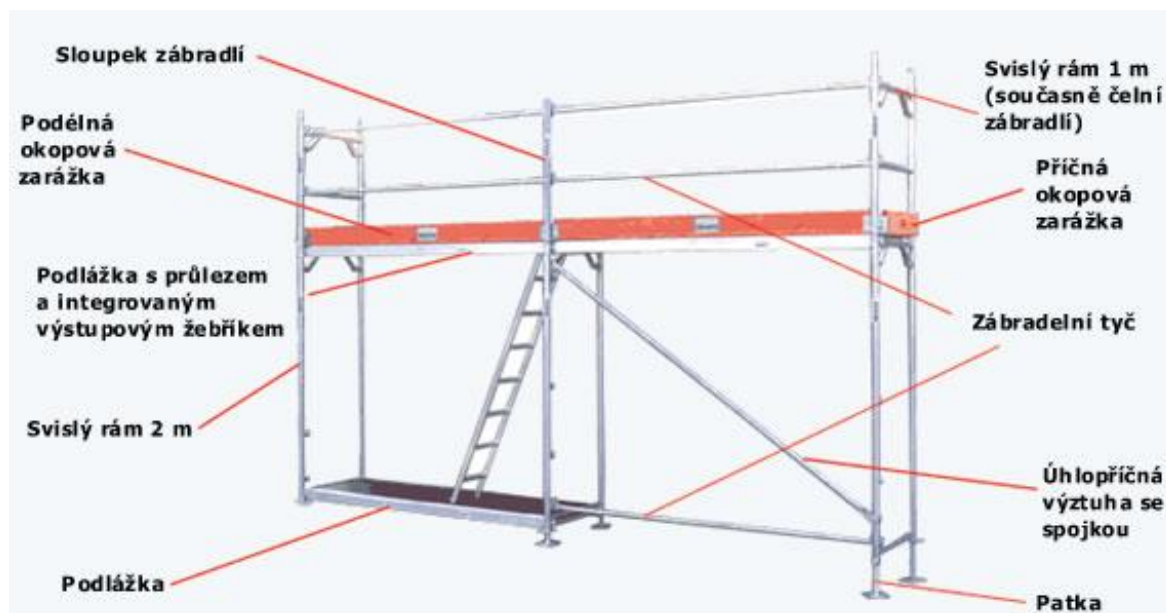

ZABEZPEČENÍ PRACOVISTĚ:

- Práce bude prováděna z mobilních lešení nebo ze země.

NEJVÝZNACNĚJŠÍ RIZIKA A JEJICH OPATŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI	
Sesutí, zborcení technické konstrukce (DSK)	- Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací. - Používat zařízení v souladu s návodem od výrobce.
Přenášení těžkých KCE dílů, montážní práce	- Organizace práce. - Vyznačení nebezpečných prostor. - Nevstupovat do ohroženého prostoru. - Dohled během prováděných prací.
Poškrábání, pohmoždění	- Používání OOPP – zejména pracovní obuv, pracovní rukavice a dále dle vypracovaných rizik a opatření zhotovitele.

Pracovní činnosti budou prováděny za pomoci (dle návodu od výrobce)

- ručního nářadí, pomocných přípravků
- pracovních strojů – lešení

Zhotovitelé při provádění prací zajistí především:


- dodržení pracovních postupů dle návodu výrobce,
- používání montážních a bezpečnostních pomůcek a přípravků stanovených v technologickém postupu.

c) MONTÁŽNÍ SDK

Bude pouze prováděna montáž SDK.

Bude prováděno primárně z mobilního lešení nebo ze země.

Nové provedené dělicí příčky jsou z SDK (sádkokartonové konstrukce). Lešení bude opatřeno kolektivním zajištěním a okopovými prvky. Do výšky 1,5 m SDK, můžou pracovníci provádět SDK práce ze země.

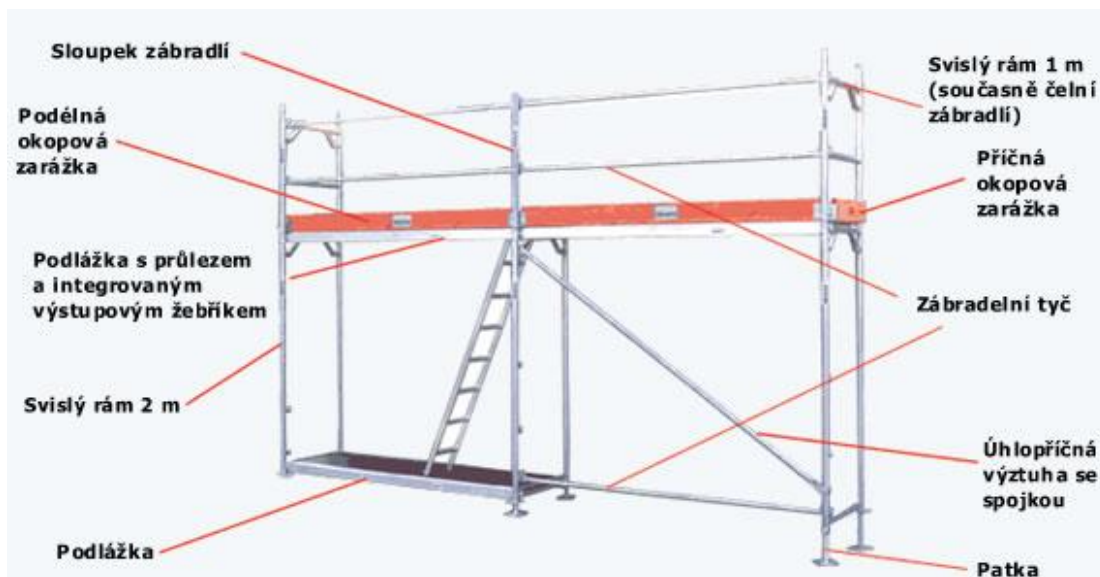

Provádění SDK prací bude dále prováděno dle odsouhlaseného technologického postupu.

NEJVÝZNAČNĚJŠÍ RIZIKA A JEJICH OPATŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI	
Sesutí, zborcení technické konstrukce	- Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací. - Používat zařízení v souladu s návodem od výrobce.
Pád materiálu z výšky	- Vymezení prostoru pod pracovištěm. - Používat ochranu hlavy a související OOPP dle TP a směrnice od zaměstnavatele. - Vyloučení práce nad sebou.
Zborcení zdi, SDK	- Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů.

Pracovní činnosti budou prováděny za pomoci (dle návodu od výrobce)

- a) ruční nářadí – montáž a demontáž lešeňové konstrukce, pro zhotovení SDK
- b) pracovní stroj – ruční nářadí

Zhotovitelé při provádění prací zajistí především:

- *dodržení pracovních postupů dle návodu výrobce,*
- *obsahu zařízení pro obsluhu strojů kvalifikovanými osobami, používat OOPP, zejména ochranu dýchacích cest a brýle během broušení a ochranu očí během montáže SDK.*

d) ODKLADY A DLAŽBY

Bude prováděno primárně z mobilního lešení nebo ze země.

Během práce s řezačkou na obklady a dlažby musí pracovníci používat ochranu očí. Pro pokládku dlažby budou pracovníci používat ochranu kolen.

Doprava materiálu bude prováděna za pomoci ručně vedených vozíků.

NEJVÝZNAČNĚJŠÍ RIZIKA A JEJICH OPATŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI	
Sesutí, zborcení technické konstrukce (DSK)	- Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací. - Používat zařízení v souladu s návodem od výrobce.
Přenášení těžkých KCE dílů, montážní práce	- Organizace práce. - Vyznačení nebezpečných prostor. - Nevstupovat do ohroženého prostoru. - Dohled během prováděných prací.
Poškrábání, pohmoždění	- Používání OOPP – zejména pracovní obuv, pracovní rukavice a dále dle vypracovaných rizik a opatření zhotovitele.
Odlétnutí materiálu	- Používání OOPP – zejména ochranu očí a dále dle vypracovaných rizik a opatření zhotovitele.

Pracovní činnosti budou prováděny za pomoci (dle návodu od výrobce)

- a) ručního nářadí, pomocných přípravků
- b) pracovních strojů – lešení

Zhotovitelé při provádění prací zajistí především:

- dodržení pracovních postupů dle návodu výrobce,
- používání montážních a bezpečnostních pomůcek a přípravků stanovených v technologickém postupu.


7) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO ŘEŠENÍ NA VEŘEJNÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A VEŘEJNÝCH PLOCHÁCH

Jedná se o rekonstrukci vnitřních prostor kuchyně a společných prostor. Venkovní prostor a přístupy do objektu zůstávají stávající.

8) POSTUPY PRO ZEDNICKÉ PRÁCE ŘEŠÍCÍ ZÁKLADNÍ TECHNOLOGIE ZDĚNÍ ZE VNITŘ OBJEKTU

Zednické práce a SDK budou prováděny.

Lešení bude opatřeno kolektivním zajištěním a okopovými prvky. Do výšky 1,5 vyzdívané zdi, můžou pracovníci provádět zednické práce ze země. Pracovníci budou práce provádět dle TP.

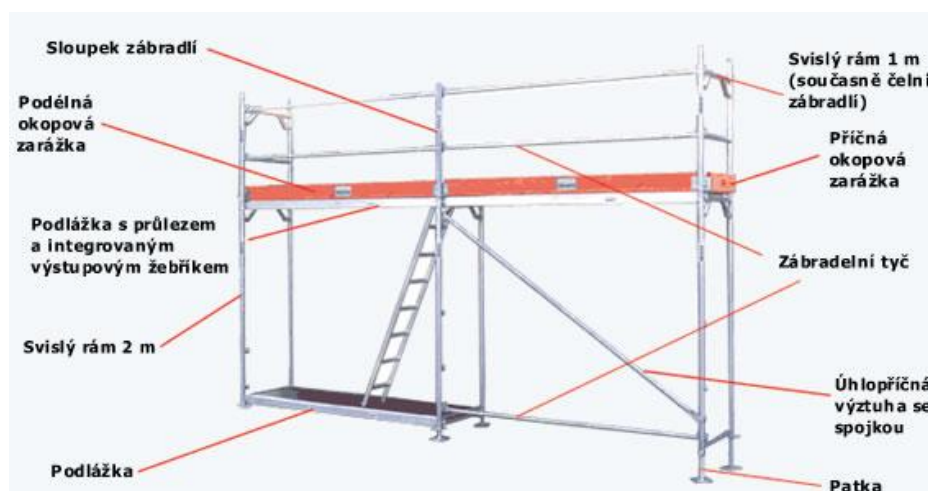

Provádění zednických prací bude dále prováděno dle odsouhlaseného technologického postupu.

HLAVNÍ RIZIKA A JEJICH OPATŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI	
Sesutí, zborcení technické konstrukce	- montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací, - používat zařízení v souladu s návodem od výrobce.
Pád materiálu z výšky	- vymezení prostoru pod pracovištěm, - používat ochranu hlavy a související OOPP, - vyloučení práce nad sebou.
Zborcení zdi, SDK	- stanovení a dodržování technologických, resp. pracovních postupů.

Pracovní činnosti budou prováděny za pomoci (dle návodu od výrobce)

- ruční nářadí – montáž a demontáž lešeňové konstrukce, pro zhotovení zednických prací
- pracovní stroj – míchačka na maltu

Zhotovitelé při provádění prací zajistí především:

- dodržení pracovních postupů dle návodu výrobce,
- obsluhu zařízení pro obsluhu strojů kvalifikovanými osobami,
- používat OOPP.

9) ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOST PRÁCE, ZEJMÉNA DOPRAVU MATERIÁLU, JEHO SKLADOVÁNÍ NA PRACOVÍŠTI

Doprava materiálu bude prováděna za pomoci nákladní/osobní dopravy, ručně vedených vozíků, auta s hydraulickou rukou nebo ručně. Pro krátkodobé skladování slouží prostor v ohrazení a dlouhodobější skladování materiálu se neuvažuje.

Dále je možné pro skladování materiálu použít vymezený/uzavřený prostor v dané části základní školy, které bude předem jasně definováno zápisem do stavebního deníku (SD). Do tohoto prostoru budou mít povolen pouze vstup zaměstnanci a pracovníci stavby, musí být zcela vyloučeno prolínání s pohybem žáků a zaměstnanců školy (vyjma zaměstnanců školy, které budou součástí stavby – zástupci zadavatele stavby).

10) POSTUPY ŘEŠÍCÍ JEDNOTLIVÉ PRÁCE A ČINNOSTI A STANOVÍCÍ OPATŘENÍ PRO PROLÍNÁNÍ A SOUBĚH JEDNOTLIVÝCH PRACÍ

V případě odhalení možného prolnutí a souběhu jednotlivých prací, bude tento souběh řešen samostatně v rámci **KONTROLNÍHO DNE KOORDINÁTORA BOZP** a dále v aktualizaci Plánu BOZP v realizaci stavby – Opatření vydané Koordinátorem BOZP.

Veškeré stavební práce, které se týkají bourání, zdění, demontáže, montáže a manipulace s objemnými břemeny budou probíhat v rámci letních prázdnin nebo s vyloučením provozu v dotčeném prostoru (uzavřením celých jednotlivých pater). Dokončovací práce drobného charakteru, již mohou probíhat za provozu školy se stanovenými opatřeními, které budou stanoveny Koordinátorem BOZP, který bude určen zadavatelem stavby pro realizační fázi.

Před samostatným zahájením prací musí být dotčená škola informována o zahájení stavebních prací a zákazu vstupu na staveniště.

11) ZAJIŠTĚNÍ ORGANIZACE A ČASOVÉ POSLOUPNOSTI NEBO SOUSLEDNOSTI PRACÍ VYKONÁVANÝCH PŘI REALIZACI STAVBY S PROVÁDĚNÍM TUNELÁŘSKÝCH A PODZEMNÍ PRACÍ

Neuvažuje se.

12) ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ VE SPOJENÍ S PRACÍ VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU, PŘI PROVÁDĚNÍ DOKONČOVACÍCH PRACÍ

Veškeré práce budou prováděny ze země nebo z mobilního lešení. Jiné práce ve výškách nebudou prováděny.

13) POSTUPY PRO SPECIFICKÁ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PODMÍNEK PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH A DALŠÍCH PRACÍ A ČINNOSTÍ V OBJEKTECH ZA JEJICH PROVOZU

Tyto postupy jsou beze změny, jedná se o úpravu vnitřních prostorů objektu.

14) POSTUPY PRO OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE SPECIFICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBU, NAPŘÍKLAD Z KONZULTACÍ S ORGÁNY INSPEKCE PRÁCE, STAVEBNÍMI ÚŘADY, ORGÁNY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A DALŠÍMI ORGÁNY

Neuvažuje se. V případě, že tato skutečnost nastane, bude řešeno samostatně v rámci **KONTROLNÍHO DNE KOORDINÁTORA BOZP** a dále v aktualizaci Plánu BOZP – Opatření vydané Koordinátorem BOZP.

15) POSTUPY PRO OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE SPECIFICKÝCH POŽADAVKŮ NA PRÁCE A ČINNOSTI SPOJENÉ ZEJMÉNA S POUŽÍVÁNÍM TOXICKÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK, AZBESTU aj.

Neuvažuje se.

16) HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ (ODHAD) – 4 měsíce

DOBA TRVÁNÍ PRACÍ (měsíc)	1	2	3	4
PROVÁDĚNÉ PRÁCE				
Provedení oplocení staveniště (kontejneru)				
Bourací práce				
Demontážní a montážní práce				
Montáž technických rozvodů				
Vnitřní práce (omítky, vnitřní podlahy, vnitřní vybavení)				
Dokončovací práce				
Vyklizení staveniště, úklid, uvedení do původního stavu				
CELKOVÉ TRVÁNÍ PRACÍ				

Harmonogram prací bude aktualizován vybraným zhotovitelem, před samostatným zahájením prací a předán Koordinátorovi BOZP ve fázi realizace stavby.

IV. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ

Bude zasláno nejpozději 8 dní před zahájením stavením prací a před předáním staveniště zhotoviteli prací na Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, Milady Horákové 1970/3, Černá Pole, 602 00 Brno, brno@suip.cz. Oznámení zašle zadavatel prací s náležitostmi, které jsou uvedeny v NV č. 591/2006 Sb., přílohy č. 4

V. ROZDĚLOVNÍK PLÁNU BOZP

Níže uvedení odpovědní zástupci zhotovitelských společností odsouhlasili Plán BOZP a to stvrzují svým podpisem. Plán BOZP nabývá účinnosti po prokazatelném seznámení všech odpovědných zástupců zhotovitelských společností na stavbě. Seznámení s plánem BOZP zajistí zástupci zhotovitele pro všechny svoje zaměstnance, plní úkoly na stavbě a pro zaměstnance „subzhotovitelů“, kteří nebyli v plánu uvedeni jako samostatní zhotovitelé. Plán BOZP je součástí dokumentace stavby. Aktualizace Plánu BOZP budou prováděny elektronicky.

1	Odsouhlasení Plánu BOZP	Firma: (název a sídlo)	Odpovědný zástupce zhotovitele: (odpovědný stavbyvedoucí)	Kontakt: (telefon a e-mail)
	Začátek	Konec	Kontrola dodaných dokumentů	
	realizovaných činností		Identifikace rizik	Technologické postupy
	Identifikace realizovaných prací na staveništi			Podpis:
2	Odsouhlasení Plánu BOZP	Firma: (název a sídlo)	Odpovědný zástupce zhotovitele: (odpovědný stavbyvedoucí)	Kontakt: (telefon a e-mail)
	Začátek	Konec	Kontrola dodaných dokumentů	
	realizovaných činností		Identifikace rizik	Technologické postupy
	Identifikace realizovaných prací na staveništi			Podpis:
3	Odsouhlasení Plánu BOZP	Firma: (název a sídlo)	Odpovědný zástupce zhotovitele: (odpovědný stavbyvedoucí)	Kontakt: (telefon a e-mail)
	Začátek	Konec	Kontrola dodaných dokumentů	
	realizovaných činností		Identifikace rizik	Technologické postupy
	Identifikace realizovaných prací na staveništi			Podpis:

Plán BOZP

25003 – MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ, MŠ A ZUŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

Níže uvedení odpovědní zástupci zhotovitelských společností odsouhlasili Plán BOZP a to stvrzují svým podpisem. Plán BOZP nabývá účinnosti po prokazatelném seznámení všech odpovědných zástupců zhotovitelských společností na stavbě. Seznámení s plánem BOZP zajistí zástupci zhotovitele pro všechny svoje zaměstnance, plní úkoly na stavbě a pro zaměstnance „subzhotovitelů“, kteří nebyli v plánu uvedeni jako samostatní zhotovitelé. Plán BOZP je součástí dokumentace stavby. Aktualizace Plánu BOZP budou prováděny elektronicky.

4	Odsouhlasení Plánu BOZP	Firma: (název a sídlo)	Odpovědný zástupce zhotovitele: (odpovědný stavbyvedoucí)	Kontakt: (telefon a e-mail)
	Začátek	Konec	Kontrola dodaných dokumentů	
	realizovaných činností		Identifikace rizik	Technologické postupy
	Identifikace realizovaných prací na staveništi			Podpis:
5	Odsouhlasení Plánu BOZP	Firma: (název a sídlo)	Odpovědný zástupce zhotovitele: (odpovědný stavbyvedoucí)	Kontakt: (telefon a e-mail)
	Začátek	Konec	Kontrola dodaných dokumentů	
	realizovaných činností		Identifikace rizik	Technologické postupy
	Identifikace realizovaných prací na staveništi			Podpis:
6	Odsouhlasení Plánu BOZP	Firma: (název a sídlo)	Odpovědný zástupce zhotovitele: (odpovědný stavbyvedoucí)	Kontakt: (telefon a e-mail)
	Začátek	Konec	Kontrola dodaných dokumentů	
	realizovaných činností		Identifikace rizik	Technologické postupy
	Identifikace realizovaných prací na staveništi			Podpis:

Plán BOZP

25003 – MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ, MŠ A ZUŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

Níže uvedení odpovědní zástupci zhotovitelských společností odsouhlasili Plán BOZP a to stvrzují svým podpisem. Plán BOZP nabývá účinnosti po prokazatelném seznámení všech odpovědných zástupců zhotovitelských společností na stavbě. Seznámení s plánem BOZP zajistí zástupci zhotovitele pro všechny svoje zaměstnance, plní úkoly na stavbě a pro zaměstnance „subzhotovitelů“, kteří nebyli v plánu uvedeni jako samostatní zhotovitelé. Plán BOZP je součástí dokumentace stavby. Aktualizace Plánu BOZP budou prováděny elektronicky.

7	Odsouhlasení Plánu BOZP	Firma: (název a sídlo)	Odpovědný zástupce zhotovitele: (odpovědný stavbyvedoucí)	Kontakt: (telefon a e-mail)
	Začátek	Konec	Kontrola dodaných dokumentů	
	realizovaných činností		Identifikace rizik	Technologické postupy
	Identifikace realizovaných prací na staveništi			Podpis:
8	Odsouhlasení Plánu BOZP	Firma: (název a sídlo)	Odpovědný zástupce zhotovitele: (odpovědný stavbyvedoucí)	Kontakt: (telefon a e-mail)
	Začátek	Konec	Kontrola dodaných dokumentů	
	realizovaných činností		Identifikace rizik	Technologické postupy
	Identifikace realizovaných prací na staveništi			Podpis:
9	Odsouhlasení Plánu BOZP	Firma: (název a sídlo)	Odpovědný zástupce zhotovitele: (odpovědný stavbyvedoucí)	Kontakt: (telefon a e-mail)
	Začátek	Konec	Kontrola dodaných dokumentů	
	realizovaných činností		Identifikace rizik	Technologické postupy
	Identifikace realizovaných prací na staveništi			Podpis:
