


Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník - tzv. plocha č. 4

Harmonogram

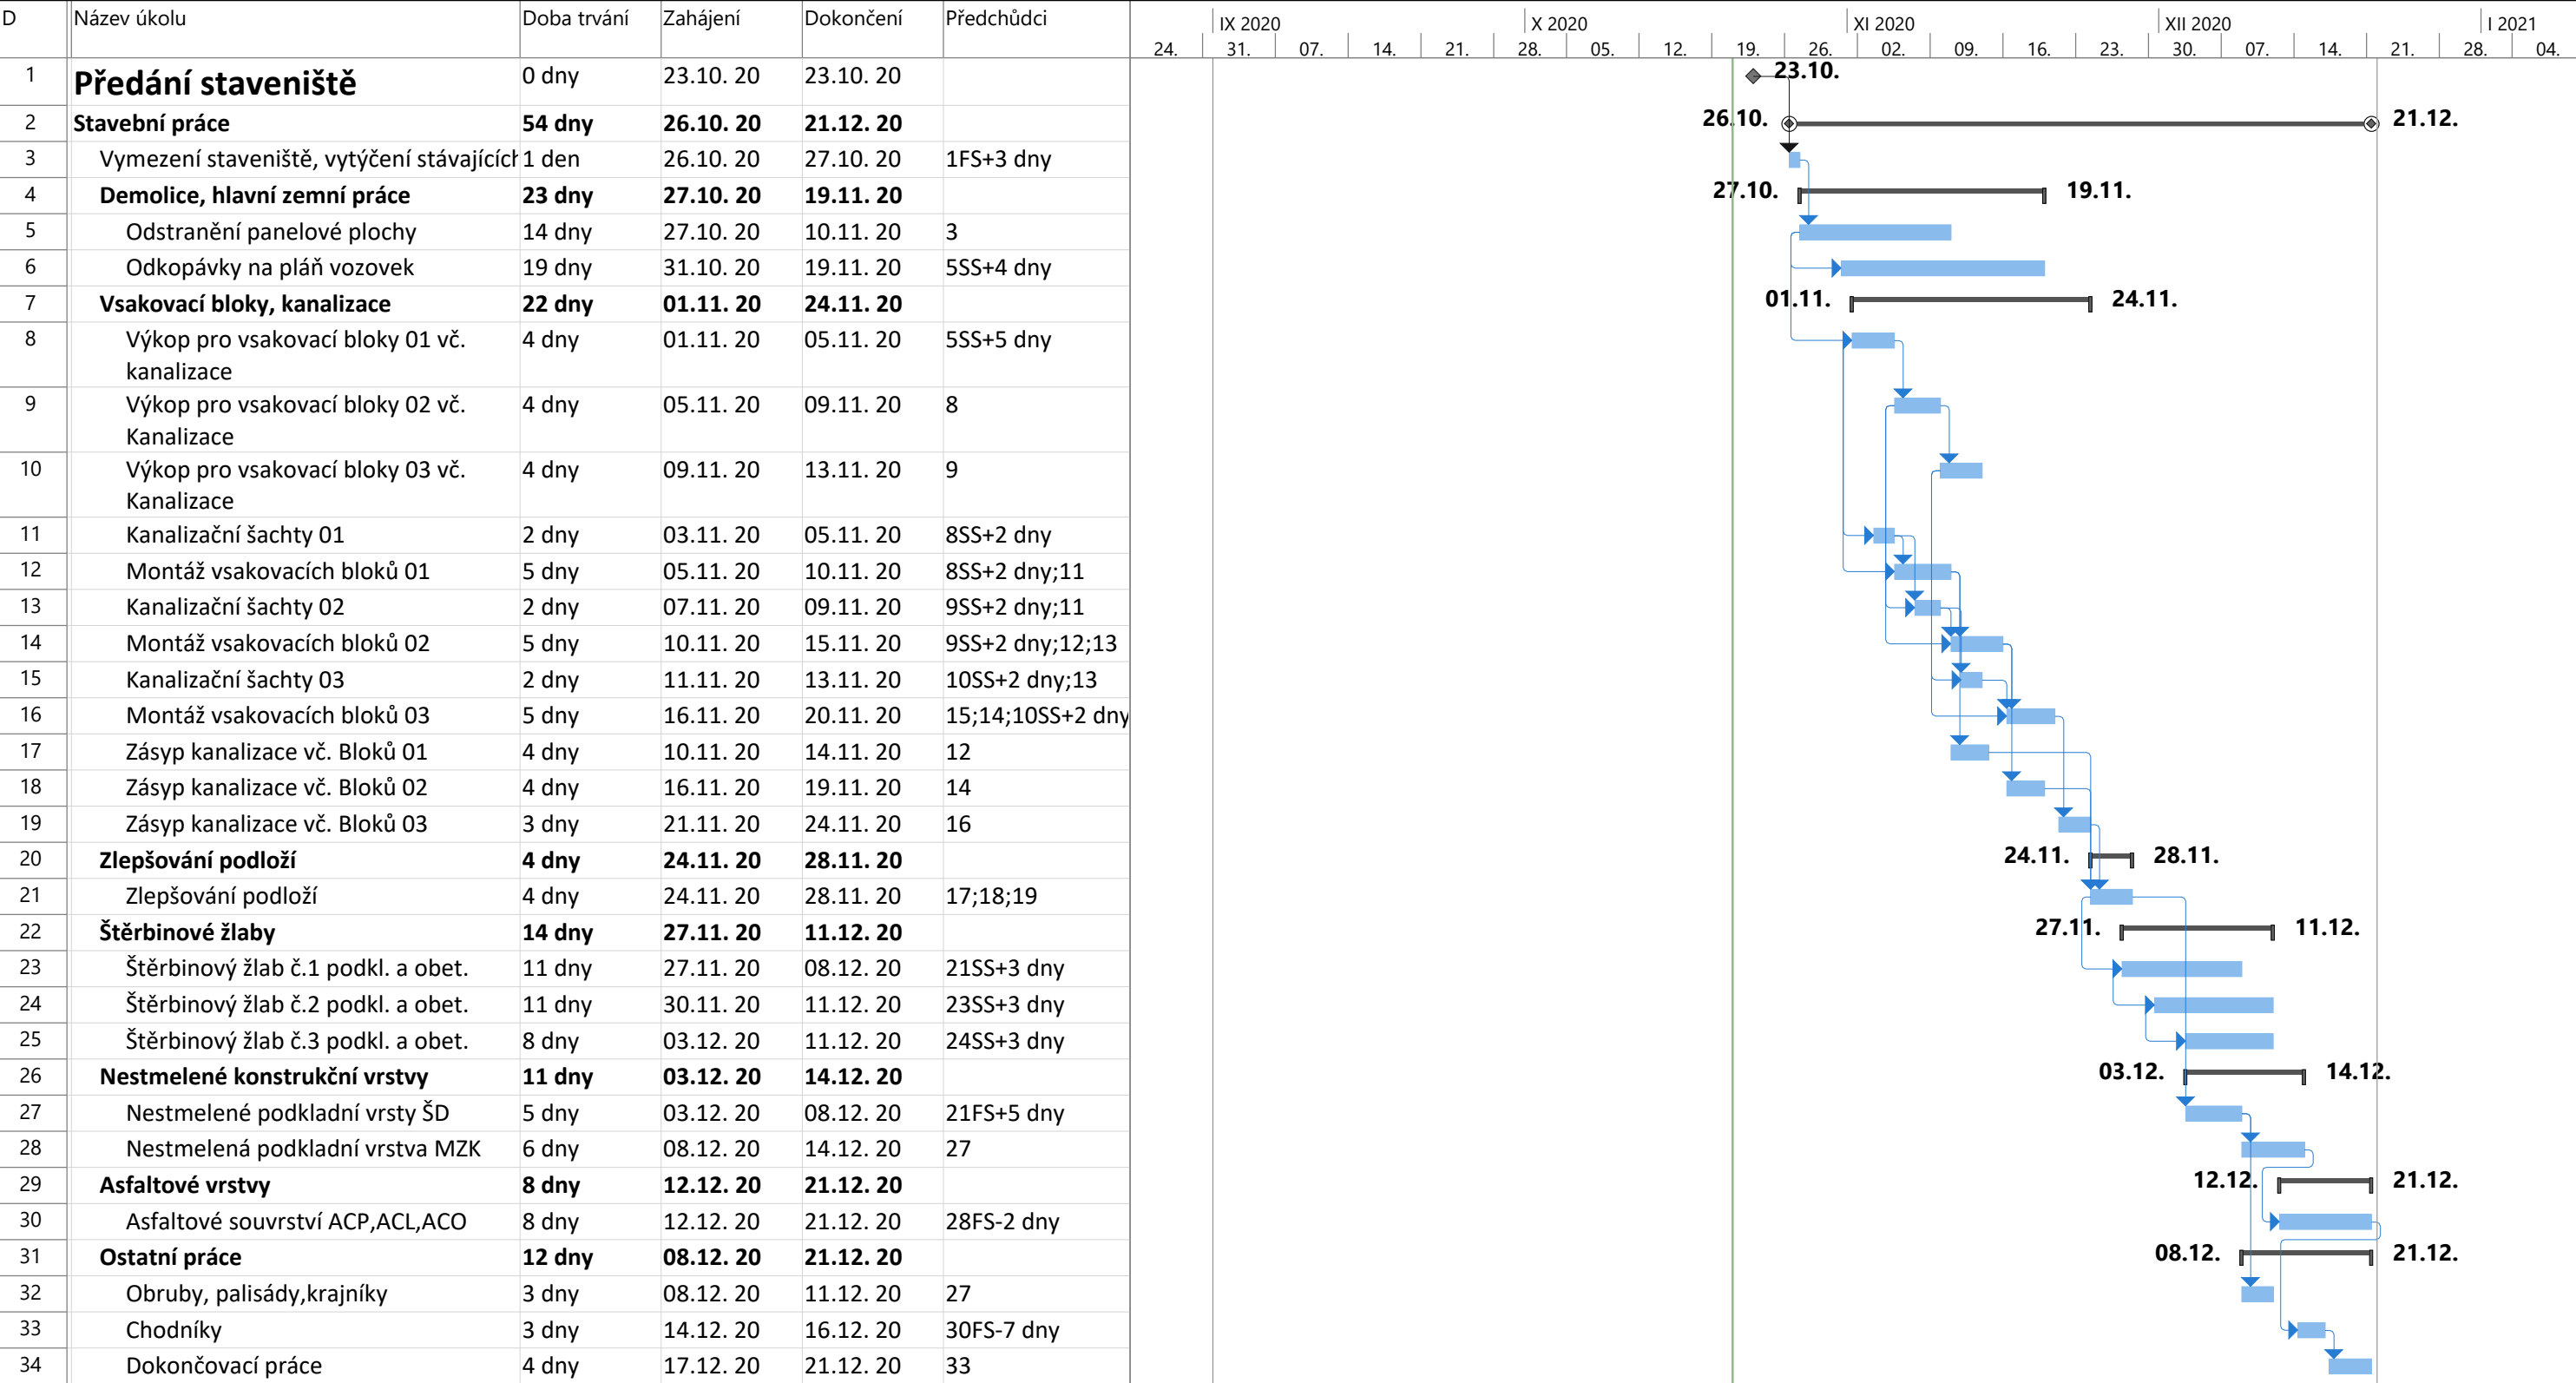

Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník - tzv. plocha č. 4

Harmonogram

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	I 2021				II 2021				III 2021				IV 2021				V 2021			
						04.	11.	18.	25.	01.	08.	15.	22.	01.	08.	15.	22.	29.	05.	12.	19.	26.	03.	10.	17.
1	Předání staveniště	0 dny	23.10. 20	23.10. 20																					
2	Stavební práce	54 dny	26.10. 20	21.12. 20																					
3	Vymezení staveniště, vytýčení stávajících	1 den	26.10. 20	27.10. 20	1FS+3 dny																				
4	Demolice, hlavní zemní práce	23 dny	27.10. 20	19.11. 20																					
5	Odstranění panelové plochy	14 dny	27.10. 20	10.11. 20	3																				
6	Odkopávky na pláš vozovek	19 dny	31.10. 20	19.11. 20	5SS+4 dny																				
7	Vsakovací bloky, kanalizace	22 dny	01.11. 20	24.11. 20																					
8	Výkop pro vsakovací bloky 01 vč. kanalizace	4 dny	01.11. 20	05.11. 20	5SS+5 dny																				
9	Výkop pro vsakovací bloky 02 vč. Kanalizace	4 dny	05.11. 20	09.11. 20	8																				
10	Výkop pro vsakovací bloky 03 vč. Kanalizace	4 dny	09.11. 20	13.11. 20	9																				
11	Kanalizační šachty 01	2 dny	03.11. 20	05.11. 20	8SS+2 dny																				
12	Montáž vsakovacích bloků 01	5 dny	05.11. 20	10.11. 20	8SS+2 dny;11																				
13	Kanalizační šachty 02	2 dny	07.11. 20	09.11. 20	9SS+2 dny;11																				
14	Montáž vsakovacích bloků 02	5 dny	10.11. 20	15.11. 20	9SS+2 dny;12;13																				
15	Kanalizační šachty 03	2 dny	11.11. 20	13.11. 20	10SS+2 dny;13																				
16	Montáž vsakovacích bloků 03	5 dny	16.11. 20	20.11. 20	15;14;10SS+2 dny																				
17	Zásyp kanalizace vč. Bloků 01	4 dny	10.11. 20	14.11. 20	12																				
18	Zásyp kanalizace vč. Bloků 02	4 dny	16.11. 20	19.11. 20	14																				
19	Zásyp kanalizace vč. Bloků 03	3 dny	21.11. 20	24.11. 20	16																				
20	Zlepšování podloží	4 dny	24.11. 20	28.11. 20																					
21	Zlepšování podloží	4 dny	24.11. 20	28.11. 20	17;18;19																				
22	Štěrbínové žlaby	14 dny	27.11. 20	11.12. 20																					
23	Štěrbínový žlab č.1 podkl. a obet.	11 dny	27.11. 20	08.12. 20	21SS+3 dny																				
24	Štěrbínový žlab č.2 podkl. a obet.	11 dny	30.11. 20	11.12. 20	23SS+3 dny																				
25	Štěrbínový žlab č.3 podkl. a obet.	8 dny	03.12. 20	11.12. 20	24SS+3 dny																				
26	Nestmelené konstrukční vrstvy	11 dny	03.12. 20	14.12. 20																					
27	Nestmelené podkladní vrstvy ŠD	5 dny	03.12. 20	08.12. 20	21FS+5 dny																				
28	Nestmelená podkladní vrstva MZK	6 dny	08.12. 20	14.12. 20	27																				
29	Asfaltové vrstvy	8 dny	12.12. 20	21.12. 20																					
30	Asfaltové souvrství ACP,ACL,ACO	8 dny	12.12. 20	21.12. 20	28FS-2 dny																				
31	Ostatní práce	12 dny	08.12. 20	21.12. 20																					
32	Obruby, palisády,krajníky	3 dny	08.12. 20	11.12. 20	27																				
33	Chodníky	3 dny	14.12. 20	16.12. 20	30FS-7 dny																				
34	Dokončovací práce	4 dny	17.12. 20	21.12. 20	33																				
