


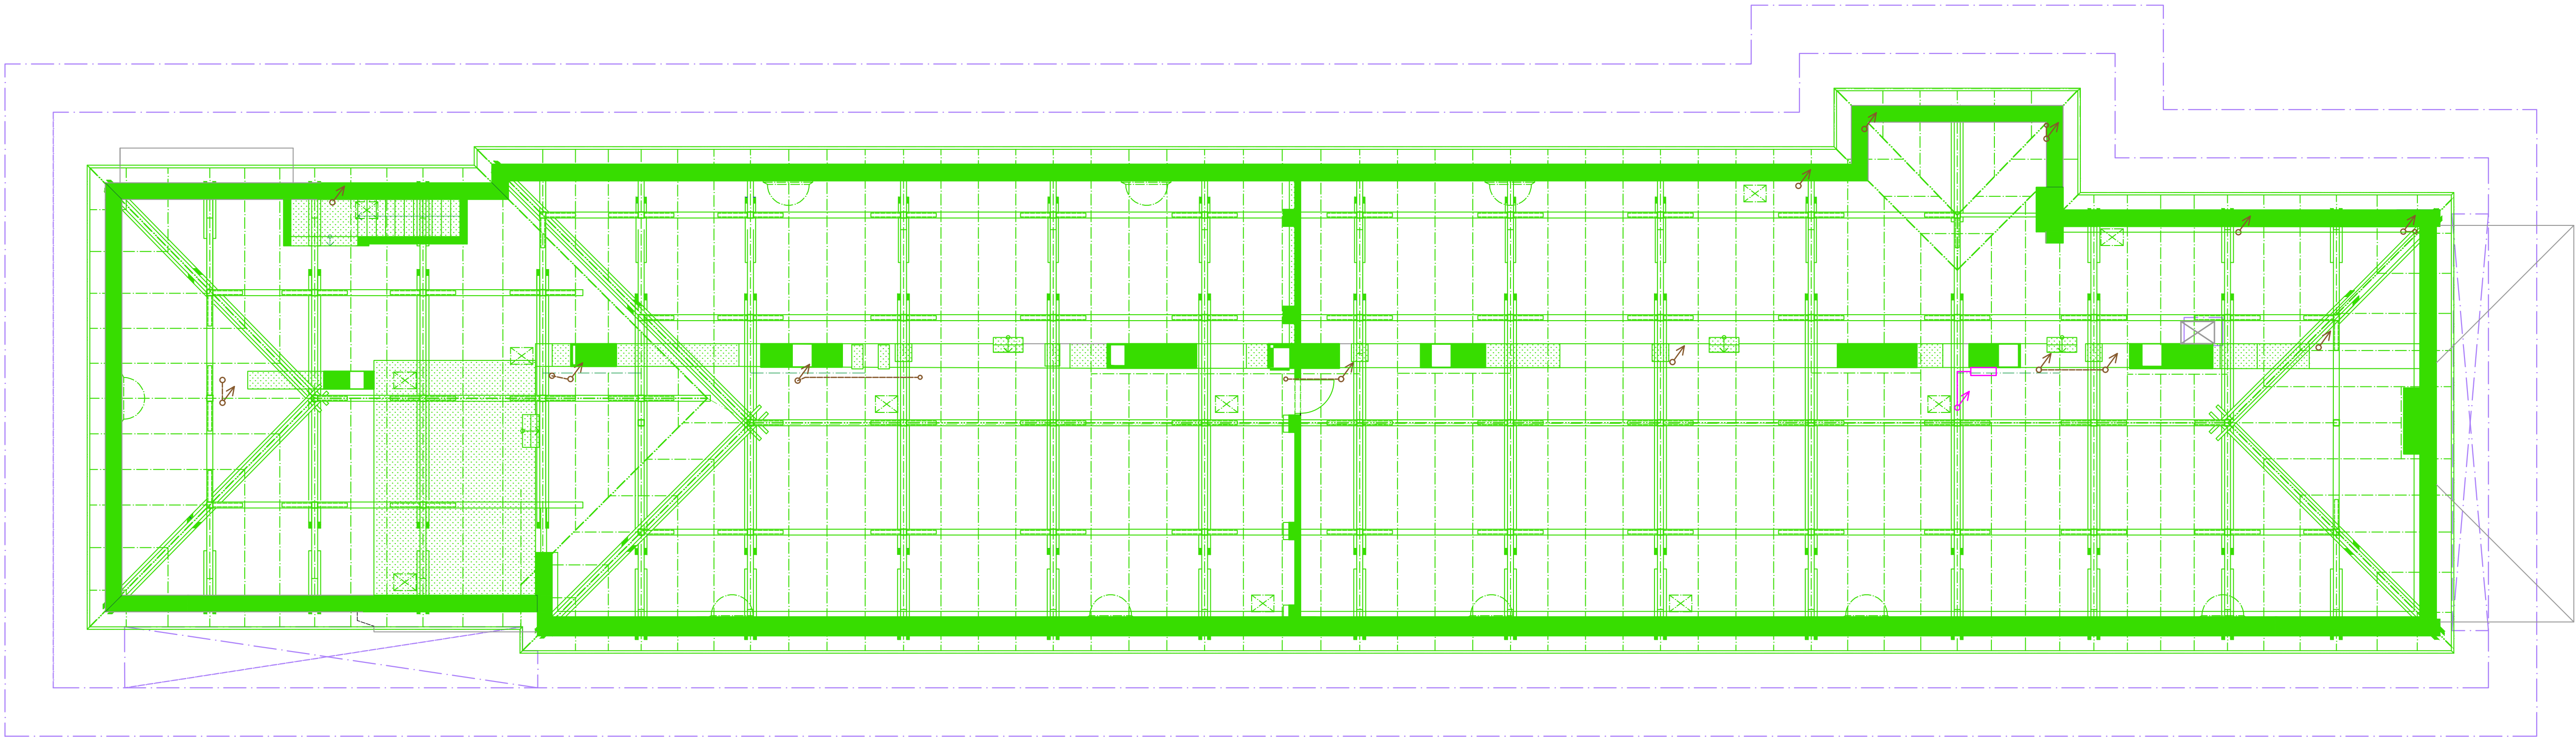

Legenda značení

- Stávající konstrukce
- 1. Etapa - dočasné a ochranné konstrukce
(montáž a zpětná demontáž po dokončení prací bouracích prací)
- 2. Etapa - bourací práce viz výkres bouracích prací (školní prázdniny)

Poznámky

- Před zahájením bouracích prací bude zpracována zhotovitelem stavby v rámci dodávky stavby dodavatelská dokumentace bouracích prací.
- Při realizaci je nutné dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky, rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- Před zahájením bouracích prací střešního pláště bude provedeno po obvodu budovy lešení s ochrannou sítí a provizorní zastřešení ze systémového lešení a systémové krycí plachty nad celým objektem školy.
- Bude provedeno provizorní zajištění stávajícího potrubí VZT za pomoci konstrukce lešení.
- V rámci 0. etapy bude ze schodišového prostoru generálním zhotovitelem stavby odstraněn veškerý mobiliář (lavice, židle, stoly, textilní čistící zóny, nástěnky, obrazy, květináče, dětské kapsáře a květináče apod).
- V rámci 1. etapy budou zhotoveny ochranné příčky z dřevěné konstrukce s dvouvrstvým záklopem z OSB desek pro zamezení prašnosti do nerekonstruovaných částí objektu.
- Do výměny stávajících dveří za nové budou stávající dveře sloužit jako stavební uzávěr. Dveře budou provizorně utěsněny v průběhu bouracích prací v objektu proti pronikání prachu.
- V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné kontaktovat projektanta.

0,000 = 268,50 m.n.m. (Bpv)

generální projektant

projektant části

číslo pare

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkytova 71/99
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Jiří Bellach

vypracoval Ing. Roman Kyška

HIP Ing. Ambrožová, Ing. Marková

kontroloval Ing. Martin Jeřábek

sam. projektant Ing. Roman Kyška

zodp. projektant Ing. Marek Vrba

stavebník MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROV V ZAHŘÁDKÁCH 48/1966, PRAHA 3, PŮDNÍ VESTAVBA

název stavby

objekt

1.2.0.4 - 101 - VESTAVBA PODKROVÍ

část

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

název dokumentu

ETAPIZACE PODKROVÍ

zakázka A-24-1134

datum 17/04/2025

stupeň DPS

měřítko 1:100

číslo přílohy

1.1.3 - 113
