



REVIZNÍ ZÁZNAM
z revize nebo zkoušky parního nebo horkovodního kotle

1. Provozovatel: **ŠKO-ENERGO, s.r.o., Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav**
Interní umístění: **teplárna E1A**

2. Technická data kotle: **parní fluidní kotel K90**

Výrobce: **VÍTKOVICE, a.s. Ostrava**

Výrobní číslo: **3171**

Rok výroby: **1997**

Jmenovitý výkon [t/h]: **140**

Pracovní teplota (max) [°C]: **535**

Pracovní přetlak [MPa]: **12,5**

Zkušební přetlak [MPa]: **18,9**

Výhřevná plocha [m²]: **5173**

Palivo: **ČU, HU, ZP**

3. Datum zkoušky: **19. 07. 2016**

4. Druh zkoušky: **zkouška těsnosti**

5. Zjištěný stav:

Zkouška těsnosti byla provedena po provedené vnitřní revizi a po provedené výměně elektrického uzavíracího ventily páry do ofukovačů.

Po dohodě s provozovatelem byla tlaková zkouška provedena při přetlaku 13,5 MPa. Po vyvození daného přetlaku byla provedena 15 min prodleva a po snížení tlaku na 80% provozního přetlaku byla provedena vizuální kontrola místa provedené opravy. Po dobu trvání zkoušky nebyly na tlakovém celku shledány žádné netěsnosti.

Zkouška těsnosti byla úspěšná.

Průběh tlakování je zřejmý z přílohy revizní zprávy – výtisk z řídicího systému PROCONTROL.

6. Navržená opatření:

Tlakový celek kotle je při stanoveném přetlaku těsný a tím způsobilý k uvedení do trvalého provozu.

7. Údaje o odstranění dřívějších závad:

8. Vyjádření o dalším provozu kotle:

Kotel JE schopen bezpečného provozu při dodržení normy ČSN 070710.


9. Razítko, podpis RT: **Ing. Milan Kraft, ev. č. 5112/6/14/R-TZ-NA,PK1,HK2**

10. Převzal: **Ing. Pavel Matějka**



19.07.16 08:00:01

19.07.16 12:30:01

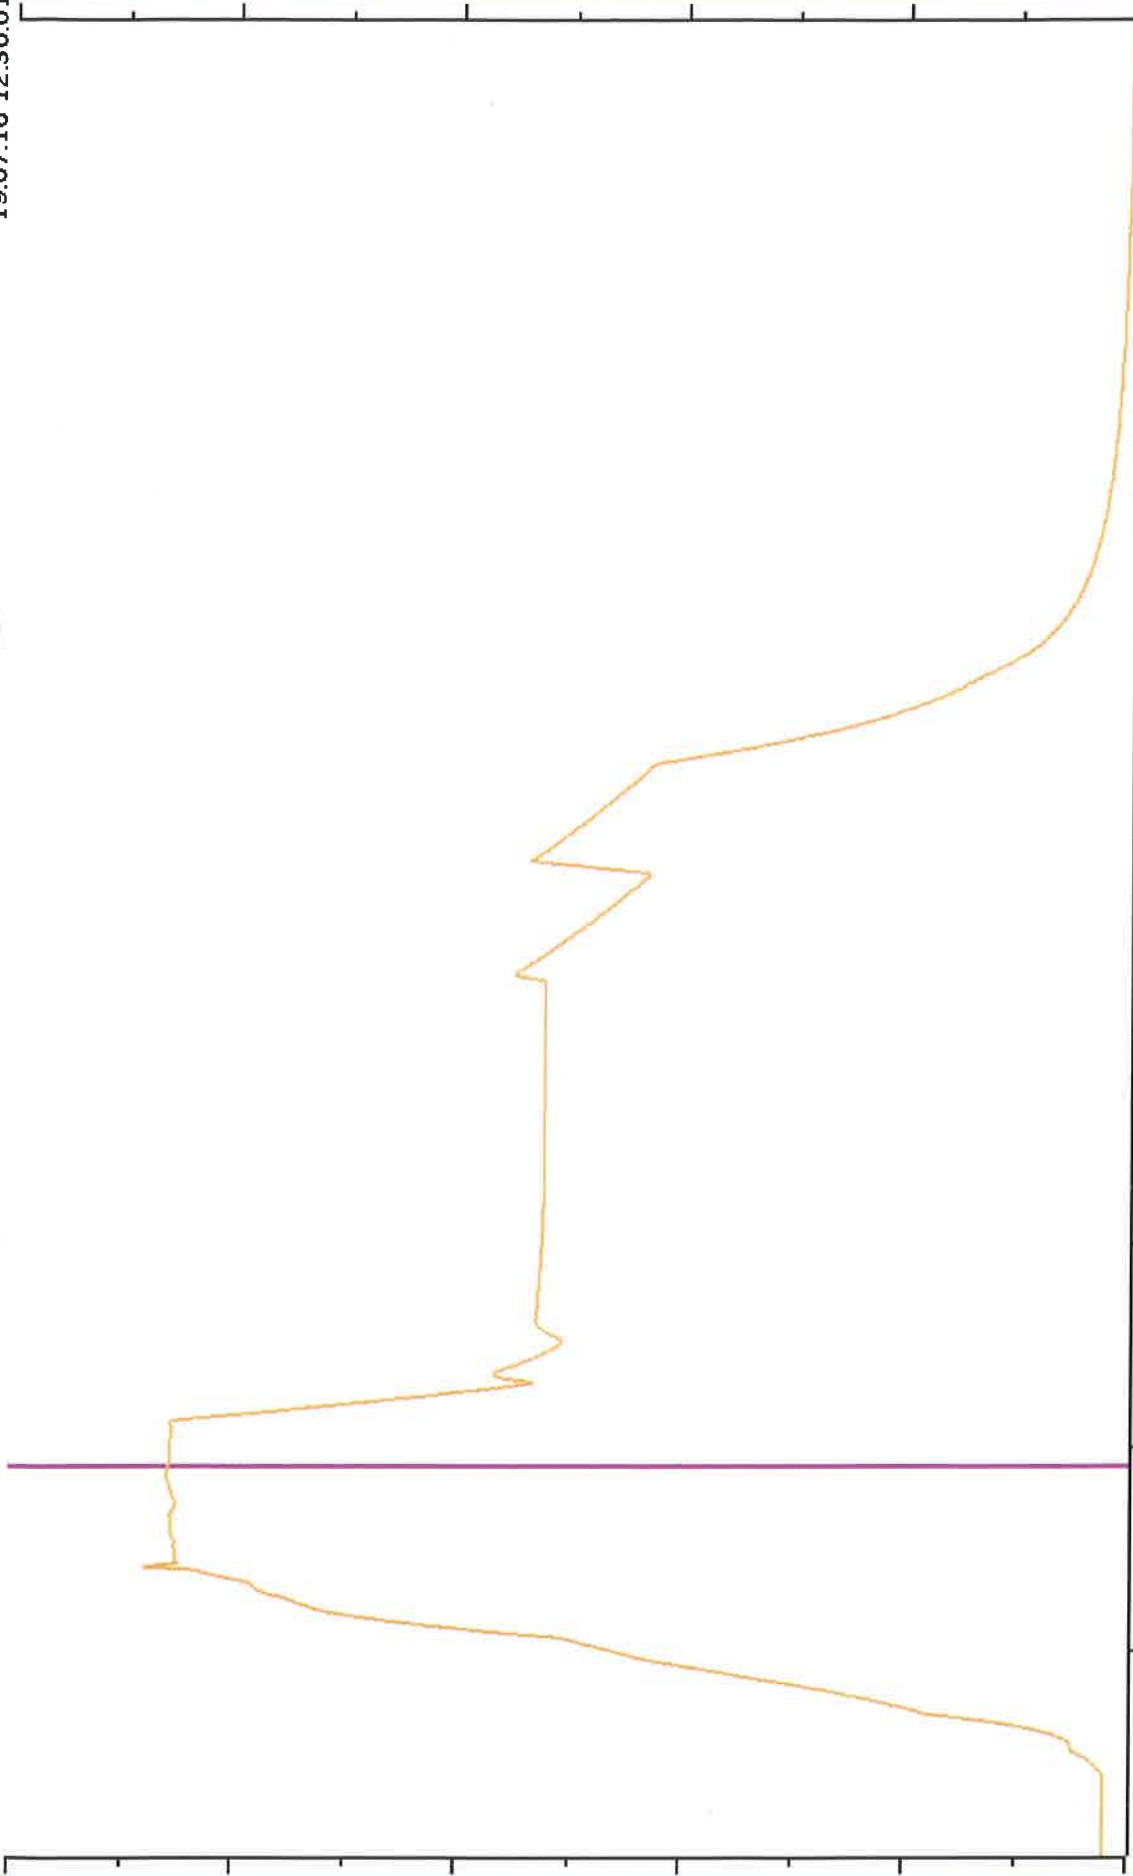

19.07.16 09:00:00

19.07.16 10:00:00

19.07.16 11:00:00

19.07.16 12:00:00

Partner	Kennzeichen	Bezeichnung	ABA	ABE	Einheit	Zeit Lineal 1	Zeit Lineal 2	Lineal Wert
<input checked="" type="checkbox"/> X-Achse	90HAD10FL801 XJ51	HIad v Bub	-300,0	300,00	mm			
<input checked="" type="checkbox"/> X-Achse	90HAD10FP801 XJ51	TI v Bub	0,000	150,00	bar	19.07.16 08:57:17		137,13
<input type="checkbox"/> X-Achse	90LAB30CP011 XQ50	P NapVo pred RV NapVo	0,000	150,00	bar			
<input type="checkbox"/> X-Achse	90LAB30CG011 XQ50	G RV NapVo	0,000	100,00	%			
