

BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V NÁSLEDUJÍCÍCH KROCÍCH

- ODSTRANĚNÍ ALUKRYTOVÉ KRYTINY VŽDY SOUČASNĚ PO OBOU STRANÁCH SEDLOVÉ STŘECHY, ABY NEDOCHÁZELO K JEDNOSTRANNÉMU ODLEHČENÍ KONSTRUKCE KROVU
- DEMONTÁŽ, ODSTRANĚNÍ, LIKVIDACE OPLECHOVÁNÍ
- ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍCH LATÍ
- ODSTRANĚNÍ STROPNÍ KCE NAD 2.NP (DŘEVĚNÝ ZÁKLOP, TEPELNÁ IZOLACE, LIGNOPOROVÉ DESKY S OMITKOU)
- RUČNÍ ROZEBRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KONSTRUKCE KROVU
- ODBOURÁNÍ ZDIVA SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 2.NP VČETNĚ VÝPLNÍ OTVORŮ (POSTUPNĚ OD SHORA DOLŮ) V ROZSAHU VYZNAČENÉM V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
- ŠETRNÉ VYBOURÁNÍ PODLAH 2.NP (BET. MAZANINA, EPS DESKY, BET. MAZANINA, SEPACE MALTOVÝ POTĚR), POSTUPNĚ PO MALÝCH ÚSECÍCH AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI STROPU (HURDISKOVÉ DESKY), PŘI BOURÁNÍ NESMÍ VZNIKAT RÁZY!!!
- STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STROPU 1.NP, PODSTOJKOVÁNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE (PLOŠNÁ HMOTNOST 590kg/m2)
- VYBOURÁNÍ PODLAH 1.NP VČ. HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY A PODKLADNÍHO BETONU
- BETONÁŽ ZÁKLADŮ NOVÝCH NOSNÝCH STĚN, VYZDĚNÍ NOVÝCH NOSNÍCH STĚN, ULOŽENÍ HEB NOSNÍKŮ, VYNESENÍ STROPŮ NAD 1.NP
- ZRUŠENÍ PROVIZORNIHO PODSTOJKOVÁNÍ, NÁSLEDNĚ BOURÁNÍ PŮVODNÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ V 1.NP
- VYBOURÁNÍ ZBYLÝCH ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ V KOLIZI S NOVÝMI VIZ. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE



POZNÁMKA

- PŘED ZAPOČETIM BOURACÍCH PRACÍ BUDE OBJEKT VYKLIZEN, VEŠKERÉ ROZVODNÉ SÍTĚ (ELEKTRICKÉ, VODNÍ, TEPELNÉ) INSTALOVANÉ V OBJEKTU ODPOJENY A ODSTRANĚNY
- PRO ODBĚR EL. PROUDU PRO POTŘEBY BOURACÍCH PRACÍ SE MUSÍ ZŘÍDIT SAMOSTATNÉ VEDENÍ/NAPOJOVACÍ BODY
- PRO SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI BOURACÍCH PRACÍ SE ZABEZPEČÍ ZDROJ VODY
- KONSTRUKCE STŘECHY SE BUDE BOURAT RUČNĚ S POUŽITÍM PROSTŘEDKŮ MALÉ MECHANIZACE (PILY)
- BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE ROZFAZOVÁNO, POSTUPOVÁNO BUDE VERTIKÁLNÍM SMĚREM SHORA DOLŮ POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM V SOULADU S PRACOVNÍM POSTUPEM, KTERÝ ZPRACUJE GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY
- PŘED BOURÁNÍM PŘÍČEK POD VODOROVNÝMI KONSTRUKCEMI JE NUTNÉ OVĚŘIT JEJICH MOŽNOU NOSNOU FUNKCI
- ROZEBÍRÁNÍ STROPŮ SE BUDE PROVÁDĚT SHORA
- PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ORGANIZOVÁNY A DOZOROVÁNY OPRAVNĚNOU OSOBOU STAVBYVEDOUČIHO DLE ZÁKONA 360/1992Sb
- V KAŽDÉM OKAMŽIKU PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE ZAJIŠTĚNA STABILITA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- BOURACÍ PRÁCE PROVÁDĚNÉ NA HRANICÍCH POZEMKU BUDOU PROVÁDĚNY BEZ POUŽITÍ TĚŽKÉ TECHNIKY, TAK ABY NEDOCHÁZELO K PŘÍPADNÝM OTŘESŮM SOUSEDNÍCH BUDOV
- VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE NEPRODLENĚ VYVÁŽEN Z PROSTOR BUDOVY, DRUHOTNĚ TŘÍDĚN DLE POŽADAVKŮ ZÁKONA O ODPADECH A KATALOGU ODPADŮ A NÁSLEDNĚ LIKVIDOVÁN V SOULADU S POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY ZEJMÉNA ZÁKONEM 185/2001 Sb. (ODVÁŽEN NA SKLÁDKU NEBO RECYKLOVÁN)
- VODOROVNÉ KONSTRUKCE NESMÍ BÝT ZATĚŽOVÁNY VYBOURANÝM MATERIÁLEM
- VZHLEDEM K TOMU, ŽE KE STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ RELEVANTNÍ PROJEKČNÍ PODKLADY, VEŠKERÉ UVEDENÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ Z ODBORNÉHO ODHADU PROJEKTANTA A PROVEDENÉHO STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU
- STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ BUDE KOMPLETNĚ VYBOURÁNO VČ. STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY A PODKLADNÍHO BETONU
- PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÉKOLIV ANOMALIE V PRŮBĚHU BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PRÁCE OKAMŽITĚ ZASTAVENY, NA MÍSTO BUDE PŘÍZVÁN GENERÁLNÍ PROJEKTANT, STATIK
- PO PROVEDENÝCH BOURACÍCH PRACÍ BUDE ODPOVĚDNOU OSOBOU GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA ZOHLEDNĚN STÁVAJÍCÍ STAV ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
- VÝKOPOVÉ PRÁCE SMÍ BÝT PROVÁDĚNY POUZE PO ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
- PŘED ZAPOČETIM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE VYTÝČENA POLOHA JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ
- VEŠKERÉ ZMĚNY, ODCHYLKY OD PROJEKČNÍHO NÁVRHU BUDOU PROJEDNÁNY A ODSOUHLASENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY
- V RÁMCI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DODRŽOVÁNY VEŠKERÉ ZÁSADY BOZP V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY Č. 591/2006 Sb
- BOURÁNÍ PODLAH NAD HURDISKOVÝMI STROPY BUDE PROBÍHAT S OHLEDEM NA PŘÍTOMNOST KERAMICKÝCH DESEK, ZEJMÉNA NESMÍ VZNIKAT RÁZY, NEBUDOU POUŽITA PNEUMATICKÁ KLAĐIVA

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM – JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM – Bpv

±0,000 = 325,000 m n.m.

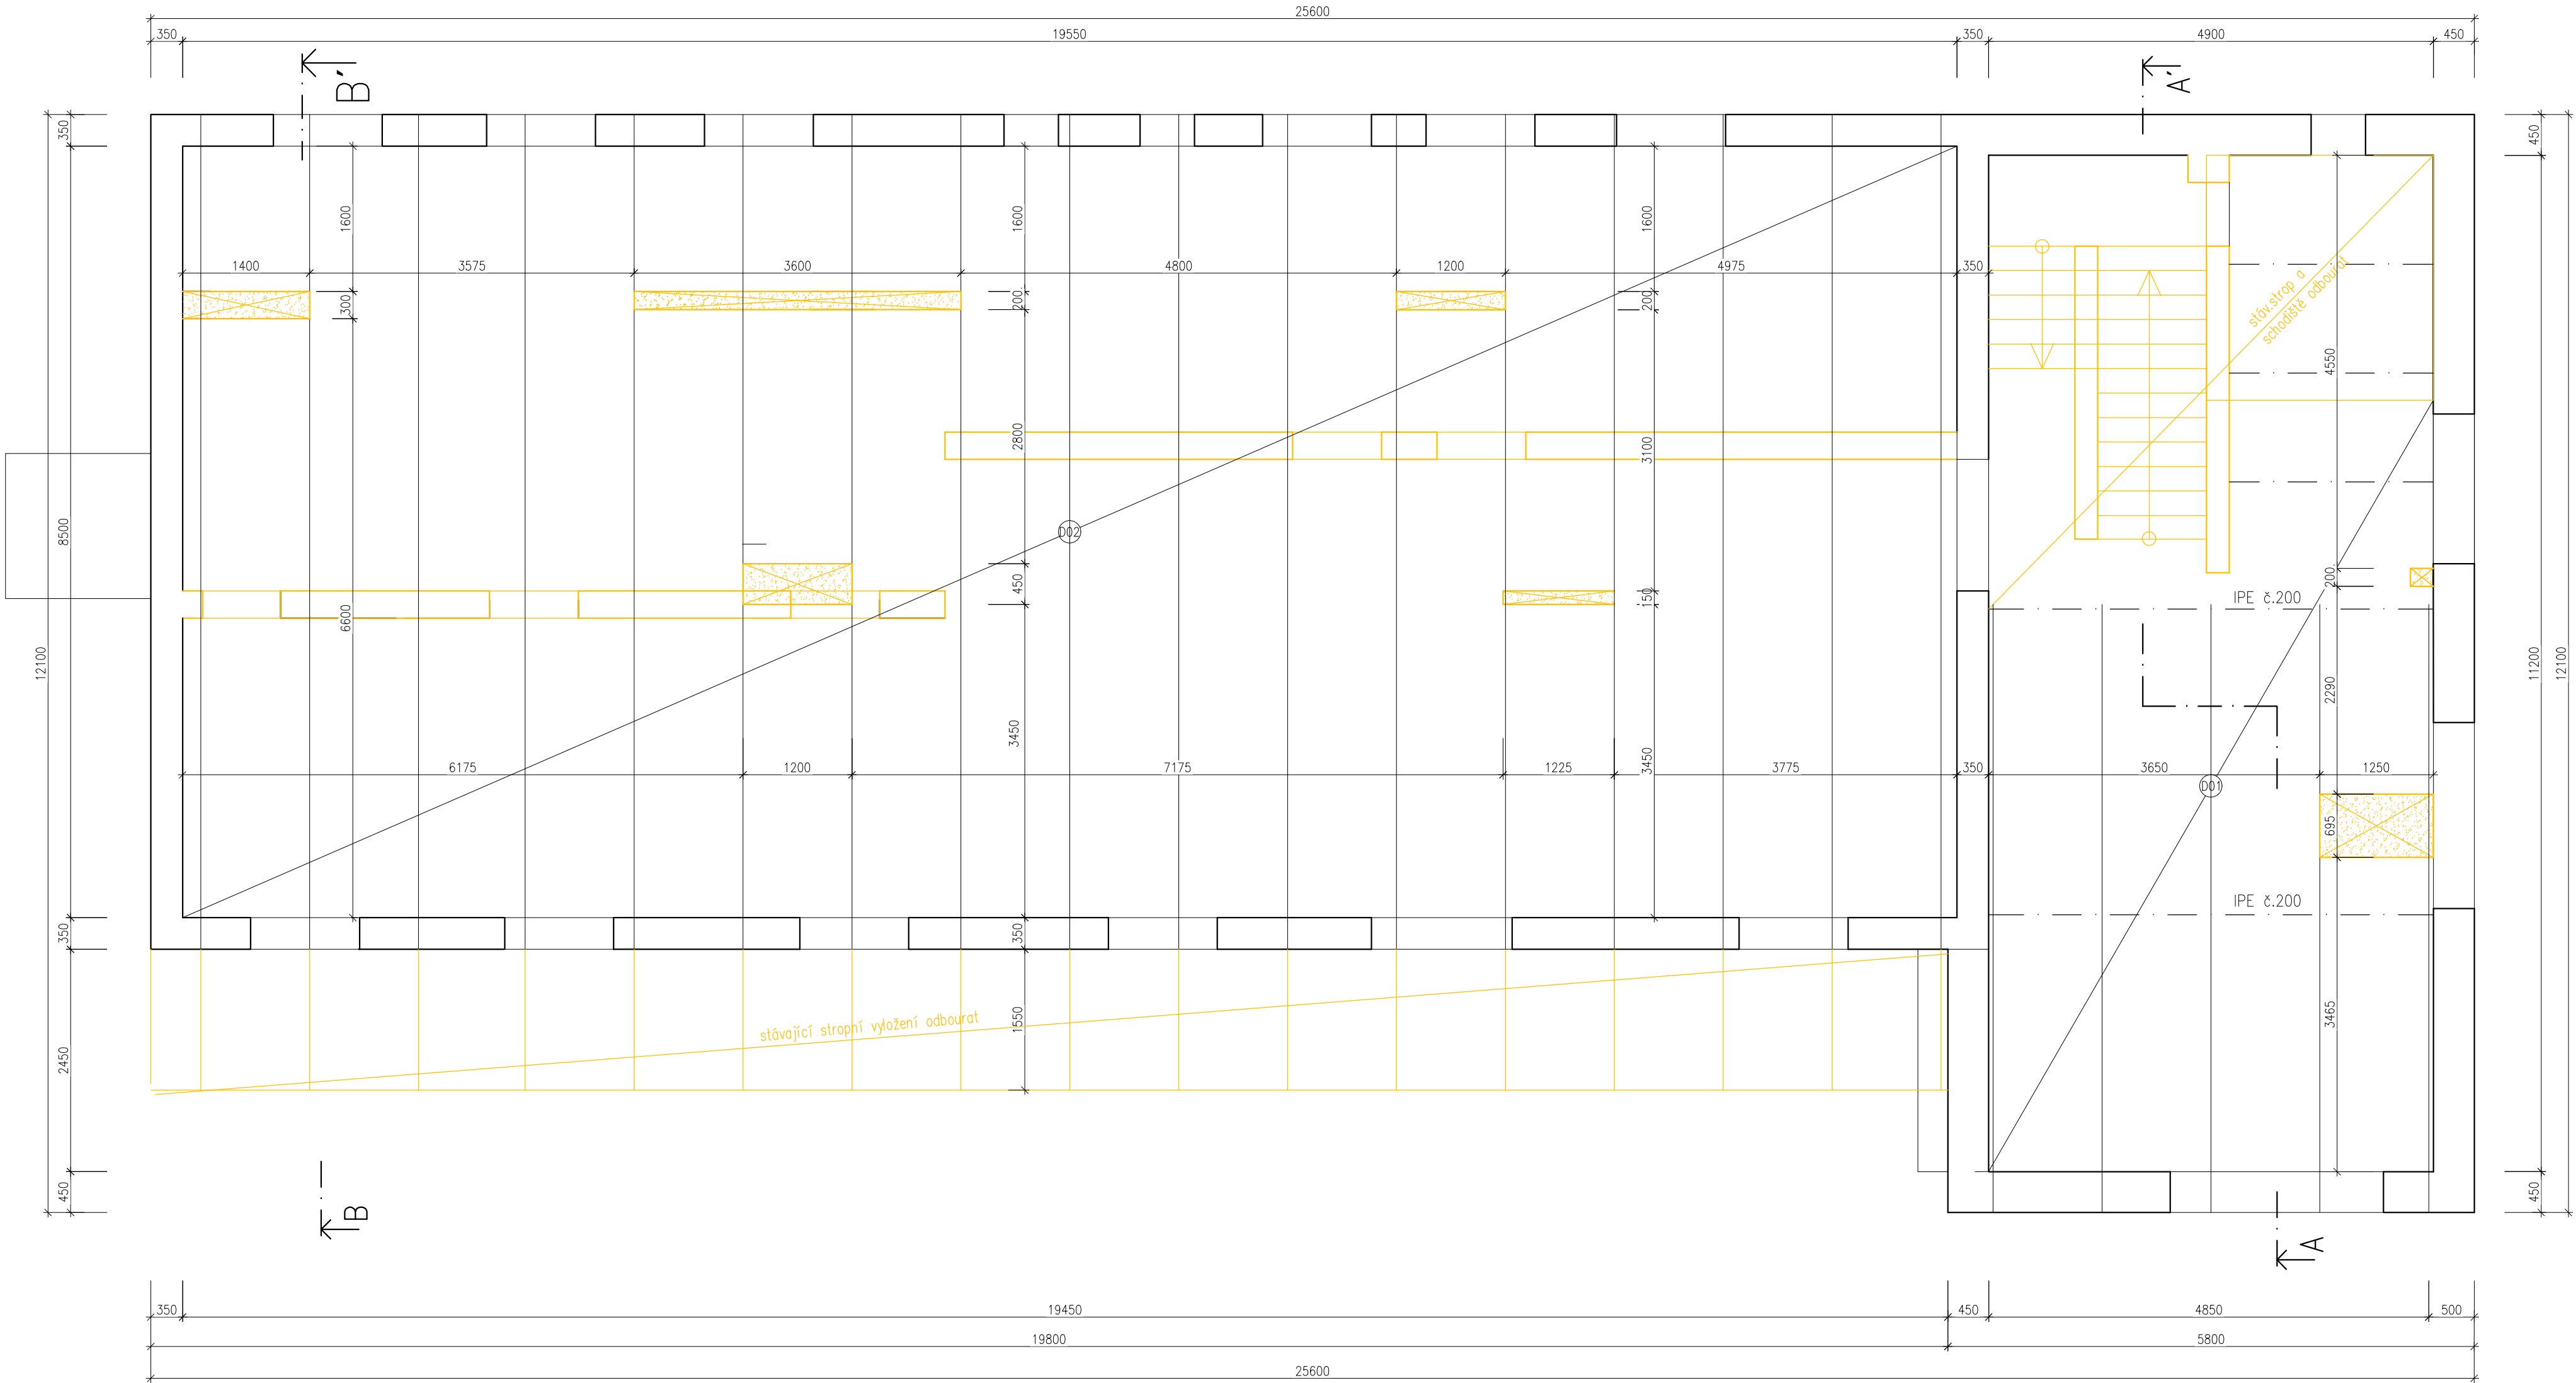

HLAVNÍ PROJEKTANT: ENERGY BENEFIT CENTRE Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz		Vypracoval: Ing. Jan Kovář Zodpovědný projektant: Ing. Miroslava Kneprová	
PROJEKT: Rekonstrukce objektu č.p. 368 ve Stříbrné Skalici na bytový dům			
STAVEBNÍK: Obec Stříbrná Skalice Sázavská 353, 281 67 Stříbrná Skalice			
ČÁST, PROFESE: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Část: D.1.1	
VÝKRES: VÝKRES STROPU NAD 1.NP – BOURACÍ PRÁCE		Stupeň: DPS	
		Změna: 00	
		Formát: 3 x A4	
		Měřítko: 1:50	
		Zakázkové číslo: 190160	
		Paré: 07/2019	
		Datum: 07/2019	
		Část: D.1.1	
		Stupeň: DPS	
		Změna: 00	
		Formát: 3 x A4	
		Měřítko: 1:50	
