
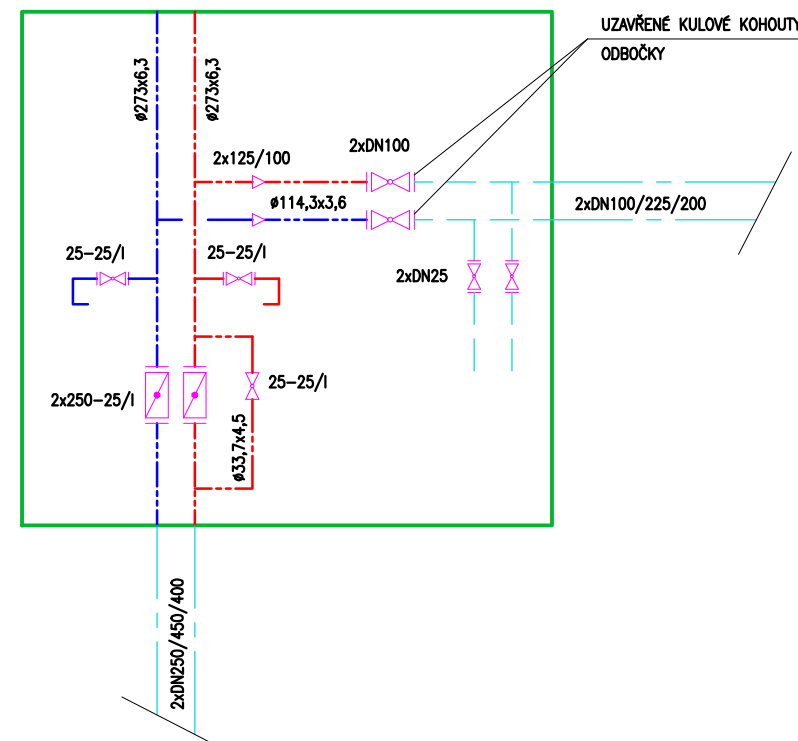


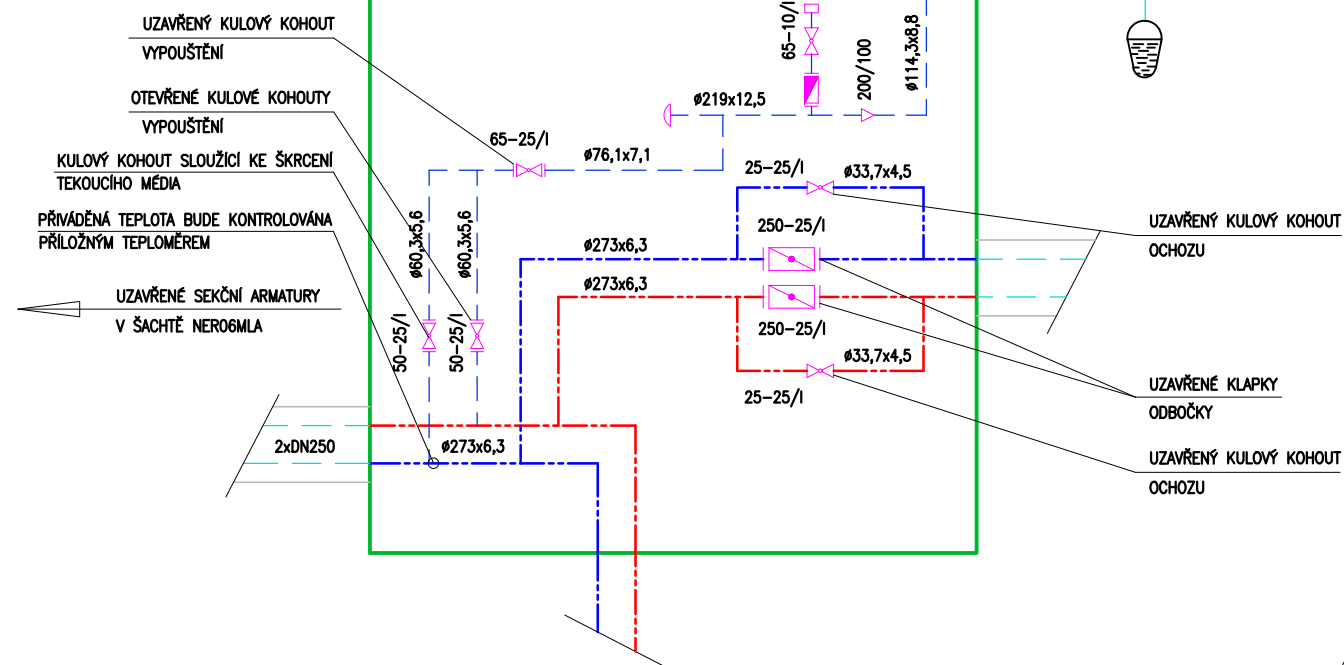



POSTUP PŘEDEHŘEVU:

- POTRUBÍ SYSTÉM JE NAVRŽEN S TEPELNÝM PŘEDEPNUTÍM
- TRASA BUDE KOMPENZOVÁNA JEDNOČINNÝMI KOMPENZÁTORY. NĚKTERÉ ÚSEKY POTRUBÍ BUDOU OBLOŽENY DILATAČNÍMI PĚNOVÝMI PRVKY (POLYURETANOVÝMI PROFILOVÝMI DESKAMI)
- JSOU NAVRŽENY ČTYŘI DVOJICE JEDNOČINNÝCH KOMPENZÁTORŮ (K1–K4), KTERÉ BUDOU VLOŽENY DO NOVĚ VYBUDOVANÉ TRASY HORKOVODU V ULICI KOJETICKÁ.
- POTRUBÍ BUDE OSAZENO DILATAČNÍMI POLŠTÁŘI DLE MONTÁŽNÍHO SCHÉMATU
- POTRUBÍ BUDE ZASYPÁNO V ROZSAHU DLE VARIANT ZNÁZORNĚNÝCH VE VÝKRESU PŘEDEHŘEVU – 1) KOMPLETNĚ ZASYPANÝ ÚSEK – PÍSKOVÝ OBSYP + ZÁSYP ZHUTNĚNOU ZEMINOU
2) ČÁSTEČNĚ ZASYPANÝ ÚSEK – PÍSKOVÝ OBSYP
3) NEZASYPANÝ ÚSEK
- NOVĚ VYBUDOVANÁ TRASA BUDE PŘÍVAŘENA KE STÁVAJÍCÍ TRASE A BUDE PROVEDENO PŘEDEPNUTÍ
- PRO MOŽNOST CÍRKULACE TOPNÉHO MÉDIA NA TRASE BUDE POUŽITO ZKRATU V ŠACHTĚ NERO1MLA A UZAVŘENY SEKČNÍ ARMATURY V ŠACHTĚ NERO6MLA.
- POTRUBÍ BUDE NEJDŘÍVE NAPUŠTĚNO ZE ZPÁTEČKY, PO JEHO PROHŘÁTÍ BUDE POSTUPNĚ PŘIMÍCHÁVÁNA VODA Z PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ
- PO NAHŘÁTÍ POTRUBÍ NA 70 AŽ 80°C A DOSAŽENÍ POTŘEBNÉHO STLAČENÍ KOMPENZÁTORŮ BUDOU KOMPENZÁTORY ZAVAŘENY
- NEZASYPANÉ ÚSEKY SE ZASYPOU KROMĚ MÍST S JEDNOČINNÝMI KOMPENZÁTORY
- TEPLOTA SE SNÍŽÍ NA MAX. 40°C A POTÉ SE KOMPENZÁTORY ZASPOUKJÍ A ZASYPOU
- VYPOUŠTĚNÍ POTRUBÍ PO PŘEDEHŘÁTÍ SE PROVEDE V ŠACHTĚ NERO1MAL
- STLAČENÍ KOMPENZÁTORU MUSÍ BÝT PROKAZATELNĚ ZDOKUMENTOVÁNO (FOTO KOMPENZÁTORU PŘED ZAČÁTKEM PŘEDPÍNÁNÍ A PO DOSAŽENÍ POŽADOVANÉHO STLAČENÍ) A PO KONTROLE MŮŽE BÝT DÁN POKYN K ZAVAŘENÍ KOMPENZÁTORU

HODNOTY STLAČENÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPENZÁTORŮ:

- JEDNOČINNÉ KOMPENZÁTORY K1 – STLAČENÍ 43mm
- JEDNOČINNÉ KOMPENZÁTORY K2 – STLAČENÍ 46mm
- JEDNOČINNÉ KOMPENZÁTORY K3 – STLAČENÍ 43mm
- JEDNOČINNÉ KOMPENZÁTORY K4 – STLAČENÍ 38mm

LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | OSA HORKOVODU PŘEDEHRŘÍVANÉHO
PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ |
|  | PŘÍVODNÍ A VRATNÉ POTRUBÍ HORKOVODU
(VIZ. DETAIL KONCOVÝCH BODŮ. |
|  | KOMPLETNĚ ZASYPANÝ ÚSEK – PÍSKOVÝ
OBSYP + ZÁSYP ZHUTNĚNOU ZEMINOU |
|  | ČÁSTEČNĚ ZASYPANÝ ÚSEK – PÍSKOVÝ
OBSYP |
|  | NEZASYPANÝ ÚSEK |
|  | STAVEBNÍ OBJEKTY |

VYTYČOVACÍ BODY HORKOVODU:

LV1	VÝŠKOVÝ LOM
Z1	KONCOVÝ BOD
V1	VSTUP DO ŠACHTY
K1	JEDNOČINNÝ KOMPENZÁTOR

 AF-Consult CZ	AKCE: Teplo Neratovice, spol. s. r. o. Obnova PTV v ulici Kojetická mezi šachtami NER10KOJ a NER01MLA			MĚŘÍTKO: —
	NÁZEV:			POČET A4: 4
	SITUACE PŘEDEHŘEVU			REVIZE: 0
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 0241T.19	VYPRACOVAL: ING. KOUKL	KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ: ING. BRÍNDÁ	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 0241T-19/D1-23	LIST:
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
DATUM: 01/2020				
