


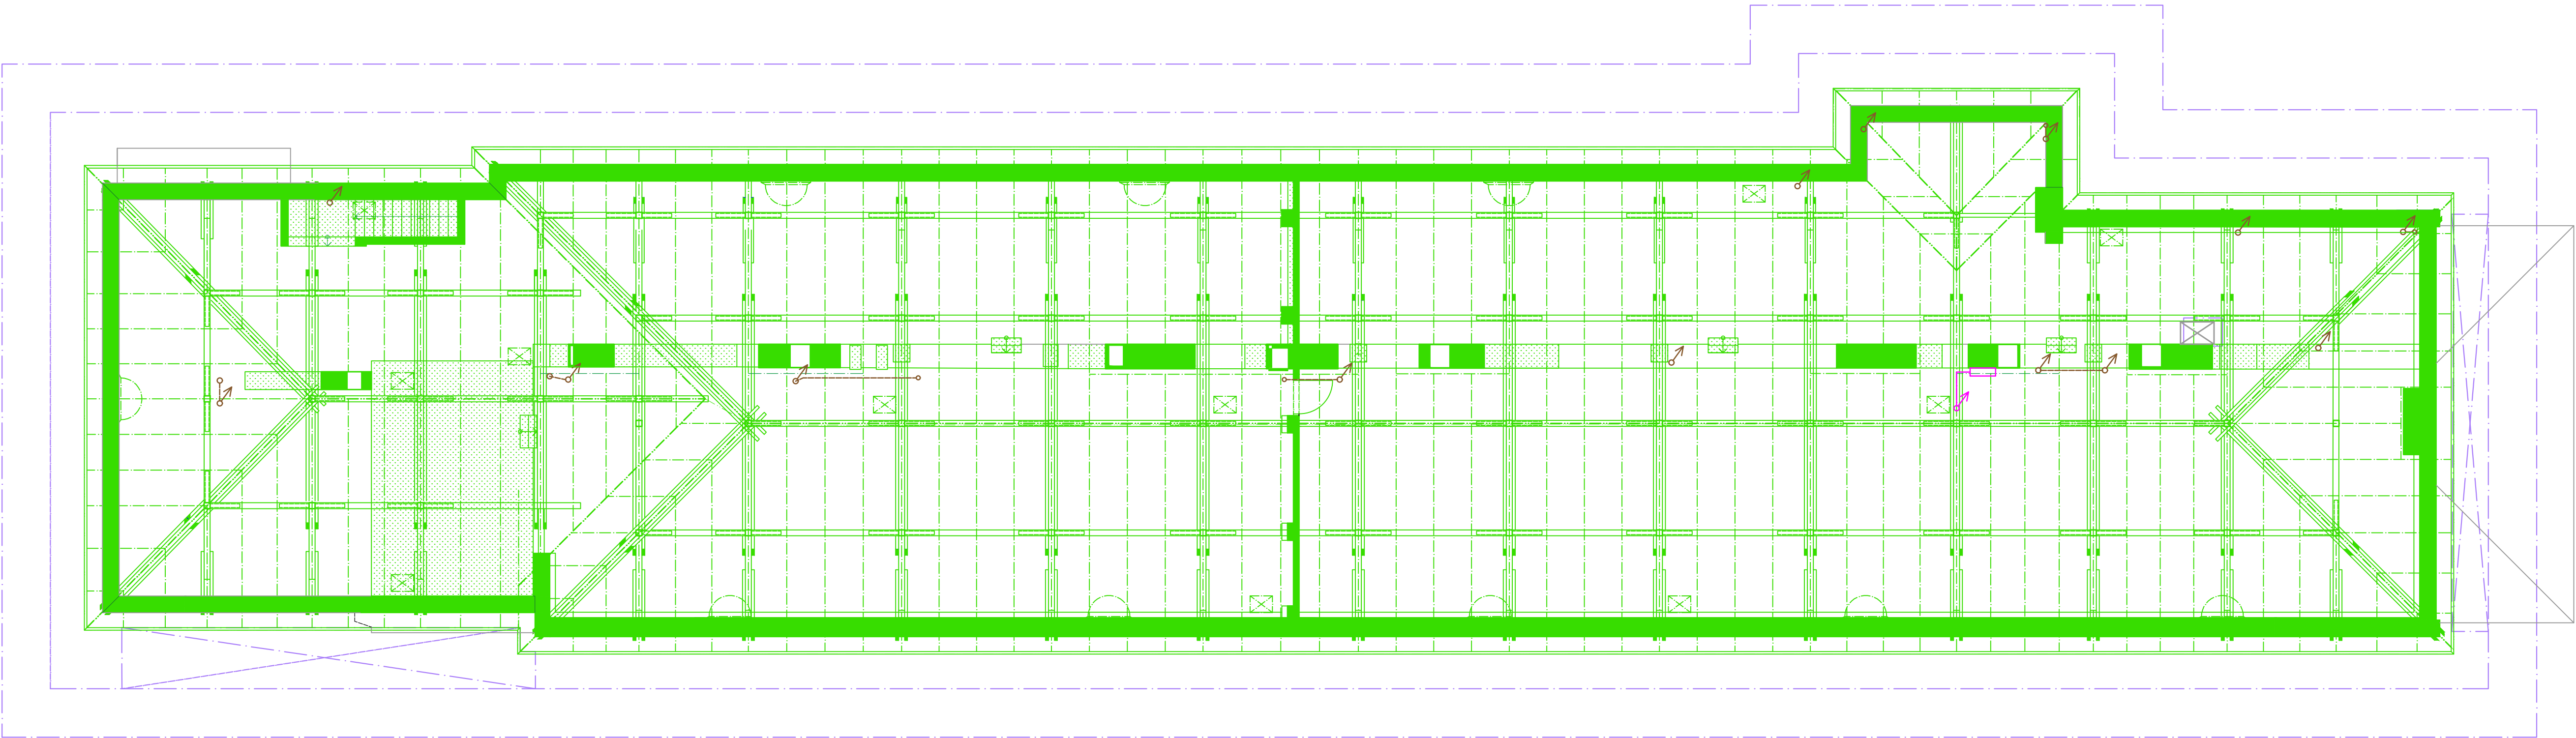

Legenda značení

- Stávající konstrukce
- 1. Etapa - dočasné a ochranné konstrukce
(montáž a zpětná demontáž po dokončení prací bouracích prací)
- 2. Etapa - bourací práce viz výkres bouracích prací (školní prázdniny)

Poznámky

- Před zahájením bouracích prací bude zpracována zhotovitelem stavby v rámci dodávky stavby dodavatelská dokumentace bouracích prací.
- Při realizaci je nutné dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky, rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- Před zahájením bouracích prací střešního pláště bude provedeno po obvodu budovy lešení s ochrannou sítí a provizorní zastřešení ze systémového lešení a systémové krycí plachty nad celým objektem školy.
- Bude provedeno provizorní zajištění stávajícího potrubí VZT za pomoci konstrukce lešení.
- V rámci 0. etapy bude ze schodišového prostoru generálním zhotovitelem stavby odstraněn veškerý mobiliář (lavice, židle, stoly, textilní čistící zóny, nástěnky, obrazy, květináče, dětské kapsáře a květináče apod).
- V rámci 1. etapy budou zhotoveny ochranné příčky z dřevěné konstrukce s dvouvrstvým záklopem z OSB desek pro zamezení prašnosti do nerekonstruovaných částí objektu.
- Do výměny stávajících dveří za nové budou stávající dveře sloužit jako stavební uzávěr. Dveře budou provizorně utěsněny v průběhu bouracích prací v objektu proti pronikání prachu.
- V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné kontaktovat projektanta.

0,000 = 268,50 m.n.m. (Bpv)

generální projektant

projektant části

číslo pare

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkytova 71/99
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Jiří Bellach
HIP Ing. Ambrožová, Ing. Marková
sam. projektant Ing. Roman Kyška
stavebník MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517

vypracoval Ing. Roman Kyška
kontroloval Ing. Martin Jeřábek
zodp. projektant Ing. Marek Vrba

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROV V ZAHŘÁDKÁCH 48/1966, PRAHA 3, PŮDNÍ VESTAVBA

název stavby

1.2.0.4 - 101 - VESTAVBA PODKROVÍ



objekt

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

část

ETAPIZACE PODKROVÍ

název dokumentu



zakázka A-24-1134
datum 17/04/2025
stupeň DPS
měřítko 1:100

číslo přílohy **1.1.3 - 113**
