



Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	28. 08. 2015
Ev.č.	ZL-046-S-H-SO 1.005	Datum schválení	31. 08. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jilová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx)		Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	1. Město Hanušovice / SO 1.005 - Stoka FA-I		
Specifikace změny: Při realizaci stoky FA-I v úseku za Š4 byl zjištěn odlišný průběh vodovodních řadů, než bylo v podkladech, z nichž vycházela RDS. V úseku Š5 – Š6 by byla stoka umístěna přímo pod vodovodním řadem. Zhotovitel navrhuje posunout šachtu Š5 přibližně 3m blíže k Š4, tak aby byla před oběma vodovodními řady a dále aby řad pokračoval mezi plynovodem a vodovodem. Aby mohla být dodržena prostorová norma vzdálenosti od plynovodu, navrhuje zhotovitel provést šachtu Š5 jako plastovou DN600.			
Předmětem změnového listu je: - Přepojení stávajících přípojek			
Finanční dopad změny:	Snížení		
Změna ceny po schválení:	-2 553,40 Kč		
Stanovisko správce stavby: <i>NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ SE JEVI VÁHLEDEM K POLOZE IN. SITI JAKO NEJVHODNĚJŠÍ, A TO JAK PO TECH- NICKÉ TAK I FINANČNÍ STRÁNCE. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ DOPORUČUJI SCHVÁLIT. (K. Štáhl)</i>			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis + situace 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Fotodokumentace 5) Stavební deník 6) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **)  SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu	 AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ46964971 Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu
Datum: 28. 08. 2015	Datum:
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno závod Brno - VHS a.s. Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **)  Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilová 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel.: 583 317 111 fax: 583 214 845 Jiří Vykydal - manažer projektu 31. 08. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Tým Správce stavby

Horní Pomoraví II - sever

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
David Sehnal	sehnald@imosbrno.eu / 602 518 490	13.10.2014

Iniciační dopis - Stoka FA-I - kolize s inž. sítěmi

Aktuální stav: Při realizaci stoky FA-I v úseku za Š4 byl zjištěn odlišný průběh vodovodních řadů, než bylo v podkladech, z nichž vycházela RDS. V úseku Š5 – Š6 by byla stoka umístěna přímo pod vodovodním řadem.

Návrh řešení: Šachtu Š5 posunout o cca 3m blíže k Š4, tak aby byla před oběma vodovodními řady a dále by řad pokračoval mezi plynovodem a vodovodem. Šachta Š5 by musela být provedena jako plastová DN600, aby mohla být dodržena prostorová norma vzdálenosti od plynovodu.

Žádáme tým správce stavby o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Bc. David Sehnal

Dne 13. 10. 2014




PRELIMINARY

7-09-425 405 35 T
405 35 T
405 35 T

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

OCHRAf

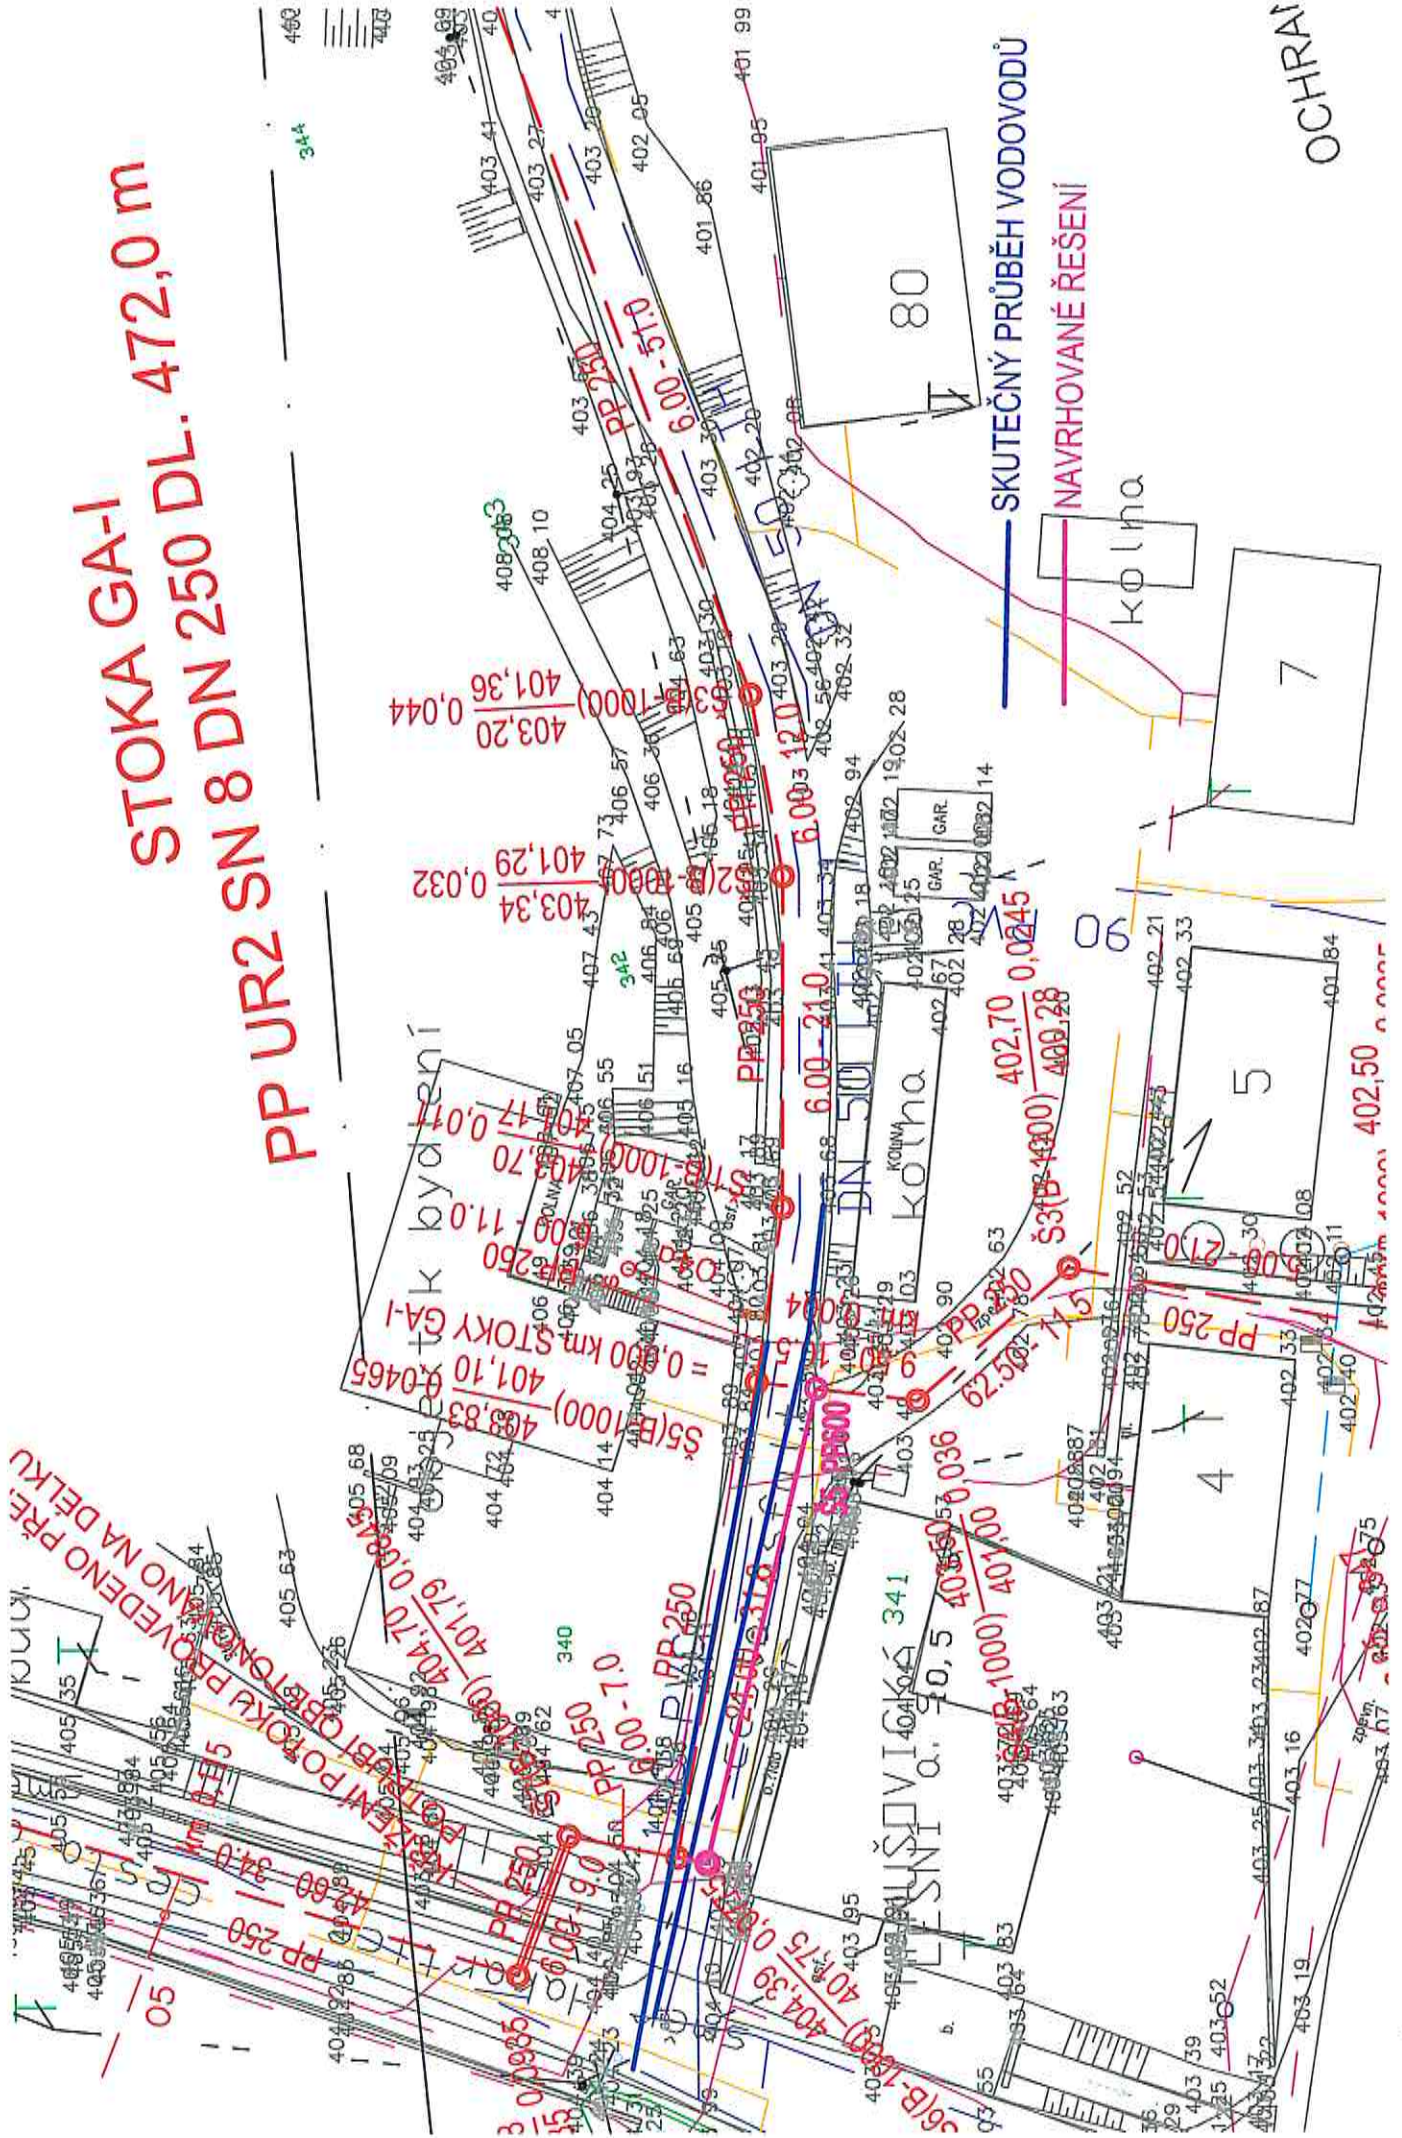

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-046-S-H-SO 1.005

1. Město Hanušovice / HORNÍ HANUŠOVICE

Kolize potrubí s inženýrskými sítěmi, plastová šachta místo prefabrikované

Pol.		Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-046-S-H-SO 1.005	
				Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
KANALIZAČNÍ STOKY KA-I, KA-I.1, GA-I, GA-I.1, GA-I.2, GA-I.3, GA-II, GA-II.1, FA-I, FA-I.1, FA-I.2													
Trubní vedení													
46		Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	107	27 457,60	2 937 963,20	106,00	27 457,60	2 910 505,60	-1,00	-27 457,60	0,00	-27 457,60
49		Revizní a čistící šachta z PP DN 600, na potrubí DN 250, poklop, rám, DN 600/250 hl. do 2,2m	kus	13	24 904,20	323 754,60	14,00	24 904,20	348 658,80	1,00	24 904,20	24 904,20	0,00
Trubní vedení celkem :						3 261 717,80			3 259 164,40		-2 553,40	24 904,20	-27 457,60
ZL-046-S-H-SO 1.005 CELKEM :													
						3 261 717,80			3 259 164,40		-2 553,40	24 904,20	-27 457,60

PROJEKTOVÁ,
INŽENÝRSKÁ
A PORADENSKÁ
ČINNOST

AQUAProcon s.r.o.
ing. Milan Jokl
Palackého tř. 12
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
933/14/Pr

VYŘÍZUJE/TELEFON
Ing. Pilarš/581 675 224

MÍSTO ODESLÁNÍ (datum)
Hranice
17.10.2014

VĚC

**Zlepšení kvality vody horního povodí řeky Moravy – II. fáze
Horní Pomoraví II sever, Město Hanušovice – doplnění kanalizace**

***Stanovisko zpracovatele RDS k iniciačnímu dopisu ID-046-S-H-SO 1.005 – stoka FA-1 –
kolize s inženýrskými sítěmi z 13.10.2014***

Zjištěná fakta

Při detailním vytyčení a prověření sondami při realizaci stoky FA-1 v úseku od Š4 do Š7 byl zjištěn skutečný průběh vodovodu odlišný od podkladů provozovatele pro RDS. Vodovod je v navržené trase kanalizace.

Navržené řešení

Šachtu Š5 posunout k Š4 s dodržáním prostorové normy od stávajícího plynovodu. Šachtu Š6 posunout ke středu komunikace s dodržáním prostorové normy od vodovodu. Kanalizace mezi šachtami Š5, Š6 bude uložena do prostoru mezi vodovod a plyn. Šachtu Š5 je nutno provést plastovou DN 600.

Řešení považuje zpracovatel RDS za vhodné a bez dotčení stávajících inženýrských sítí.

Ing. Josef Pilarš
technický ředitel





Tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 259, 532 173 259, imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu
bankovní spojení: KB Brno venkov, č.ú.: 63706-641/0100
IČ: 25 32 22 57, DIČ: CZ25322257, OR u KS Brno, oddíl B, vložka 2211





Tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 259, 532 173 259, imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu
bankovní spojení: KB Brno venkov, č.ú.: 63706-641/0100
IČ: 25 32 22 57, DIČ: CZ25322257, OR u KS Brno, oddíl B, vložka 2211

Datum	Denní záznamy stavby
	Stokoe FA - III - poročaru pletaku vytkaku III - poročaru IS + vytkaku splyny Metný stj - bocnuče strofu - rypču počty vyložení píska na skládě
zápis zhotovitel	V úseku staly FA-1 34-36 byl zjištěn odlišný průběh mž. sítě mž v podkladě z mž vyložena RDS. Trasa staly bude upravena tak, aby byly dodrženy prostorové podmínky uložení mž. sítě. Rovněž 35 bude provedena jako plastová DN600. Tato změna bude řešena postupem dle OP dle Sporná stavba došlo v tendru tuto skutečnost a nemá vliv na cenu.
14.10.2014 UT	Počasí: oblačno + 4°C + 15°C, přívalový Prac. doba: 7:00 - 18:30 Přítomnost: 2x THP, 6x D, 4x ST Mobilizace: bagr, traktor bagr, T143, T1815, mulčovač Práce: Hlavní objekt - výživa výstřež stropu - čerpadla vody vylož III - montáž vykop jámy na koncovou částku na stavovici potrubí, paženi vody - montáž a nystrojení koncové části vyložu - napojení na stavovici potrubí - hutnění záhy po vstřevu - dle 3D 0-63
15.10.2014	DLE 12.10.2014 BYLO PO TELEFONICKÉ DOHODĚ PROVEDENO ZASTAVĚNÍ VODODUŠNÉHO ŘÁDU PE 6/4". DLE DOHODY BYLO PROVEDENO ZASTAVĚNÍ POTRUBÍ A ŽRA PŘIČESNÁ FOTOZKONTROLA PŘED ZASTAVĚNÍM + PO ZASTAVĚNÍ POTRUBÍ - FOTO PŘEDÁVÁ. MÍSTO KŘÍŽENÍ: ULICE V ZATÍŽI - HADUTONICE STOKA FAI, KŘÍŽENÍ ŠACHET 3-4 ZA ŠPV, A.S. JADKO



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

☎ 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603-841/0100

AQUA Procon s.r.o.
Ing. Jokl M.
Palackého tř. 12,
612 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
0884- 50000/2015

e-mail
heitmar@spvs.cz

Vyřizuje/
Heitmar Petr

Šumperk
11.8.2015

Věc: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“

Týká se: „ Horní Pomoraví II sever, Město Hanušovice – doplnění kanalizace „

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk jako provozovatel obdržela dne 6.8. 2015 od zhotovitele stavby fa: IMOS BRNO, a.s. žádost o vyjádření k předloženému stanovisku (Iniciační dopis ID -046-S-H-SO 1.005 stoka FA-1 – kolize s IS).

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk k předloženému návrhu konstatuje následující:

- souhlasíme s navrženým řešením

S pozdravem

Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911

Ing. Pavel Paloncý
technický ředitel
