



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	4. 12. 2015
Ev.č.	ZL-084-S-Z-SO 3.008	Datum schválení	7. 12. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx)		Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh / SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH		
<u>Specifikace změny:</u> Zhotovitel byl správcem stavby upozorněn na nutnost zařadit do výstavby novou stoku 08.1-23. Tato změna vyplynula z dodatečného požadavku Města Zábřeh, vyplývajícího z revize přípojek pro jednotlivé nemovitosti a možnost odvedení vod přitékajících z extravilánu (polí u nemovitosti Sokolská 29, 29a, 30). Zhotovitel navrhuje zařadit stoku 08.1-23 do stavby.			
<u>Předmětem změnového listu je:</u> - Nová stoka 08.1-23 v délce 70,6 m			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	563 753,07 Kč		
Stanovisko správce stavby: <i>Nová stoka s navrhovaným osazením pro nové napojení přípojek a včetně příslušného osazení. Vše souhlasí s doplněným tímto osazením souhlasit a schválit.</i>			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis + situace 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. 5) Žádost o doplnění projektu Města Zábřeh 6) Připomínky Města Zábřeh k RDS SO 3.008 Krumpach		




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fund soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/ nedoporučuji schválit **)	
 SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu	 AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ46984971 Ing. Jan Polášek - hlavní inženýr projektu
Datum: 4. 12. 2015	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 602 00 Brno závod Brno - VHS a.s. 4 Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **)  Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilemá 2769/61-787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel. 583 317 111 fax: 583 214 845 Jiří Vykydal - manažer projektu 7. 12. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Aquaprocon

Ing. Vlastislav Kolečkář

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Holotík Vladimír	holotikv@imosbrno.eu / 602 713 982	15.8.2015

Iniciační dopis ID-084-S-Z-SO 3.008 - Nová stoka 08.1-23

Aktuální stav:

Správcem stavby jsme byli upozorněni na nutnost zařadit do výstavby novou stoku 08.1-23. Tato změna vyplynula z dodatečného požadavku Města Zábřeh, vyplývajícího z revize přípojek pro jednotlivé nemovitosti a možnost odvedení vod přitékajících z extravilánu (polí u nemovitostí Sokolská 29, 29a, 30).


Návrh řešení:

Zařadit stoku 08.1-23 do stavby.


Žádáme zodpovědného projektanta a provozovatele o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Ing. Holotík Vladimír

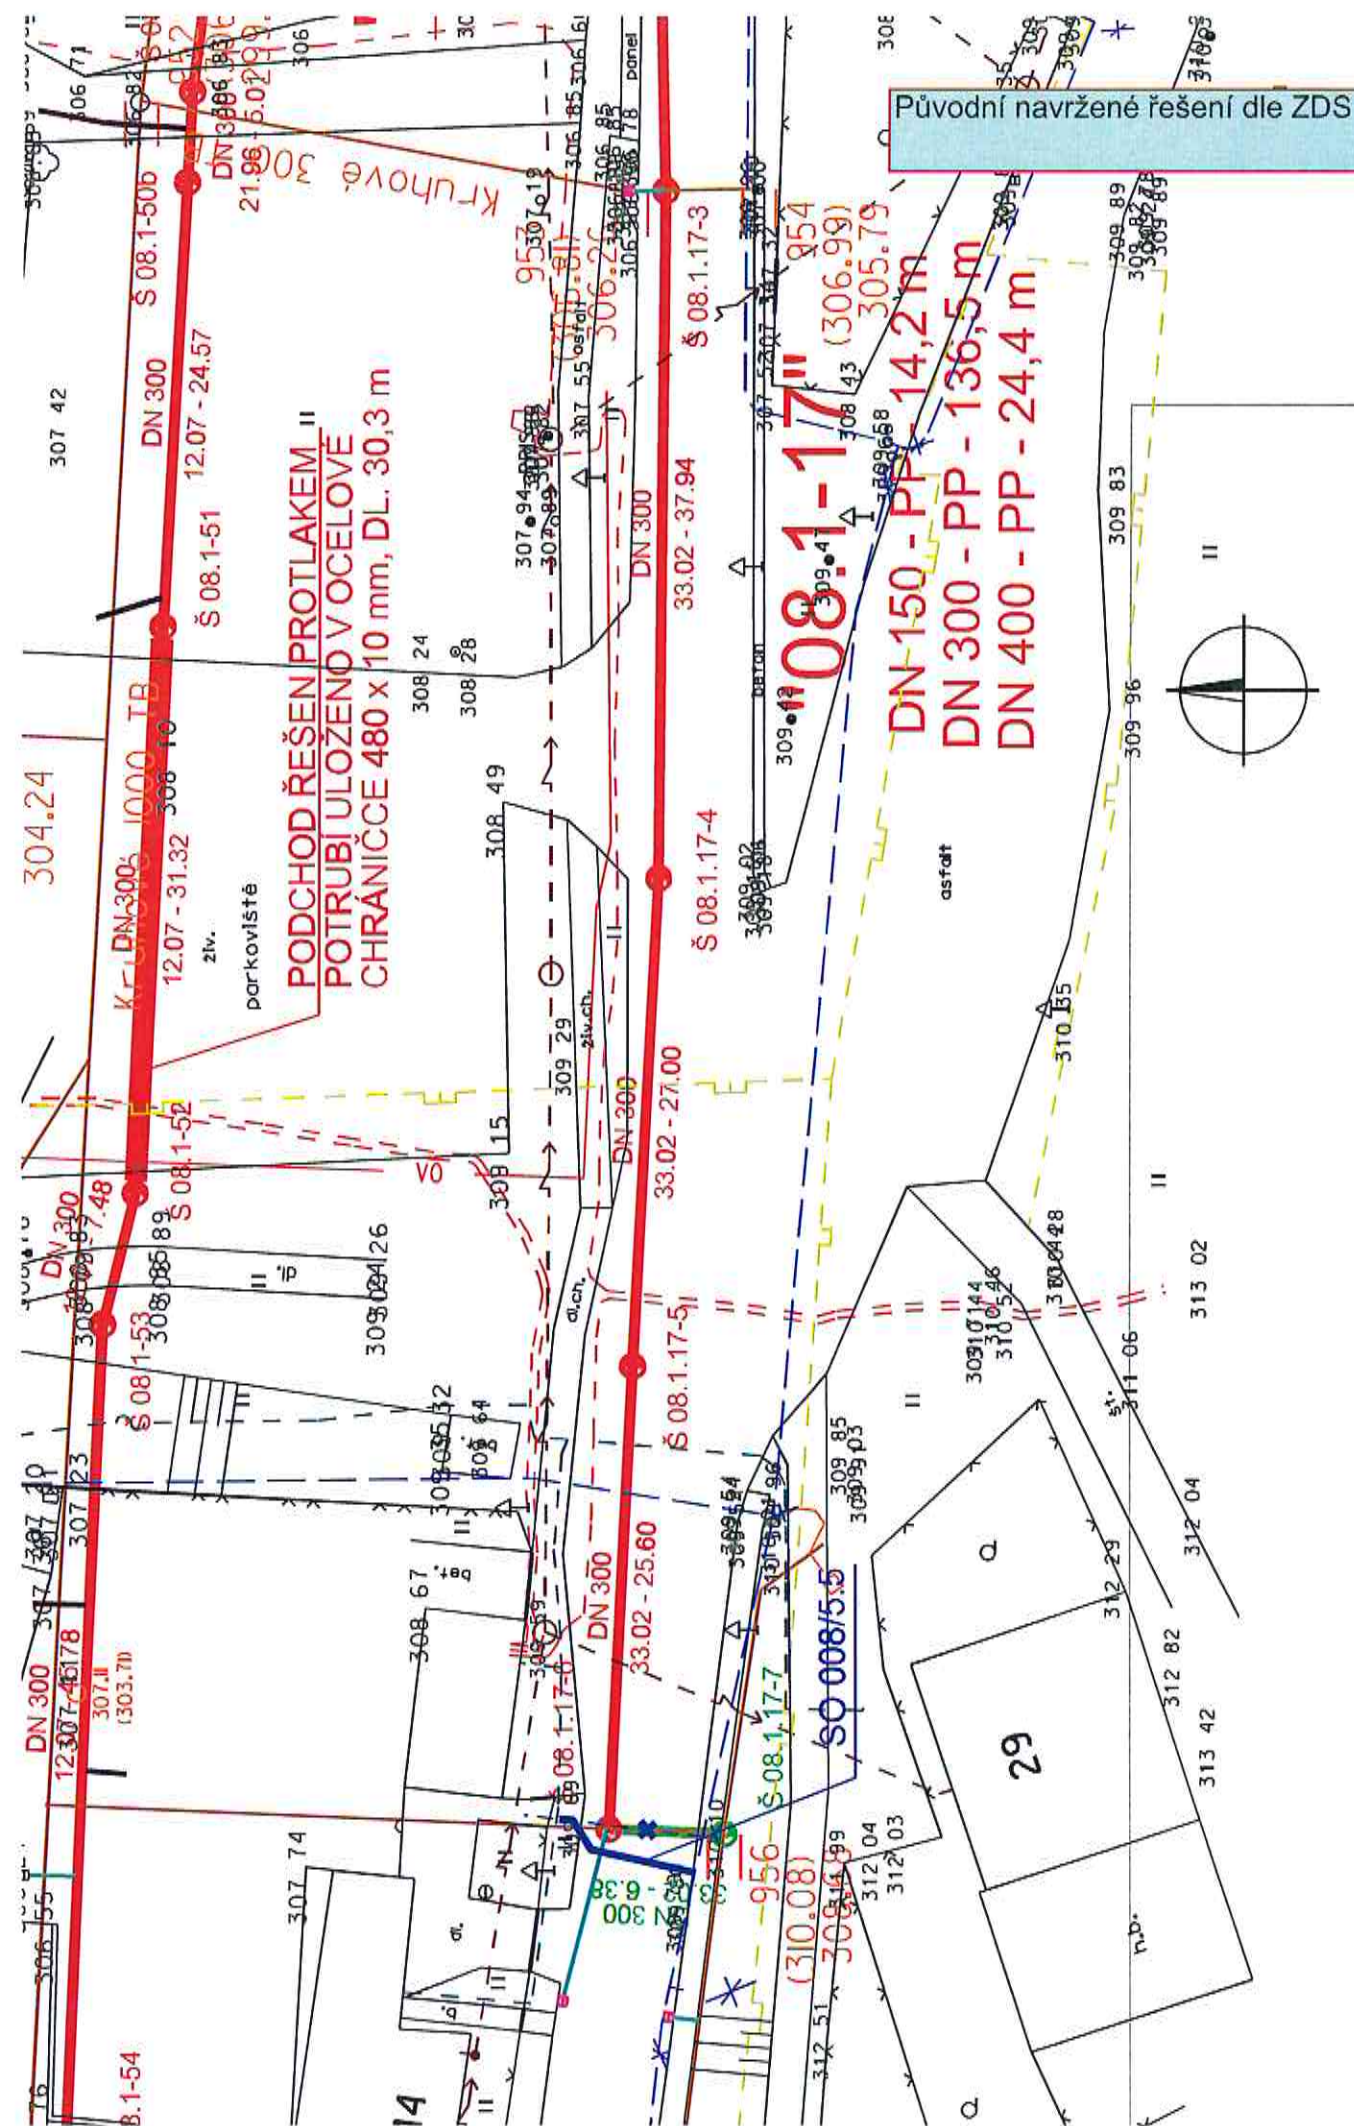

JŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK (jednotná Trigonometrická síť Katastrální), VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.V. (Balt po Vyrovnání).
 ISY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ DLE ÚDAJŮ POSKYTNUTÝCH SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
 NEZNÁMÉM VÝŠKOVÉM ULOŽENÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘEDPOKLÁDÁME ULOŽENÍ DLE ČSN 73 6005.
 OMÍNKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A DOTČENÝCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY DANÉ JEJICH PÍSEMNÝM STANOVISKEM BUDOU DODRŽENY.

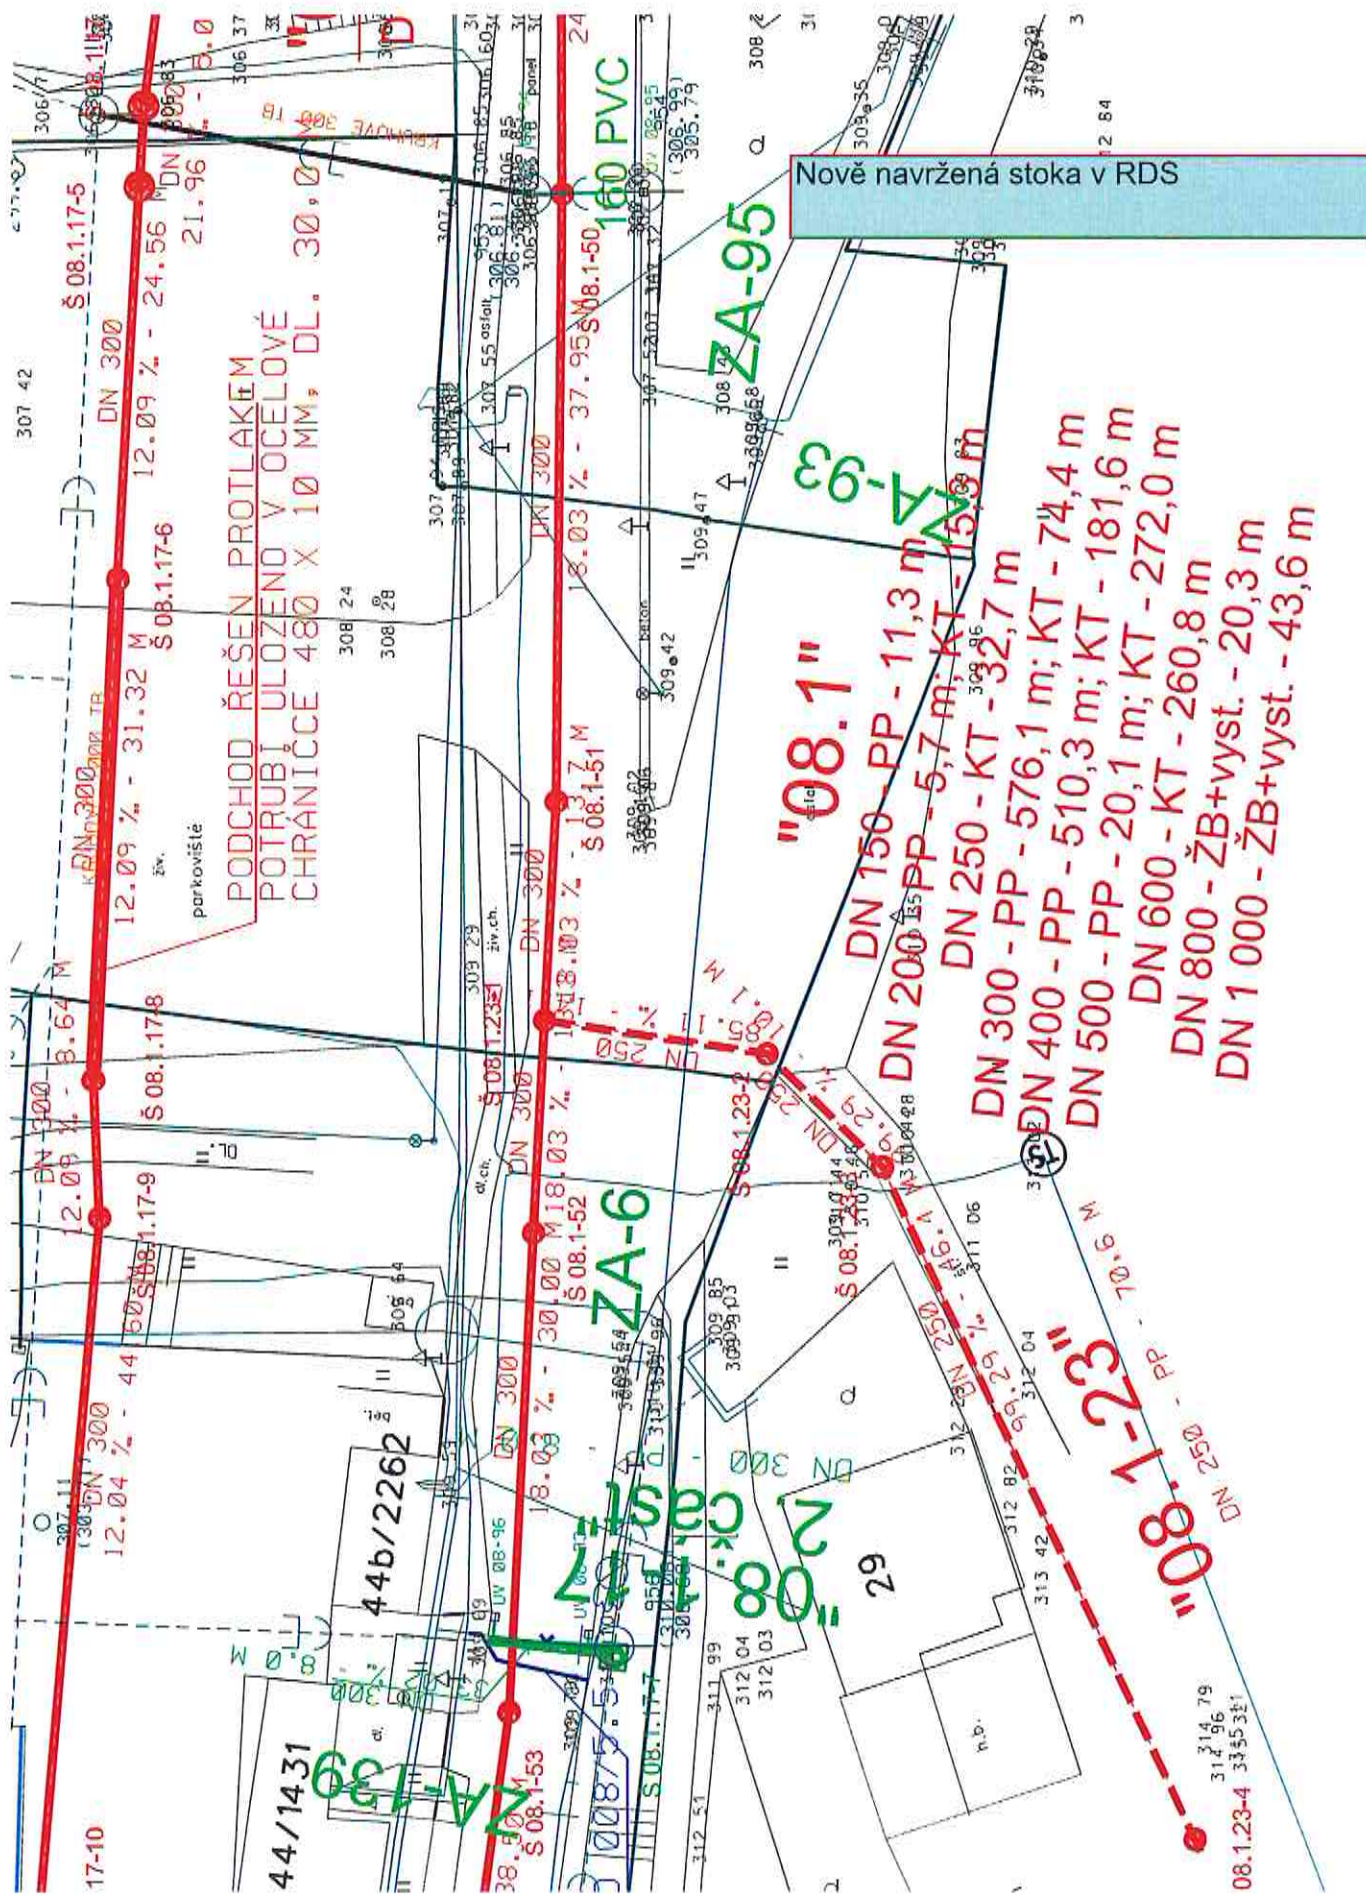

Nově navržená stoka v RDS

PODCHOD ŘEŠEN PROTLAKEM
POTRUBÍ ULOŽENO V OCELOVÉ
CHRÁNICI 480 X 10 MM, DL. 30,0

"08.1"

"08.1-23"

- DN 150 - PP - 11,3 m
- DN 200 - PP - 5,7 m; KT - 15,3 m
- DN 250 - KT - 32,7 m
- DN 300 - PP - 576,1 m; KT - 74,4 m
- DN 400 - PP - 510,3 m; KT - 181,6 m
- DN 500 - PP - 20,1 m; KT - 272,0 m
- DN 600 - KT - 260,8 m
- DN 800 - ŽB+vyst. - 20,3 m
- DN 1 000 - ŽB+vyst. - 43,6 m

08.1.23-4 314.79
312.96 315.31

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-084-S-Z-SO 3.008

3. Město Zábřeh / SO 3.008

Nová stoka 08.1-23

PoL	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-084-S-Z-SO 3.008		
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP	
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH													
STOKA 08.1-23 - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
1	Dočasné zajištění potrubí	m	0,00	204,10	0,00	2,20	204,10	449,02	2,20	449,02	449,02	0,00	
2	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	0,00	154,90	0,00	1,10	154,90	170,39	1,10	170,39	170,39	0,00	
3	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,00	270,10	0,00	13,00	270,10	3 511,84	13,00	3 511,84	3 511,84	0,00	
4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	214,80	0,00	175,17	214,80	37 625,98	175,17	37 625,98	37 625,98	0,00	
5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	964,20	0,00	13,21	964,20	12 732,84	13,21	12 732,84	12 732,84	0,00	
6	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	0,00	129,70	0,00	351,63	129,70	45 606,93	351,63	45 606,93	45 606,93	0,00	
7	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	0,00	26,70	0,00	351,63	26,70	9 388,63	351,63	9 388,63	9 388,63	0,00	
8	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00	22,50	0,00	13,18	22,50	296,65	13,18	296,65	296,65	0,00	
9	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,00	24,60	0,00	152,49	24,60	3 751,18	152,49	3 751,18	3 751,18	0,00	
10	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	0,00	280,70	0,00	152,49	280,70	42 803,07	152,49	42 803,07	42 803,07	0,00	
11	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,00	294,90	0,00	13,18	294,90	3 888,14	13,18	3 888,14	3 888,14	0,00	
12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00	86,00	0,00	122,05	86,00	10 495,99	122,05	10 495,99	10 495,99	0,00	
13	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00	296,80	0,00	39,25	296,80	11 648,63	39,25	11 648,63	11 648,63	0,00	
14	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00	109,10	0,00	152,49	109,10	16 636,32	152,49	16 636,32	16 636,32	0,00	

15	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,00	109,10	0,00	13,18	109,10	1 438,44	13,18	1 438,44	1 438,44	0,00
16	Vhodný záspový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	0,00	536,00	0,00	46,24	536,00	24 785,60	46,24	24 785,60	24 785,60	0,00
17	Vhodný záspový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	0,00	536,00	0,00	64,15	536,00	34 386,44	64,15	34 386,44	34 386,44	0,00
18	Štěrkopek frakce 8-16	t	0,00	276,10	0,00	72,82	276,10	20 105,16	72,82	20 105,16	20 105,16	0,00
	Zemní práce celkem :				0,00			279 721,25		279 721,25	279 721,25	0,00
Přípravné a přidružené práce												
19	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.léžené tl.20 cm	m2	0,00	43,80	0,00	21,10	43,80	924,18	21,10	924,18	924,18	0,00
20	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,00	48,50	0,00	67,06	48,50	3 252,41	67,06	3 252,41	3 252,41	0,00
21	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	0,00	73,40	0,00	21,10	73,40	1 548,74	21,10	1 548,74	1 548,74	0,00
22	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,00	65,20	0,00	21,10	65,20	1 375,72	21,10	1 375,72	1 375,72	0,00
23	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,00	47,40	0,00	21,10	47,40	1 000,14	21,10	1 000,14	1 000,14	0,00
24	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,00	169,20	0,00	34,03	169,20	5 758,16	34,03	5 758,16	5 758,16	0,00
25	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,00	76,10	0,00	34,03	76,10	2 589,81	34,03	2 589,81	2 589,81	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				0,00			16 449,16		16 449,16	16 449,16	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce												
26	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	0,00	795,80	0,00	12,52	795,80	9 963,42	12,52	9 963,42	9 963,42	0,00
27	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,00	2 549,90	0,00	0,68	2 549,90	1 721,18	0,68	1 721,18	1 721,18	0,00
28	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,00	280,80	0,00	1,80	280,80	505,44	1,80	505,44	505,44	0,00
29	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně obdávky žlabu a poklopu	m	0,00	217,70	0,00	3,10	217,70	674,87	3,10	674,87	674,87	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				0,00			12 864,91		12 864,91	12 864,91	0,00
Komunikace												
30	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.35 cm + asfaltový recyklát (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	0,00	483,40	0,00	21,10	483,40	10 199,74	21,10	10 199,74	10 199,74	0,00
	Komunikace celkem :				0,00			10 199,74		10 199,74	10 199,74	0,00
Trubní vedení												
31	Montáž trub z tvrdého PVC a PP , gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,00	40,00	0,00	70,60	40,00	2 824,00	70,60	2 824,00	2 824,00	0,00
32	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	107,40	0,00	70,60	107,40	7 582,44	70,60	7 582,44	7 582,44	0,00
33	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,00	26 815,50	0,00	1,00	26 815,50	26 815,50	1,00	26 815,50	26 815,50	0,00

34	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,00	30 947,30	0,00	2,00	30 947,30	61 894,60	2,00	61 894,60	61 894,60	0,00
35	Kameryové zkoušky potrubí	m	0,00	41,50	0,00	70,60	41,50	2 929,90	70,60	2 929,90	2 929,90	0,00
36	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	0,00	803,10	0,00	77,17	803,10	61 971,85	77,17	61 971,85	61 971,85	0,00
	Trubní vedení celkem :		0,00					164 018,29		164 018,29	164 018,29	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání											
37	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm	m	0,00	79,40	0,00	34,80	79,40	2 763,12	34,80	2 763,12	2 763,12	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :		0,00					2 763,12		2 763,12	2 763,12	0,00
	STOKA 08.1-23 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ											
	Přípravné a přidružené práce											
38	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,00	43,80	0,00	5,22	43,80	228,64	5,22	228,64	228,64	0,00
39	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.dřené tl.30 cm	m2	0,00	73,40	0,00	10,44	73,40	766,30	10,44	766,30	766,30	0,00
40	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	0,00	47,40	0,00	17,40	47,40	824,76	17,40	824,76	824,76	0,00
41	Frézování koryta pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,00	84,10	0,00	60,50	84,10	5 088,05	60,50	5 088,05	5 088,05	0,00
42	Vodovodná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,00	169,20	0,00	14,88	169,20	2 517,36	14,88	2 517,36	2 517,36	0,00
43	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00	76,10	0,00	14,88	76,10	1 132,22	14,88	1 132,22	1 132,22	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :		0,00					10 557,33		10 557,33	10 557,33	0,00
	Komunikace											
44	Podklad ze šetrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	0,00	130,20	0,00	26,32	130,20	3 426,86	26,32	3 426,86	3 426,86	0,00
45	Šetrk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	0,00	384,60	0,00	31,54	384,60	12 130,28	31,54	12 130,28	12 130,28	0,00
46	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	0,00	270,50	0,00	38,50	270,50	10 414,25	38,50	10 414,25	10 414,25	0,00
47	Postřik živčiny infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	0,00	23,70	0,00	38,50	23,70	912,45	38,50	912,45	912,45	0,00
48	Postřik živčiny spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	0,00	13,80	0,00	81,60	13,80	1 126,08	81,60	1 126,08	1 126,08	0,00
49	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	0,00	282,40	0,00	81,60	282,40	23 043,84	81,60	23 043,84	23 043,84	0,00
	Komunikace celkem :		0,00					51 053,76		51 053,76	51 053,76	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání											
50	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	0,00	21,30	0,00	32,00	21,30	681,60	32,00	681,60	681,60	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :		0,00					681,60		681,60	681,60	0,00
	STOKA 08.1-23 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ											
	Komunikace											
51	Podklad z kam.dřené 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	0,00	207,40	0,00	67,06	207,40	13 908,24	67,06	13 908,24	13 908,24	0,00

Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-084-S-Z-SO 3.008

52	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	0,00	22,90	0,00	67,06	22,90	1 535,67	67,06	1 535,67	1 535,67	0,00
Komunikace celkem :												
					0,00			15 443,91		15 443,91	15 443,91	0,00
ZL-084-S-Z-SO 3.008 CELKEM :												
					0,00			563 753,07		563 753,07	563 753,07	0,00



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 271-2/15/K
Datum: 10. 4. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze
Iniciační dopis č.: ID-084-S-Z-SO 3.008 Nová stoka 08.1-23
Vyjádření projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že byl Správcem stavby upozorněn na nutnost zařadit do výstavby novou stoku 08.1-23. Tato změna vyplynula z dodatečného požadavku Města Zábřeh, vyplývajícího z revize přípojek pro jednotlivé nemovitosti a možnost odvedení vod přitékajících z extravilánu (polí u nemovitostí Sokolská 29, 29a, 30).

Zhotovitel je připraven toto prodloužení realizovat.

Projektant s návrhem souhlasí, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat.

Za projektanta:

Ing. Vlastislav Kolečkář

Datum:

Podpis:





IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
602 00 Brno

Zn. dopisu: 271-3/15/K
Datum: 10. 4. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Joki

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze
Změnový list č.: ZL-084-S-Z-SO 3.008 Nová stoka 08.1-23
Vyjádření generálního projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že byl Správcem stavby upozorněn na nutnost zařadit do výstavby novou stoku 08.1-23. Tato změna vyplynula z dodatečného požadavku Města Zábřeh, vyplývajícího z revize přípojek pro jednotlivé nemovitosti a možnost odvedení vod přitékajících z extravilánu (polí u nemovitosti Sokolská 29, 29a, 30).

Zhotovitel je připraven toto prodloužení realizovat.

Z pozice generálního projektanta s návrhem souhlasíme, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvidat.

Za generálního projektanta:

Ing. Jan Polášek

Datum:

Podpis:



Šumerská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

☎ 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603-841/0100

AQUA Procon s.r.o.
Ing. Kolečkář
Palackého tř. 12,
612 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

e-mail
heitmar@spvs.cz

Vyřizuje/
Heitmar Petr

Šumperk
23.9.2015

Věc: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“

Týká se: „ Horní Pomoraví II sever, Město Zábřeh „

Šumerská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk jako provozovatel obdržela od zhotovitele stavby fa: IMOS BRNO, a.s. žádost o vyjádření k předloženému stanovisku (Iniciační dopis ID-084-S-Z-SO 3.008 – Nová stoka 08.1-23).

Šumerská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk k předloženému návrhu konstatuje následující:

- S navrženým řešením souhlasíme.

S pozdravem

Šumerská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911


Ing. Pavel Paloncý
technický ředitel



67807/2014/MUZ
2014/875/RÚP-MUZB

Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jílová 6
787 01 Šumperk

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: 2014/875/RÚP-MUZB
VYŘIZUJE: Doležal Václav
TELEFON: 583 468 234
E-MAIL: vaclav.dolezal@muzabreh.cz
DATUM: 2014-09-30

Žádost o doplnění projektu „Zlepšení kvality povrchových vod horního povodí reky Moravy – táze II“

Vážení,

Při kontrole realizační projektové dokumentace na výše uvedenou akci jsme zjistili, že v ní nejsou dle našeho názoru dostatečným způsobem řešeny některé níže uvedené části projektu, které však je možné ještě v rámci přípravy realizace dořešit.

Jedná se o tyto úseky:

- 1) Ul. Sokolská – na konci stoky 08.1-17 není dostatečným způsobem vyřešeno odvedení dešťových vod stékajících hlavně z přilehlých polí. Vybudováním krátké větve kanalizace, do které by se napojily domy č.o.27a,29,31 by došlo ke skutečnému oddělení dešťových a splaškových vod. Návrh řešení je vyznačen v příloze č.1 – „Sokolská – snížení odvodu dešťových vod“
- 2) Na Zábrančí – vyřešit odvedení splaškových vod domů č.6,8,10 gravitačním způsobem novým úsekem stoky (společné přípojky) vedené soukromým pozemkem v souběhu se stávající stokou jednotné kanalizace, případně tuto kanalizaci vyvlokovat – viz příloha č.2 – „Na Zábrančí“
- 3) V prostoru křižovatky Malá Strana x Morávka prověřit a případně upravit polohu kanalizačních šachet tak, aby bylo možné v budoucnosti zrealizovat úpravu této křižovatky a s ní související opěrné zidky. Dotčená plocha a stavební záměr jsou uvedeny v příloze č.3a – „Zábřeh – Morávka – úprava trasy –sit, kterou rovněž poskytujeme v digitální podobě – příloha 3b“
- 4) Na ul. Sušilova, v místě začátku stoky 08.1-7, jsou rodinné domy napojeny dostávajícího kanalizačního řadu, který je však předpokládáme nově v RDS určen ke zrušení, aniž je ale zajištěno přepojení stávajících domů na nový řad v téže ulici. Buď je tedy potřeba stávající řad ponechat, nebo domy napojit na kanalizaci novou – vyznačeno v příloze č. 4 – „Sušilova – napojení domů 28 až 36“
- 5) Další, dle našeho názoru prozatím nedorušenou problematikou, je přepojování kanalizačních přípojek nemovitostí umístěných podél zatrubněného potoka/kanalizace zejména v lokalitě Krum-pach, ale také v centru města. V podstatě se jedná o to, že existují skupinky domů, které bude nutno nově napojit až za stávající zatrubnění, ale kde budování jednotlivých přípojek je v podstatě nerealizovatelné. Možností je buď provedení sdružené přípojky (což pravděpodobně odpovídá předpisům a bude ztěžovat jejich budoucí údržbu a provozování), nebo krátkými kanalizačními řady – bohužel však převážně na soukromých pozemcích. V dokumentaci jsou tyto přípojky řešeny pouze povrchně. V rámci přípravy města byly všechny pracovní zahrnuty do stavebního objektu SO 15. Z celkového počtu cca 56 přípojek přecházejících stávající zatrubnění je těch míst kde je nutné se zabývat jejich sdružením cca 5. jejich polohu jsme vyznačili v přílohách č.5a až 9b.

Žádáme Vás o odborné posouzení a dořešení výše uvedených připomínek a jejich zapracování do projektu „Pomoraví II“.

S pozdravem

Ing. arch. Václav Doležal
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

Přílohy:

Příloha č_1 - Sokolská - snížení odvodu dešťových vod
příloha č_2 - Na Zábrančí
příloha 3a - Zábřeh-Morávková - úprava trasy-sit
příloha 3b - Zábřeh-Morávková_úprava trasy-sit.dwg
příloha č_4 - Sušilova - napojení domů 28 až 36
příloha č_5a - 28_října - přípojky SO_15 - přípojka 9_10 -RDS
příloha č_5b - 28 Října - přípojky SO_15 - přípojka 9_10 - Ille
příloha č_6a - Krumpach - přípojky SO_15 - přípojka 14
příloha č_6b - Krumpach - přípojky SO_15 - přípojka 14_17 - Ille
příloha č_7 - Krumpach - přípojky SO_15 - přípojka 17 - RDS
příloha č_8a - Krumpach - přípojky SO_15 - přípojka 23 - RDS
příloha č_8b - Krumpach - přípojky SO_15 - přípojka 23 - Ille
příloha č_9a - Krumpach - přípojky SO_15 - přípojky 53_54_55_56_57
příloha č_9b - Krumpach - přípojky SO_15 - přípojka 53_54_55_56_57 - Ille

Návrh - Připomínky k RDS SO 3.008 Krumpach

Stoka	Adresa	čís.orient.	Vlastník	připomínka
	Sokolská	72	Nečasová Zdeňka, SV 12	doplnit odbočku,
	Sokolská - lokalita Pod Račicí	parc. 4411/150		je tato lokalita svedena do stoky 08.1-20 ?
08.1	Sokolská	98		Prodloužení pod Dolečským potokem
08.1	Sokolská	96		Prodloužení pod Dolečským potokem
08.1	Sokolská	70		Prodloužení pod Dolečským potokem
08.1	Sokolská	68A		Prodloužení pod Dolečským potokem
08.1	Sokolská	68		Prodloužení pod Dolečským potokem
08.1	Sokolská	66		Prodloužení pod Dolečským potokem
08.1	Sokolská	64		Prodloužení pod Dolečským potokem
08.1	Sokolská	62		Prodloužení pod Dolečským potokem
08.1	Sokolská	60		Prodloužení pod Dolečským potokem
08.1	Sokolská	58		Prodloužení pod Dolečským potokem
08.1	Sokolská	56		Prodloužení pod Dolečským potokem
08.1	Sokolská	54		Prodloužení pod Dolečským potokem
08.1	Sokolská	52		Prodloužení pod Dolečským potokem
08.1	Sokolská	50B		Prodloužení pod Dolečským potokem
08.1	Sokolská	44A		Prodloužení pod Dolečským potokem
08.1-15	Sokolská	20		připojení stávající - zakreslit odbočku dle přílohy
08.1-17	Sokolská	29		Stávající stoka (viz příloha) stahuje vody z polí, z ulice Sokolská a splašky z objektů č. 27A, 29, 29A a 31 do Dolečského potoka. Při větších deštích jde o velmi velké množství (křižovatka Sokolská-Sušilova bývá zaplavena). Dle RDS se v šachtě SO 008/5.5 má přepojit na novou stoku 08.1-17, napojení na Dolečský potok se tedy asi ruší a zbytek stoky vpravo od šachty se má podle dokumentace rovněž zrušit. Do této pravé části jsou ale svedeny dešťové vody z polí a přepady ze septiků domů č.29 a 29A. Podle našeho názoru by mělo stávající napojení do Dolečského potoka zůstat zachováno a propojení těch 4 domů na novou stoku by se mělo vymyslet jinak. Viz příl.Sokolská 27A,29,29A,31.
08.1-17	Sokolská	29A		
08.1-15	B.Němcové	28		stávající společná přípojka dvojdomku - doplnit odbočku - viz příloha. (Přípojka vedena pod garáží ke značce na druhé straně křižovatky).
08.1-15	B.Němcové	26		
08.1	Sušilova	70	rest.Na hrádku	Prodloužení pod Dolečským potokem -
08.1	Sušilova	72 + 68		Prodloužení pod Dolečským potokem - společná přípojka pro dva domy
08.1-17	Sušilova	67+69		společná přípojka (+ další 2 domy) do Doleč.potoka -přepojit do splašk.kanal.
08.1-17	Sušilova	65+63+61		společná přípojka do Doleč.potoka -přepojit do splašk.kanal. - šachta před domem č.61
08.1	Sušilova	66-1		Prodloužení pod Dolečským potokem
08.1	Sušilova	66-2		Prodloužení pod Dolečským potokem
08.1	Sušilova	57		chybí odbočka,
08.1	Sušilova	60		Prodloužení podél pravého břehu Dolečského potoka
08.1	Sušilova	56		Prodloužení podél levého břehu Dolečského potoka
08.1-9-1	Sušilova	48		oba objekty jsou dnes napojeny na stáv.stoku v chodníku, ta je pak napojena do šachty Š 08.1.9.1-2. Podle výkresu rušených stok by se ale tato stoka měla zrušit?
08.1-9-1	Sušilova	46		

08.1-12	Sušilova	43	Bezdek Jiří a Milada	V RDS mylně označeno č. 34 ! Dnes napojen do Krumpašského potoka - přepojit do stoky 08.1-12 - vyvolaná investice - na náklady VHZ společně s domy Morávkova 30 a 32
08.1	Sušilova	25		Domy jsou napojeny na nezakreslenou kanalizaci - odhad umístění viz příloha. Na stoce 08.1-8 bude možná nutné osadit odbočku.
08.1	Sušilova	23		
08.1-7-1	Sušilova	28A,30,32,34,36		objekty jsou dnes napojeny na stáv.stoku v chodníku, ta je pak napojena do šachty Š 08.1.7.1-2. Podle výkresu rušených stok by se ale tato stoka měla zrušit!?
	Sušilova	1		Asi napojen do stávající stoky , z jejíž části má být stoka 08.1-3, zbytek stoky se má zrušit. do ní je ale také zřejmě napojen dům Morávkova 2. Přehodnotit uzavření stoky.
08.1-16	U Horního rybníka	5		mají dvě splaškové přípojky, zakreslena jen jedna -viz příloha
08.1-16	U Horního rybníka	9		prověřit spol.přípojku s číslem 11
08.1-16	U Horního rybníka	8		Prodloužení pod Dolečským potokem
08.1-16	U Horního rybníka	4		Prodloužení pod Dolečským potokem - přípojka společná s domem U Bořin 3 _
08.1-12	Morávkova	30	vedle ZUŠ	dnes napojen do Krumpašského potoka - přepojit do stoky 08.1-12 - vyvolaná investice - na náklady VHZ společně s domem Sušilova 43
08.1-12	Morávkova	32	Matoušek Zdeněk	
08.1	Morávkova	parc.991/3 (asi bude č.27)	Hrdina, M.Strana 26	nezkolaudovaná novostavba,měl by se přepojit , nyní zaústěn do vodoteče na jižní straně domu- viz příl.
08.1	Morávkova	17		v současnosti napojen, zakreslit odbočku dle přílohy
08.1	Morávkova	15	Gruz Jiří, Morávkova 15	dnes napojen do stávající stoky DN500 TB od ZŠ B.Němcové (ta bude možná zkončena už ve stoce 08.1-5) - měl by se přepojit? Viz příloha
08.1	Morávkova	2	Opravišková Soňa, Drozdov 84	viz pozn. k Sušilova 1
	Morávkova	parc.945		novostavba (ve výstavbě) již napojena na Krumpašský potok - doplnit odbočku do PD - viz příloha
08.1-11	Malá strana			proč se dělá úsek stoky mezi Š3 a Š4 ?? Žádná přípojka - zbytečné
	Valová	8	OPTOMEDIC DD sro, U panelárny 3, OL	odkanalizován do Krumpašského potoka - viz příloha navrhnout nové odbočení ze stoky do místa dle příl.
	Valová	5	Město Zábřeh	připojit do koncové šachty stoky 08.1-2-1
08.1-2	Valová	7	Město Zábřeh	zakreslit odbočku, stávající je cca 1,5 m od hranice domů č. 5 a 7
08.1-1	Dvorská	4A	Homolová Veronika	chce přípojku do vjezdu do areálu pro plánovanou výstavbu

