



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	12. 10. 2015
Ev.č.	ZL-120-S-Z-SO 3.008	Datum schválení	16. 10. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx) Oprava položek dle skutečnosti		
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh / SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH / Stoka 08.1		
<u>Specifikace změny:</u> Při realizaci stoky 08.1 nelze pokračovat ve výstavbě stoky přes zahrady v prostoru mezi šachtami 08.1-47 až 08.1-57. Majitel nemovitosti č.p. 50 se rozhodl, že umístění průběžné stoky 08.1 na svůj pozemek odmítne, i když původně souhlasil. Nově sdělil, že jeho souhlas platí jen pro umístění koncové stoky. Zhotovitel navrhuje provést záměnu tras stoky 08.1 a 08.1-17. Průběžnou stoku 08.1 přesunout ze zahrady do ulice Sokolské a koncovou stoku 08.1-17 přesunout do zahrad.			
<u>Předmětem změnového listu je:</u> - Změna trasy stoky 08.1 v úseku Š08.1-47 až Š08.1-57, změna trasy stoky 08.1-17			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	1 950 956,87 Kč		
Stanovisko správce stavby: <i>S ohledem na změnu stanovisko ke stavbě od vlastního projektanta a nemovitosti č. 50 - sdělilo, že nabízená řešení nejsou alternativní, a že není vhodné stavbu realizovat. Bez provedení změny trasy 08.1 nelze stoku 08.1 dokončit. Důvodem je omezení stávajícího pozemku nemovitosti.</i>			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis + situace 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Vyjádření majitele nemovitosti č.p. 50 5) Stanovisko Šumerská provozní vodohospodářská společnost, a.s.		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **) SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu Datum: 12. 10. 2015	AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ46964371 Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
IMOS Brno, a.s. Olešnická 174, 627 00 Brno závod Brno - VHS a DS Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **) Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. Jilová 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel.: 583 317 111 fax: 583 214 845 Jiří Vykydal - manažer projektu 16. 10. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Tým Správce stavby

Horní Pomoraví II - sever

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Holotík Vladimír	holotikv@imosbrno.eu / 739 391 653	22.4.2015

Iniciační dopis ID-120-S-Z-SO 3.008 - Změna trasy stoky 08.1 v úseku Š08.1-47 až Š08.1-57

Aktuální stav:

při realizaci stoky 08.1 nelze pokračovat ve výstavbě stoky přes zahrady v prostoru mezi šachtami 08.1-47 až 08.1-57. Majitel nemovitosti č.p. 50 se rozhodl, že umístění průběžné stoky 08.1 na svůj pozemek odmítne, i když původně souhlasil. Nově sdělil, že jeho souhlas platí jen pro umístění koncové stoky.

Návrh řešení:


provést záměnu tras stoky 08.1 a 08.1-17. Průběžnou stoku 08.1 přesunout ze zahrady do ulice Sokolské a koncovou stoku 08.1-17 přesunout do zahrad.


Žádáme tým správce stavby o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Ing. Holotík Vladimír

Původní řešení stok
08.1 a 08.1-17 dle
ZDS

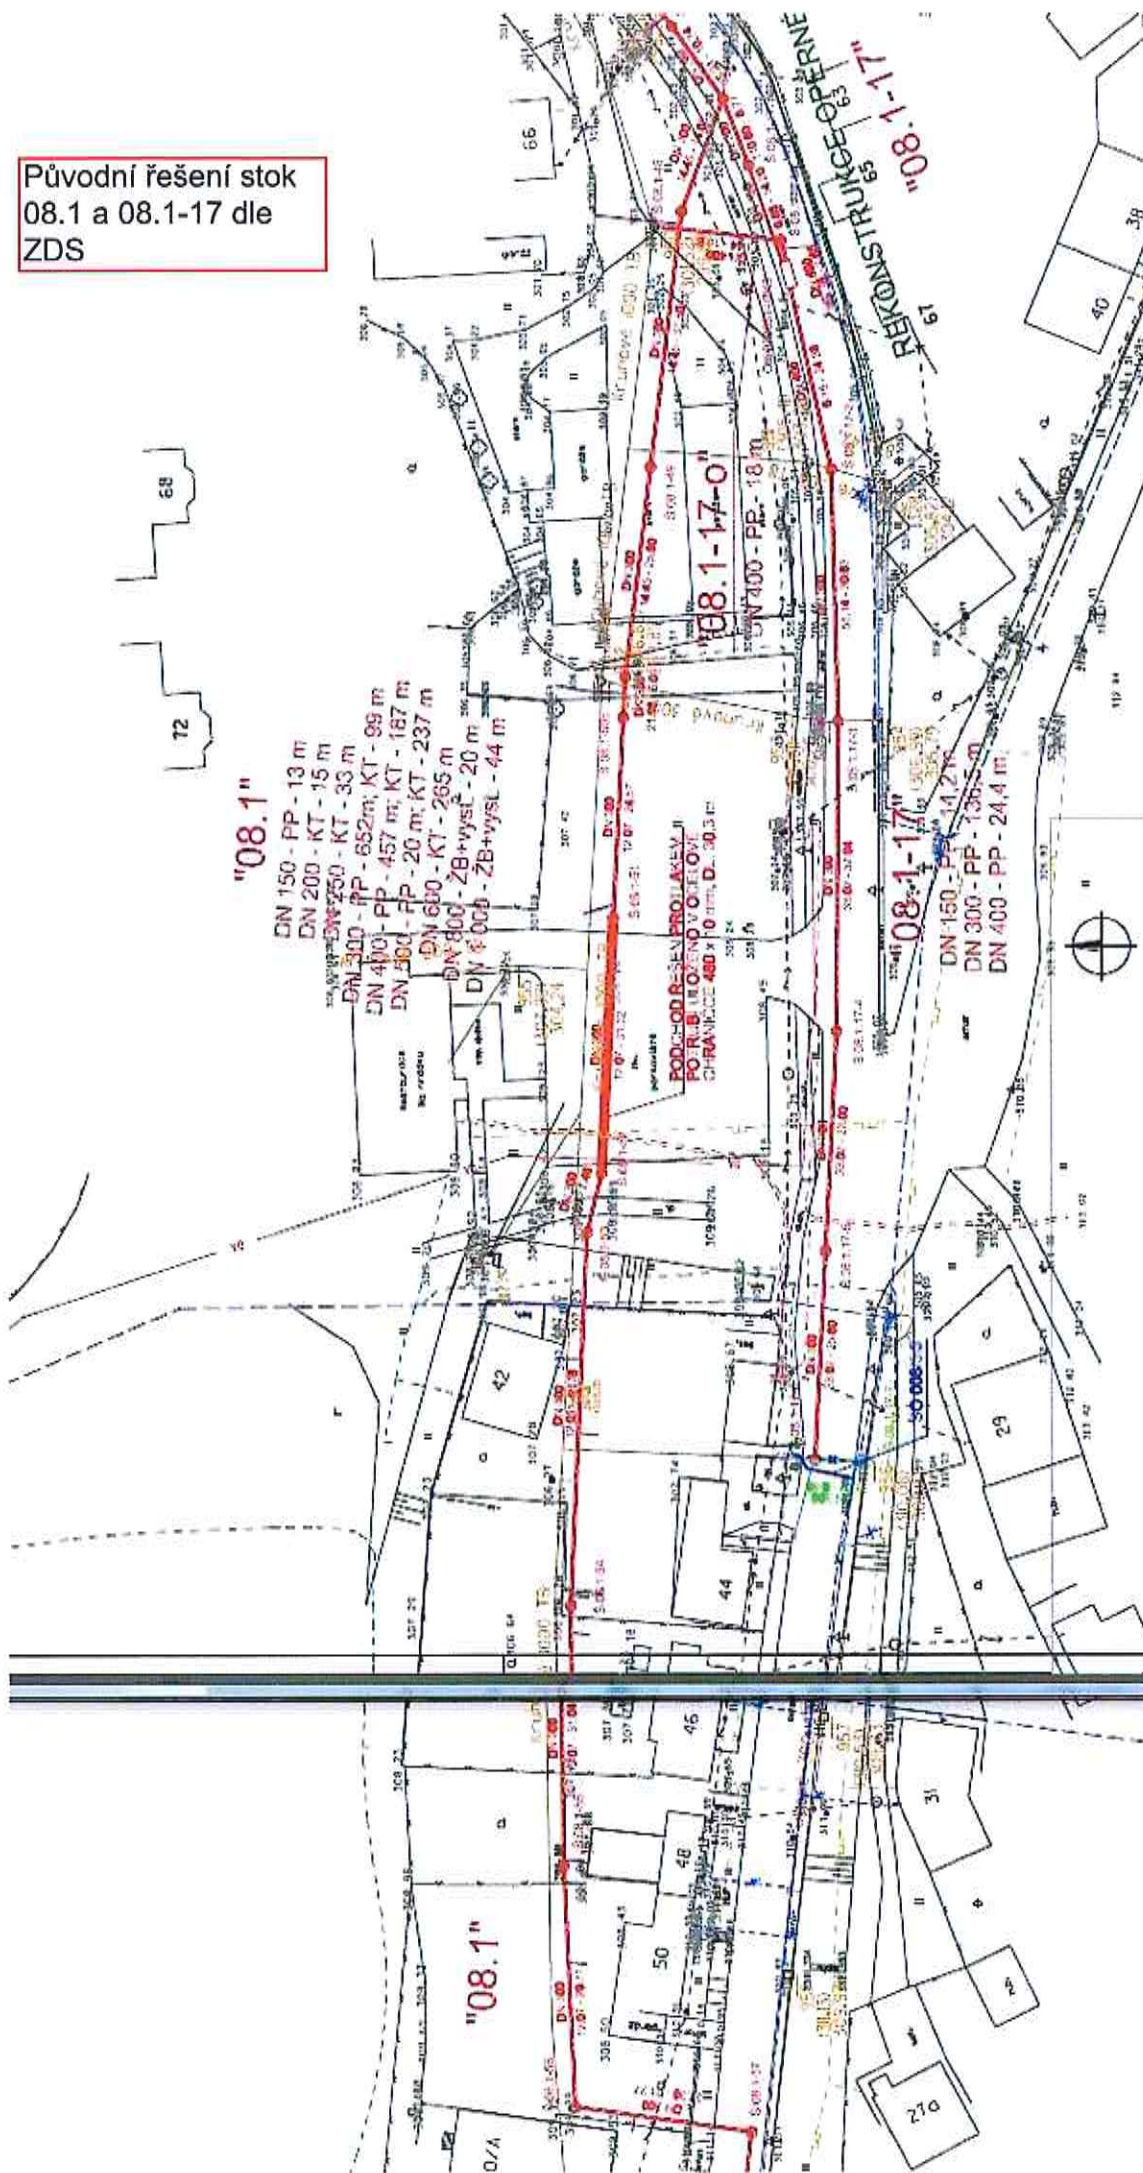

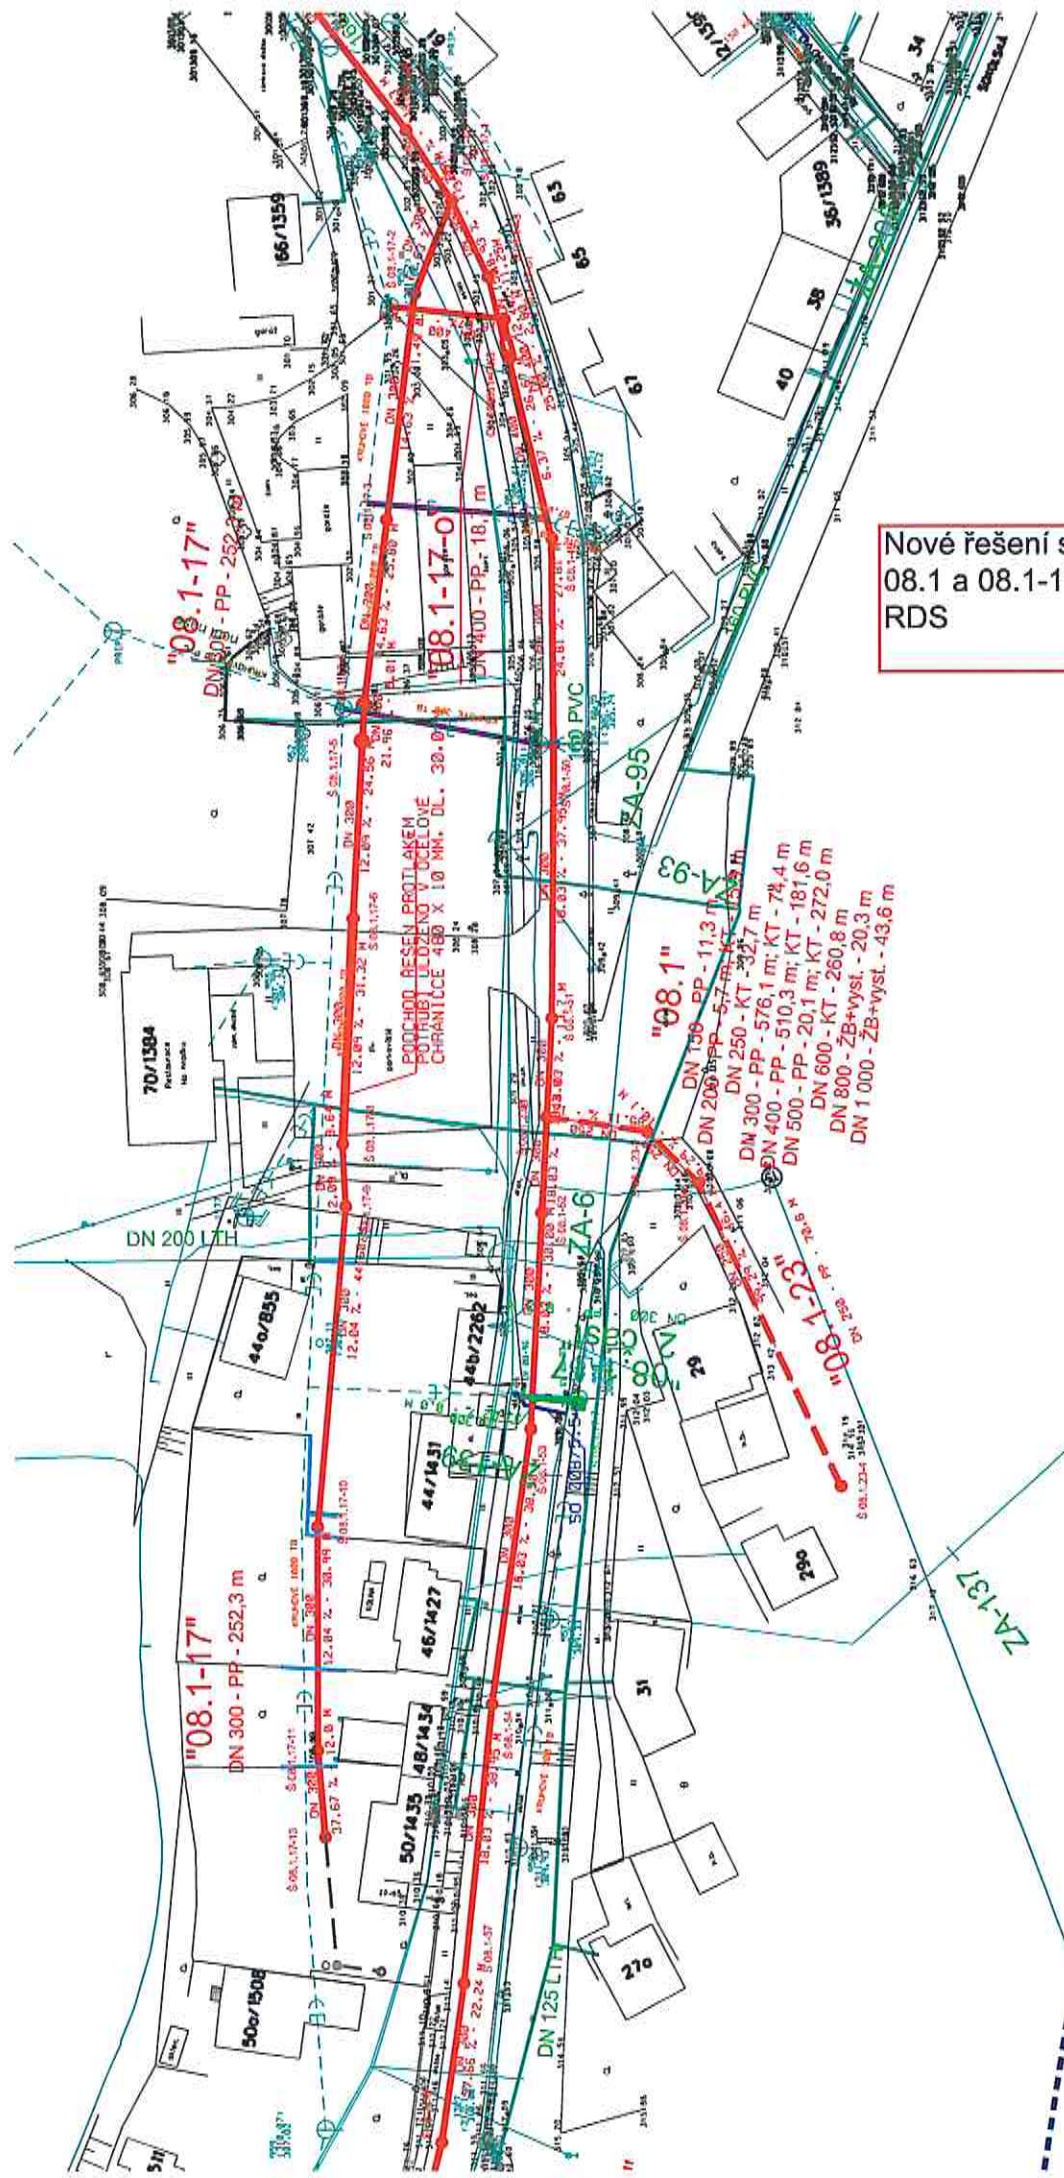

Nové řešení stok
08.1 a 08.1-17 dle
RDS

"08.1"
DN 100 - PP - 11,3 m
DN 200 - PP - 5,7 m
DN 250 - KT - 32,7 m
DN 300 - PP - 576,1 m; KT - 74,4 m
DN 400 - PP - 510,3 m; KT - 181,6 m
DN 500 - PP - 20,1 m; KT - 272,0 m
DN 600 - KT - 280,8 m
DN 800 - ZB - 20,3 m
DN 1000 - ZB - 43,6 m

"08.1-17"
DN 300 - PP - 252,3 m

"08.1-23"
DN 200 - PP - 5,7 m

2000-000 BESEN PROTLAKEM
POHUBU DLENO V OCELOVÉ
CHARANICE 480 X 10 MM. DL. 30.0 m

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-120-S-Z-SO 3.008

3. Město Zábřeh / SO 3.008

Změna trasy stoky 08.1 v úseku Š08.1-47 až Š08.1-57, změna trasy stoky 08.1-17

Pol.	Popis položky	Rozpočet dle SoD				Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-120-S-Z-SO 3.008		
		m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP	
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH - změna trasy stoky 08.1 v úseku Š 08.1-47 až Š 08.1-57													
STOKA 08.1 - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
2	Dočasné zajištění potrubí	m	59,95	204,10	12 235,80	64,45	204,10	13 154,25	4,50	918,45	918,45	0,00	
3	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	34,20	154,90	5 297,58	36,40	154,90	5 638,36	2,20	340,78	340,78	0,00	
4	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	116,00	140,30	16 274,80	0,00	140,30	0,00	-116,00	-16 274,80	0,00	-16 274,80	
5	Příplatek za zřízené hloubení v blízkosti vedení	m3	614,18	270,10	165 888,94	673,05	270,10	181 789,72	58,87	15 900,78	15 900,78	0,00	
6	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	3,05	1 063,80	3 242,46	5,81	1 063,80	6 175,57	2,76	2 933,11	2 933,11	0,00	
7	Hloubení zapážených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	306,77	189,30	58 071,26	224,26	189,30	42 453,08	-82,50	-15 618,18	0,00	-15 618,18	
8	Hloubení zapážených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	23,09	850,10	19 628,89	16,88	850,10	14 349,69	-6,21	-5 279,20	0,00	-5 279,20	
9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	9 521,20	214,80	2 045 153,22	9 683,59	214,80	2 080 036,01	162,40	34 882,79	34 882,79	0,00	
10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	716,65	964,20	690 993,26	728,87	964,20	702 779,06	12,22	11 785,80	11 785,80	0,00	
11	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor. 1 - 4	m	50,00	31 046,60	1 552 330,00	19,70	31 046,60	611 618,02	-30,30	-940 711,98	0,00	-940 711,98	
13	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	307,94	70,60	21 740,83	351,14	70,60	24 790,75	43,20	3 049,92	3 049,92	0,00	

14	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	8 967,06	129,70	1 163 027,16	8 372,56	129,70	1 085 920,51	-594,50	-77 106,65	0,00	-77 106,65
15	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8m	m2	7 049,79	202,50	1 427 582,72	8 228,86	202,50	1 666 344,39	1 179,07	238 761,67	238 761,67	0,00
16	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	307,94	16,00	4 927,10	351,14	16,00	5 618,30	43,20	691,20	691,20	0,00
17	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	8 967,06	26,70	239 420,40	8 372,56	26,70	223 547,25	-594,50	-15 873,15	0,00	-15 873,15
18	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	7 049,79	66,40	468 106,14	8 228,86	66,40	546 396,38	1 179,07	78 290,24	78 290,24	0,00
19	Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč.rozeptění	m2	497,04	202,50	100 650,60	371,64	202,50	75 257,10	-125,40	-25 393,50	0,00	-25 393,50
20	Odstanění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozeptění	m2	497,04	66,40	33 003,46	371,64	66,40	24 676,90	-125,40	-8 326,56	0,00	-8 326,56
21	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	5 236,66	37,50	196 374,70	5 325,98	37,50	199 724,13	89,32	3 349,43	3 349,43	0,00
22	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	306,77	47,10	14 448,79	224,26	47,10	10 562,81	-82,50	-3 885,98	0,00	-3 885,98
23	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	397,21	40,70	16 166,25	406,69	40,70	16 552,09	9,48	385,84	385,84	0,00
24	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	23,09	82,50	1 904,93	16,88	82,50	1 392,60	-6,21	-512,33	0,00	-512,33
25	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	116,00	40,70	4 721,20	0,00	40,70	0,00	-116,00	-4 721,20	0,00	-4 721,20
26	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	5 726,41	280,70	1 607 403,43	6 722,18	280,70	1 886 914,55	995,76	279 511,12	279 511,12	0,00
27	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	3,05	281,60	858,32	5,81	281,60	1 634,74	2,76	776,42	776,42	0,00
28	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	739,74	294,90	218 149,15	745,75	294,90	219 922,47	6,01	1 773,32	1 773,32	0,00
29	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7 624,71	86,00	655 724,91	7 673,95	86,00	659 959,59	49,24	4 234,68	4 234,68	0,00
30	Obsyp potrubí bez probíhání sypaniny	m3	1 455,28	296,80	431 927,76	1 470,24	296,80	436 367,88	14,96	4 440,12	4 440,12	0,00
31	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 160,00	10,70	12 412,00	0,00	10,70	0,00	-1 160,00	-12 412,00	0,00	-12 412,00
32	Rozprošení omnice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	1 160,00	41,60	48 256,00	0,00	41,60	0,00	-1 160,00	-48 256,00	0,00	-48 256,00
33	Poplatek za skládku suti	t	6,71	313,40	2 101,54	12,77	313,40	4 002,56	6,07	1 901,02	1 901,02	0,00
34	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5 726,41	109,10	624 751,39	6 722,18	109,10	733 389,30	995,76	108 637,91	108 637,91	0,00
35	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	739,74	109,10	80 705,57	745,75	109,10	81 361,62	6,01	656,05	656,05	0,00
37	Trubka ocelová hladká 480x10 mm	m	48,51	7 772,50	377 043,98	15,18	7 772,50	117 986,55	-33,33	-259 057,43	0,00	-259 057,43
39	Vhodný zásypaný materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	3 186,86	536,00	1 708 155,83	4 270,29	536,00	2 288 877,58	1 083,44	580 721,75	580 721,75	0,00
40	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	719,76	536,00	385 792,91	700,67	536,00	375 561,69	-19,09	-10 231,22	0,00	-10 231,22
41	Štěrkopisek frakce 8-16	t	2 700,09	276,10	745 493,99	2 727,84	276,10	753 157,54	27,76	7 663,55	7 663,55	0,00
	Zemní práce celkem :				15 159 967,27			15 097 913,04		-62 054,23	1 381 605,95	-1 443 660,18
Přípravné a přidružené práce												
43	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	20,10	24,80	498,48	15,48	24,80	383,90	-4,62	-114,58	0,00	-114,58
44	Odstanění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	20,10	63,90	1 284,39	15,48	63,90	989,17	-4,62	-295,22	0,00	-295,22
45	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2 477,97	43,80	108 535,18	2 796,78	43,80	122 499,06	318,81	13 963,88	13 963,88	0,00
46	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1 438,35	48,50	69 808,48	1 391,85	48,50	67 504,73	-47,50	-2 303,75	0,00	-2 303,75
47	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1 281,03	73,40	94 027,76	1 599,84	73,40	117 428,42	318,81	23 400,66	23 400,66	0,00
48	Odstanění podkladu nad 200 m2, živčního tl.5 cm	m2	2 477,97	65,20	161 563,79	2 796,78	65,20	182 350,20	318,81	20 786,41	20 786,41	0,00

49	Frézování krytu nad 500 m ² , bez překážek, tl.5 cm	m ²	2 477,97	84,10	208 397,46	2 796,78	84,10	235 208,38	318,81	28 811,92	26 811,92	0,00
50	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	t	2 014,36	169,20	340 829,67	2 277,23	169,20	385 306,68	262,87	44 477,01	44 477,01	0,00
51	Poplatek za skládku slabební suší	t	2 014,36	76,10	153 292,78	2 277,23	76,10	173 296,91	262,87	20 004,13	20 004,13	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				1 138 237,99			1 284 988,45		146 730,46	149 444,01	-2 713,55
	Základy a zvláštní zakládání											
52	Tratřovdy z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrpkopískem, trubky d 100 mm	m	673,34	170,10	114 535,13	823,34	170,10	140 050,13	150,00	25 515,00	25 515,00	0,00
	Základy a zvláštní zakládání celkem :				114 535,13			140 050,13		25 515,00	25 515,00	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce											
53	Lože pod potrubí ze štěrkodrté 0 - 63 mm	m ³	140,95	795,80	112 166,18	165,70	795,80	131 862,23	24,75	19 696,05	19 696,05	0,00
54	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m ³	268,47	795,80	213 645,88	270,40	795,80	215 181,77	1,93	1 535,89	1 535,89	0,00
56	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m ³	22,50	2 549,90	57 360,00	21,65	2 549,90	55 192,58	-0,85	-2 167,41	0,00	-2 167,41
58	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m ²	53,38	280,80	14 989,10	51,38	280,80	14 427,50	-2,00	-561,60	0,00	-561,60
59	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	84,20	217,70	18 330,34	90,40	217,70	19 680,08	6,20	1 349,74	1 349,74	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				416 491,50			436 344,17		19 852,67	22 581,68	-2 729,01
	Komunikace											
62	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hultěný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklat (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m ²	1 272,06	483,40	614 913,32	1 590,87	483,40	769 026,07	318,81	154 112,75	154 112,75	0,00
	Komunikace celkem :				614 913,32			769 026,07		154 112,75	154 112,75	0,00
	Trubní vedení											
64	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300 vč. středních objímek a uzavření koncu chrániček	m	36,20	2 402,40	86 966,88	5,90	2 402,40	14 174,16	-30,30	-72 792,72	0,00	-72 792,72
80	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	37,47	24,40	914,27	60,72	24,40	1 481,57	23,25	567,30	567,30	0,00
81	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	651,61	40,00	26 064,40	594,84	40,00	23 793,60	-56,77	-2 270,80	0,00	-2 270,80
82	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	456,50	53,00	24 194,50	483,17	53,00	25 608,01	26,67	1 413,51	1 413,51	0,00
84	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	24	70,10	1 682,40	30,00	70,10	2 103,00	6,00	420,60	420,60	0,00
85	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2	168,90	337,80	5,00	168,90	844,50	3,00	506,70	506,70	0,00
87	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.ulěsnění koncu potrubí	m	93,02	98,80	9 190,38	116,27	98,80	11 487,48	23,25	2 297,10	2 297,10	0,00
88	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.ulěsnění koncu potrubí	m	761,97	107,40	81 835,58	705,20	107,40	75 738,48	-56,77	-6 097,10	0,00	-6 097,10

89	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.útesnění konců potrubí	m	643,09	121,70	78 264,05	669,76	121,70	81 509,79	26,67	3 245,74	3 245,74	0,00
95	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	25 735,60	25 735,60	0,00	25 735,60	0,00	-1,00	0,00	0,00	-25 735,60
96	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	16	30 709,80	491 356,80	14,00	30 709,80	429 937,20	-2,00	0,00	0,00	-61 419,60
98	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	15	37 004,60	555 069,00	14,00	37 004,60	518 064,40	-1,00	0,00	0,00	-37 004,60
99	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 6,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	44 659,30	44 659,30	3,00	44 659,30	133 977,90	2,00	89 318,60	89 318,60	0,00
110	Kamerové zkoušky potrubí	m	2 041,57	41,50	84 725,16	2 022,72	41,50	83 942,88	-18,85	0,00	0,00	-782,28
111	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	15	2 419,70	36 295,50	18,00	2 419,70	43 554,60	3,00	7 259,10	7 259,10	0,00
117	Spadistě prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půllžábkem výložným čedičem pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 7,0 m, výška spadistě přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	58 106,70	58 106,70	0,00	58 106,70	0,00	-1,00	0,00	0,00	-58 106,70
121	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	40,95	339,10	13 887,74	66,37	339,10	22 505,05	25,41	8 617,31	8 617,31	0,00
122	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	712,21	1 143,90	814 696,68	650,16	1 143,90	743 718,14	-62,05	0,00	0,00	-70 978,54
123	Roura PP kanalizační DN400 SN8	m	498,95	1 923,70	959 838,77	528,10	1 923,70	1 015 915,20	29,15	56 076,43	56 076,43	0,00
125	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	9,14	263,50	2 407,07	12,18	263,50	3 209,43	3,05	802,36	802,36	0,00
126	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	9,14	298,70	2 728,62	12,18	298,70	3 638,17	3,05	909,55	909,55	0,00
129	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	2,03	2 805,40	5 694,96	5,08	2 805,40	14 237,41	3,05	8 542,45	8 542,45	0,00
Trubní vedení celkem :					3 404 652,16			3 249 440,97		-155 211,19	179 976,76	-335 187,94
Ostatní konstrukce, bourání												
156	Zalití potrubí poplícementovou suspenzí	m3	1,45	1 802,20	2 618,60	5,06	1 802,20	9 115,53	3,61	6 496,93	6 496,93	0,00
157	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	52,65	2 355,60	124 029,88	56,12	2 355,60	132 188,73	3,46	8 158,85	8 158,85	0,00
158	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3 469,00	79,40	275 438,60	4 004,36	79,40	317 946,18	535,36	42 507,58	42 507,58	0,00
159	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	37,20	110,20	4 099,44	28,80	110,20	3 173,76	-8,40	0,00	0,00	-925,68
160	Výčištění potrubí slávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	276,50	86,70	23 972,55	398,00	86,70	33 639,60	111,50	9 667,05	9 667,05	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					430 159,07			496 063,80		65 904,73	66 830,41	-925,68
Bourání konstrukcí												
161	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	12	554,60	6 655,20	15,00	554,60	8 319,00	3,00	1 663,80	1 663,80	0,00
162	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,288	169,20	48,73	0,36	169,20	60,91	0,07	12,18	12,18	0,00
163	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,288	76,10	21,92	0,36	76,10	27,40	0,07	5,48	5,48	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					6 725,85			8 407,31		1 681,46	1 681,46	0,00
STOKA 08.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												

Příloha č.2 ke změnóvémú listu č. ZL-120-S-Z-SO 3.008

164	Sejmutí omítky s přemístěním do 50 m	m3	5,10	140,30	715,53	7,68	140,30	1 077,50	2,58	361,97	361,97	0,00
165	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	397,42	270,10	107 342,87	452,45	270,10	122 207,83	55,04	14 864,96	14 864,96	0,00
166	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 729,28	214,80	371 450,27	1 831,65	214,80	393 438,29	102,37	21 988,02	21 988,02	0,00
167	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	130,16	964,20	125 501,43	137,87	964,20	132 930,49	7,70	7 429,06	7 429,06	0,00
168	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	3 609,80	129,70	468 191,05	3 508,86	129,70	455 099,14	-100,94	0,00	-13 091,92	-13 091,92
169	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8m	m2	0,00	202,50	0,00	308,40	202,50	62 451,00	308,40	62 451,00	62 451,00	0,00
170	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	3 609,80	26,70	96 381,66	3 508,86	26,70	93 686,56	-100,94	0,00	-2 695,10	-2 695,10
171	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	0,00	66,40	0,00	308,40	66,40	20 477,76	308,40	20 477,76	20 477,76	0,00
172	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1 729,28	37,50	64 848,16	1 831,65	37,50	68 686,85	102,37	3 838,69	3 838,69	0,00
173	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	130,16	40,70	5 297,56	137,87	40,70	5 611,15	7,70	313,59	313,59	0,00
174	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	5,10	40,70	207,57	7,68	40,70	312,58	2,58	105,01	105,01	0,00
175	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	389,31	280,70	109 279,68	427,78	280,70	120 078,80	38,47	10 799,12	10 799,12	0,00
176	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	130,16	294,90	38 384,54	137,87	294,90	40 656,71	7,70	2 272,17	2 272,17	0,00
177	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 417,44	86,00	121 899,64	1 521,82	86,00	130 876,58	104,38	8 976,94	8 976,94	0,00
178	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	343,64	296,80	101 992,29	348,29	296,80	103 373,30	4,65	1 381,01	1 381,01	0,00
179	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	51,00	10,70	545,70	76,80	10,70	821,76	25,80	276,06	276,06	0,00
180	Rozprostření omítky, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	51,00	41,60	2 121,60	76,80	41,60	3 194,88	25,80	1 073,28	1 073,28	0,00
181	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	389,31	109,10	42 473,86	427,78	109,10	46 671,17	38,47	4 197,31	4 197,31	0,00
182	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	130,16	109,10	14 200,59	137,87	109,10	15 041,19	7,70	840,60	840,60	0,00
183	Vhodný zásylový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	86,06	536,00	46 129,88	131,05	536,00	70 241,51	44,98	24 111,63	24 111,63	0,00
184	Vhodný zásylový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	101,78	536,00	54 552,20	65,91	536,00	35 329,58	-35,86	0,00	-19 222,62	-19 222,62
185	Štěrkopísek frakce 8-16	t	637,58	276,10	176 035,56	646,21	276,10	178 419,13	8,63	2 383,57	2 383,57	0,00
Zemní práce celkem :					1 947 551,65			2 100 683,76		153 132,11	188 141,75	-35 009,64
Přípravné a přidružené práce												
187	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.droené tl.10 cm	m2	13,97	24,80	346,46	16,61	24,80	411,93	2,64	65,47	65,47	0,00
188	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.droené tl.30 cm	m2	54,01	73,40	3 964,33	63,91	73,40	4 690,99	9,90	726,66	726,66	0,00
189	Odstanění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	13,97	63,90	892,68	16,61	63,90	1 061,38	2,64	168,70	168,70	0,00
190	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	206,91	43,80	9 062,66	209,55	43,80	9 178,29	2,64	115,63	115,63	0,00

191	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.dícené tl.20 cm	m2	255,42	48,50	12 387,87	250,36	48,50	12 142,46	-5,06	-245,41	0,00	-245,41
192	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčného tl.5 cm	m2	206,91	65,20	13 490,53	208,55	65,20	13 662,66	2,64	172,13	172,13	0,00
193	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	206,91	84,10	17 401,13	209,55	84,10	17 623,16	2,64	222,03	222,03	0,00
194	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	184,28	169,20	31 179,90	189,46	169,20	32 056,12	5,18	876,22	876,22	0,00
195	Poplatek za skládku slabební sutí	t	184,28	76,10	14 023,58	189,46	76,10	14 417,67	5,18	394,09	394,09	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				102 749,14			105 244,66		2 495,52	2 740,93	-245,41
	Podkladní a vedlejší konstrukce											
196	Lože pod potrubí ze šěrčkopisku do 63 mm	m3	24,38	795,80	19 398,42	25,41	795,80	20 221,28	1,03	822,86	822,86	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				19 398,42			20 221,28		822,86	822,86	0,00
	Komunikace											
198	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.35 cm + asfaltový recyklat (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	152,90	483,40	73 911,86	145,64	483,40	70 402,38	-7,26	-3 509,48	0,00	-3 509,48
199	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.35 cm + asfaltový recyklat (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	54,01	483,40	26 108,43	63,91	483,40	30 894,09	9,90	4 785,66	4 785,66	0,00
	Komunikace celkem :				100 020,29			101 296,47		1 276,18	4 785,66	-3 509,48
	Trubní vedení											
208	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	186,28	24,40	4 545,23	195,68	24,40	4 774,59	9,40	229,36	229,36	0,00
210	Montáž tvarovek jednos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	130	70,10	9 113,00	133,00	70,10	9 323,30	3,00	210,30	210,30	0,00
212	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	5	168,90	844,50	6,00	168,90	1 013,40	1,00	168,90	168,90	0,00
215	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	689,00	98,80	68 073,20	698,40	98,80	69 001,92	9,40	928,72	928,72	0,00
218	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	74	2 419,70	179 057,80	75,00	2 419,70	181 477,50	1,00	2 419,70	2 419,70	0,00
219	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	203,60	339,10	69 042,12	213,88	339,10	72 526,10	10,27	3 483,98	3 483,98	0,00
221	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	28,42	263,50	7 488,67	29,44	263,50	7 756,12	1,02	267,45	267,45	0,00
222	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	28,42	298,70	8 489,05	29,44	298,70	8 792,23	1,02	303,18	303,18	0,00
225	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	5,08	2 805,40	14 237,41	6,09	2 805,40	17 084,89	1,02	2 847,48	2 847,48	0,00
	Trubní vedení celkem :				360 890,98			371 750,05		10 859,07	10 859,07	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání											
238	Řezání stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	376,20	79,40	29 870,28	381,00	79,40	30 251,40	4,80	381,12	381,12	0,00
239	Řezání stávajícího živčného krytu tl. 10 - 15 cm	m	25,40	110,20	2 799,08	30,20	110,20	3 328,04	4,80	528,96	528,96	0,00

Ostatní konstrukce, bourání celkem :										32 669,36				33 579,44		910,08	910,08	0,00
STOKA 08.1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ																		
Přípravné a přidružené práce																		
240	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	815,15	43,80	35 703,65	983,43	43,80	43,80	43 074,31	168,28						7 370,66	7 370,66	0,00
241	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1 039,73	73,40	76 315,87	1 251,40	73,40	73,40	91 852,75	211,67						15 536,88	15 536,88	0,00
242	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	1 339,16	65,20	87 313,09	1 608,69	65,20	65,20	104 886,44	269,53						17 573,35	17 573,35	0,00
243	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	2 434,96	84,10	204 779,95	3 077,37	84,10	84,10	258 807,05	642,42						54 027,10	54 027,10	0,00
245	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	1 080,54	169,20	182 827,17	1 314,24	169,20	169,20	222 369,19	233,70						39 542,02	39 542,02	0,00
246	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1 080,54	76,10	82 229,00	1 314,24	76,10	76,10	100 013,57	233,70						17 784,57	17 784,57	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :										669 168,73				821 003,31		151 834,58	151 834,58	0,00
Komunikace																		
247	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2 348,19	130,20	305 734,86	2 845,18	130,20	130,20	370 442,31	496,99						64 707,45	64 707,45	0,00
248	Štěr částecně vyplněný MC tl.250mm	m2	2 572,77	384,60	989 486,57	3 113,15	384,60	384,60	1 197 316,34	540,38						207 829,77	207 829,77	0,00
249	Podklad kamen, obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	2 872,20	270,50	776 930,10	3 470,44	270,50	270,50	938 752,67	598,24						161 822,57	161 822,57	0,00
250	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	2 872,20	23,70	68 071,14	3 470,44	23,70	23,70	82 249,31	598,24						14 178,17	14 178,17	0,00
251	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 968,00	13,80	54 758,40	4 939,12	13,80	13,80	68 159,86	971,12						13 401,46	13 401,46	0,00
252	Belon asfaltový ABJ modifik. tl.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	3 968,00	282,40	1 120 563,20	4 939,12	282,40	282,40	1 394 807,49	971,12						274 244,29	274 244,29	0,00
Komunikace celkem :										3 315 544,27				4 051 727,98		736 183,71	736 183,71	0,00
Ostatní konstrukce, bourání																		
254	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 497,16	79,40	118 874,50	1 774,94	79,40	79,40	140 930,24	277,78						22 055,74	22 055,74	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :										118 874,50				140 930,24		22 055,74	22 055,74	0,00
STOKA 08.1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ																		
Přípravné a přidružené práce																		
259	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	12,84	24,80	318,43	12,12	24,80	24,80	300,58	-0,72						0,00	-17,85	-17,85
260	Odstranění podkladu pl.200 m2, živice tl. 15 cm	m2	12,84	63,90	820,48	12,12	63,90	63,90	774,47	-0,72						0,00	-46,01	-46,01
261	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	348,85	43,80	15 279,54	346,21	43,80	43,80	15 163,91	-2,64						0,00	-115,63	-115,63
262	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	381,37	48,50	18 496,35	378,73	48,50	48,50	18 368,31	-2,64						0,00	-128,04	-128,04
263	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	348,85	65,20	22 744,89	346,21	65,20	65,20	22 572,76	-2,64						0,00	-172,13	-172,13
264	Frézování krytu pl.200 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	348,85	84,10	29 338,12	346,21	84,10	84,10	28 116,09	-2,64						0,00	-222,03	-222,03
266	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	282,85	169,20	47 858,44	280,68	169,20	169,20	47 490,98	-2,17						0,00	-367,46	-367,46
267	Poplatek za skládku stavební sutí	t	282,85	76,10	21 524,98	280,68	76,10	76,10	21 359,71	-2,17						0,00	-165,27	-165,27
Přípravné a přidružené práce celkem :										156 381,23				155 146,81		0,00	-1 234,42	-1 234,42
Komunikace																		
268	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 714,09	130,20	223 174,26	1 704,19	130,20	130,20	221 885,28	-9,90						0,00	-1 288,98	-1 288,98
269	Štěr částecně vyplněný MC tl.200 mm	m2	1 714,09	311,10	533 252,78	1 704,19	311,10	311,10	530 172,89	-9,90						0,00	-3 079,89	-3 079,89

270	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň. kamen. 15 cm	m2	254,70	207,40	52 824,78	209,40	207,40	43 429,56	-45,30	-9 395,22	0,00	-9 395,22
271	Podklad ze štiřkódtří po zhtutnění tloušťky 10 cm	m2	188,17	103,70	19 513,23	185,47	103,70	19 233,24	-2,70	-279,99	0,00	-279,99
273	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 714,09	270,50	463 660,80	1 704,19	270,50	460 982,85	-9,90	-2 677,95	0,00	-2 677,95
274	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl. 10 cm	m2	188,17	542,10	102 006,96	185,47	542,10	100 543,29	-2,70	-1 463,67	0,00	-1 463,67
275	Posyp křytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	254,70	22,90	5 832,63	209,40	22,90	4 795,26	-45,30	-1 037,37	0,00	-1 037,37
276	Vyspravení křytu po překópu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	188,17	471,00	88 628,07	185,47	471,00	87 356,37	-2,70	-1 271,70	0,00	-1 271,70
277	Posiřkř živniřný infiltr.+ posyp.z asfaltem 2 kg/m2	m2	1 714,09	23,70	40 623,89	1 704,19	23,70	40 389,26	-9,90	-234,63	0,00	-234,63
278	Posiřkř živniřný spojovací z asfaltem 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 714,09	13,80	23 654,41	1 704,19	13,80	23 517,79	-9,90	-136,62	0,00	-136,62
279	Beton asfaltový AB.I modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 714,09	282,40	484 058,45	1 704,19	282,40	481 282,69	-9,90	-2 795,76	0,00	-2 795,76
Komunikace celkem :			2 037 230,26						2 013 568,48		0,00	-23 661,78
Ostatní konstrukce, bourání												
285	Řezání stávajícího živniřného křytu tl. 5 - 10 cm	m	1 744,24	79,40	138 482,66	1 731,04	79,40	137 444,58	-13,20	-1 048,08	0,00	-1 048,08
286	Řezání stávajícího živniřného křytu tl. 10 - 15 cm	m	64,20	110,20	7 074,84	60,60	110,20	6 678,12	-3,60	-396,72	0,00	-396,72
Ostatní konstrukce, bourání celkem :			145 567,50						144 122,70		0,00	-1 444,80
SO 3.008 - stoka 08.1 CELKEM :			30 291 728,62						31 541 489,12		3 100 082,39	-1 850 321,89
SO 3.008 - LOKALITA KRUMPACH - změnía trasy stoky 08.1-17												
STOKA 08.1-17 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
4540	Dočasné zajiřtění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,30	154,90	511,17	2,20	154,90	340,78	-1,10	-170,39	0,00	-170,39
4541	Sejmutí omice s přemísťním do 50 m	m3	1,00	140,30	140,30	103,80	140,30	14 563,14	102,80	14 422,84	14 422,84	0,00
4542	Připílatek za zřtžené hloubení v blízkosti vedení	m3	16,50	270,10	4 456,65	36,98	270,10	9 988,84	20,48	5 532,19	5 532,19	0,00
4543	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	2,76	1 063,80	2 933,11	0,00	1 063,80	0,00	-2,76	-2 933,11	0,00	-2 933,11
3.008/7	Hloubení zapážžených jam v hor. tř. 1-4, s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemísťním ve výkopu a dále buď s přemísťním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	189,30	0,00	82,51	189,30	15 618,20	82,51	15 618,20	15 618,20	0,00
3.008/8	Hloubení zapážžených jam v hor. tř. 5-7, s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemísťním ve výkopu a dále buď s přemísťním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	850,10	0,00	6,21	850,10	5 279,21	6,21	5 279,21	5 279,21	0,00
4544	Hloubení rýř štíky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážžených i nezapážžených s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýřy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	481,06	214,80	103 330,68	903,39	214,80	194 048,75	422,34	90 718,07	90 718,07	0,00

4545	SO 3.008/ 523	Hĺbosení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	36,21	964,20	34 912,24	68,00	964,20	65 563,00	31,79	30 650,76	0,00
4546	SO 3.008/ 523	Protláčení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	0,00	31 046,60	0,00	30,00	31 046,60	931 398,00	30,00	931 398,00	0,00
4547		Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	269,31	70,60	19 012,98	58,92	70,60	4 159,54	-210,39	-14 853,44	-14 853,44
4548		Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	681,07	129,70	88 334,80	1 041,65	129,70	135 101,95	360,58	46 767,15	0,00
4549		Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8m	m2	67,03	202,50	13 573,56	468,07	202,50	94 783,53	401,04	81 209,95	0,00
4550		Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	269,31	16,00	4 308,89	58,92	16,00	942,67	-210,39	-3 366,22	-3 366,22
4551		Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	681,07	26,70	18 184,57	1 041,65	26,70	27 812,04	360,58	9 627,47	0,00
4552		Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	67,03	66,40	4 450,79	468,07	66,40	31 079,64	401,04	26 628,85	0,00
SO 3.008/ 530		Pažení stěn výkopu hloubky do 8 m vč.rozeptění	m2	0,00	202,50	0,00	125,40	202,50	25 393,50	125,40	25 393,50	0,00
SO 3.008/ 531		Odstanění pažení stěn hl. do 8 m vč.rozeptění	m2	0,00	66,40	0,00	125,40	66,40	8 326,56	125,40	8 326,56	0,00
4553		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	264,58	37,50	9 921,77	496,87	37,50	18 632,48	232,29	8 710,71	0,00
SO 3.008/ 533		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	0,00	47,10	0,00	82,51	47,10	3 885,99	82,51	3 885,99	0,00
4554		Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	22,67	40,70	922,75	37,40	40,70	1 522,12	14,73	599,37	0,00
SO 3.008/ 535		Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	0,00	82,50	0,00	6,21	82,50	512,33	6,21	512,33	0,00
4555		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,00	40,70	40,70	103,80	40,70	4 224,66	102,80	4 183,96	0,00
4556		Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	477,18	280,70	133 944,06	167,11	280,70	46 907,27	-310,07	-87 036,79	-87 036,79
4557		Vodorovné přemístění sutí na skládku vč.uložení	m3	2,76	281,60	776,43	0,00	281,60	0,00	-2,76	-776,43	-776,43
4558		Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	36,21	294,90	10 677,89	74,21	294,90	21 883,76	38,00	11 205,87	0,00
4559		Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	329,45	86,00	28 332,36	828,77	86,00	71 273,79	499,32	42 941,43	0,00
4560		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	110,84	296,80	32 896,63	121,58	296,80	36 083,61	10,74	3 186,98	0,00
4561		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhuťnění	m2	10,00	10,70	107,00	1 038,00	10,70	11 106,60	1 028,00	10 999,60	0,00
4562		Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	10,00	41,60	416,00	1 038,00	41,60	43 180,80	1 028,00	42 764,80	0,00
4563		Poplatek za skládku sutí	t	6,07	313,40	1 901,02	0,00	313,40	0,00	-6,07	-1 901,02	-1 901,02
4564		Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	469,20	109,10	51 189,64	167,11	109,10	18 231,70	-302,09	-32 957,94	-32 957,94
SO 3.008/ 4864		Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	36,21	109,10	3 950,35	74,21	109,10	8 096,03	38,00	4 145,68	0,00
4565		Trubka ocelová hladká 480x10 mm	m	0,00	7 772,50	0,00	33,00	7 772,50	256 492,50	33,00	256 492,50	0,00
4566		Vhodný zášypový materiál pro krajské komunikace podle TP 146	m3	353,93	536,00	189 704,23	11,09	536,00	5 943,06	-342,84	-183 761,17	-183 761,17
		Štěrkopisec frakce 8-16	t	205,64	276,10	56 778,56	225,58	276,10	62 281,51	19,93	5 502,95	0,00
Zemní práce celkem :						815 709,15			2 174 657,56		1 686 704,92	-327 756,51

Přípravné a přidružené práce											
4567	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	4,20	24,80	104,25	8,82	24,80	218,83	4,62	114,58	114,58
SO 3.008/297	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,00	48,50	0,00	47,50	48,50	2 303,75	47,50	2 303,75	2 303,75
4568	Odstanění podkladu pl.200 m2, živice tl. 15 cm	m2	4,20	63,90	268,62	8,82	63,90	563,84	4,62	295,22	295,22
4569	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.ičžené tl.20 cm	m2	240,78	43,80	10 546,08	9,35	43,80	409,53	-231,43	0,00	0,00
4570	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	240,78	73,40	17 673,11	9,35	73,40	686,29	-231,43	0,00	0,00
4571	Odstanění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	240,78	65,20	15 698,73	9,35	65,20	609,62	-231,43	0,00	0,00
4572	Frézování krytu pl.200 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	240,78	84,10	20 249,43	9,35	84,10	786,33	-231,43	0,00	0,00
4573	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	210,39	169,20	35 597,76	23,20	169,20	3 924,60	-187,19	0,00	0,00
4574	Poplatek za skládku stavební sutí	t	210,39	76,10	16 010,58	23,20	76,10	1 765,14	-187,19	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				116 148,56			11 257,93		2 713,55	-107 594,18
Základy a zvláštní zakládání											
4575	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrpkem, trubky d 100 mm	m	24,38	170,10	4 147,04	40,00	170,10	6 804,00	15,62	2 656,96	2 656,96
	Základy a zvláštní zakládání celkem :				4 147,04			6 804,00		2 656,96	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce											
4576	Lože pod potrubí ze štěrkodrté 0 - 63 mm	m3	4,39	795,80	3 492,29	6,60	795,80	5 252,28	2,21	1 759,99	1 759,99
4577	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	36,74	795,80	29 236,98	40,96	795,80	32 597,56	4,22	3 360,58	3 360,58
4578	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,32	2 549,90	5 915,26	2,96	2 549,90	7 549,74	0,64	1 634,48	1 634,48
4579	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	5,00	280,80	1 404,00	7,16	280,80	2 010,53	2,16	606,53	606,53
4580	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	9,30	217,70	2 024,61	6,20	217,70	1 349,74	-3,10	0,00	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				42 073,14			48 759,85		6 686,71	-674,87
Komunikace											
4581	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutěný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklat (prosvětka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	240,78	483,40	116 392,09	9,35	483,40	4 519,79	-231,43	0,00	-111 872,30
	Komunikace celkem :				116 392,09			4 519,79		0,00	-111 872,30
Trubní vedení											
SO 3.008/64	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300 vč. sříděcích objímek a uzavření koncu chrániček	m	0,00	2 402,40	0,00	30,00	2 402,40	72 072,00	30,00	72 072,00	0,00
4582	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	26,20	24,40	639,28	0,00	24,40	0,00	-26,20	0,00	-639,28

Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-120-S-Z-SO 3.008

4583	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	136,52	40,00	5 460,80	236,30	40,00	9 452,00	99,78	3 991,20	3 991,20	0,00
4584	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	24,38	53,00	1 292,14	0,00	53,00	0,00	-24,38	-1 292,14	-1 292,14	0,00
4585	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	6	70,10	420,60	0,00	70,10	0,00	-6,00	-420,60	-420,60	0,00
4586	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3	168,90	506,70	0,00	168,90	0,00	-3,00	-506,70	-506,70	0,00
4587	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	26,20	98,80	2 588,56	0,00	98,80	0,00	-26,20	-2 588,56	-2 588,56	0,00
4588	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	136,52	107,40	14 862,25	236,30	107,40	25 378,62	99,78	10 716,37	10 716,37	0,00
4589	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	24,38	121,70	2 967,05	0,00	121,70	0,00	-24,38	-2 967,05	-2 967,05	0,00
4590	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3	23 950,70	71 852,10	0,00	23 950,70	0,00	-3,00	-71 852,10	-71 852,10	0,00
4591	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	2 891,30	2 891,30	4,00	2 891,30	11 565,20	3,00	8 673,90	8 673,90	0,00
SO 3.008/97	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0	32 940,80	0,00	1,00	32 940,80	32 940,80	1,00	32 940,80	32 940,80	0,00
SO 3.008/98	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0	37 004,60	0,00	3,00	37 004,60	111 013,80	3,00	111 013,80	111 013,80	0,00
4592	Kamerové zkoušky potrubí	m	175,10	41,50	7 266,65	236,30	41,50	9 806,45	61,20	2 539,80	2 539,80	0,00
4593	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	3	2 419,70	7 259,10	0,00	2 419,70	0,00	-3,00	-7 259,10	-7 259,10	0,00
SO 3.008/4274	Univerzální spojka pro napojení na stáv.stoku DN300 <i>(cena použita jako DN 250)</i>	kus	0	2 706,00	0,00	1,00	2 706,00	2 706,00	1,00	2 706,00	2 706,00	0,00
SO 3.008/115	Spadistě prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým příližábekem vyloženým čedičem pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 5,0 m, výška spadistě přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0	47 536,00	0,00	1,00	47 536,00	47 536,00	1,00	47 536,00	47 536,00	0,00
SO 3.008/117	Spadistě prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým příližábekem vyloženým čedičem pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 7,0 m, výška spadistě přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0	58 106,70	0,00	1,00	58 106,70	58 106,70	1,00	58 106,70	58 106,70	0,00
4594	Monolitická šachta Š08.1.17-2 na potrubí DN300 se spadistěm na přítoku stávající bet. stoky DN300. Výška poklop - dno 2,83 m. Sv.rozměry monolitické části: půdorys 2,05 m2, výška 1990 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven,prefabrikát tl.250 mm, výstl. komín z prefabrikátů v. 740 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovými kamenivem, kyselá - radiální čedičové tvarovky, nárazová stěna-čedičový obklad, podestě-opevnění čedičovými obkladem s protiskluznou úpravou, betonový příližábek vyložený čedičem, vnitřní povrch - uzavírací náterový systém. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1	126 067,20	126 067,20	0,00	126 067,20	0,00	-1,00	-126 067,20	-126 067,20	0,00

4595	Monolitická šachta Š08.1.17-3 na potrubí DN300. Na přítoku slávající beton. stoka DN300. Výška poklop - dno 2,0 m. Sv.rozměry monolitické tási 1400x1400x1250 mm. nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komin z prefabrikátů v. 500 mm, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Vypířkový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamením, kyneta - radiální čedičové tvarovky, podesta-opevňení čedičovým obkladem s proliskluznou úpravou, vnitřní povrch - uzavírací náletový systém. Všechné úpravy zhlaví šachty.	kus	1	87 504,20	87 504,20	0,00	87 504,20	0,00	-1,00	-87 504,20	0,00	-87 504,20
4597	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	28,64	339,10	9 710,67	0,00	339,10	0,00	-28,64	-9 710,67	0,00	-9 710,67
4598	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	149,22	1 143,90	170 688,64	258,28	1 143,90	295 441,80	109,06	124 753,16	124 753,16	0,00
4599	Roura PP kanalizační DN400 SN8	m	26,65	1 923,70	51 261,41	0,00	1 923,70	0,00	-26,65	-51 261,41	0,00	-51 261,41
4600	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	3,05	263,50	802,36	0,00	263,50	0,00	-3,05	-802,36	0,00	-802,36
4601	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	3,05	298,70	909,54	0,00	298,70	0,00	-3,05	-909,54	0,00	-909,54
4602	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	3,05	2 805,40	8 542,44	0,00	2 805,40	0,00	-3,05	-8 542,44	0,00	-8 542,44
	Trubní vedení celkem :				573 292,99			676 019,37		102 726,38	475 049,73	-372 323,35
	Ostatní konstrukce, bourání											
4608	Zalití potrubí poplkoementovou suspenzí	m3	3,61	1 802,20	6 496,93	0,00	1 802,20	0,00	-3,61	-6 496,93	0,00	-6 496,93
4609	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	3,46	2 355,60	8 158,86	0,00	2 355,60	0,00	-3,46	-8 158,86	0,00	-8 158,86
4610	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	393,60	79,40	31 251,84	17,00	79,40	1 349,80	-376,60	-29 902,04	0,00	-29 902,04
4611	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,80	110,20	639,16	14,20	110,20	1 564,84	8,40	925,68	925,68	0,00
4612	Vyčištění potrubí slávající odstávené kanalizace vč.šachet	m	105,00	86,70	9 103,50	0,00	86,70	0,00	-105,00	-9 103,50	0,00	-9 103,50
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				55 650,29			2 914,64		-52 735,65	925,68	-53 661,33
	Bourání konstrukcí											
4613	Vybourání kanál.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	3	554,60	1 663,80	0,00	554,60	0,00	-3,00	-1 663,80	0,00	-1 663,80
4614	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,072	169,20	12,18	0,00	169,20	0,00	-0,07	-12,18	0,00	-12,18
4615	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,072	76,10	5,48	0,00	76,10	0,00	-0,07	-5,48	0,00	-5,48
	Bourání konstrukcí celkem :				1 681,46			0,00		-1 681,46	0,00	-1 681,46
	STOKA 08.1-17 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY											
	Zemní práce											
SO 3.008/164	Sejmání ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,00	140,30	0,00	0,74	140,30	103,82	0,74	103,82	103,82	0,00
SO 3.008/165	Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,00	270,10	0,00	25,92	270,10	7 000,99	25,92	7 000,99	7 000,99	0,00

Příloha č.2 ke změnóvémú listu č. ZL-120-S-Z-SO 3.008

SO 3.008/ 166	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	214,80	0,00	48,21	214,80	10 355,77	48,21	10 355,77	10 355,77	0,00
SO 3.008/ 167	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	964,20	0,00	3,63	964,20	3 498,89	3,63	3 498,89	3 498,89	0,00
SO 3.008/ 168	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	0,00	129,70	0,00	100,94	129,70	13 091,92	100,94	13 091,92	13 091,92	0,00
SO 3.008/ 169	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	0,00	26,70	0,00	100,94	26,70	2 695,10	100,94	2 695,10	2 695,10	0,00
SO 3.008/ 170	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	0,00	37,50	0,00	48,21	37,50	1 807,92	48,21	1 807,92	1 807,92	0,00
SO 3.008/ 171	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	0,00	40,70	0,00	3,63	40,70	147,69	3,63	147,69	147,69	0,00
SO 3.008/ 172	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	0,00	40,70	0,00	0,74	40,70	30,12	0,74	30,12	30,12	0,00
SO 3.008/ 173	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	0,00	280,70	0,00	8,99	280,70	2 524,39	8,99	2 524,39	2 524,39	0,00
SO 3.008/ 174	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,00	294,90	0,00	3,63	294,90	1 070,13	3,63	1 070,13	1 070,13	0,00
SO 3.008/ 175	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00	86,00	0,00	39,38	86,00	3 386,42	39,38	3 386,42	3 386,42	0,00
SO 3.008/ 176	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00	296,80	0,00	10,20	296,80	3 026,47	10,20	3 026,47	3 026,47	0,00
SO 3.008/ 177	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	0,00	10,70	0,00	7,40	10,70	79,18	7,40	79,18	79,18	0,00
SO 3.008/ 178	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseř travním semenem	m2	0,00	41,60	0,00	7,40	41,60	307,84	7,40	307,84	307,84	0,00
SO 3.008/ 179	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00	109,10	0,00	8,99	109,10	981,16	8,99	981,16	981,16	0,00
SO 3.008/ 180	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,00	109,10	0,00	3,63	109,10	395,90	3,63	395,90	395,90	0,00
SO 3.008/ 182	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	0,00	536,00	0,00	0,18	536,00	95,30	0,18	95,30	95,30	0,00
SO 3.008/ 183	Štěrkopisek frakce 8-16	t	0,00	276,10	0,00	18,92	276,10	5 223,59	18,92	5 223,59	5 223,59	0,00
Zemní práce celkem :			0,00					55 822,60		55 822,60	55 822,60	0,00
Přípravné a přidružené práce												
SO 3.008/ 295	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,00	43,80	0,00	7,26	43,80	317,98	7,26	317,98	317,98	0,00
SO 3.008/ 297	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,00	48,50	0,00	7,26	48,50	352,11	7,26	352,11	352,11	0,00

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-120-S-Z-SO 3.008

SO 3.008/ 2503	Odstanění podkladu pl. 200 m2, živčného tl.5 cm	m2	0,00	65,20	0,00	7,26	65,20	473,35	7,26	473,35	473,35	0,00
SO 3.008/ 193	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,00	84,10	0,00	7,26	84,10	610,57	7,26	610,57	610,57	0,00
SO 3.008/ 50	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,00	169,20	0,00	5,09	169,20	861,10	5,09	861,10	861,10	0,00
SO 3.008/ 51	Poplatek za skládku slabební sutí	t	0,00	76,10	0,00	5,09	76,10	387,29	5,09	387,29	387,29	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				0,00			3 002,41		3 002,41	3 002,41	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce											
SO 3.008/ 54	Lože pod potrubí ze šterkopiskú do 63 mm	m3	0,00	795,80	0,00	2,27	795,80	1 803,28	2,27	1 803,28	1 803,28	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				0,00			1 803,28		1 803,28	1 803,28	0,00
	Komunikace											
SO 3.008/ 61	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosiivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	0,00	483,40	0,00	7,26	483,40	3 509,48	7,26	3 509,48	3 509,48	0,00
	Komunikace celkem :				0,00			3 509,48		3 509,48	3 509,48	0,00
	Trubní vedení											
SO 3.008/ 80	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	0,00	24,40	0,00	20,60	24,40	502,64	20,60	502,64	502,64	0,00
SO 3.008/ 84	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	0	70,10	0,00	3,00	70,10	210,30	3,00	210,30	210,30	0,00
SO 3.008/ 85	Montáž tvarovek odoč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	0	168,90	0,00	1,00	168,90	168,90	1,00	168,90	168,90	0,00
SO 3.008/ 87	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění koncú potrubí	m	0,00	98,80	0,00	20,60	98,80	2 035,28	20,60	2 035,28	2 035,28	0,00
SO 3.008/ 111	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	0	2 419,70	0,00	1,00	2 419,70	2 419,70	1,00	2 419,70	2 419,70	0,00
SO 3.008/ 121	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	0,00	339,10	0,00	22,52	339,10	7 635,11	22,52	7 635,11	7 635,11	0,00
SO 3.008/ 125	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	0,00	263,50	0,00	1,02	263,50	267,45	1,02	267,45	267,45	0,00
SO 3.008/ 126	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	0,00	298,70	0,00	1,02	298,70	303,18	1,02	303,18	303,18	0,00
SO 3.008/ 129	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	0,00	2 805,40	0,00	1,02	2 805,40	2 847,48	1,02	2 847,48	2 847,48	0,00
	Trubní vedení celkem :				0,00			16 390,04		16 390,04	16 390,04	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání											

SO 3.008/ 158	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00	79,40	0,00	13,20	79,40	1 048,08	13,20	1 048,08	1 048,08	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				0,00			1 048,08		1 048,08		0,00
STOKA 08.1-17 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
4616	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	111,02	43,80	4 862,54	2,55	43,80	111,69	-108,47	-4 750,85	0,00	-4 750,85
4617	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	139,56	73,40	10 243,85	5,10	73,40	374,34	-134,46	-9 869,51	0,00	-9 869,51
4618	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	177,62	47,40	8 419,28	8,50	47,40	402,90	-169,12	-8 016,38	0,00	-8 016,38
4619	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	434,52	84,10	36 543,30	17,00	84,10	1 429,70	-417,52	-35 113,60	0,00	-35 113,60
4621	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	156,36	169,20	26 456,90	6,53	169,20	1 105,05	-149,83	-25 351,85	0,00	-25 351,85
4622	Poplatek za skládku stavební suti	t	156,36	76,10	11 899,35	6,53	76,10	497,01	-149,83	-11 402,34	0,00	-11 402,34
	Přípravné a přidružené práce celkem :				98 425,22			3 920,69		-94 504,53	0,00	-94 504,53
Komunikace												
4623	Podklad ze šlérkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	359,50	130,20	46 806,25	11,90	130,20	1 549,38	-347,60	-45 256,87	0,00	-45 256,87
4624	Šlérk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	388,04	384,60	149 240,18	14,45	384,60	5 557,47	-373,59	-143 682,71	0,00	-143 682,71
4625	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	426,10	270,50	115 260,05	17,85	270,50	4 828,43	-408,25	-110 431,62	0,00	-110 431,62
4626	Postřik živýný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	426,10	23,70	10 098,57	17,85	23,70	423,05	-408,25	-9 675,52	0,00	-9 675,52
4627	Postřik živýný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	683,00	13,80	9 425,40	26,35	13,80	383,63	-856,65	-9 061,77	0,00	-9 061,77
4628	Beeton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	683,00	282,40	192 878,20	26,35	282,40	7 441,24	-856,65	-185 437,96	0,00	-185 437,96
	Komunikace celkem :				523 709,65			20 163,20		-503 546,45	0,00	-503 546,45
Ostatní konstrukce, bourání												
4630	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	190,30	79,40	15 109,82	17,00	79,40	1 349,80	-173,30	-13 760,02	0,00	-13 760,02
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				15 109,82			1 349,80		-13 760,02	0,00	-13 760,02
STOKA 08.1-17 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
SO 3.008/ 295	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,00	43,80	0,00	2,64	43,80	115,63	2,64	115,63	115,63	0,00
4632	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1,16	24,80	28,77	2,84	24,80	70,43	1,68	41,66	41,66	0,00
SO 3.008/ 297	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,00	48,50	0,00	2,64	48,50	128,04	2,64	128,04	128,04	0,00
SO 3.008/ 2503	Odstanění podkladu pl. 200 m2, živého tl.5 cm	m2	0,00	65,20	0,00	2,64	65,20	172,13	2,64	172,13	172,13	0,00
4633	Odstanění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	1,16	63,90	74,12	2,84	63,90	181,48	1,68	107,36	107,36	0,00
SO 3.008/ 193	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	0,00	84,10	0,00	2,64	84,10	222,02	2,64	222,02	222,02	0,00
4634	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,517	169,20	87,54	3,12	169,20	527,44	2,60	439,90	439,90	0,00
4635	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,517	76,10	39,37	3,12	76,10	237,23	2,60	197,86	197,86	0,00

Přípravné a přidružené práce celkem :										229,80				1 654,40		1 424,60		1 424,60	0,00
Komunikace																			
SO 3.008/247	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	0,00	130,20	0,00	0,00	9,90	130,20						1 288,98	9,90	1 288,98		1 288,98	0,00
SO 3.008/289	Šterk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	0,00	311,10	0,00	0,00	9,90	311,10						3 079,89	9,90	3 079,89		3 079,89	0,00
SO 3.008/270	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň. kamen. 15 cm	m2	0,00	207,40	0,00	0,00	47,50	207,40						9 851,50	47,50	9 851,50		9 851,50	0,00
4636	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	5,36	103,70	556,23	11,66	11,66	103,70						652,91	6,30	652,91		652,91	0,00
SO 3.008/249	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	0,00	270,50	0,00	0,00	9,90	270,50						2 677,95	9,90	2 677,95		2 677,95	0,00
4637	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	5,36	542,10	2 907,72	11,66	11,66	542,10						6 320,89	6,30	3 413,17		3 413,17	0,00
SO 3.008/275	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	0,00	22,90	0,00	0,00	47,50	22,90						1 087,75	47,50	1 087,75		1 087,75	0,00
4638	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	5,36	471,00	2 526,35	11,66	11,66	471,00						5 491,86	6,30	2 965,51		2 965,51	0,00
SO 3.008/250	Posítk živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	0,00	23,70	0,00	0,00	9,90	23,70						234,63	9,90	234,63		234,63	0,00
SO 3.008/251	Posítk živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	0,00	13,80	0,00	0,00	9,90	13,80						136,62	9,90	136,62		136,62	0,00
SO 3.008/252	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	0,00	282,40	0,00	0,00	9,90	282,40						2 795,76	9,90	2 795,76		2 795,76	0,00
Komunikace celkem :										5 990,30				34 174,97		28 184,67		28 184,67	0,00
Ostatní konstrukce, bourání																			
SO 3.008/158	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	0,00	79,40	0,00	0,00	13,20	79,40						1 048,08	13,20	1 048,08		1 048,08	0,00
4639	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,80	110,20	639,16	14,20	14,20	110,20						1 564,84	8,40	925,68		925,68	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :										639,16				2 612,92		1 973,76		1 973,76	0,00
SO 3.008 - stoka 08.1-17 CELKEM :										2 369 198,67				3 070 395,01		701 196,34		2 288 571,34	-1 587 375,00
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH - změna trasy stoky 08.1 v úseku Š 08.1-47 až Š 08.1-57																			
STOKA 8.1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY																			
Zemní práce																			
342	Sejmutí omíčky s přemístěním do 50 m	m3	15,56	140,90	2 192,40	12,24	12,24	140,90						1 724,62	-3,32	-467,78		0,00	-467,78
343	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	405,01	271,00	109 756,36	351,83	351,83	271,00						95 344,58	-53,18	-14 411,78		0,00	-14 411,78
344	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přetvořením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podléhající osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	753,31	215,60	162 413,49	654,39	654,39	215,60						141 087,45	-98,91	-21 326,04		0,00	-21 326,04

345	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	56,70	967,80	54 874,94	49,26	967,80	47 669,47	-7,45	-7 205,47	0,00	-7 205,47
346	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	1 502,80	16,10	24 195,08	1 303,60	16,10	20 987,96	-199,20	-3 207,12	0,00	-3 207,12
347	Odstraňování pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	1 502,80	16,10	24 195,08	1 303,60	16,10	20 987,96	-199,20	-3 207,12	0,00	-3 207,12
348	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	753,31	22,60	17 024,81	654,40	22,60	14 789,44	-98,91	-2 235,37	0,00	-2 235,37
349	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	56,70	24,70	1 400,49	49,26	24,70	1 216,60	-7,45	-183,89	0,00	-183,89
350	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	15,56	40,90	636,40	12,24	40,90	500,62	-3,32	-135,78	0,00	-135,78
351	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	172,46	281,60	48 564,74	148,96	281,60	41 947,14	-23,50	-6 617,60	0,00	-6 617,60
352	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	56,70	296,00	16 783,20	49,26	296,00	14 579,63	-7,44	-2 203,57	0,00	-2 203,57
353	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	605,16	86,40	52 285,41	529,75	86,40	45 769,99	-75,41	-6 515,42	0,00	-6 515,42
354	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	174,78	297,90	52 067,44	150,13	297,90	44 724,20	-24,65	-7 343,24	0,00	-7 343,24
355	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	155,60	10,70	1 664,92	122,40	10,70	1 309,68	-33,20	-355,24	0,00	-355,24
356	Rozproštění ornice, rovina, hl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	155,60	41,80	6 504,08	122,40	41,80	5 116,32	-33,20	-1 387,76	0,00	-1 387,76
357	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	172,46	109,40	18 867,12	148,96	109,40	16 296,22	-23,50	-2 570,90	0,00	-2 570,90
358	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	56,70	109,40	6 202,98	49,26	109,40	5 388,50	-7,45	-814,48	0,00	-814,48
360	Štěrkopisek frakce 8-16	t	324,28	277,20	89 890,86	278,55	277,20	77 213,15	-45,73	-12 677,71	0,00	-12 677,71
	Zemní práce celkem :				689 519,80			596 653,53		-92 866,27	0,00	-92 866,27
	Přípravné a přidružené práce											
365	Odstraňování podkladu pl. 200 m2, kam. drcené II 20 cm	m2	52,14	48,70	2 539,22	43,01	48,70	2 094,59	-8,13	-444,63	0,00	-444,63
372	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	t	52,51	169,90	8 921,66	50,37	169,90	8 557,13	-2,15	-364,53	0,00	-364,53
373	Poplatek za skládku slávební suší	t	52,51	76,40	4 011,86	50,37	76,40	3 847,94	-2,15	-163,92	0,00	-163,92
	Přípravné a přidružené práce celkem :				15 472,74			14 499,66		-973,08	0,00	-973,08
	Podkladní a vedlejší konstrukce											
374	Lože pod potrubí ze štěrkopisků do 63 mm	m3	36,39	798,70	29 062,78	30,09	798,70	24 030,97	-6,30	-5 031,81	0,00	-5 031,81
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				29 062,78			24 030,97		-5 031,81	0,00	-5 031,81
	Trubní vedení											
385	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	132,70	24,40	3 237,88	82,90	24,40	2 022,76	-49,80	-1 215,12	0,00	-1 215,12
387	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	32	70,30	2 249,60	16,00	70,30	1 124,80	-16,00	-1 124,80	0,00	-1 124,80
389	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	25	169,60	4 240,00	17,00	169,60	2 883,20	-8,00	-1 356,80	0,00	-1 356,80
391	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	346,20	99,10	34 308,42	296,40	99,10	29 373,24	-49,80	-4 935,18	0,00	-4 935,18
392	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	30	2 428,60	72 858,00	22,00	2 428,60	53 429,20	-8,00	-19 428,80	0,00	-19 428,80
393	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	145,04	340,30	49 357,49	90,61	340,30	30 834,48	-54,43	-18 523,01	0,00	-18 523,01
396	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	16,24	264,40	4 293,86	8,12	264,40	2 146,93	-8,12	-2 146,93	0,00	-2 146,93
397	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	16,24	299,80	4 888,75	8,12	299,80	2 434,36	-8,12	-2 434,37	0,00	-2 434,37

400	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	16,24	2 815,60	45 725,34	8,12	2 815,60	22 862,67	-8,12	-22 862,67	0,00	-22 862,67
	Trubní vedení celkem :				221 139,34			147 111,66		-74 027,68	0,00	-74 027,68
STOKA 8.1 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
430	Odstředění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	18,96	48,70	923,35	15,64	48,70	761,67	-3,32	-161,68	0,00	-161,68
436	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	t	10,75	169,90	1 825,87	9,97	169,90	1 693,32	-0,78	-132,55	0,00	-132,55
437	Poplatek za skládku slávební suší	t	10,75	76,40	821,05	9,97	76,40	761,45	-0,78	-59,60	0,00	-59,60
	Přípravné a přidružené práce celkem :				3 570,27			3 216,44		-353,83	0,00	-353,83
Komunikace												
441	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	13,95	208,10	2 803,00	1,50	208,10	312,15	-12,45	-2 590,85	0,00	-2 590,85
449	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavětřováním	m2	13,95	23,00	320,85	1,50	23,00	34,50	-12,45	-286,35	0,00	-286,35
	Komunikace celkem :				3 223,85			346,65		-2 877,20	0,00	-2 877,20
SO 3.015 - stoka 08.1 CELKEM :												
					961 988,73			785 858,91		-176 129,87	0,00	-176 129,87
SO 3.015 - PŘÍPOJKY KRUMPACH - změna trasy stoky 08.1-17												
STOKA 8.1-17 - ODOBČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
SO 3.015/342	Sejmutí ornice s přemíslením do 50 m	m3	0,00	140,90	0,00	3,32	140,90	467,79	3,32	467,79	467,79	0,00
SO 3.015/343	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	0,00	271,00	0,00	53,18	271,00	14 411,78	53,18	14 411,78	14 411,78	0,00
SO 3.015/344	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	215,60	0,00	98,91	215,60	21 326,03	98,91	21 326,03	21 326,03	0,00
SO 3.015/345	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,00	967,80	0,00	7,45	967,80	7 205,46	7,45	7 205,46	7 205,46	0,00
SO 3.015/346	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	0,00	16,10	0,00	199,20	16,10	3 207,12	199,20	3 207,12	3 207,12	0,00
SO 3.015/347	Odstředění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	0,00	16,10	0,00	199,20	16,10	3 207,12	199,20	3 207,12	3 207,12	0,00
SO 3.015/348	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00	22,60	0,00	98,91	22,60	2 235,37	98,91	2 235,37	2 235,37	0,00
SO 3.015/349	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,00	24,70	0,00	7,45	24,70	183,89	7,45	183,89	183,89	0,00
SO 3.015/350	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00	40,90	0,00	3,32	40,90	135,79	3,32	135,79	135,79	0,00
SO 3.015/351	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	0,00	281,60	0,00	23,50	281,60	6 617,60	23,50	6 617,60	6 617,60	0,00

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-120-S-Z-SO 3.008

SO 3.015/ 352	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,00	296,00	0,00	7,44	296,00	2 203,57	7,44	2 203,57	2 203,57	0,00
SO 3.015/ 353	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00	86,40	0,00	75,41	86,40	6 515,42	75,41	6 515,42	6 515,42	0,00
SO 3.015/ 354	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00	297,90	0,00	24,65	297,90	7 343,24	24,65	7 343,24	7 343,24	0,00
SO 3.015/ 355	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	0,00	10,70	0,00	33,20	10,70	355,24	33,20	355,24	355,24	0,00
SO 3.015/ 356	Rozproštění omnice, rovina, tl. do 10 cm vč.oselí travním semenem	m2	0,00	41,80	0,00	33,20	41,80	1 387,76	33,20	1 387,76	1 387,76	0,00
SO 3.015/ 357	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00	109,40	0,00	23,50	109,40	2 570,90	23,50	2 570,90	2 570,90	0,00
SO 3.015/ 358	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,00	109,40	0,00	7,45	109,40	814,48	7,45	814,48	814,48	0,00
SO 3.015/ 360	Štěrkopisek frakce 8-16	t	0,00	277,20	0,00	45,73	277,20	12 677,71	45,73	12 677,71	12 677,71	0,00
Zemní práce celkem :					0,00			92 866,27		92 866,27	92 866,27	0,00
Přípravné a přidružené práce												
SO 3.015/ 365	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,00	48,70	0,00	9,13	48,70	444,63	9,13	444,63	444,63	0,00
SO 3.015/ 372	Vodorovná oprava suší po suchu na skládku vč.uložení	t	0,00	169,90	0,00	2,15	169,90	364,53	2,15	364,53	364,53	0,00
SO 3.015/ 373	Poplatek za skládku stavební suší	t	0,00	76,40	0,00	2,15	76,40	163,92	2,15	163,92	163,92	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					0,00			973,08		973,08	973,08	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce												
SO 3.015/ 374	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	0,00	798,70	0,00	6,30	798,70	5 031,81	6,30	5 031,81	5 031,81	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					0,00			5 031,81		5 031,81	5 031,81	0,00
Trubní vedení												
SO 3.015/ 385	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	0,00	24,40	0,00	49,80	24,40	1 215,12	49,80	1 215,12	1 215,12	0,00
SO 3.015/ 387	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	0	70,30	0,00	16,00	70,30	1 124,80	16,00	1 124,80	1 124,80	0,00
SO 3.015/ 389	Montáž tvarovek odošč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	0	169,60	0,00	8,00	169,60	1 356,80	8,00	1 356,80	1 356,80	0,00
SO 3.015/ 391	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,00	99,10	0,00	49,80	99,10	4 935,18	49,80	4 935,18	4 935,18	0,00
SO 3.015/ 392	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	0	2 428,60	0,00	8,00	2 428,60	19 428,80	8,00	19 428,80	19 428,80	0,00
SO 3.015/ 393	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	0,00	340,30	0,00	54,43	340,30	18 523,01	54,43	18 523,01	18 523,01	0,00
SO 3.015/ 396	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	0,00	264,40	0,00	8,12	264,40	2 146,93	8,12	2 146,93	2 146,93	0,00

Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-120-S-Z-SO 3.008

SO 3.015/ 397	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	0,00	299,80	0,00	8,12	299,80	2 434,38	8,12	2 434,38	2 434,38	0,00
SO 3.015/ 400	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	0,00	2 815,60	0,00	8,12	2 815,60	22 862,67	8,12	22 862,67	22 862,67	0,00
Trubní vedení celkem :			0,00		0,00			74 027,69		74 027,69	74 027,69	0,00
STOKA 8.1-17 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH												
Přípravné a přidružené práce												
SO 3.015/ 365	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,00	48,70	0,00	3,32	48,70	161,68	3,32	161,68	161,68	0,00
SO 3.015/ 372	Vodrovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,00	169,90	0,00	0,78	169,90	132,56	0,78	132,56	132,56	0,00
SO 3.015/ 373	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,00	76,40	0,00	0,78	76,40	59,61	0,78	59,61	59,61	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :			0,00		0,00			353,85		353,85	353,85	0,00
Komunikace												
SO 3.015/ 441	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	0,00	208,10	0,00	12,45	208,10	2 590,85	12,45	2 590,85	2 590,85	0,00
SO 3.015/ 449	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	0,00	23,00	0,00	12,45	23,00	286,35	12,45	286,35	286,35	0,00
Komunikace celkem :			0,00		0,00			2 877,20		2 877,20	2 877,20	0,00
SO 3.015 - stoka 08.1-17 CELKEM :			0,00		0,00			176 129,90		176 129,90	176 129,90	0,00
ZL-120-S-Z-SO 3.008 CELKEM:			33 622 916,07					35 573 872,94		1 950 956,87	5 564 783,63	-3 613 826,76



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu:
Datum: 10. 9. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-120-S-Z-SO 3.008 Změna trasy stoky 08.1 v úseku Š 08.1-47 až Š 08.1-57.

Vyjádření generálního projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky 08.1 nelze pokračovat ve výstavbě stoky přes zahrady v prostoru mezi šachtami 08.1-47 až 08.1-57. Majitel nemovitosti č.p. 50 se rozhodl, že umístění průběžné stoky 08.1 na svůj pozemek odmítne, i když původně souhlasil. Nově sdělil, že jeho souhlas platí jen pro umístění koncové stoky.

Zhotovitel tedy navrhuje provést záměnu tras stoky 08.1 a 08.1-17. Průběžnou stoku 08.1 přesunout ze zahrady do ulice Sokolské a koncovou stoku 08.1-17 přesunout do zahrad.

Z pozice generálního projektanta s návrhem souhlasíme, neboť konkrétní situaci, kdy majitel neočekávaně změnil svoje původně kladné stanovisko, nebylo možno předvídat. Bez navržených úprav není možné pokračovat v realizaci stoky 08.1.

Za generálního projektanta:

Datum:

Ing. Jan Polášek

Podpis:



AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno, ČR
DIČ: CZ46964371



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu:
Datum: 10. 9. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iniciační dopis č.: ID-120-S-Z-SO 3.008 Změna trasy stoky 08.1 v úseku Š 08.1-47 až Š 08.1-57.

Vyjádření projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky 08.1 nelze pokračovat ve výstavbě stoky přes zahrady v prostoru mezi šachtami 08.1-47 až 08.1-57. Majitel nemovitosti č.p. 50 se rozhodl, že umístění průběžné stoky 08.1 na svůj pozemek odmítne, i když původně souhlasil. Nově sdělil, že jeho souhlas platí jen pro umístění koncové stoky.


Zhotovitel tedy navrhuje provést záměnu tras stoky 08.1 a 08.1-17. Průběžnou stoku 08.1 přesunout ze zahrady do ulice Sokolské a koncovou stoku 08.1-17 přesunout do zahrad.

Projektant s návrhem souhlasí, neboť konkrétní situaci, kdy majitel neočekávaně změnil svoje původně kladné stanovisko, nebylo možno předvídat. Bez navržených úprav není možné pokračovat v realizaci stoky 08.1.

Za projektanta:

Datum:

Ing. Vlastislav Kolečkář

Podpis: 
 AQUA PROCON s.r.o.
 Palackého tř. 12
 612 00 Brno, ČR
 DIČ: CZ46964371



„Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II fáze“

Akceptační číslo: 08022651 OPŽP

CCI 2009CZ161PR002



AP INVESTING s.r.o.



ZÁZNAM

Z JEDNÁNÍ K REALIZACI STOKY 08.1 A 08.1-17 – LOKALITA KRUMPACH

konaného dne: 26.08.2015 od 09:00 hod.
za účasti: pí. Krejčí Helena – vlastník parcely p.č. 4368 a 4369 k.ú. Zábřeh na Moravě
Ing. Janča J. - správce stavby
záznam vypracoval: Ing. Janča J.


PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

Jednání bylo uskutečněno za účelem dořešení požadavku vlastníka pozemků k trase stoky 08.1 v rámci stavby „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy-II.fáze“.

Vlastník pozemků p.č.4368 a 4369 v k.ú. Zábřeh při projednávání vstupů na pozemky zásadně nesouhlasí s vedením části trasy stoky 08.1 podél boční strany domu směrem k ul. Sokolovská, v této části stoky vedoucí po soukromém pozemku je vyprojektováno odbočení pro sousední nemovitost Sokolská 50a.

Správce stavby ve spolupráci s projektantem na dnešním jednání předložil změnu trasy stoky 08.1 spočívající v záměně stok 08.1 a 08.1-17 s tím, že přes soukromé pozemky bude vedena stoka 08.1-17 končící na parcele vlastníka a stoka 08.1 bude vedena v komunikaci Sokolská před domy č.44-50. Odbočení pro nemovitost Sokolská 50a bude provedeno z nové trasy stoky 08.1 z ul. Sokolské a nebude tak zatěžovat soukromé pozemky vlastníka.

Vlastník pozemků s touto navrženou variantou vyslovil souhlas s tím, že koncová šachta stoky 08.1-17 bude vytažena do úrovně terénu zahrady.


Ing. Janča J.


pí. Krejčí Helena



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

☎ 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603-841/0100

AQUA Procon s.r.o.
Ing. Kolečkář
Palackého tř. 12,
612 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

1019

Naše značka

50000/2015

e-mail

heitmar@spvs.cz

Vyřizuje/

Heitmar Petr

Šumperk

21.9.2015

Věc: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“

Týká se: „ Horní Pomoraví II sever, Město Zábřeh „


Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk jako provozovatel obdržela od zhotovitele stavby fa: IMOS BRNO, a.s. žádost o vyjádření k předloženému stanovisku (Iniciační dopis ID-120-S-Z-SO 3.008 – Změna trasy stoky 08.1 v úseku Š 08.1-47 až Š 08.1-57).

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk k předloženému návrhu konstatuje následující:

- S navrženým řešením souhlasíme.

S pozdravem

Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911



Ing. Pavel Paloncý
technický ředitel
