



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	14. 05. 2015
Ev.č.	ZL-045-S-Z-SO 3.004	Datum schválení	18. 05. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jilová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS **)		
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh / SO 3.004/stoka 04.1.o/ úsek Š04.1.o-5 až Š04.1.o-6		
Specifikace změny: Při provádění stoky 04.1-o v úseku Š04.1.o-5 až Š04.1.o-6 byla v trase nově realizované kanalizace odkryto stávající potrubí, které je ve výškové kolizi se stokou 04.1-o. Z potrubí je patrný přítok splaškových vod, který jsme museli dočasně podchytit do stoky 04.1-o. Provedli jsme kamerový průzkum boční stoky/přípojky a ověřili její délku a přibližný sklon. Z kamerové prohlídky je patrné, že odkrytá stávající stoka/přípojka je ve velmi malém podélném sklonu (cca 3‰). V konečné fázi musí být stoka/přípojka napojena do stoky 04.2 (jednotná kanalizace). Aby bylo možné přepojit gravitačně stoku/přípojku 04.2 bude nutné stoku/přípojku v celé její délce (cca 12m) vybourat a vybudovat nově v upravené niveletě (cca 10‰), což umožní nadejít nad nově budovanou stokou 04.1-o.			
Předmětem změnového listu je: - Přepojení stoky 04.2			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	143.804,64Kč		
Stanovisko správce stavby: <i>Projektant přepojí všechny uvolněné stávající přípojky. Správce stavby s ním souhlasí a souhlasí s tím, že po provedení příslušné snímky a definování jednotlivých schválností přebírá přípojky na své vlastní zodpovědnost, které jsou podle potřeby nutné pro přepojení přípojky do nové stávající stoky.</i>			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Zaměření geodetem 5) Stavební deník 6) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.		




Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schvaluji/neschvaluji **) SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno  Ing. Martin Staněk – zástupce vedoucího týmu Datum: 14. 05. 2015	 AQUA PROCOM s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR IČ: 246984371 Ing. Jan Polášek – hlavní inženýr projektu Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno Brno - VHS a D6 4 Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **)  Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilová 2769/8 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel.: 583 317 111 fax: 583 214 845 Ing. Petr Suchomel - manažer projektu 18. 05. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nehodící se škrtno



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Aquaprocon

Ing. Vlastislav Kolečkář

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Holotík Vladimír	holotikv@imosbrno.eu / 602 713 982	10.10.2014

Iniciační dopis č. ID-045-S-Z-SO 3.004 - Kolize stoky 04.1.o s přípojkou na ul. 28. října, č.pop.14

Aktuální stav:

Při provádění stoky 04.1-o v úseku Š04.1.o-5 až Š04.1.o-6 byla v trase nově realizované kanalizace odkryto stávající potrubí, které je ve výškové kolizi se stokou 04.1-o. Z potrubí je patrný přítok splaškových vod, které jsme museli dočasně podchytit do stoky 04.1-o.

Provedli jsme kamerový průzkum boční stoky/přípojky a ověřili její délku a přibližný sklon. Z kamerové prohlídky je patrné, že odkrytá stávající stoka je ve velmi malém podélném sklonu (cca 3‰).

V konečné fázi musí být stoka/přípojka napojena do stoky 04.2 (jednotná kanalizace).

Návrh řešení:


Aby bylo možné přepojit gravitačně stoku/přípojkou do stoky 04.2 bude nutné stoku/přípojkou v celé její délce (cca 12m) vybourat a vybudovat nově v upravené niveletě (cca 10‰), což umožní nadejít nad nově budovanou stokou 04.1-o.

Žádáme zodpovědného projektanta o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a návrh řešení.

S pozdravem

Ing. Holotík Vladimír

Dne 10. 10. 2014

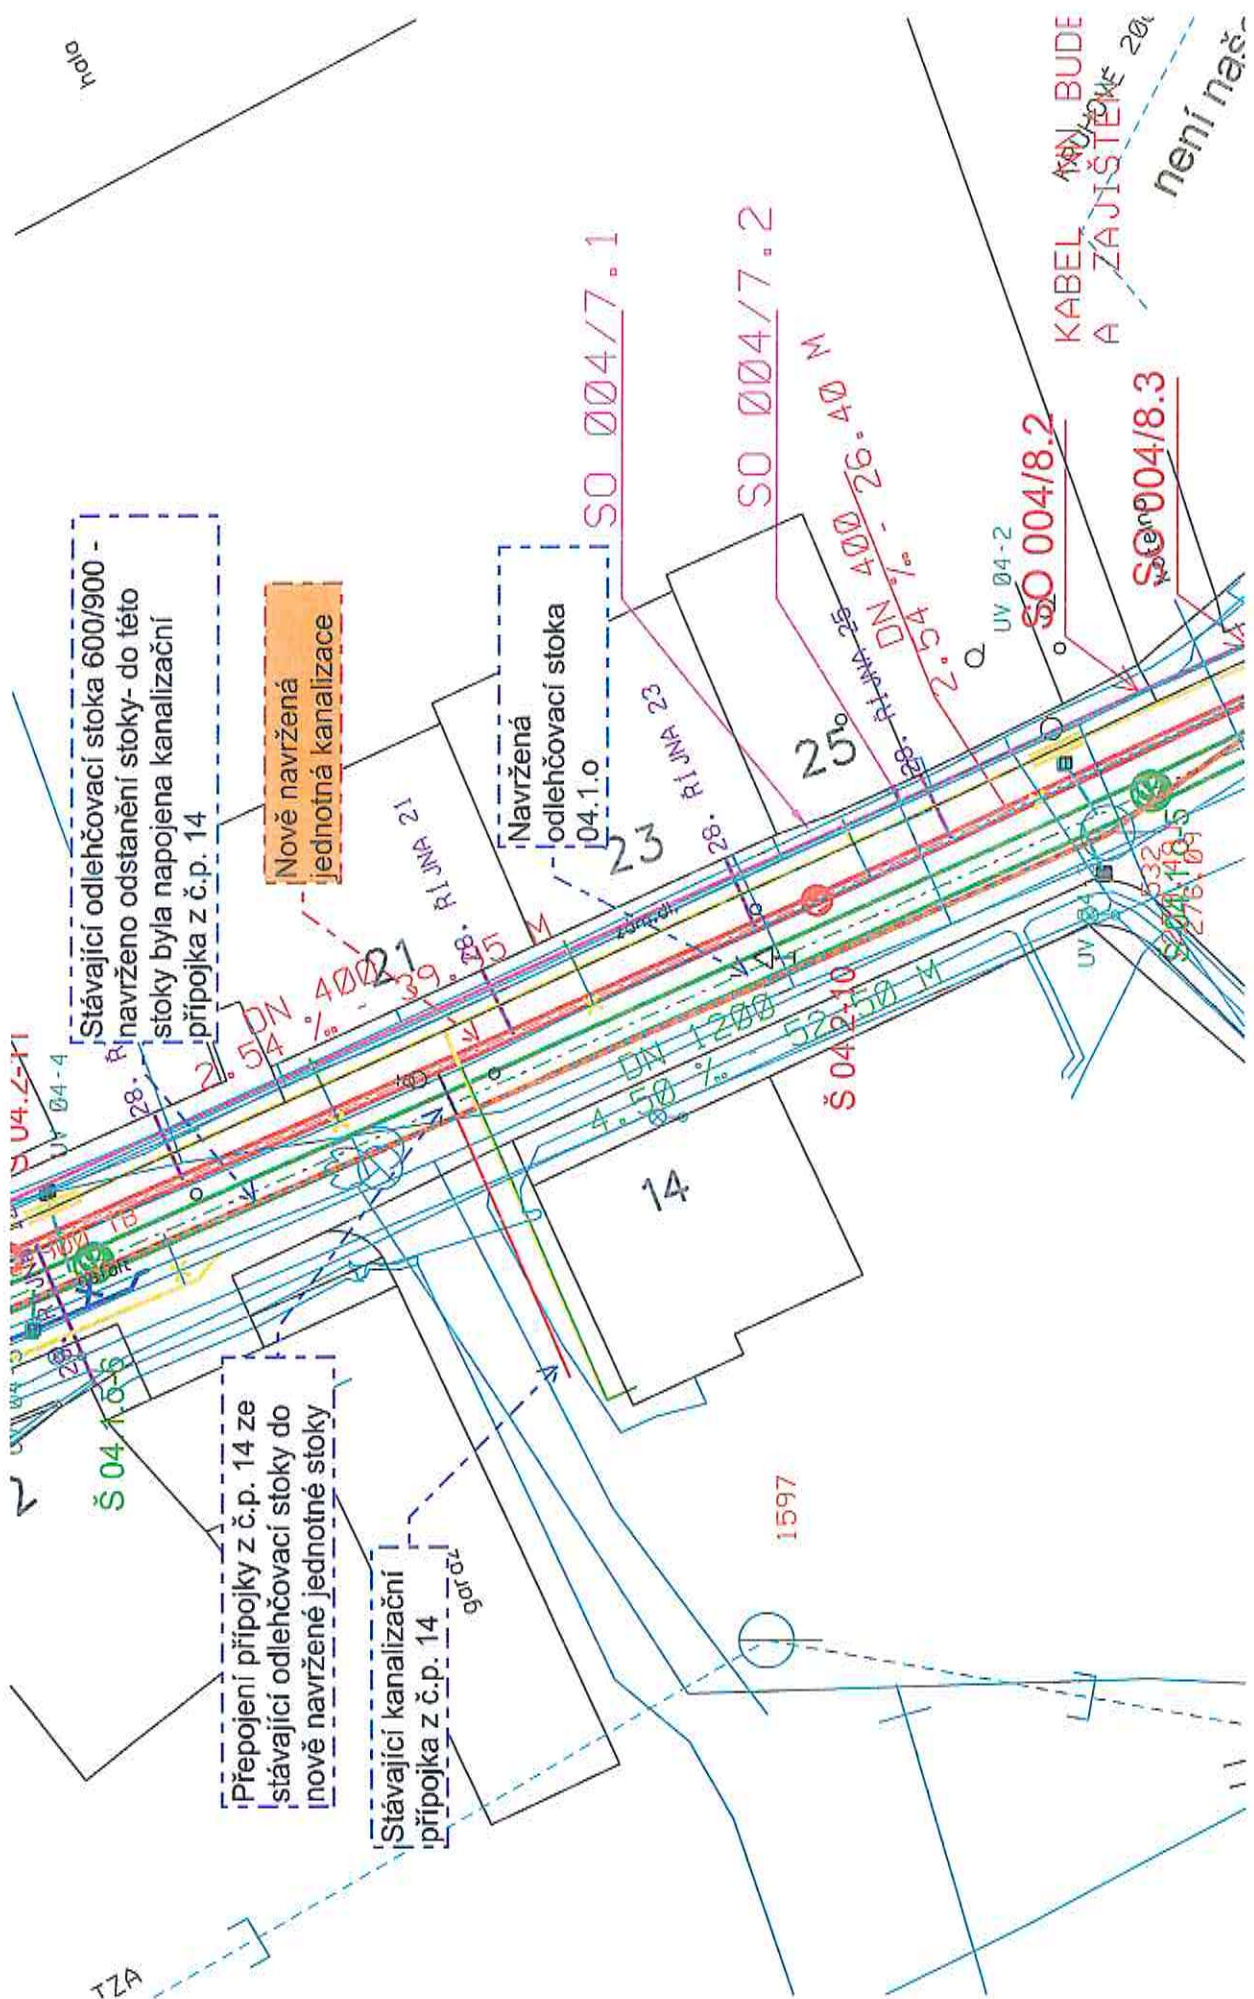

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-045-S-Z-SO 3.004

3. Město Zábřeh / STOKA 04.2

Kolize stoky 04.1.O s přípojkou na ul. 28. října, č. p. 14 na stoce 04.2

Pol.	Popis položky	Rozpočet dle SoD				Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-045-S-Z-SO 3.004		
		m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP	
SO 3.004 - LOKALITA UL. 28. ŘÍJNA													
STOKA 04.2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY													
Zemní práce													
1626	Příplatek za zližené hloubení v blízkosti vedení	m3	58,94	270,10	15 918,34	62,02	270,10	16 750,25	3,08	831,91	831,91		
	1.1*2,8*1												
1572	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,80	154,90	743,52	5,90	154,90	913,91	1,10	170,39	170,39		
SO 3.009/ 3008	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	37,95	6 195,20	235 127,66	38,44	6 195,20	238 133,96	0,49	3 006,30	3 006,30		
	výbourání slávejícího ŽB potrubí DN 200: 3.14159*10,14*2-0,10*2)*16,09												
1627	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	109,62	214,90	23 557,14	159,18	214,90	34 207,59	49,56	10 650,45	10 650,45		
	16.09*1,1*2,8												
1629	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	246,40	70,60	17 395,84	336,50	70,60	23 756,90	90,10	6 361,06	6 361,06		
	16.09*2,8*2												
1630	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	246,40	16,10	3 967,04	336,50	16,10	5 417,65	90,10	1 450,61	1 450,61		
1631	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	109,62	22,50	2 466,45	159,18	22,50	3 581,55	49,56	1 115,10	1 115,10		
1633	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	31,46	280,70	8 830,82	81,02	280,70	22 742,31	49,56	13 911,49	13 911,49		
671	Vodorovné přemístění sutí na skládku vč.uložení	m3	122,64	281,70	34 547,69	123,13	281,70	34 684,39	0,49	136,70	136,70		
1635	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	78,16	86,10	6 729,80	116,41	86,10	10 023,21	38,25	3 293,41	3 293,41		
1636	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	30,08	296,90	8 929,98	36,94	296,90	10 967,01	6,86	2 037,03	2 037,03		
	KT:(1,1*0,44-3,14159*0,14*0,14)*10,95												
	PP:(1,1*0,44-3,14159*0,125*0,125)*5,14												
1637	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	31,46	109,10	3 432,29	81,02	109,10	8 839,28	49,56	5 406,99	5 406,99		
675	Poplatek za skládku sutí	t	269,81	313,50	84 584,81	270,92	313,50	84 934,71	1,12	349,90	349,90		

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD				Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-045-S-Z-SO 3.004	
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč		Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
1593	Vhodný záspový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	264,51	536,10	141 802,15		333,36	536,10	178 713,55	68,85	36 911,40	36 911,40	
1639	Štěrkoštěpek frakce 8-16	t	55,81	276,20	15 414,58		68,16	276,20	18 825,60	12,35	3 411,02	3 411,02	
	Zemní práce celkem :				603 448,11				692 491,87		89 043,76	89 043,76	0,00
	Přípravné a přidružené práce												
1641	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	33,00	43,80	1 445,40		50,70	43,80	2 220,66	17,70	775,26	775,26	
	1,1*16,09												
1643	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	40,26	48,50	1 952,61		57,96	48,50	2 811,06	17,70	858,45	858,45	
1644	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	33,00	21,30	702,90		50,70	21,30	1 079,91	17,70	377,01	377,01	
1646	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	33,00	84,20	2 778,60		50,70	84,20	4 268,94	17,70	1 490,34	1 490,34	
1647	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	26,90	169,30	4 554,11		36,46	169,30	6 172,61	9,56	1 618,50	1 618,50	
	1,1*16,09*0,4*1,8+1,1*16,09*0,1*2,2												
1648	Poplatek za skládku stavební sutí	t	26,90	76,10	2 047,06		36,46	76,10	2 774,58	9,56	727,52	727,52	
	Poplatek za skládku stavební sutí				13 480,68				19 327,76		5 847,08	5 847,08	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :												
	Podkladní a vedlejší konstrukce												
1604	Lože pod potrubí ze štěrku tl.0 - 63 mm	m3	52,22	795,90	41 565,72		53,43	795,90	42 524,38	1,20	958,66	958,66	
	KT:10,95*0,1*1,1												
1605	Lože pod potrubí ze štěrku tl.0 do 63 mm	m3	12,21	795,90	9 716,75		12,78	795,90	10 170,41	0,57	453,66	453,66	
	PP:5,14*0,1*1,1												
1649	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	9,63	2 550,40	24 555,51		11,20	2 550,40	28 559,63	1,57	4 004,12	4 004,12	
	10,95*0,13*1,1												
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				75 837,98				81 254,42		5 416,44	5 416,44	0,00
	Komunikace												
1650	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recykát (prosilka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	33,00	483,50	15 955,50		50,70	483,50	24 513,45	17,70	8 557,95	8 557,95	
	Komunikace celkem :				15 955,50				24 513,45		8 557,95	8 557,95	0,00
	Trubní vedení												
1651	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	61,60	148,90	9 172,24		72,55	148,90	10 802,70	10,95	1 630,46	1 630,46	
1652	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	20	140,40	2 808,00		22,00	140,40	3 088,80	2,00	280,80	280,80	
SO 3.003/1076	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	0,00	24,40	0,00		5,14	24,40	125,42	5,14	125,42	125,42	
SO 3.003/1077	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	0	70,10	0,00		2,00	70,10	140,20	2,00	140,20	140,20	

Příloha č.2 ZL-045-S-Z-SO 3.004

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-045-S-Z-SO 3.004	
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zak. 137/2006)	MNP
SO 3.003/1082	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	0,00	339,20	0,00	5,62	339,20	1 906,30	5,62	1 906,30	1 906,30	
SO 3.003/126	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	0,00	298,70	0,00	2,00	298,70	597,40	2,00	597,40	597,40	
1654	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	61,60	98,80	6 086,08	77,69	98,80	7 675,77	16,09	1 589,69	1 589,69	
1616	Kamerové zkoušky potrubí	m	410	41,50	17 014,17	426,07	41,50	17 681,91	16,09	667,74	667,74	
1351	Montáž a dodávka plastové šachty DN400 vč.poklopu litinového -	kus	1	27 209,40	27 209,40	2,00	27 209,40	54 418,80	1,00	27 209,40	27 209,40	
1657	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	20,30	396,00	8 038,80	22,30	396,00	8 830,80	2,00	792,00	792,00	
	Trubní vedení celkem :				70 328,69			105 268,10		34 939,41	34 939,41	0,00
	ZL-045-S-Z-SO 3.004 CELKEM :				779 050,96			922 855,60		143 804,64	143 804,64	0,00



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 210/15/K
Datum: 25. 2. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jolík

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iniciační dopis č.: ID-045-S-Z-SO 3.004

Vyjádření projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při provádění odlehčovací stoky 04.1.0 na ulici 28. října byla v úseku Š 04.1.0-5 až Š 04.1.0-6, vedle domu č.14, zjištěna neznámá boční stoka/přípojka, která výškově koliduje s realizovanou odlehčovací stokou 04.1.0. Z potrubí je patrný přítok splaškových vod, boční stoka proto byla přerušena a dočasně podechylena do stoky 04.1.0. Ve finálním stavu však musí být zjištěná boční stoka napojena do stoky 04.2 (jednotná kanalizace).

Zhotovitel zajistil kamerový průzkum boční stoky a overil její délku a přibližný podélný sklon, včetně všech bočních přítoků. Z kamerového průzkumu je zřejmé, že boční stoka je ve velmi malém podélném sklonu (cca 3 ‰). Aby ji bylo možno přepojit gravitačně na stoku 04.2 bude nutné stoku v celé její délce (cca 12 m) vybourat a znovu vybudovat v upravené niveletě (cca 10 ‰), která umožní nadejít nad nově vybudovanou odlehčovací stoku 04.1.0. Při úpravě boční stoky bude pravděpodobně nutno provést přeložku stávající domovní plynovodní přípojky a stávajícího kabelu O₂ – obě vedení jsou totiž uložena v těsné blízkosti stávající boční stoky.

Projektant s navrženým řešením souhlasí. Vzniklou situaci nebylo možno předvidat, neboť podklady o prostorové poloze boční stoky nebyly v době zpracování zadávací dokumentace k dispozici. Bez úpravy podélního profilu zjištěné boční stoky ji nebude možno napojit do stoky 04.2.

Za projektanta:

Datum:

Ing. Vlastislav Kolečkář
AQUA PROCON s.r.o.
Podpis: 
DIČ CZ4096437

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel: +420 541 426 011
Fax: +420 541 426 012
E-mail: info@aquaprocon.cz

IC: 40964371
DIČ CZ40964371
KB Empo, venkovská 124301641 0100
Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, úřadová
Království soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 212/15/K
Datum: 25. 2. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Joki

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-045-S-Z-SO 3.004

Vyjádření generálního projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při provádění odlehčovací stoky 04.1.o na ulici 28. října byla v úseku Š 04.1.o-5 až Š 04.1.o-6, vedle domu č.14, zjištěna neznámá boční stoka/přípojka, která výškově koliduje s realizovanou odlehčovací stokou 04.1.o. Z potrubí je patrný přítok splaškových vod, boční stoka proto byla přerušena a dočasně podchycena do stoky 04.1.o. Ve finálním stavu však musí být zjištěná boční stoka napojena do stoky 04.2 (jednotná kanalizace).

Zhotovitel provedl sondáž boční stoky a ověřil její délku a podélný sklon (potvrzen předpoklad 3 ‰). Aby ji bylo možno přepojit gravitačně na stoku 04.2 bude nutné stoku v celé její délce (cca 12 m) vybourat a znovu vybudovat v upravené niveletě (10 ‰), která umožní nadejít nad nově vybudovanou odlehčovací stoku 04.1.o. Při úpravě boční stoky bude pravděpodobně nutno provést přeložku stávající domovní plynovodní přípojky a stávajícího kabelu O₂ – obě vedení jsou totiž uložena v těsné blízkosti stávající boční stoky.

Z pozice generálního projektanta s navrženým řešením souhlasíme. Vzniklou situaci nebylo možno předvídat, neboť podklady o prostorové poloze boční stoky nebyly v době zpracování zadávací dokumentace k dispozici. Bez úpravy podélného profilu zjištěné boční stoky ji nebude možno napojit do stoky 04.2.

Za generálního projektanta:

Datum:

Ing. Jan Polášek

Podpis:





AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno, ČR
DIČ: CZ46964371

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
KB Brno-venkov č. ú.: 24301641/0100
Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

Novosady

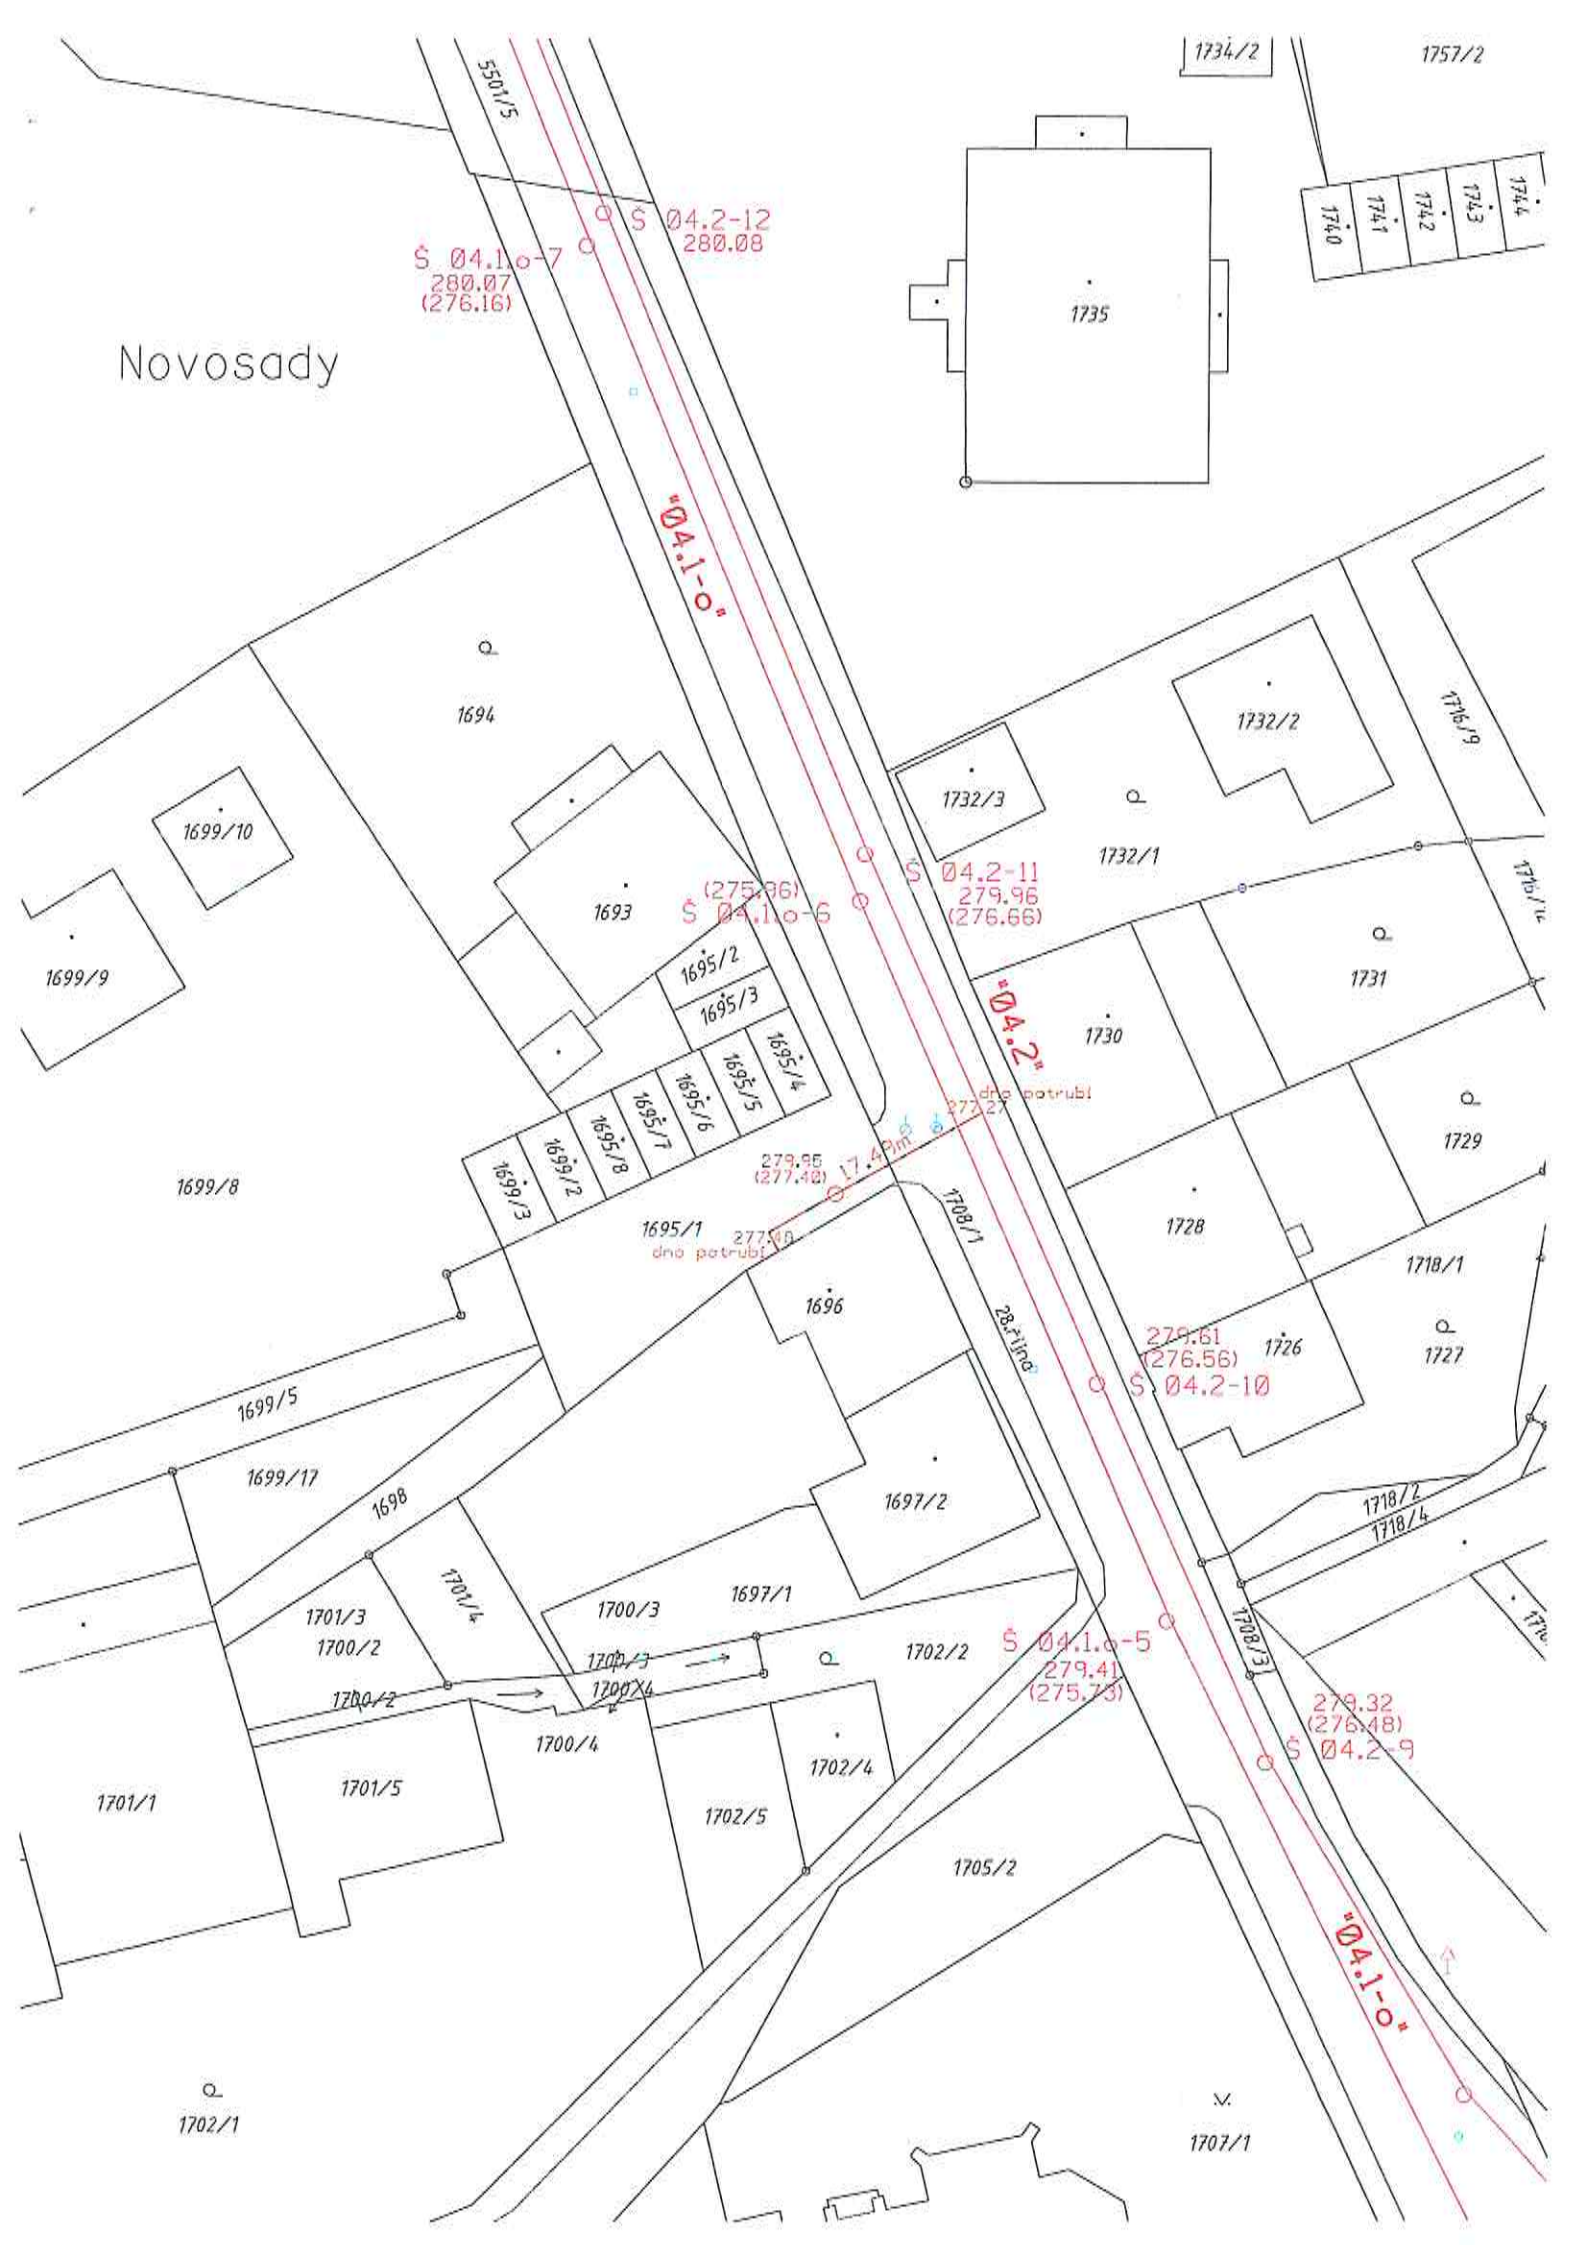

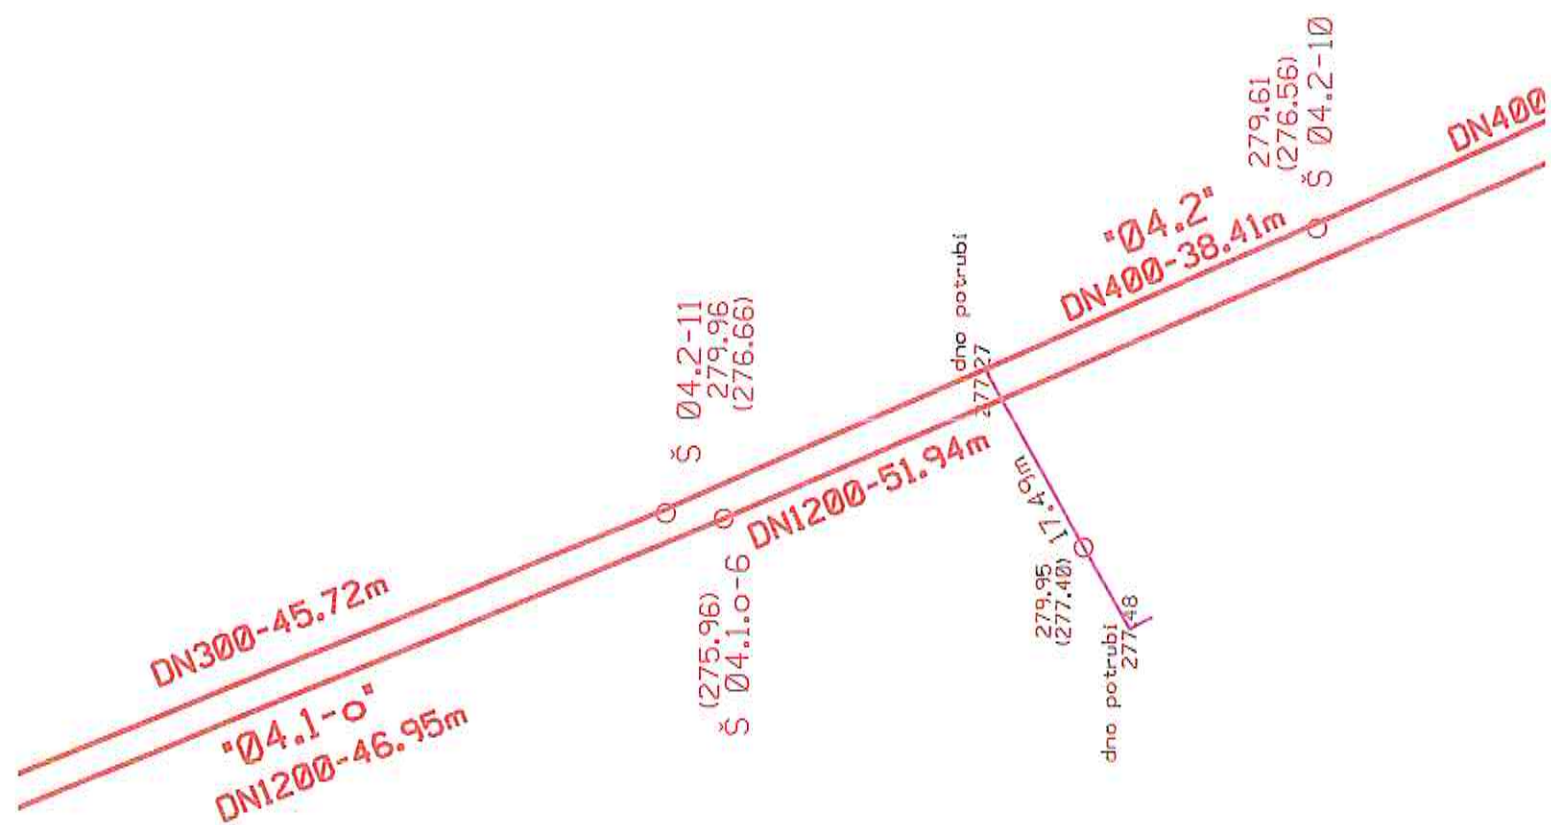

Datum

Denní záznamy stavby

18.9.2014

STOKA 06.1.0

- výkop jhy v úseku V06.1.0-5 až V06.1.0-6 v proužku
- pokládka potrubí DN 1200 - Set. podle CIR/NT - 25m
- obrys potrubí
- provedení provizurního napojení přířezů na ul. 28. října u č. p. 14., toto přířezka není uvedena v paspitu.
- opětovné závlahy v lúčném potrubí 200mm
- demontáž stávajícího potrubí + uložení a odvoz vlny na skládku
- přesetování vln. kanalizace
- odvoz přebytečné zeminy na skládku

STOKA 06.1.1

- výkop jhy v úseku V06.1.1-3 až V06.1.1-4 v proužku
- obrys potrubí 1000
- křm. plně zakladací vrst. tloušťka 082-64mm (zouh)
- provedení základnicových CIR/NT tl. 100mm
- pokládka potrubí DN 1000/1000 žs - 761
- odvoz přebytečné zeminy na skládku

STOKA 06.5.1

- výkop jhy v úseku V06.5.1-4 až V06.5.1-5 v proužku
- pokládka potrubí DN 700 TP-120 + obrys potrubí
- opětovné závlahy v lúčném potrubí
- odvoz přebytečné zeminy na skládku

STOKA 06.5.6

- výkop jhy v úseku V06.5.6-1 až V06.5.6-2
- provedení lůžky 009/1006 a 009/1017
- výkop jhy pro lůžky vody DN 160 TE a DN 80 LT
- pokládka potrubí TE DN 160 a DN 80 LT
- obrys potrubí + uložení páska
- opětovné závlahy v lúčném potrubí 200mm
- uložení provizurního obřadu lůžky uložení ul. 28. října

Holek

18.9.2014

Kýma zhotovitele

- výzvěme správce stavy ke kontrole
- výzvěme výkopu monolitické stavitelky V 0.2.3-1
- základová vrst. a uložení potrubí 0.2.3. úsek V02.3-3 až V02.3-4.

19.9.14

Sp. St. ložnice na vlně



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Šumperk, čp. 2769, Jilová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

☎ 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603-841/0100

AQUA Procon s.r.o.
Ing. Kolečkář V.
Palackého tř. 12,
612 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

e-mail

Vyřizuje/
Heitmar Petr

Šumperk
14.4.2015

0386 - 50000/2015

heitmar@spvs.cz

Věc: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“

Týká se: „Horní Pomoraví II sever, Město Zábřeh „

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk jako provozovatel obdržela dne 10.4. 2015 od zhotovitele stavby fa: IMOS BRNO,a.s. žádost o vyjádření k předloženému stanovisku (Iniciační dopis ID-045-S-Z-SO 3.004 - Kolize stoky 04.1.o s přípojkou na ul. 28.října ,č.pop. 14).

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk k předloženému návrhu konstatuje následující:

- Souhlasíme s navrženým řešením pro přepojení přípojky gravitačně na stoku 04.2 ve spádu 1,2% na ul. 28.října v Zábřeze.

S pozdravem

Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jilová 6, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911

Ing. Pavel Paloncý
technický ředitel

Provozovatel potvrzuje správnost podkladů.
v Šumperku dne 17.6.2015

Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jilová 5, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911

