




OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	14. 05. 2015
Ev.č.	ZL-053-S-Z-SO 3.005	Datum schválení	18. 05. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx) Oprava položek dle skutečnosti		
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh / SO 3.005/stoka 05.1/ šachta Š05.1-18		
<u>Specifikace změny:</u> Při realizaci stavební jámy na stoce 05.1 pro revizní šachtu Š 05.1-18 byla v prostoru budoucí revizní šachty Š 05.1-18 zastížena stávající kanalizační stoka DN 500 v jiné trase než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Stoka není umístěna v ose nově budované stoky 05.1, nýbrž zasahuje do stěny monolitické šachty Š05.1-18. Stranové posunutí šachty není možné s ohledem na vedení STL plynovodu, které svým umístěním brání event. posunu nově budované monolitické revizní šachty. Proto je nutné vybudovat novou revizní šachtu za ukončením stoky 05.1 ulici Komenského cca 5-7 m za revizní šachtou Š05.1-18 s provedením odklonění trasy kanalizace směrem do středu revizní šachty Š05.1-18. V místě nové revizní šachty provést přeložku vodovodu DN80.			
<u>Předmětem změnového listu je:</u> - Vybudování nové revizní šachty			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	45.789,80Kč		
Stanovisko správce stavby: <i>Při realizaci stoky 05.1 vznikl problém s umístěním stoky DN 500. Navrženo je její umístění pod novou šachtou, což však by vedlo k jejímu poškození. Sledová stoka souhlasí s provedením nové TS a přeložkou DN 80 a doplněním této změny rozhodl schválit.</i>			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis + situace 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Fotodokumentace 5) Stavební deník 6) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.		



Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **) SPRAVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Čáslavského tř. 12, 612 00 Brno  Ing. Martin Staněk – zástupce vedoucího týmu	 Ing. Jan Polášek – hlavní inženýr projektu
Datum: 14. 05. 2015	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 IMOS Brno, a.s. Olešnická 174, 627 00 Brno Brno - VHS a DS  Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **)  Ing. Petr Suchomel - manažer projektu 18. 05. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nahodící se škrtno



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Aquaprocon

Ing. Vlastislav Kolečkář

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Holotík Vladimír	holotikv@imosbrno.eu / 602 713 982	29.10.2014

Iniciační dopis č. ID-053-S-Z-SO 3.005 - Kolize monolitické šachty Š 05.1-18 s plynovodem NTL

Aktuální stav:

Při realizaci stavební jámy na stoce 05.1 pro revizní šachtu Š 05.1-18 byla v prostoru budoucí revizní šachty Š 05.1-18 zastižena stávající kanalizační stoka DN 500 v jiné trase než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Stoka není umístěna v ose nově budované stoky 05.1, nýbrž zasahuje do stěny monolitické šachty Š05.1-18. Stranové posunutí šachty není možné s ohledem na vedení STL plynovodu, které svým umístěním brání event. posunu nově budované monolitické revizní šachty.

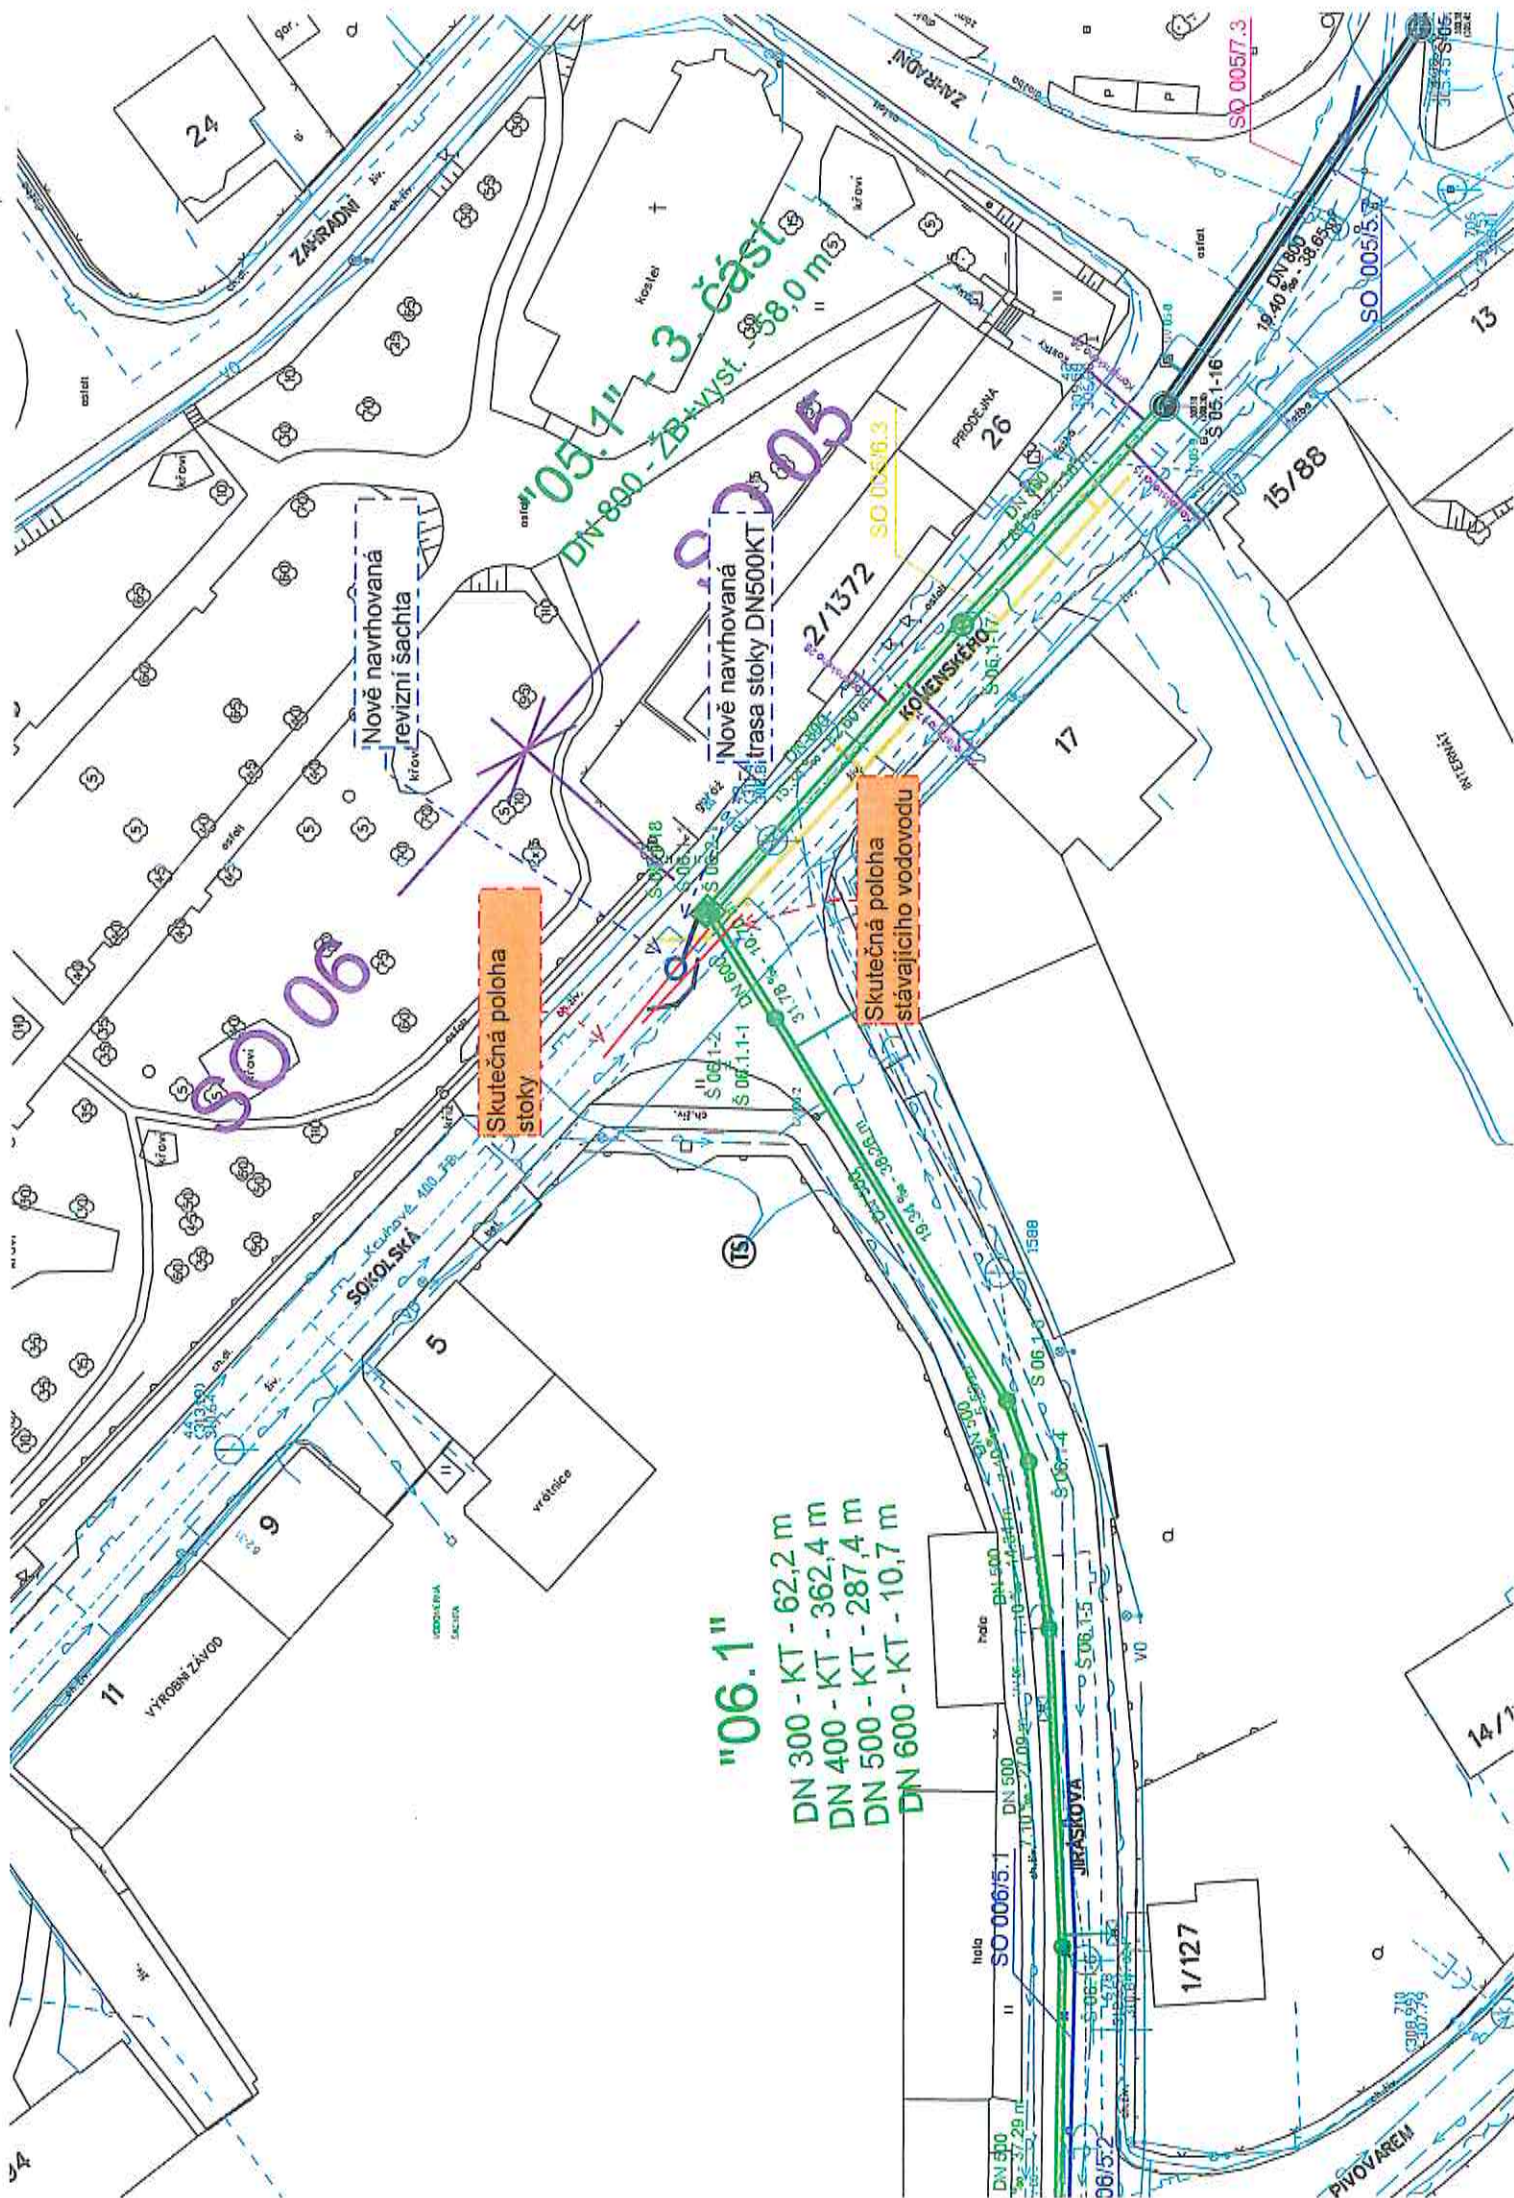
Návrh řešení:

Vybudovat novou revizní šachtu za ukončením stoky 05.1 ulici Komenského cca 5-7 m za revizní šachtou Š05.1-18 s provedením odklonění trasy kanalizace směrem do středu revizní šachty Š05.1-18. V místě nové revizní šachty provést přeložku vodovodu DN80.

Žádáme zodpovědného projektanta o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Ing. Holotík Vladimír
Dne 29. 10. 2014



Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-053-S-Z-SO 3.005

3. Město Zábřeh / STOKA 05.1

Kolize monolitické šachty Š 05.1-18 s plynovodem NTL

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-053-S-Z-SO 3.005		
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP	
SO 3.005 - LOKALITA UL. KOMENSKÉHO													
STOKA 05.1 - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
2	Dočasné zajištění potrubí	m	63,00	204,10	12 858,30	71,00	214,80	15 250,80	8,00	2 392,50	2 392,50	0,00	
	<i>zajištění vodovodního potrubí DN 80</i>												
	Zemní práce celkem :				12 858,30			15 250,80		2 392,50	2 392,50	0,00	
Trubní vedení													
SO2.005/51	Šachta z betonových dílců pro DN 500 a DN 600 výška vstupu 3,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0	43 397,30	0,00	1,00	43 397,30	43 397,30	1,00	43 397,30	43 397,30	0,00	
	Trubní vedení celkem :				0,00			43 397,30		43 397,30	43 397,30	0,00	
					12 858,30			58 648,10			45 789,80	0,00	
ZL-053-S-Z-SO 3.005 CELKEM :													



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 93-8/15/K
Datum: 25. 2. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jolík

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iniciační dopis č.: ID-053-S-Z-SO 3.005

Vyjádření projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stavební jámy pro revizní šachtu Š 05.1-18 bylo v prostoru budoucí revizní šachty Š 05.1-18 zastiženo vedení STL plynovodu, které svým umístěním brání výstavbě revizní šachty. Prostor pro realizaci revizní šachty je od okraje stávajícího potrubí DN 500 ŽB po okraj vedení STL plynovodu je cca 30 cm.

Zhotovitel navrhuje vybudovat novou revizní šachtu za ukončením stoky 05.1 ulici Komenského cca 5-7 m za revizní šachtou Š05.1-18 s provedením odklonění trasy kanalizace směrem do středu revizní šachty Š05.1-18. V místě nové revizní šachty provést přeložku vodovodu DN 80.


Projektant s návrhem zhotovitele souhlasí, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. Odlišný průběh stávající kanalizace i stávajícího plynovodu od jejich předpokládané polohy se nedal dopředu předjímat. Bez úpravy, kterou navrhuje zhotovitel není možné stoku 05.1 dokončit.

Za projektanta:

Datum:

Ing. Vlastislav Kolečkář

Podpis:





IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 93-9/15/K
Datum: 25. 2. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-053-S-Z-SO 3.005

Vyjádření generálního projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stavební jámy pro revizní šachtu Š 05.1-18 bylo v prostoru budoucí revizní šachty Š 05.1-18 zastiženo vedení STL plynovodu, které svým umístěním brání výstavbě revizní šachty. Prostor pro realizaci revizní šachty je od okraje stávajícího potrubí DN 500 ŽB po okraj vedení STL plynovodu je cca 30 cm.

Zhotovitel navrhuje vybudovat novou revizní šachtu za ukončením stoky 05.1 ulicí Komenského cca 5-7 m za revizní šachtou Š05.1-18 s provedením odklonění trasy kanalizace směrem do středu revizní šachty Š05.1-18. V místě nové revizní šachty provést přeložku vodovodu DN 80.

Z pozice generálního projektanta s návrhem zhotovitele souhlasíme. Odlišný průběh stávající kanalizace i stávajícího plynovodu od jejich předpokládané polohy se nedal dopředu předjímat. Bez úpravy, kterou navrhuje zhotovitel není možné stoku 05.1 dokončit.

Za generálního projektanta:

Ing. Jan Polášek

Datum:

Podpis: v.z. *Kolečkář*





Plynovod NTL

Vzdálenost potrubí
NTL od stávající
kanalizace cca. 30
cm

Stávající kanaliza-
ce nutno napojit do
revizní šachty Š 05.1-
18

Půdorys budoucí
revizní šachty
Š05.1-18

Datum

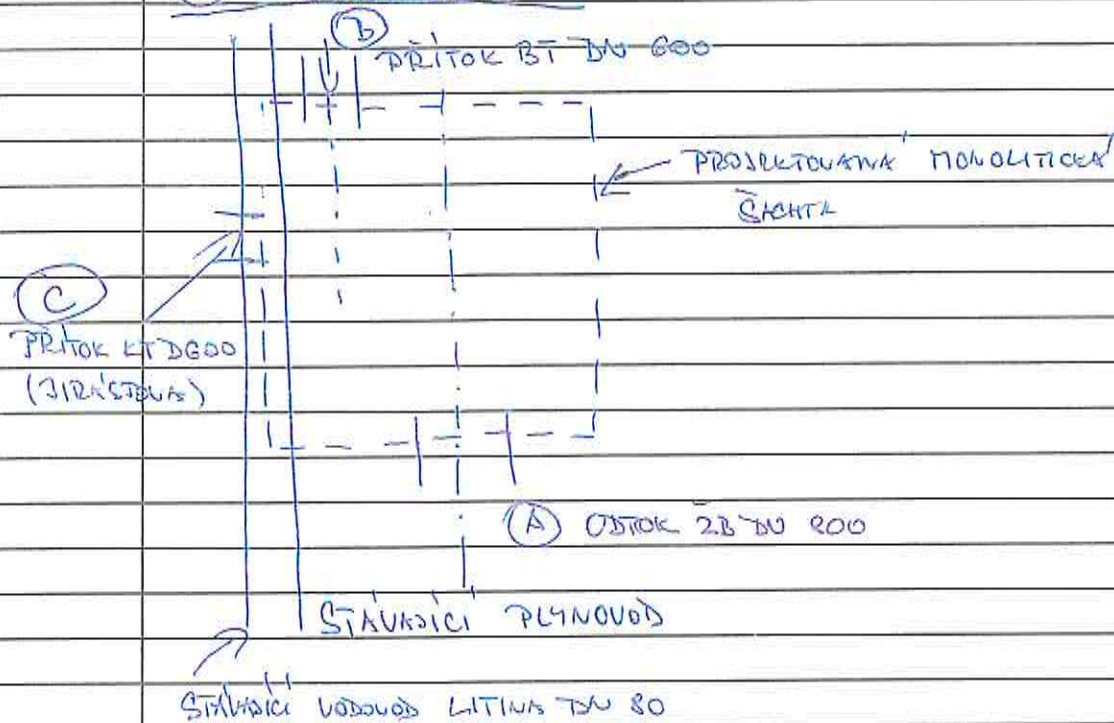
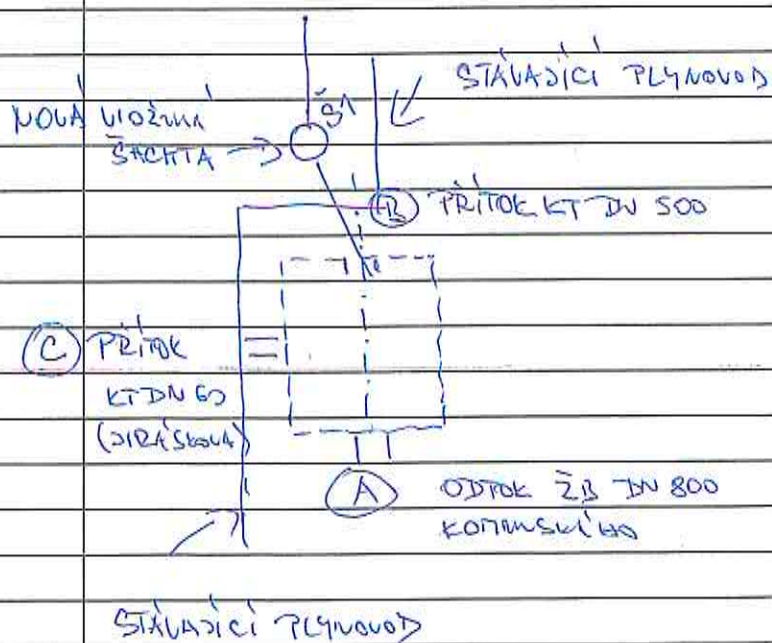
Denní záznamy stavby

SACHTA OT. 1-12

DLEŠNÍHO DLE PROBLÉMU SEDNÁM

SE SP. ST A PROJEKTOVATEM NG. KOLČEKEM

A BYLO DOHODNUTO:

(1) STÁVAJÍCÍ STAV:(2) NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD

Datum

Denní záznamy stavby

PŘI VÝKOTOVÝCH BYLA KOLIZE BUDOUCÍ MONOLITICKÉ ŠACHTY
SE STÁVNÍM PLYNOVODNÍM A STÁVNÍM VODOVODNÍM
ŘÁDEM (OBR.1)

PROJEKTOVÝ ÚSEK NOVÉ ŘEŠENÍ

CCA 8-9 m OD PŮVODNÍHO ZAČETÍ KANALIZACE
BÍ. DN 500 Z ULICE SOKOLSKÉ SE VYBUDUJE
REKONSTRUKČNÍ ŠACHTA A TAD ÚHEM 195° A SE ZAČETÍ
DO MONOLITICKÉ ŠACHTY V TĚ VODNÍM (PROJEKTOVÁNÝM)
MÍSTĚ. (OBR.2).

V MÍSTĚ NOVÉ REKONSTRUKČNÍ ŠACHTY (PRŮŘ.) SE PROVEDE
PŘELOŽKA VODY.

STOKA 2.2.-2

- VÝKOP PÁŽEVNÍ ŘÍMY V ÚSEKU Ě-3 - S4
- POKLÁDKA ŽB DN 800 + OBETONOVÁNÍ
- OBŠYP + ZÁŠYP + HUTNĚNÍ

STOKA 04.1.0

- VÝKOP PÁŽEVNÍ ŘÍMY V ÚSEKU Ě10 - S9
- POKLÁDKA TOTOŽNÍ ŽB DN 1200 DO BET. SÍDLY
- OBŠYP + ZÁŠYP + HUTNĚNÍ

STOKA 04.1.

- VÝKOP PÁŽEVNÍ ŘÍMY V ÚSEKU S6 - S7
- POKLÁDKA ŽB DN 500/350 DO BETONOVÉHO SÍDLY
- OBŠYP + ZÁŠYP + HUTNĚNÍ

STOKA 04.1+2

- VÝKOP PÁŽEVNÍ ŘÍMY V ÚSEKU S3 - S4
- POKLÁDKA KT DN 300 DO BET. SÍDLY
- OBŠYP + ZÁŠYP + HUTNĚNÍ

STOKA 9.6

- VÝKOP PÁŽEVNÍ ŘÍMY V ÚSEKU S1 - S2
- POKLÁDKA PP DN 300 DO PÍSKOVINOVÉHO LOKU
- OBŠYP + ZÁŠYP + HUTNĚNÍ

UŽIVA: UŽÍVATEL SP ST KE KONTROLĚ ZÁKLADOVÝCH SPRÁV,
POKLÁDKA TRUB, ZÁŠYPŮ I OBŠYPŮ NA REALIZOVANÝCH
STOKÁCH.

SP ST BUDUJE VÝKOP KONTROLNÍHO VÝKOPU.



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

☎ 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603-841/0100

AQUA Procon s.r.o.
Ing. Kolečkář V.
Palackého tř. 12,
612 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

e-mail

Vyřizuje/
Heitmar Petr

Šumperk
14.4.2015

0384-50000/2015

heitmar@spvs.cz

Věc: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“

Týká se: „Horní Pomoraví II sever, Město Zábřeh „

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk jako provozovatel obdržela od zhotovitele stavby fa: IMOS BRNO, a.s. žádost o vyjádření k předloženému stanovisku (Iniciační dopis ID-053-S-Z-SO 3.005 – Kolize monolitické šachty Š 05.1-18 s plynovodem NTL).

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk k předloženému návrhu konstatuje následující:

- Souhlasíme s navrženým řešením.

S pozdravem

Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911
-6-

Ing. Pavel Paloncý
technický ředitel
