



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.	Datum předložení	12. 10. 2015
Ev.č.	ZL-149-S-Š-SO 2.002	Datum schválení

16. 10. 2015

Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jilová 6, 787 01 Šumperk
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Změnový list předkládá:	zhotovitel
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx) Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	2. Město Šumperk / SO 2.002 LOKALITA 2 - SÍDLIŠTĚ TEMENICE

Specifikace změny:

Při odkopání a zahájení bourání původní šachty byla v místě napojení trub DN 1600 na šachtu nalezena konstrukce z monolitického betonu, kterou bylo nutné vybourat, současně zde byly zabetonovány ocelové pažnice, pravděpodobně ponechané z doby původní výstavby kanalizace. Celkem se jednalo o vybourání 20 m³ betonu a odřezání 4 kusů ocelových pažnic.

Po vybourání původní šachty byla postavena šachta nová podle ZD, avšak vzhledem k výše uvedenému nutnému vybourání betonů, navazujících na šachtu, bylo nutné provést propojení mezi potrubím stoky a vlastní šachtou v délce 1 m na odtoku a 2,5 m na přítoku – jedná se o bednění potrubí a provedení železobetonu o celkovém objemu 10 m³.

Předmětem změnového listu je:
- Bourání betonu, úprava napojení na šachtu

Finanční dopad změny:	Navýšení
Změna ceny po schválení:	189 517,46 Kč

Stanovisko správce stavby:
NA ZÁKLADĚ UVEDENÝCH PODKLADŮ SPŠT SOUHLASÍ S PŘEDLOŽENÝM ZL.
PŘIČEMŽ SE JEDNÁ O OKOLNOST, KTEROU ZADAVATEL JEDNALÍ S NÁLEZEM PŘÍ-
NĚLOU PŘEDVÍDAT, SPŠT. DOPORUČÍME OBJEDNATELI ZMĚNU SCHVÁLIT.

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3

Vyjádření objednatele:

Přílohy č.:	1) Iniciační dopis + situace 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Fotodokumentace 5) Stavební deník 6) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
-------------	---



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **) SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu Datum: 12. 10. 2015	AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ46964971 Ing. Jan Polášek - hlavní inženýr projektu Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
IMOS Brno, a.s. Olešnická 174, 627 00 Brno závod Brno - VHS a DS Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **) Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilová 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel.: 583 317 111 fax: 583 214 845 Jiří Vykydal - manažer projektu 16. 10. 2015

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

***) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

VRV - API

Horní Pomoraví II - sever

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
František Rauscher	rauscherf@imosbrno.eu / 733623829	10.9.2015

ID-149-S-Š-SO 2.002 - lokalita sídliště Temenice - stoka Temenická 3-monol.šachta 1040

Aktuální stav:

Při demontáži stávající šachty 1040 na stoce Temenická 3 bylo po odkopání zjištěno, že kolem šachty a v místech napojení trub DN 1600 byla konstrukce z monolitického betonu, ve kterém byly navíc zabetonovány ocelové pažnice.

Návrh řešení:

Zhotovitel navrhuje vybourat všechn beton, odstranit ocelové pažnice tak, aby bylo možné postavit novou monolitickou šachtu 1040 vč. propojení trub DN 1600 na přítoku a odtoku.


Žádáme projektanta o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

František Rauscher



Tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 259, 532 173 259, imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu
bankovní spojení: KB Brno venkov, č.ú.: 63706-641/0100
IČ: 25 32 22 57, DIČ: CZ25322257, OR u KS Brno, oddíl B, vložka 2211

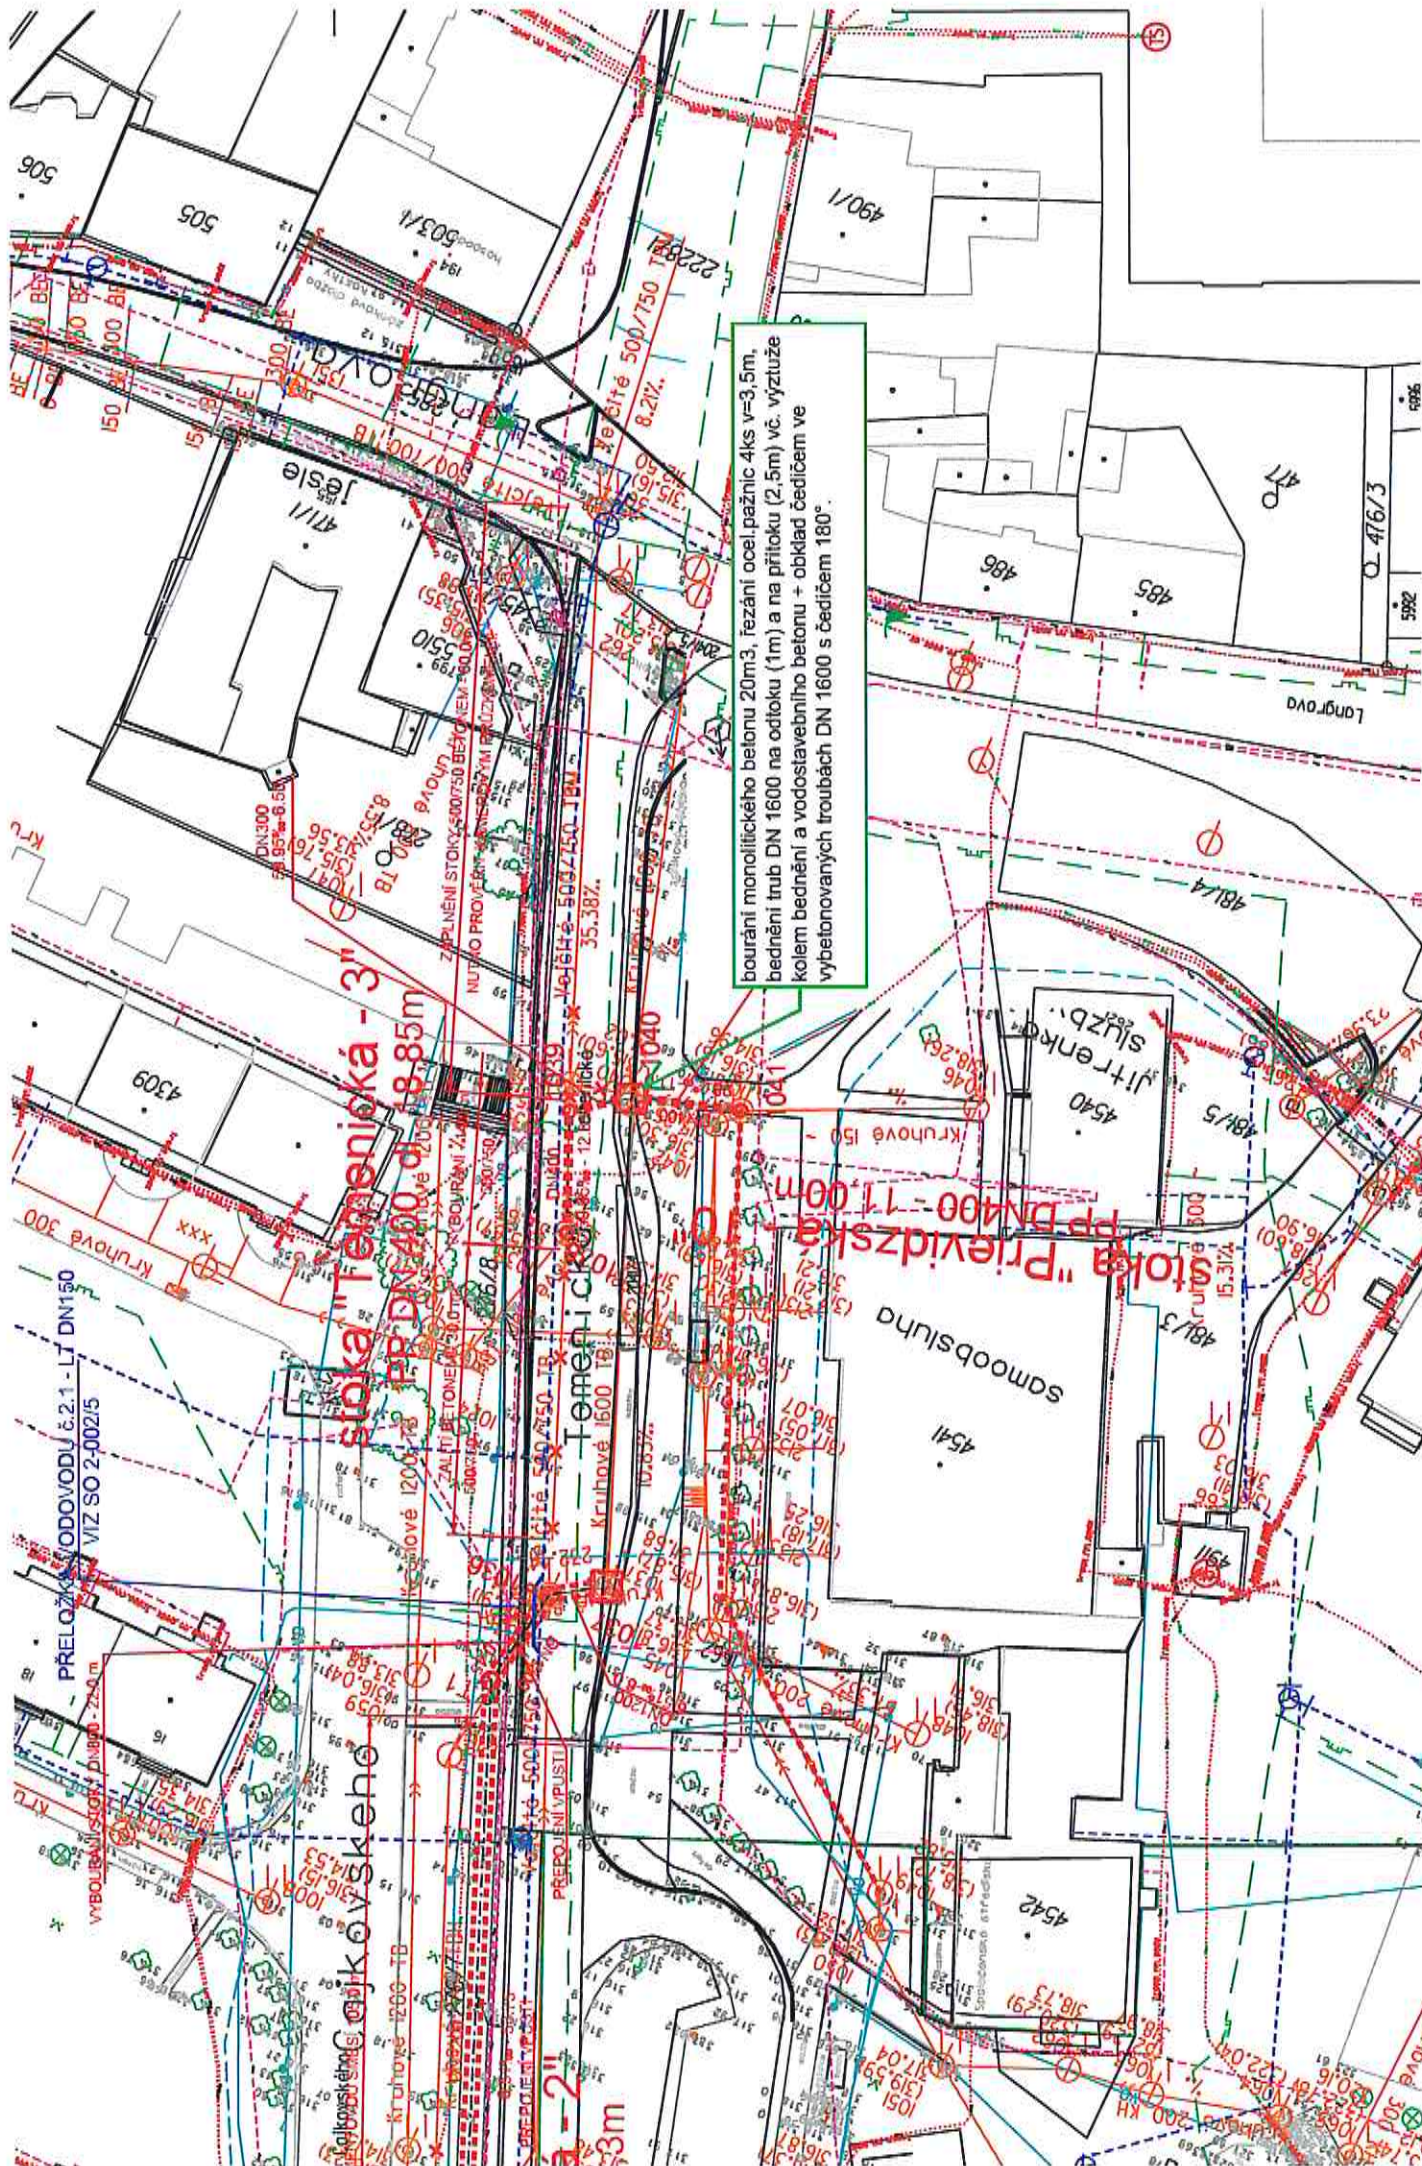

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-149-S-Š-SO 2.002

3. Město Šumperk / SO 2.002

Temenická 3 - úprava monol. šachty vč. propojů ŽB DN 1600

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-149-S-Š-SO 2.002		
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP	
SO 2.002 LOKALITA 2 - SÍDLISTÉ TEMENICE													
TEMENICKÁ 3 - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
255	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	8 129,80	8 129,80	1,20	8 129,80	9 755,76	0,20	1 625,96	1 625,96	0,00	
259	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	10,87	1 098,30	11 937,75	30,87	1 098,30	33 903,75	20,00	21 966,00	21 966,00	0,00	
260	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	210,26	221,80	46 635,96	264,91	221,80	58 757,68	54,65	12 121,72	12 121,72	0,00	
262	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8m	m2	100,94	209,00	21 096,46	128,37	209,00	26 830,17	27,43	5 733,71	5 733,71	0,00	
264	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	100,94	68,50	6 914,39	128,37	68,50	8 793,62	27,43	1 879,23	1 879,23	0,00	
265	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	115,64	38,70	4 475,41	145,70	38,70	5 638,67	30,06	1 163,26	1 163,26	0,00	
266	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	10,87	42,00	456,51	30,87	42,00	1 296,51	20,00	840,00	840,00	0,00	
267	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	168,64	104,40	17 605,65	195,28	104,40	20 387,50	26,65	2 781,85	2 781,85	0,00	
268	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení	m3	10,87	104,30	1 133,67	30,87	104,30	3 219,67	20,00	2 086,00	2 086,00	0,00	
269	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	155,28	88,80	13 789,11	198,94	88,80	17 686,26	43,66	3 877,15	3 877,15	0,00	
271	Poplatek za skládku suti	t	23,91	323,60	7 738,09	67,91	323,60	21 976,49	44,00	14 238,40	14 238,40	0,00	
272	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	168,64	112,60	18 988,47	195,28	112,60	21 988,82	26,65	3 000,35	3 000,35	0,00	
273	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	95,92	520,80	49 957,53	113,32	520,80	59 016,33	17,39	9 058,80	9 058,80	0,00	
Zemní práce celkem :					208 858,80			289 231,23		80 372,43	80 372,43	0,00	
Přípravné a přidružené práce													

275	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těžení včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	25,39	112,80	2 863,43	32,08	112,80	3 618,62	6,70	755,19	755,19	0,00
276	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	42,74	45,20	1 931,62	49,43	45,20	2 234,24	6,70	302,62	302,62	0,00
277	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	25,39	50,10	1 271,79	32,08	50,10	1 607,21	6,70	335,42	335,42	0,00
278	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	42,74	75,80	3 239,31	49,43	75,80	3 746,79	6,70	507,48	507,48	0,00
279	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	42,74	22,00	940,17	49,43	22,00	1 087,46	6,70	147,29	147,29	0,00
280	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	42,74	86,90	3 713,67	49,43	86,90	4 295,47	6,70	581,80	581,80	0,00
281	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	42,97	62,10	2 688,68	50,35	62,10	3 126,44	7,37	457,76	457,76	0,00
282	Poplatek za skládku sivební sutí	t	42,97	78,60	3 377,76	50,35	78,60	3 957,13	7,37	579,37	579,37	0,00
Přípravné a příružené práce celkem :					20 006,43			23 673,36		3 666,93	3 666,93	0,00
Základy a zvláštní zakládání												
RTS 2015/II/231942212	Řezání příčné zaberaných štětovic vč.likvidace	kus	0,00	569,00	0,00	4,00	569,00	2 276,00	4,00	2 276,00	2 276,00	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					0,00			2 276,00		2 276,00	2 276,00	0,00
Komunikace												
281	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutný štěr. tl.35 cm + asfaltový recykliát (prosvika) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	42,74	511,60	21 863,23	49,43	511,60	25 288,39	6,70	3 425,16	3 425,16	0,00
Komunikace celkem :					21 863,23			25 288,39		3 425,16	3 425,16	0,00
Trubní vedení												
SO 1.008/29	Kompletní koe ŽB z C30/37 XC3 vč. bednění, výztuže, prostupů a zajištění vodotěsnosti spár a prostupů	m3	0,00	8 117,10	0,00	2,90	8 117,10	23 539,59	2,90	23 539,59	23 539,59	0,00
	Propojení slávajícího potrubí DN1600 do šachty - dl.1,0 m (bednění, výztuž, beton)	kus										
SO 1.008/29	Kompletní koe ŽB z C30/37 XC3 vč. bednění, výztuže, prostupů a zajištění vodotěsnosti spár a prostupů	m3	0,00	8 117,10	0,00	7,25	8 117,10	58 848,98	7,25	58 848,98	58 848,98	0,00
	Propojení slávajícího potrubí DN1600 do šachty - dl.2,5 m (bednění, výztuž, beton)	kus										
Trubní vedení celkem :					0,00			82 388,57		82 388,57	82 388,57	0,00
TEMENICKÁ 3 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a příružené práce												
305	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	9,09	45,20	410,87	9,54	45,20	431,21	0,45	20,34	20,34	0,00
306	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	18,36	75,80	1 391,69	19,26	75,80	1 459,91	0,90	68,22	68,22	0,00
307	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	31,00	22,00	682,00	32,50	22,00	715,00	1,50	33,00	33,00	0,00
308	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	157,27	86,90	13 666,33	170,57	86,90	14 822,53	13,31	1 156,20	1 156,20	0,00
309	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	32,69	62,10	2 030,27	35,01	62,10	2 174,22	2,32	143,95	143,95	0,00

Příloha č.2 k ZL-149-S-Š-SO 2.002

310	Poplatek za skládku stavební sutí	t	32,69	78,60	2 569,71	35,01	78,60	2 751,91	2,32	182,20	182,20	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :												
					20 750,87			22 354,78		1 603,91	1 603,91	0,00
Komunikace												
311	Podklad ze šlérkopisků po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	51,83	128,20	6 643,97	56,97	128,20	7 559,95	7,15	915,98	915,98	0,00
312	Šléřk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	61,10	370,90	22 660,14	68,69	370,90	25 477,12	7,60	2 816,98	2 816,98	0,00
313	Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	73,34	287,50	21 083,81	81,93	287,50	23 554,88	8,60	2 471,07	2 471,07	0,00
314	Postřik živičný infiltr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	73,34	25,40	1 862,71	81,93	25,40	2 081,02	8,60	218,31	218,31	0,00
315	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	200,00	14,20	2 840,00	220,00	14,20	3 124,00	20,00	284,00	284,00	0,00
316	Beton asfaltový ABJ modifik. tl.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	200,00	299,70	59 940,00	220,00	299,70	65 934,00	20,00	5 994,00	5 994,00	0,00
Komunikace celkem :					115 030,63			127 730,97		12 700,34	12 700,34	0,00
TEMENICKÁ 3 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
318	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	9,12	112,80	1 028,17	9,42	112,80	1 062,58	0,31	34,41	34,41	0,00
319	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.dřené tl.20 cm	m2	9,12	50,10	456,66	9,72	50,10	486,97	0,61	30,31	30,31	0,00
320	Vytřnění silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	10,00	44,00	440,00	12,00	44,00	528,00	2,00	88,00	88,00	0,00
322	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vž.uložení	t	3,59	62,10	223,06	2,28	62,10	141,85	-1,31	0,00	0,00	-81,21
323	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,59	78,60	282,33	2,28	78,60	179,54	-1,31	0,00	0,00	-102,79
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 430,22			2 398,94		152,72	152,72	-184,00
Komunikace												
324	Podklad ze šléřkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	45,00	128,20	5 769,00	52,00	128,20	6 686,40	7,00	897,40	897,40	0,00
325	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dně tl. 3 cm	m2	45,00	222,70	10 021,50	52,00	222,70	11 580,40	7,00	1 558,90	1 558,90	0,00
Komunikace celkem :					15 790,50			18 246,80		2 456,30	2 456,30	0,00
Ostatní konstrukce, bourání												
327	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	10,00	243,50	2 435,00	12,00	243,50	2 922,00	2,00	487,00	487,00	0,00
328	Očištění výbour. obrubníků všech loží a výplní	m	23,00	22,00	506,00	25,00	22,00	550,00	2,00	44,00	44,00	0,00
329	Očištění výbour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	45,00	18,30	823,50	52,00	18,30	951,60	7,00	128,10	128,10	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					3 764,50			4 423,60		659,10	659,10	0,00
ZL-149-S-Š-SO 2.002 CELKEM :												
					408 495,18			598 012,64		189 517,46	189 701,46	-184,00

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze**Iniciační dopis č.: ID-149-S-Š-SO 2.002****Vyjádření projektanta**

Při provádění rekonstrukce šachty 1040 na stoce Temenická-3 bylo po odkopání nalezena v místě napojení trub DN 1600 na šachtu konstrukce z monolitického betonu, kterou bylo nutné vybourat, současně zde byly zabetonovány ocelové pažnice, pravděpodobně ponechané z doby původní výstavby kanalizace. Celkem se jednalo o vybourání 20 m³ betonu a odřezání 4 kusů ocelových pažnic.

Po vybourání původní šachty byla postavena šachta nová podle ZD, avšak vzhledem k výše uvedenému nutnému vybourání betonů, navazujících na šachtu, bylo nutné provést propojení mezi potrubím stoky a vlastní šachtou v délce 1 m na odtoku a 2,5 m na přítoku – jedná se o bednění potrubí a provedení železobetonu o celkovém objemu 10 m³.

Projektant s uvedeným řešením souhlasí.

Za projektanta:

Ing. Milan Jokl

Datum: 10. 9. 2015

Podpis:



Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze**Změnový list č.: ZL-149-S-Š-SO 2.002****Vyjádření generálního projektanta**

Projektová dokumentace „Město Šumperk – rekonstrukce a doplnění kanalizace“ byla vypracována ve všech stupních (DUR, DSP, ZD) s využitím podkladů správce inženýrských sítí. Pro uvedené stupně byly podklady o těchto sítích aktualizovány a na jejich podkladě byly navrženy trasy projektované kanalizace. Nová, resp. rekonstruovaná kanalizace v ulici Temnické byla navržena s využitím dostupných podkladů a podle průzkumu vybraných stávajících objektů. Takto byla navržena i rekonstrukce šachty 1040 pro umožnění napojení nových úseků stok.

Při odkopání a zahájení bourání původní šachty byla v místě napojení trub DN 1600 na šachtu nalezena konstrukce z monolitického betonu, kterou bylo nutné vybourat, současně zde byly zabetonovány ocelové pažnice, pravděpodobně ponechané z doby původní výstavby kanalizace. Celkem se jednalo o vybourání 20 m³ betonu a odřezání 4 kusů ocelových pažnic.

Po vybourání původní šachty byla postavena šachta nová podle ZD, avšak vzhledem k výše uvedenému nutnému vybourání betonů, navazujících na šachtu, bylo nutné provést propojení mezi potrubím stoky a vlastní šachtou v délce 1 m na odtoku a 2,5 m na přítoku – jedná se o bednění potrubí a provedení železobetonu o celkovém objemu 10 m³.


Z pozice generálního projektanta s uvedeným řešením souhlasíme. Jedná se o stav, který nebylo možné předvídat, poněvadž před odkopáním šachty nemohl nikdo předvídat existenci monolitických betonů pod terénem.

Za generálního projektanta:

Datum: 10. 9. 2015

Ing. Jan Polášek

Podpis:



Temenická 3_Š 1040











Datum	Denní záznamy stavby
7. 10. 15 VCP	Útoka Javnicka 3: Spístka lviše pohládneho potrubí PP DN 300 s lvišnou vodorovnou v lvišnou mase: 57 - 58 v lviši vodorovná. Vodorovná DN 80 je 29 cm nad niveletou dna projektovaného potrubí PP DN 300. Nutná přeložka.
15. 10. 15 VCP	Útoka Pernická 1: V lvišnou sáček 1270 - 1272 byla spístka střípní kanalizace ŽB DN 400. Byla provedena povíšením slakovou rotnou, kamery selama a odakoušením na neličnou s obliče sáček. Poté potrubí nilede neličnou. Spístka, se potrubí neličnou a bude sápní lední cementopřílbovou snápní.
16. 10. 15 HP	Pernická 2 a 3: Byla odakoušena snápní se sápníci SPVS na sáčkách 1040 a 1034, v lvišnou lvišnou přechodu střípní dnu, lvišnou spístkou a spápní.
20. 10. 15 VCP	Pernická 3: Pro vyloupení v lvišnou a jazy v S 1040 byla spístka ve vyloupení střípní se. Spápní DN 100, lvišnou sápníci paku. Byla snápní je potrubí odakoušeno a vyloupeno. Dále ve vyloupení spístkou v lvišnou střípní betonu a byla snápní jej střípní snápní. K ní došlo k provedení potrubí DN 1600 a je snápní sápníci neličnou neličnou. Sáčkem S 1040 dle RPD a lvišnou se snápní sápní se dle 16. 10. 15 k lvišnou sáčkem.
3. 11. 15 VCP	Útoka Pernická: Provedení neličnou střípní snápní kanalizace, kde byl spístkou neličnou před dnu neličnou pípípní neličnou je PD. Dále je snápní pípípní dle neličnou snápní střípní se obliče a neličnou před pípípní neličnou. neličnou.



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

☎ 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603-841/0100

AQUA Procon s.r.o.
Ing. Jokl M.
Palackého tř. 12,
612 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

e-mail

Vyřizuje/

Šumperk

1116 - 50000/2015

heitmar@spvs.cz

Heitmar Petr

5.10.2015

Věc: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“

Týká se: „ Horní Pomoraví II sever, Město Šumperk – doplnění kanalizace „

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk jako provozovatel obdržela od zhotovitele stavby fa: IMOS BRNO, a.s. žádost o vyjádření k předloženému stanovisku Iniciační dopis (ID-149-S-Š-SO 2.002 – lokalita sídliště Temenická – stoka Temenická 3 – monol. šachta 1040).

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk k předloženému návrhu konstatuje následující:

- Souhlasíme s předloženým řešením.

S pozdravem

Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911


Ing. Pavel Paloncý
technický ředitel
