



MOST PŘEHOŘOV
PŮDORYS
M 1:100

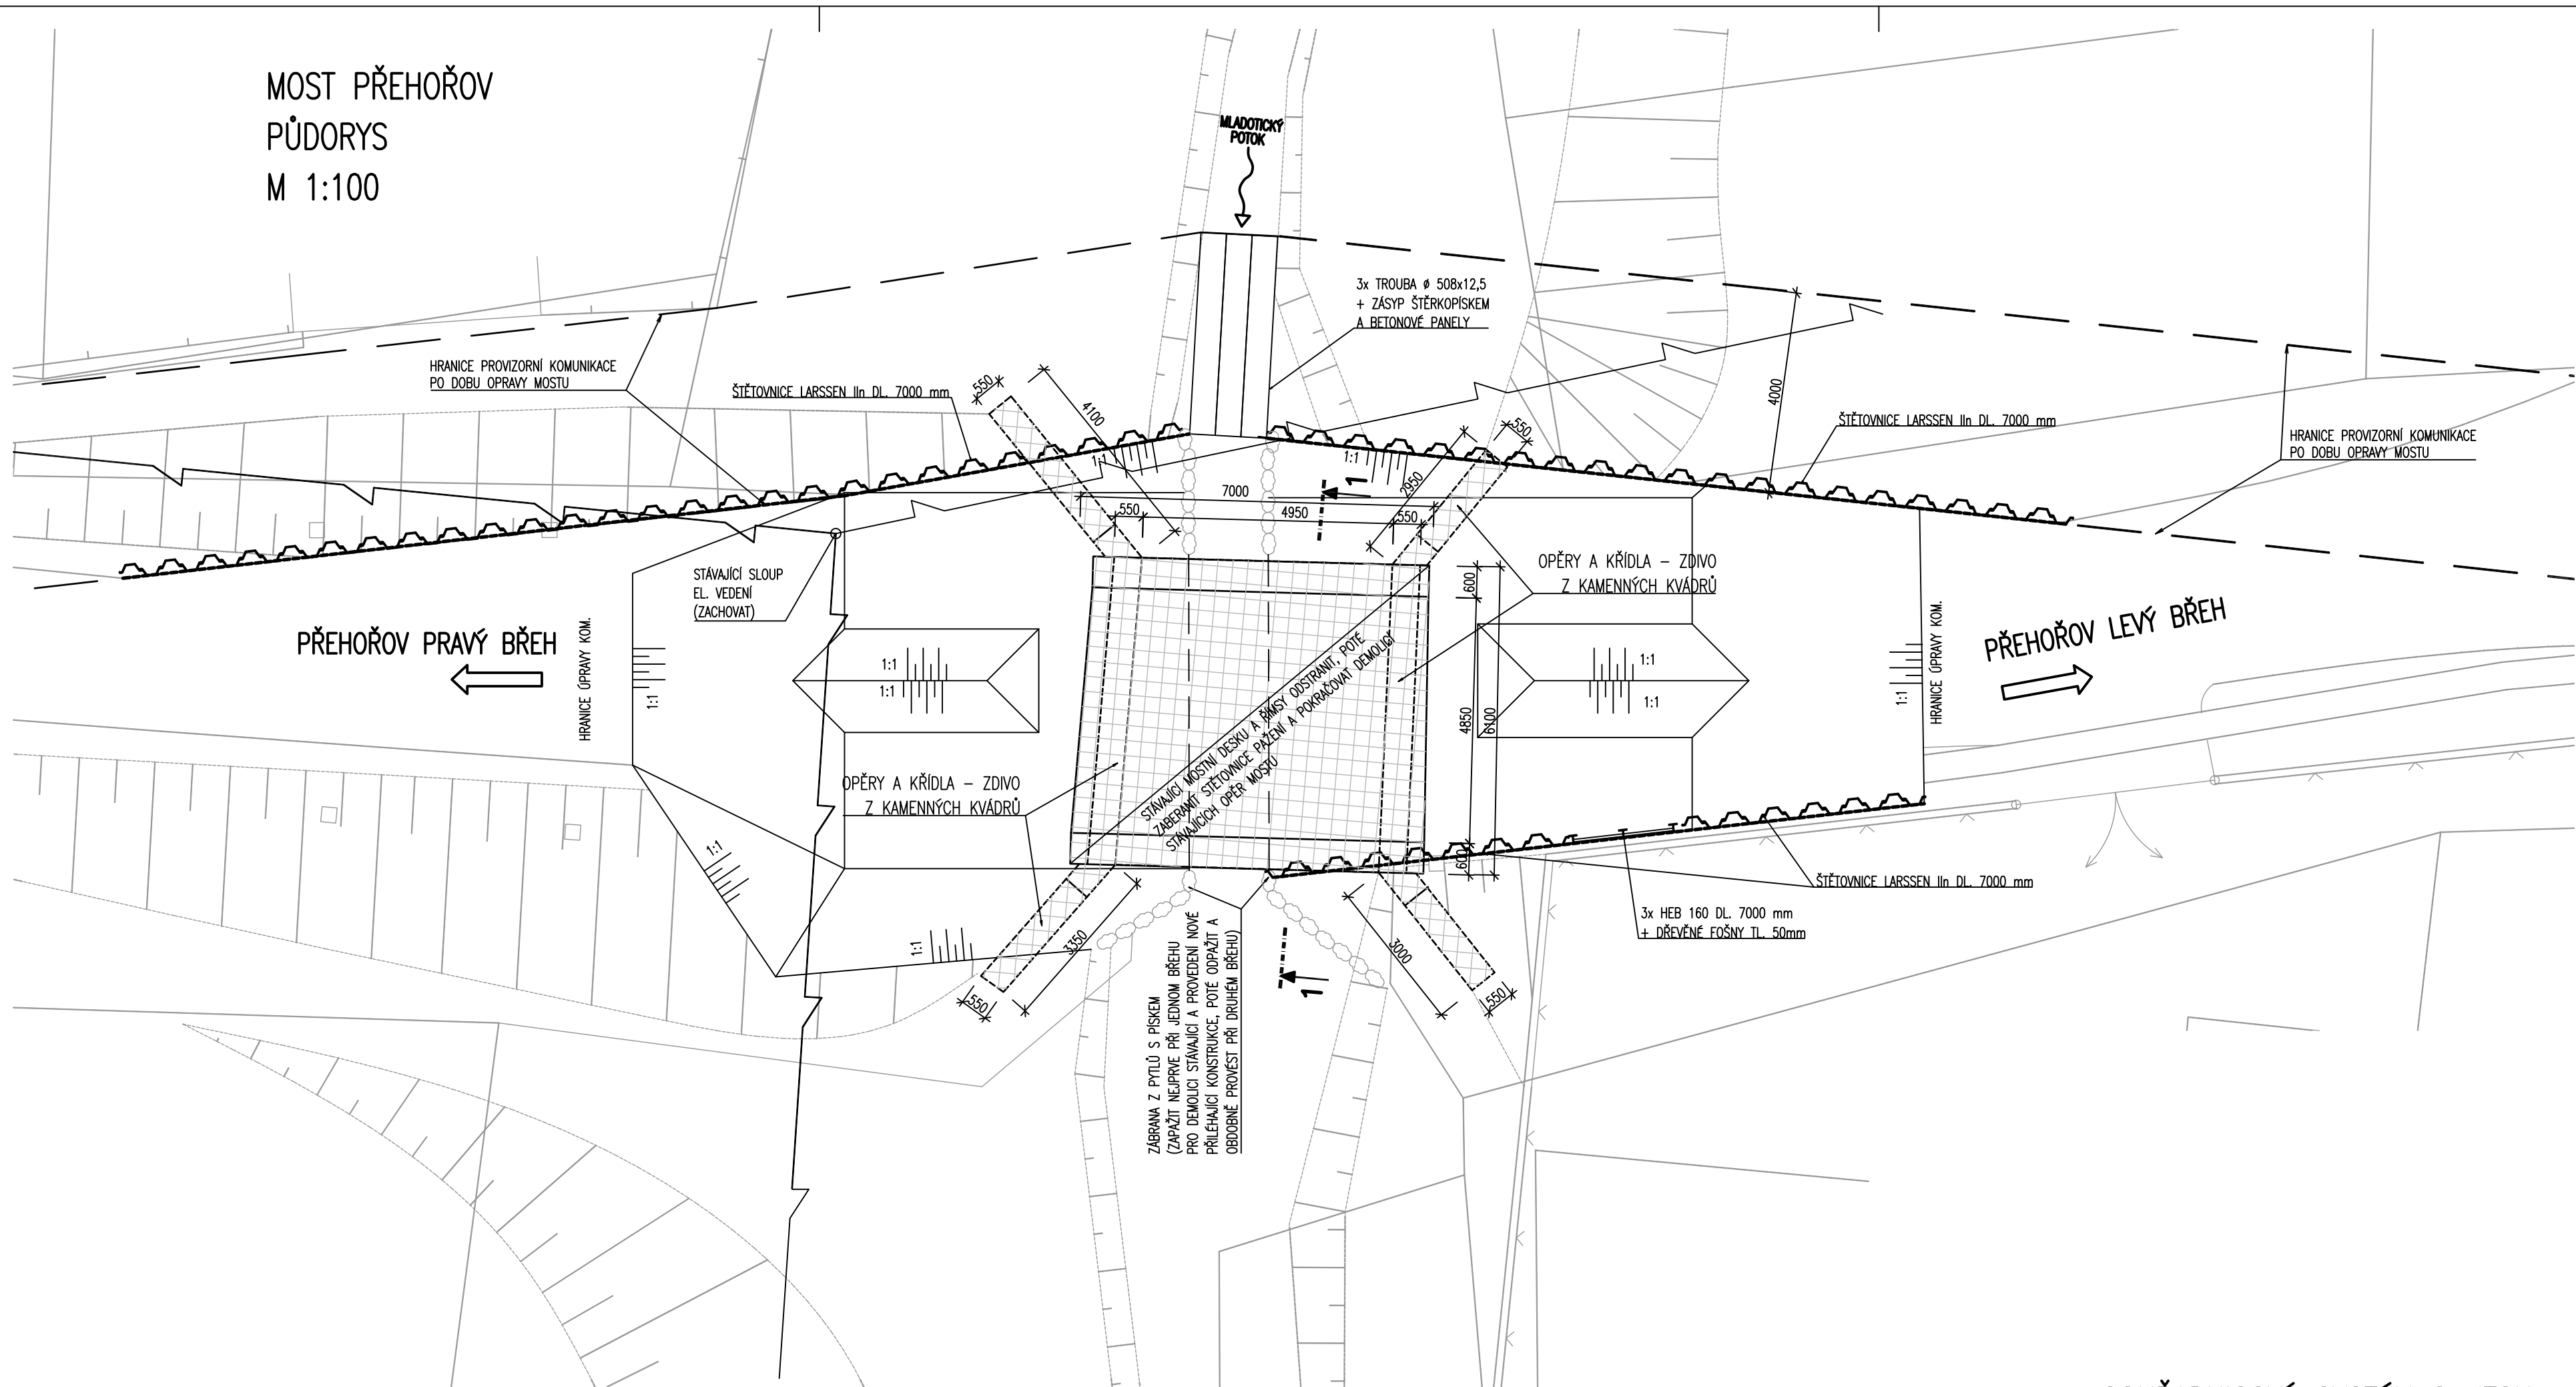

ŘEZ 1-1 – STÁVAJÍCÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE
M 1:50

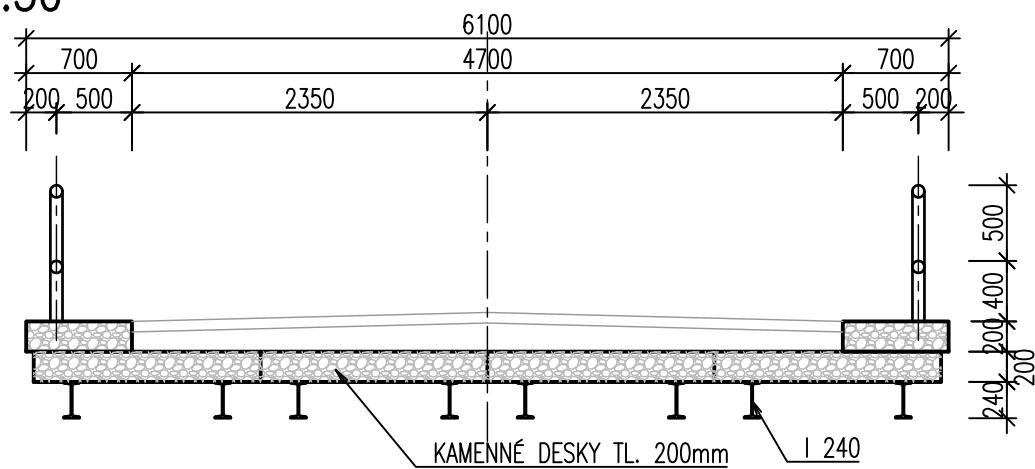

POSTUP DEMOLICE

PŘED ZAPOČETÍM DEMOLIČNÍCH PRACÍ NA STÁVAJÍCÍM MOSTĚ JE NUTNO ZŘÍDIT PROVIZORNÍ OBJÍZDNOU TRASU. V MÍSTĚ PROVIZORNÍHO BRODU BUDE POTOK SVEDEN DO 3 OCELOVÝCH TRUB 508x12,5. TY BUDOU ZASYPÁNY ŠTĚRKEM A JAKO VRCHNÍ VRSTVA BUDOU POLOŽENY ŽB PANELE.

FÁZE I.

NEJPRVE BUDE ODSTRANĚNO ZÁBRADLÍ MOSTU VČETNĚ SLOUPKŮ, ŘÍMSY, ASFALTOVÉ SOUVRSTVÍ, PŘÍPADNÁ ŠTĚRKOVÁ VRSTVA A IZOLACE. POTÉ BUDOU ODSTRANĚNY KAMENNÉ DESKY A I NOSNÍKY. PŘEDPOKLÁDÁ SE ODVOZ DESEK A NOSNÍKŮ NA NÁKLADNÍM VOZIDLE PŘÍMO NA SKLÁDKU. HMOTNOST 1 m² MOSTOVKY (DESEK) JE CCA 520 KG, HMOTNOST 1 m NOSNÍKŮ JE CCA 36 KG. MOSTOVKA CELÉHO MOSTU VÁŽÍ CCA 29,3 t VČETNĚ ŘÍMS. PŘESNÝ POSTUP DEMOLICE BUDE PROVEDEN DODAVATELEM DLE JEHO TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ. SOUČÁSTÍ DEMOLICE JE I ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO KOBERCE A JEHO PODKLADNÍCH VRSTEV ZA KŘÍDLY V ROZSAHU DLE VÝKRESU VÝKOPŮ.

FÁZE II.

V POTŘEBNÉM ROZSAHU SE ZABERANÍ PAŽENÍ ZE ŠTĚTOVNIC LARSEN Iln. POTOK BUDE SVEDEN POMOCÍ ZÁBRAN Z PYTLŮ S PÍSKEM (ZAPAŽIT NEJPRVE PŘI JEDNOM BŘEHU PRO DEMOLICI STÁVAJÍCÍ OPĚRY A PROVEDENÍ NOVÉ KONSTRUKCE, POTÉ ODPÁŽIT A OBDOBĚ PROVÉST PŘI DRUHÉM BŘEHU). KŘÍDLA A OPĚRY JSOU KAMENNÉ TL. CCA 550 mm A VÝŠKY CCA 2,5 m. HMOTNOST VŠECH KŘÍDEL JE CCA 38,3 t A HMOTNOST OBOU OPĚR JE CCA 43,6 t. V MÍSTECH, KDE BY ZABERANĚNÉ ŠTĚTOVNICE MOHLI PORUŠIT PLOT PŘILÉHAJÍHO POZEMKU, JSOU ŠTĚTOVNICE NAHRAZENY OCELOVÝMI VÁLCOVANÝMI PROFILY HEB 160, MEZI KTERÉ SE VYKLINUJÍ FOŠNY TL. 50 mm. PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ JE NUTNO PŘÍSLUŠNÝMI SPRÁVCI NECHAT VYTÝČIT POLOHU VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU STAVBY, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.

FÁZE III.

UBOURÁNÍ KAMENNÉHO ZDIVA KŘÍDEL A OPĚR STÁVAJÍCÍHO MOSTU NA VÝŠKOVOU ÚROVEŇ 419,565 m.n.m

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

Zodpovědný projektant		Vypracoval		Vedoucí projektant		 STATICA Plzeň s.r.o. statika konstrukce V Obilí 1180/12 326 00, Plzeň tel.: 601 579 350 mob.: 777 220 129 e-mail: statica@statica.cz		
Ing. David Chmelík		Ing. Tomáš Roch		Ing. David Chmelík				
Obec: Přehořov		Kraj: Plzeňský						
Objednatel: obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle								
Akce: MOST PŘEHOŘOV SO 202 DEMOLICE						Formát	6 x A4	Výtisk číslo
						Datum	06/2014	
						Stupeň	PDPS	
						Č. zak.	2013/014	
						Měřítko	1:50	
Část: C – STAVEBNÍ ČÁST						Č. přílohy	02.	
Obsah: SCHÉMA PROVÁDĚNÍ								
