

1.1 - DMYCHÁRNA

30,99 m²

1.2 - VELÍN

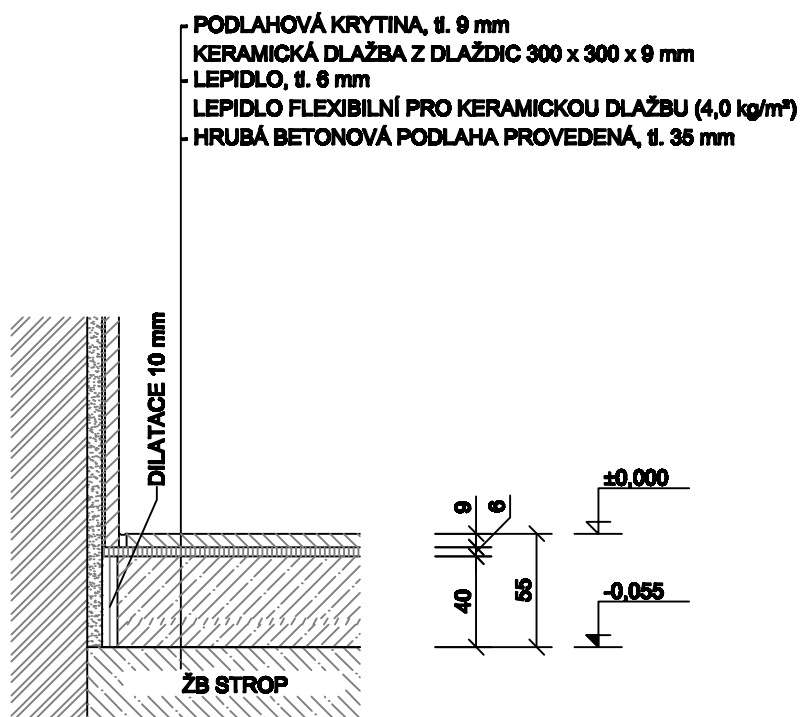
7,74 m²

1.3 - WC

1,54 m²

-

CELKEM

40,27 m²**POZNÁMKA**

SOKL (300 x 80 mm) PO CELÉM OBVODU STĚN V MÍSTNOSTI VELÍNU CELKEM cca 10,4 m

V MÍSTNOSTI WC KERAMICKÝ OBKLAD v = 2000 mm

V MÍSTNOSTI DMYCHÁRNÝ A NAD AKTIVACEMA KERAMICKÝ OBKLAD v = 2000 mm

SPÁROŘEZ DLAŽBY BUDE NAVAZOVAT NA SPÁROŘEZ SOKLU (OBKLADU)

±0,000 = 447,055 NAVRHOVANÁ PODLAHA PŘÍZEMÍ**SO-01****VAK** projekt s.r.o.

B. Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice

Tel.: 602 150 148; Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUcí ÚTVARU	KOPIE ČÍSLO
ING. MARTINA ZAMLINSKÁ			ING. PUDIL JIŘÍ	
OKRES	JINDŘICHÓV HRADEC (JIHOČESKÝ KRAJ)			STUPEŇ PROJEKTU
MÍSTO STAVBY	LÁSENICE			PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO
INVESTOR	OBEČ LÁSENICE			PROVÁDĚNÍ STAVBY
NÁZEV AKCE	LÁSENICE - DOSTAVBA KANALIZACE A ČOV PRO 600 E.O.			DATUM PROJEKTU
STAVEBNÍ OBJEKT				10/2015
SO - 01 ČOV PRO 600 E.O.				FORMÁT VÝKRESU
OBSAH VÝKRESU				3xA4
TABULKA PODLAH				MĚŘÍTKO
				1:50
				Č. VÝKRESU
				D1.01.1-13
