

ZMENOVÝ LIST		číslo ZL : 01
Zhotovitel : BFK service a. s. Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Obec Tuklaty Na Valech 19 250 82, Tuklaty IČO : 00235822 DIČ : CZ00235822		Kontrola za TDI Dozoring s.r.o. Býchory 233 280 02 Kolín Jan Říha; jan.riha@dozoring.cz tel.: 721 711 117
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 27.07.2026		Stavba: „Základní škola Tuklaty - Přístavba tělocvičny a učeben“
Odkazy na dokumentaci :		Projektová dokumentace z 02/2024 zpracovaná firmou INGARA s.r.o. Veverkova 1218 500 02 Hradec Králové Ing. Aleš Řada, GP a AD tel.: 739 207 686
na rozpočet :		Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo ze dne 28.05.2026
na jednání na akci:		"ZŠ Tuklaty - přístavba tělocvičny a učeben"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: ZL01 řeší dodatečnou úpravu v rámci přesunu na meziskládku a zrušení skládkovného na základě posouzení vykopané zeminy dle požadavku objednatele. Dále je zde doplněno zařazení vykopaných zemin, viz. zápis ve SD přizvaný geolog Ing. Jaroslav Zákostelecký v důsledku nálezkového stavu, které PD neobsahovala. Tento ZL č. 01 řeší pouze zemní práce pro objekt učebny v předepsané figuře v rozsahu PD, bez přesahů. GDS si vyhrazuje právo o doplnění - zpřesnění stavu po pokračujících stavebních pracích za dozoru stavby geotechnikem.		
Cenové vyčíslení: Cena bez DPH - 474 933,13 Kč		
Tento ZL č. 01 má vliv na dokončení díla		
Generální zhotovitel:  Ing. Jiří Fořt, člen představenstva		Odsouhlasení objednatelem:  Tomáš Kolinský, místostarosta obce
 Ing. Jiří Fořt, člen představenstva		Monika Petrisková, starostka
 Jan Říha, TDI, KOBOZP		Odsouhlasení TD:

stavba: „Základní škola
objekty: Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben “
díl: "D1.1 - ARSČ"
objednatel: "vícepráce a méněpráce ZL č. 01"
"Obec Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 26.07.2026

REKAPITULACE - ZL č. 01

"D1.1 - ARSČ"

D.1.1-ARSČ_zakládání stavby učebna, zařídění

Připočty	1 - Zemní práce	610 047,12 Kč
Odpočty	1 - Zemní práce	- 1 084 980,25 Kč
Celkem připočty		610 047,12 Kč
Celkem odpočty		- 1 084 980,25 Kč
CELKEM PŘIPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 01, bez DPH		- 474 933,13 Kč
21% DPH		- 99 735,96 Kč
CELKEM PŘIPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 01, s DPH		- 574 669,09 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód 222

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

KSO:
Místo:

801 32

CC-CZ:
Datum: 26.07.2026

Zadavatel:

Obec Tuklaty

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

BFK service a.s.

IČ: 27155153
DIČ: CZ27155153

Projektant:

INGARA s.r.o.

IČ: 06553044
DIČ:

Zpracovatel:

06553044

Poznámka

Cena bez DPH

-474 933,13

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
-474 933,13
0,00

Výše daně
-99 735,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

-574 669,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 222

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

Místo:

Datum:

26.07.2026

Zadavatel:

Obec Tuklaty

Projektant:

INGARA s.r.o.

Zhotovitel:

BFK service a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
ZL01	D.1.1-ARSČ_zakládání stavby učebna, zařídění	-474 933,13	-574 669,09
		-474 933,13	-574 669,09

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4
Objekt: ZL01 - D.1.1-ARSC_zakládání stavby učebna, zatřídění

KSO: 801 32
Místo:

Zadavatel: Obec Tuklaty
Zhotovitel: BFK service a.s.
Projektant: INGARA s.r.o.
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 26.07.2026
Datum:

IČ: 27155153
DIČ: CZ27155153

IČ: 06553044
DIČ:

IČ: 06553044
DIČ:

Cena bez DPH

-474 933,13

DPH základní
snížená

Základ daně
-474 933,13
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-99 735,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

-574 669,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

Objekt:

ZL01 - D.1.1-ARŠČ_zakládání stavby učebna, zatřídění

Místo:

Zadavatel: Obec Tuklaty

Zhotovitel:

BFK service a.s.

Datum:

26.07.2026

Projektant:

INGARA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

-474 933,13

-474 933,13

-474 933,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

Objekt: ZL01 - D.1.1-ARSČ_zakládání stavby učebna, zatřídění

Místo:

Zadavatel: Obec Tuklaty

Zhotovitel: BFK service a.s.

Datum: 26.07.2026

Projektant: INGARA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
4	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-563,580	180,00	-474 933,13	
W			"Změna vzdálenosti a skladkovně dle dohody s objednateltem_06/2026"					
W			"fez3 - učebna"-30,3*18,6					
W			Součet		-563,580		-474 933,13	
100	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	32,608	230,00	7 499,84	CS ÚRS 2026 01
W			"Změna vzdálenosti a skladkovně dle dohody s objednateltem_06/2026"					
W			"výkaz výměr pro výkop SJ učebna					
W			2,90*(13,10*12,25)		465,378			
W			0,75*(13,10*12,25)/2		60,178			
W			2,80*(14,10*1,00)		39,480			
W			(14,10*1,00*1,00)/2		7,050			
W			3,60*(13,10*1,00)		47,160			
W			(13,10*1,00*0,30)/2		1,965			
W			(5,41+4,91)*1*3		30,960			
W			Mezisoučet		652,171			
W			-(358,694+163,043+97,826)*odpočet třídy těžitelnosti sk 4;5;6		-619,563			
W			Mezisoučet		-619,563			
W			Součet		32,608			
101	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	358,694	255,00	91 466,97	CS ÚRS 2026 01
W			"Změna vzdálenosti a skladkovně dle dohody s objednateltem_06/2026"					
W			652,171*0,55*třídy těžitelnosti sk 4_55%		358,694			
W			Součet		358,694			
W			"Zápis ve SD Ing. Zákostelecký - geolog"					
102	K	122451104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	163,043	591,00	96 358,41	CS ÚRS 2026 01
W			"Změna vzdálenosti a skladkovně dle dohody s objednateltem_06/2026"					
W			652,171*0,25*třídy těžitelnosti sk 5_25%		163,043			
W			Součet		163,043			
W			"Zápis ve SD Ing. Zákostelecký - geolog"					
103	K	122551103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3	m3	97,826	1 030,00	100 760,78	CS ÚRS 2026 01
W			"Změna vzdálenosti a skladkovně dle dohody s objednateltem_06/2026"					
W			652,171*0,15*třídy těžitelnosti sk 6_15%		97,826			
W			Součet		97,826			
W			"Zápis ve SD Ing. Zákostelecký - geolog"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162251121	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m	m3	-285,670	55,00	-15 711,85	D.1.1-Sod
	W		"Změna vzdálenosti a skladkovně dle dohody s objednatелеm_06/2026"					
	W		"spodní stavba"					
	W		-(5,9*25,3+4,4*31)					
	W		Součet		-285,670			
104	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	285,670	119,00	33 994,73	CS ÚRS 2026 01
	W		"Změna vzdálenosti a skladkovně dle dohody s objednatелеm_06/2026"					
	W		"spodní stavba"					
	W		(5,9*25,3+4,4*31)"zařídění hornin SK 4,5					
	W		Součet		285,670			
8	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1 222,000	270,00	-329 940,00	D.1.1-Sod
	W		"Změna vzdálenosti a skladkovně dle dohody s objednatелеm_06/2026"					
	W		-1222,00					
	W		Součet		-1 222,000			
105	K	162551128	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	1 124,174	172,00	193 357,93	CS ÚRS 2026 01
	W		"Změna vzdálenosti a skladkovně dle dohody s objednatелеm_06/2026"					
	W		1222,00-(652,171*0,15)					
	W		Součet		1 124,174			
106	K	162551148	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	97,826	197,00	19 271,72	CS ÚRS 2026 01
	W		"Změna vzdálenosti a skladkovně dle dohody s objednatелеm_06/2026"					
	W		(652,171*0,15)					
	W		Součet		97,826			
9	K	16715112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	554,345	71,00	39 358,50	D.1.1-Sod
	W		"Změna vzdálenosti a skladkovně dle dohody s objednatелеm_06/2026"					
	W		"řez3 - učebna - skutečnost - doplnění chybí ve VV"652,171					
	W		-652,171*0,15"zařídění zemin SK 6					
	W		Součet		554,345			
107	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	97,826	286,00	27 978,24	CS ÚRS 2026 01
	W		"Změna vzdálenosti a skladkovně dle dohody s objednatелеm_06/2026"					
	W		652,171*0,15"zařídění zemin SK 6					
	W		Součet		97,826			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	-2 199,600	290,00	-637 884,00	D.1.1-Sod
	W		"Změna vzdálenosti a skladkovně dle dohody s objednatелеm_06/2026"					
	W		-1222*1,8					
	W		Součet		-2 199,600			
			POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCENĚNY DLE ÚRS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM					

Počasí: Polojasno $t = +16^{\circ}$, $t = +25^{\circ}$
 Pracovní doba: 7⁰⁰ až 16³⁰
 Pracovníci: BFK 2. THP, Desky CZ s.r.o.
 Mechanizace: WN 8003, Kubota U68-4, Renault Midlum 220,
 Iveco ml 120.

Provedení práce: - Realizace výkopu stavební jámy
 Porpožadováno materiálů pracovní tým se
 užívalo jako nedostatečné, proto bylo na
 požadovaný výkop v úrovni -
 nasazeno hydraulické broušení kladiva.

Počasí:

Pracovní doba

Pracovníci: BFK 1. THP, Okterm 4, Desky CZ s.r.o. 4
 Mechanizace

- Prohlídka probíhla bez zjištění archaologických nálezů
 a situací jsou dle ÚAPPŠ DOK.

Provedení práce: - Realizace výkopu stavební
 jámy.
 - Odstranění a výpání podloží výkopu
 pro možné odčerpání pomocí hydraulického
 kladiva.
 - Přizván geotechnik pro posouzení zemín
 a hornin.

9.7.2026. Zapis Geotechnika o kontrole
 zapříčení těžeb stavební jámy

Po odkrytí svrchní vstupy zeleň, proti
 těžbě pomocí pásového bagru 8003
 těžba tří I/3 a II/4, dle je nutné po
 10t rozložení prachovce a levic 200-400
 mm pomocí hydraulického kladiva a
 rozryvacího tanku pro 10. těžbu, II/5 a III/6.
 Doporučení úpravu za třídění těžby:

tř. I/3	5%
tř. II/4	55%
tř. II/5	25%
tř. III/6	15%

Zapsal 9/7/2026



Zpráva geotechnika z kontroly těžitelnosti u výkopu stavební jámy na stavbě - ZŠ Tuklaty – Přístavba tělocvičny p. č. 34

Stavba : ZŠ Tuklaty - Přístavba tělocvičny na poz. p.č. 34

Zhotovitel stavby : BFK service a.s., Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmyky
v zastoupení : Daniel Pavel - stavbyvedoucí , tel. 605 108 883 , pasvel@bfk.cz

Datum kontroly: 9.7.2026

Na základě písemné objednávky č. 2026/115 byla provedena kontrola na staveništi dne 9.7. 2026 v době , kdy byla prováděna dokončovaná těžba stavební jámy pro založení přístavby s postupným odbouráváním horninového masívu pomocí pásového bagru mírně zvětralého až navětralého prachovce v pevných lavicích až 30 cm za použití rozrývacího trnu a hydraulického kladiva namontovaného na rameno bagru. (pro třídu těžitelnosti tř. II/ 5 až tř III/ 6.

Účelem kontroly na staveništi bylo zhodnotit zatřídění odbourávané horniny dle ČSN 736133 s doplněním třídy těžitelnosti dle původní normy ČSN 73 30 50. (dnes stále používané)

Z hlediska vrtatelnosti (dle původní ČSN 73 1001) je zatřídění slabě zvětralého až navětralého prachovce ve tř. R4/ R3

Po prohlídce odtěžení celého svahu je možné zatřídít těžitelnost takto :

Výskyt v %	Dle ČSN 73 6133	Doplněno dle ČSN 73 3050
1.Úroveň vrstev - 5%	těžitelnost tř. I -	tř. 3 - zvětralé horniny drobné Eluvium až zvětralý prachovec
2. Úroveň vrstev - 55%	těžitelnost tř. II.	tř. 4 – slabě zvětralý prachovec , silně rozpukaný
3. Úroveň vrstev - 25%	těžitelnost tř. III. -	tř. 5 - horniny navětralé Rozpukaný prachovec v lavicích
4. Úroveň vrstev - 15%	těžitelnost tř. III. -	tř. 6 - horniny slabě navětralé Navětralý až zdravý prachovec

Zapsal dne 9.7. 2026

Ing. Jaroslav Zákostelecký

AI pro geotechniku



ZMENOVÝ LIST		číslo ZL : 02
Zhotovitel : BFK service a. s. Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Obec Tuklaty Na Valech 19 250 82, Tuklaty IČO : 00235822 DIČ : CZ00235822	Kontrola za TDI Dozoring s.r.o. Býchory 233 280 02 Kolín Jan Říha; jan.riha@dozoring.cz tel.: 721 711 117	
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 31.07.2026		Stavba: „Základní škola Tuklaty - Přístavba tělocvičny a učeben“
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 02/2024 zpracovaná firmou INGARA s.r.o. Veverkova 1218 500 02 Hradec Králové Ing. Aleš Řada, GP a AD tel.: 739 207 686	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo ze dne 28.05.2026	
na jednání na akci:	"ZŠ Tuklaty - přístavba tělocvičny a učeben"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: ZL02 řeší dodatečný požadavek investora v rámci odstranění a likvidace odpadu ze stávajících základů ze ŽB po odstranění buňkoviště na řízenou skládku - příloha č. 3. Přílohou č. 1 a 2 tohoto ZL č. 02 jsou kopie skládkových lístků. Tento ZL list č. 02 neobsahuje odstranění ostatních odpadů, které zůstaly po demontáži buňek - bude samostatně vyčísleno dle kustečnosti.		
Cenové vyčíslení: Cena bez DPH 236 170,76 Kč		
Tento ZL č. 02 má vliv na dokončení díla		
Generální zhotovitel:  Ing. Jiří Fořt, člen představenstva	Odsouhlasení objednatelem:  Tomáš Kolínský, místostarosta obce	
	Monika Petrislová, starostka	
	Odsouhlasení TD:  Jan Říha, TDI, KOBOZP	

stavba: „Základní škola
objekty: Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben “
díl: "D1.1 - ARSČ"
objednatel: "vícepráce a méněpráce ZL č. 02"
"Obec Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty
zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 31.07.2026

REKAPITULACE - ZL č. 02

"D1.1 - ARSČ"

D.1.1-ARSČ_odstranění stávajících základů po demontáži buněk

Přípočty	9 - Ostatní konstrukce a práce bourání	171 450,30 Kč
Přípočty	997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	64 720,46 Kč
Celkem přípočty		236 170,76 Kč
Celkem odpočty		- Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 02, bez DPH		236 170,76 Kč
21% DPH		49 595,86 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 02, s DPH		285 766,62 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 222 Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

KSO Místo 801 32 CC-CZ: 31.07.2026 Datum:
Zadavatel: Obec Tuklaty IČ: IČ: 27155153 DIČ: CZ27155153
Zhotovitel: BFK service a.s. IČ: 06553044 DIČ:
Projektant: INGARA s.r.o. IČ: 06553044 DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 236 170,76

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	236 170,76	49 595,86
12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 285 766,62

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 222

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

Místo: 31.07.2026

Zadavatel: Obec Tuklaty

Zhotovitel: BFK service a.s.

Projektant: INGARA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL02.R1 D.1.1-ARSC_ odstranění stávajících základů po demontáži buněk

236 170,76	285 766,62
236 170,76	285 766,62

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

Objekt:

ZL02.R1 - D.1.1-ARSČ_odstranění stávajících základů po demontáži buněk

KSO:

801 32

Misto:

CC-CZ:
Datum: 31.07.2026

Zadavatel:

Obec Tuklaty

Zhotovitel:

BFK service a.s.

Projektant:

INGARA s.r.o.

Zpracovatel:

IC: 27155153
DIČ: CZ27155153
IC: 06553044
DIČ: 06553044

Poznámka:

Cena bez DPH

236 170,76

DPH základní
snížená

Základ daně
236 170,76
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
49 595,86
0,00

Cena s DPH

▼ CZK

285 766,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

Objekt: ZL02.R1 - D.1.1-ARSČ_odstranění stávajících základů po demontáži buněk

Místo:

Zadavatel: Obec Tuklaty

Zhotovitel: BFK service a.s.

Datum: 31.07.2026

Projektant: INGARA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	236 170,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	236 170,76
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	171 450,30
	64 720,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

Objekt: ZL02.R1 - D.1.1-ARSČ_odstranění stávajících základů po demontáži buněk

Místo:

Zadavatel: Obec Tuklaty

Zhotovitel: BFK service a.s.

Datum: 31.07.2026

Projektant: INGARA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				171 450,30	
200	K	961031513	Bourání zdiva základového z tvármic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu, třídy C25/30	m3	25,782	6 650,00	171 450,30 CS ÚRS 2026 01	
			"Odstranění stávajících základů ze ŽB po odstranění buněkoviště"					
			"odkaz na výkresovou část - stávající tvar základových pasů - skutečnost		4,536			
			(12,60*0,60*0,30)*2*ob1,2_kóta -1,320 a -1,020		1,872			
			(5,20*0,60*0,30)*2*ob3,4_kóta -1,320 a -1,020		3,744			
			(5,20*0,60*0,30)*4*střed st 1-4_kóta -1,070 a -0,770		7,380			
			(12,30*0,30*1,00)*2*ŽB ob1,2_kóta -1,02 a -0,020		3,300			
			(5,50*0,30*1,00)*2*ŽB ob3,4_kóta -1,02 a -0,020		4,950			
			(5,50*0,30*0,75)*4*ŽB střed 1-4_kóta -0,770 a -0,020		25,782			
			Součet					

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

201	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	56,416	133,00	7 503,33 CS ÚRS 2026 01	
			"Odstranění stávajících základů ze ŽB po odstranění buněkoviště"					
			"odkaz na výkresovou část - stávající tvar základových pasů - skutečnost		56,416			
			25,782*2,1882		56,416			
			Součet					

202	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	56,416	315,00	17 771,04 CS ÚRS 2026 01	
			"Odstranění stávajících základů ze ŽB po odstranění buněkoviště"					
			"odkaz na výkresovou část - stávající tvar základových pasů - skutečnost		56,416			
			25,782*2,1882		56,416			
			Součet					

203	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přřplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	507,746	13,80	7 006,89 CS ÚRS 2026 01	
			"Odstranění stávajících základů ze ŽB po odstranění buněkoviště"					
			"odkaz na výkresovou část - stávající tvar základových pasů - skutečnost		507,746			
			(25,782*2,1882)*9_skládka 10km Český Brod		507,746			
			Součet					

204	K	997013862.R1	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 - vybraná skládka	t	56,416	575,00	32 439,20 vlastní	
			Poznamka k položce:					
			Ripená skládka dle platného ceníku 500 Kč/t, cena včetně uložení a zvlázení + 15%					
			"Odstranění stávajících základů ze ŽB po odstranění buněkoviště"					
			"odkaz na výkresovou část - stávající tvar základových pasů - skutečnost		56,416			
			25,782*2,1882		56,416			
			Součet					
			"JC vychází z aktuálního ceníku skládky + 15%"					

POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCEŇOVÁNY DLE ÚRS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM

Lejček
6SX 9777

DODACÍ LIST

ve smyslu zákona č. 541/2012 Sb. v platném znění a prováděcích právních předpisů

Identifikační údaje původce odpadu:	Provozovna předání a převzetí odpadu:
Marek Lejček	Martin Sklenář
Choceradská 5	Palackého 143, Český Brod 282 01
Svojetice, 251 62	IČ: CZ502614
IČO: 74903985	IČP:
akce: Tuklaty ZŠ	

ODPAD (zařazení podle Katalogu odpadů)

Kat.číslo	Kat.	Název	množství	rozbory	oú
170101	0	Beton	43,2 t	ANO/NE	ANO/NE

7,36 / 8,52 / 9,16 / 9,76 / 8,4


ČESTNĚ PROHLÁŠENÍ

Dodávaný odpad odpovídá svým původem a vlastnostmi informacím obsaženým v základním popisu odpadu, který byl předán spolu s první z řady dodávek odpadu do zařízení. Před předáním byly dodány požadované rozbory odpadu (pokud je tak uvedeno, v opačném případě je dodán odborný úsudek).

K datu předání této opakované dodávky odpadu do zařízení nedošlo ke změně surovin a technologie procesu, ve kterém odpad vzniká nebo dalším změnám, které by ovlivnily kvalitativní ukazatele odpadu klíčové pro možnost přijetí odpadu do zařízení a všechny údaje uvedené v této průvodce jsou úplné a pravdivé.

V případě pravidelného ověřování kritických ukazatelů je odpad do zařízení dodáván opakovaně pouze v případě, že nejsou kritické ukazatele překročeny.

Zařízení odběratele odpadu:	Odběratel odpadu (razítko, podpis, datum přijetí odpadu):
Martin Sklenář Palackého 143, Český Brod 282 01 IČ: 75915910 Sběrný dvůr Martin Sklenář IČZ: CZ502614	Datum: 09.07.2026 Podpis, razítko: MS servis Martin Sklenář Palackého 143, 282 01 Český Brod Tel: 75915910 IČ: 75915910, DIČ: CZ7807100775

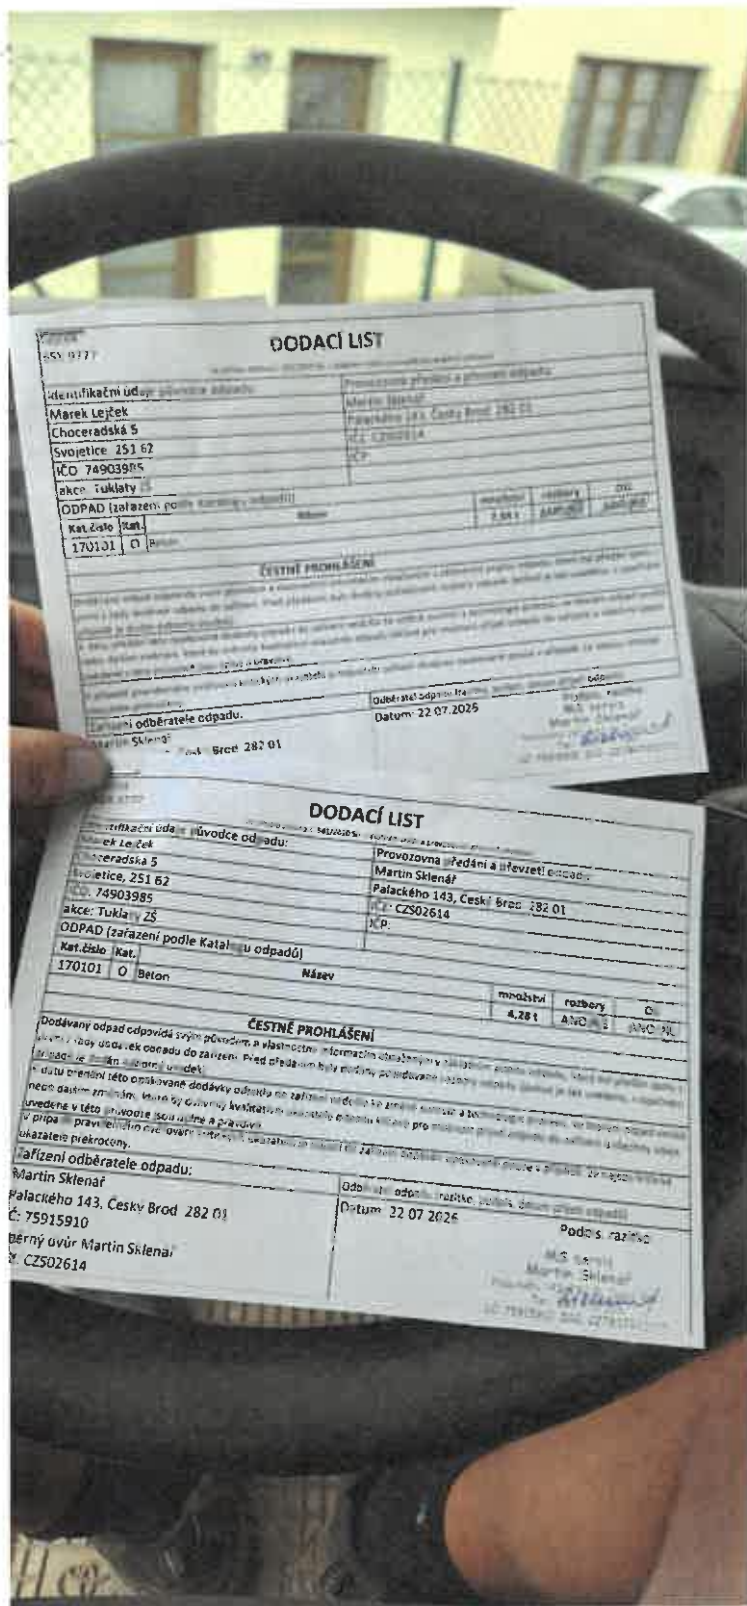

DODACÍ LIST

Identifikační údaje výrobce odpadu: **Marek Lejtek**
Choceradská 5
Svojetice 251 62
IČO 74903985
akce: tuklaty

Provozovna předání a převzetí odpadu:
Martin Sklenář
Palackého 143, Český Brod 282 01
IČO CZ502614
ČP

ODPAD (zařazení podle Katalogu odpadů):
Kat. číslo (Kat.) **170101** ☐ **Beton**

množství	rozloha	označení
2,881	ANO	ANO

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Provozovna předání a převzetí odpadu: **Martin Sklenář**
Palackého 143, Český Brod 282 01
IČO CZ502614
ČP

Datum: **22.07.2025**

Nařízení odběratele odpadu:
Martin Sklenář
Palackého 143, Český Brod 282 01

DODACÍ LIST

Identifikační údaje výrobce odpadu: **Marek Lejtek**
Choceradská 5
Svojetice 251 62
IČO 74903985
akce: tuklaty ZS

Provozovna předání a převzetí odpadu:
Martin Sklenář
Palackého 143, Český Brod 282 01
IČO CZ502614
ČP

ODPAD (zařazení podle Katalogu odpadů):
Kat. číslo (Kat.) **170101** ☐ **Beton**

množství	rozloha	označení
4,281	ANO	ANO

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Provozovna předání a převzetí odpadu: **Martin Sklenář**
Palackého 143, Český Brod 282 01
IČO CZ502614
ČP


Datum: **22.07.2026**

Nařízení odběratele odpadu:
Martin Sklenář
Palackého 143, Český Brod 282 01
IČO CZ502614

Provozovna předání a převzetí odpadu: **Martin Sklenář**
Palackého 143, Český Brod 282 01
IČO CZ502614
ČP

Datum: **22.07.2026**

Nařízení odběratele odpadu:
Martin Sklenář
Palackého 143, Český Brod 282 01
IČO CZ502614

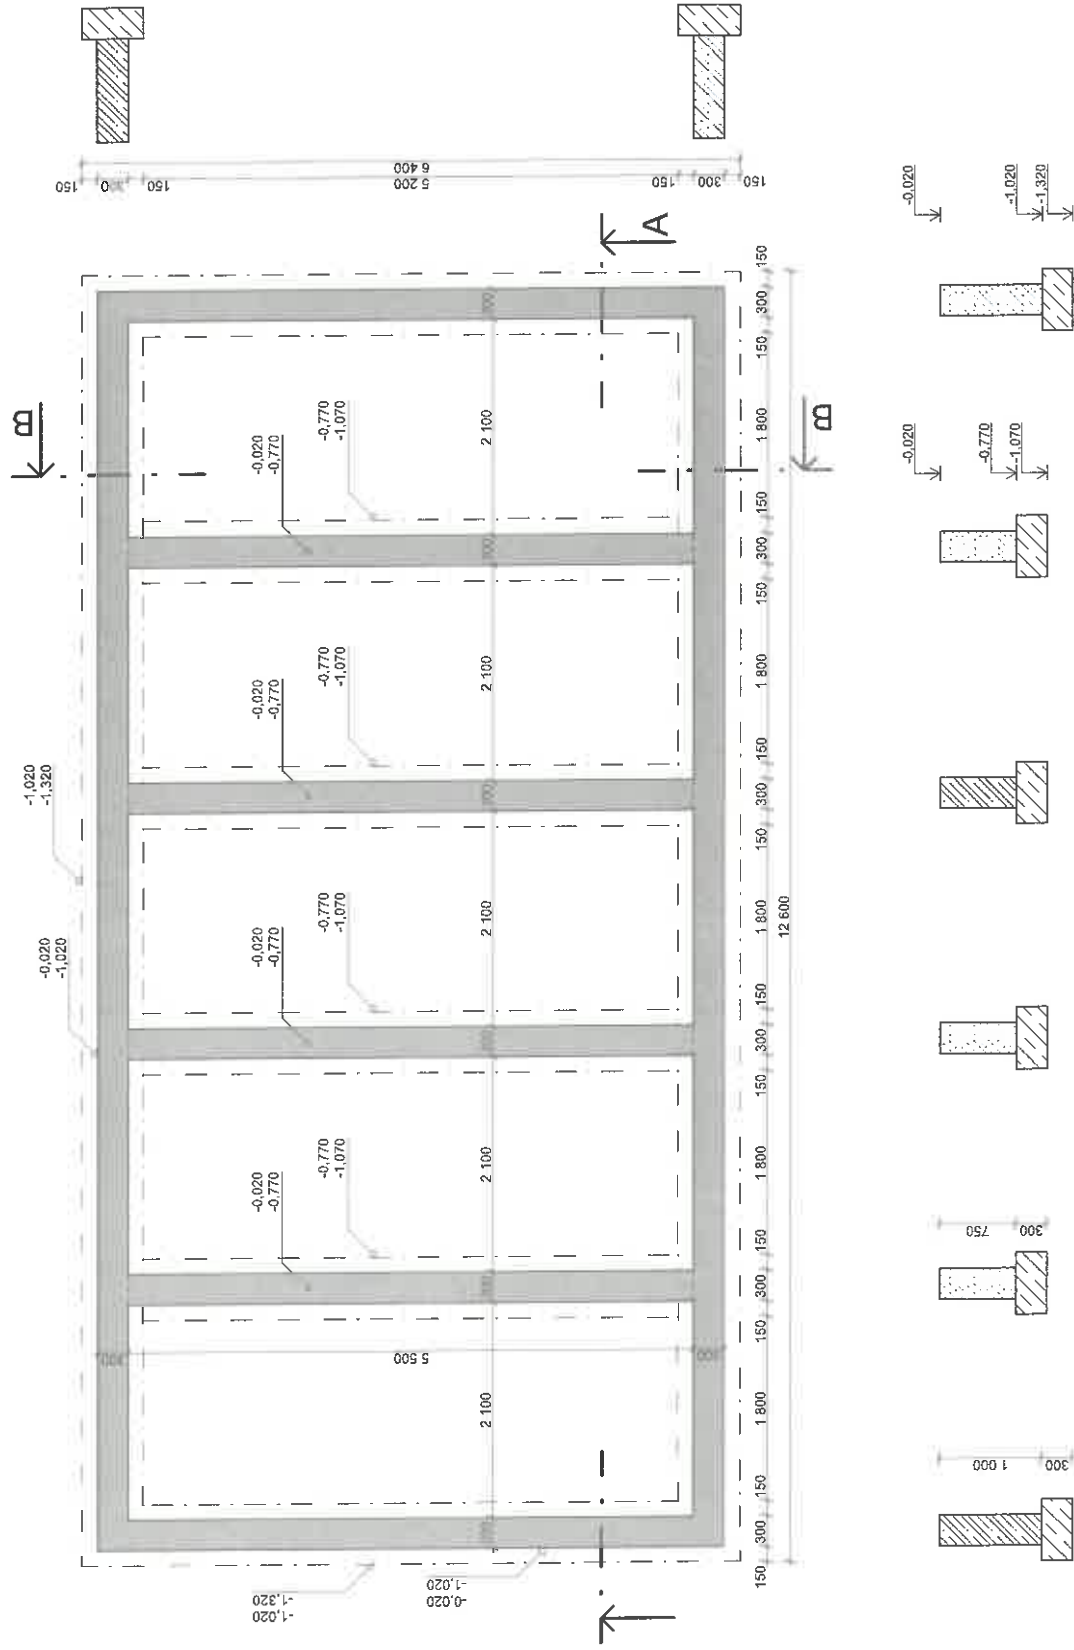

ZMENOVY LIST		číslo ZL : 03
Zhotovitel : BFK service a. s. Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Obec Tuklaty Na Valech 19 250 82, Tuklaty IČO : 00235822 DIČ : CZ00235822		Kontrola za TDI Dozoring s.r.o. Býchory 233 280 02 Kolín Jan Říha; jan.riha@dozoring.cz tel.: 721 711 117
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 03.08.2026		Stavba: „Základní škola Tuklaty - Přístavba tělocvičny a učeben“
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace z 02/2024 zpracovaná firmou INGARA s.r.o. Veverkova 1218 500 02 Hradec Králové Ing. Aleš Řada, GP a AD tel.: 739 207 686 Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo ze dne 28.05.2026 "ZŠ Tuklaty - přístavba tělocvičny a učeben"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: ZL03 řeší technicky a časově proveditelný způsob prohloubení stávajících základových pasů objektu ZŠ vůči založení nové přístavby učeben. V důsledku geologického nálezu viz. zatřídění vrstev hornin dttto odkaz ZL č. 01 a různorodého podloží bylo navrženo nové řešení tzv. Torkret viz. Technická dokumentace pro provedení stavby zak. číslo 170 59 - 26, autorizovaná Ing. Zdeňkem Dobiášem, která popisuje technologii provedení. Důvodem této změny a provedení bylo zejména neohrozit stabilitu stávajících zákl. kcí ZŠ, kde by při odtěžení horniny - skála (mechanické odbourávání hydraulickými kladivy), by došlo k narušení stability stávající stavby a zároveň i narušení jinak pevného stabilního podloží pro nové založení přístavby učeben. Na původně uvažované řešení v PD, které se ukázalo jako nevhodné (pro nálezový stav hornin vyšších tříd) se způsob výše uvedeného provedení ukázal jako bezprecedentně bezpečný a technicky realizovatelný. Přílohou č. 1 je konkurenční cenová nabídka - podrobný rozpočet na Torkret, která je povýšena o 10% v rámci koordinace stavby a příloha č. 2 Dokument Tento ZL list č. 02 - Technická dokumentace pro provedení stavby zak. číslo 170 59 - 26, autorizovaná Ing. Zdeňkem Dobiášem. Tento ZL č. 03 neobsahuje D+M betonové plomby, bude vyčísleno dle skutečnosti v samostatném ZL		
Cenové vyčíslení: Cena bez DPH 95 755,90 Kč		
Tento ZL č. 03 má vliv na dokončení díla		
Generální zhotovitel:  Ing. Jiří Fořt, člen představenstva		Odsouhlasení objednatelem:  Tomáš Kolinský, místostarosta obce Monika Petříšková, starostka
		Odsouhlasení TD:  Jan Říha, TDI, KOOBOZP

stavba: „Základní škola
objekty: Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben “
díl: "D1.1 - ARSČ"
objednatel: "vícepráce a méněpráce ZL č. 03"
"Obec Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty
zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 31.07.2026

REKAPITULACE - ZL č. 03

"D1.1 - ARSČ"

D.1.1-ARSČ_zajištění stabilizace stávajících základů ZŠ Tuklaty

Přípočty	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	163 131,00 Kč
Přípočty	VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	19 000,00 Kč
Odpočty	1 - Zemní práce	- 30 411,91 Kč
Odpočty	2 - Zakládání	- 54 288,36 Kč
Odpočty	998 - Přesun hmot	- 1 674,83 Kč
Celkem přípočty		182 131,00 Kč
Celkem odpočty		- 86 375,10 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 03, bez DPH		95 755,90 Kč
21% DPH		20 108,74 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 03, s DPH		115 864,64 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 222 Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

KSO 801 32 CC-CZ: 30.07.2026
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Obec Tuklaty IČ: 27155153 DIČ: CZ27155153
Zhotovitel: BFK service a.s. IČ: 06553044 DIČ:
Projektant: INGARA s.r.o. IČ: 06553044 DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámky

Cena bez DPH		95 755,90
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně 95 755,90 0,00
		Výše daně 20 108,74 0,00
Cena s DPH		115 864,64

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 222

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

Místo:

Datum:

30.07.2026

Zadavatel:

Obec Tuklaty
BFK service a.s.

Projektant:

INGARA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

95 755,90 115 864,64

ZL03 D.1.1-ARSČ_zajištění stabilizace stávajících
základů ZŠ Tuklaty

95 755,90 115 864,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4
Objekt: ZL03 - D.1.1-ARŠČ_zajištění stabilizace stávajících základů ZŠ Tuklaty

KSO:	801 32	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.07.2026
Zadavatel:	Obec Tuklaty	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	BFK service a.s.	IČ:	27155153
		DIČ:	CZ27155153
Projektant:	INGARA s.r.o.	IČ:	06553044
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	06553044
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH		95 755,90	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	95 755,90 0,00	21,00% 12,00%	20 108,74 0,00
Cena s DPH		115 864,64	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Tukulaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4
Objekt: ZL03 - D.1.1-ARSČ_zajištění stabilizace stávajících základů ZŠ Tukulaty
Místo:
Zadavatel: Obec Tukulaty
Zhotovitel: BFK service a.s.

Datum: 30.07.2026
Projektant: INGARA s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	95 755,90
1 - Zemní práce	76 755,90
2 - Zakládání	-30 411,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-54 288,36
998 - Přesun hmot	163 131,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-1 674,83
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	19 000,00
	19 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

Objekt:

ZL03 - D.1.1-ARSČ_zajištění stabilizace stávajících základů ZŠ Tuklaty

Místo:

Datum: 30.07.2026

Zadavatel:

Obec Tuklaty

Projektant: INGARA s.r.o.

Zhotovitel:

BFK service a.s.

Zpracovatel:

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				76 755,90	
D 1 Zemní práce								
6	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	-13,362	2 059,00	-27 512,36	D.1.1-Sod
	W		"Odpočet -náhrada za torčet stěny, viz. zajištění stability stávajícího základu, zak. číslo 170 59 - 26"					
	W		"podbetonování základů"					
	W		-(2,07*7,09+1,62+1,12+0,62)*0,5		-9,018			
	W		-(2,07+1,62+1,12+0,62)*0,8		-4,344			
	W		Součet		-13,362			
116	K	162551148	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	-13,362	197,00	-2 632,31	CS ÚRS 2026 01
	W		"Odpočet -náhrada za torčet stěny, viz. zajištění stability stávajícího základu, zak. číslo 170 59 - 26"					
	W		"podbetonování základů"					
	W		-(2,07*7,09+1,62+1,12+0,62)*0,5		-9,018			
	W		-(2,07+1,62+1,12+0,62)*0,8		-4,344			
	W		Součet		-13,362			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-13,362	20,00	-267,24	D.1.1-Sod
	W		"Odpočet -náhrada za torčet stěny, viz. zajištění stability stávajícího základu, zak. číslo 170 59 - 26"					
	W		"podbetonování základů"					
	W		-13,362					
	W		Součet					
D 2 Zakládání								
23	K	279113146	Zakladové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	-18,036	3 010,00	-54 288,36	D.1.1-Sod
	W		"Odpočet -náhrada za torčet stěny, viz. zajištění stability stávajícího základu, zak. číslo 170 59 - 26"					
	W		"podbetonování základů"					
	W		-(2,07*7,09+1,62+1,12+0,62)		-18,036			
	W		Součet		-18,036			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
300	K	300-DP.1	Montáž a dodávka, záchodová štelka závěsná, nerez, viz specifikace X15	m2	30,000	5 437,70	163 131,00	vlastní
	W		"CN na střihané betony - zpevnění chvilného zdiva"					
	W		30,00"viz. příloha č. 1 samostatná cenová kalkulace		30,000			
	W		Součet		30,000			
	W		"cenová nabídka povýšena o +10%"					
D	998		Přesun hmot				-1 674,83	

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	998012102	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-22,331	75,00	-1 674,83	D.1.1-Sod
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				19 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				19 000,00	
301	K	011103000	Geotechnický průzkum - přístavba učeben zápis ze dne 9.7.2026	soubor	1,000	2 900,00	2 900,00	vlastní
VV			"Zápis geotechnika a zpracování zatřídění zemin pro objekt přístavby učeben ze dne 9.7.2026"		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
302	K	013002000	Projektové práce-DD pro zajištění stability stávajícího základu, zak. číslo 170 59 - 26 - nálezový stav	soubor	1,000	16 100,00	16 100,00	vlastní
VV			"DD pro zajištění stability stávajícího základu, zak. číslo 170 59 - 26 - nálezový stav"		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCENĚNÝ DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM								

nabídka na stříkané betony - zpevnění cihelného zdiva										
STAVBA:	Tuklaty									
ZADAVATEL	BFK service a.s.				Daniel Pavel tel: +420 605 108 883 E-mail: pavel@bfk.cz					
ZHOTOVITEL:	Podzemní stavby Brno, s.r.o.				Číslo nabídky: 1 vypracoval: Jan Zajíč, tel: 602 329 446 Datum: 29.07.2026					
Položka					Cena celkem					
					m.j.	množství	cena/m.j.	cena celkem Kč		
stříkané betony - zpevnění poloskalní stěny výkopu										
dopravní náklady					kmp	1,00	28 000,00	28 000,00		
dočistění stěny výkopu od lokálních nerovností					m²	30,000	110,00	3 300,00		
kotvičky z R10, délka 500 mm do stěny, na stavební lepidlo, 4 ks /1 m²					ks	120,000	55,00	6 600,00		
dodávka a instalace KARI sítě 100×100×8 mm, přesáhy 2 oka, 1 vrstva					m²	30,000	560,00	16 800,00		
dodávka a aplikace torcretu C25/30, tloušťka nástrihu 150 - 180 mm, povrch neupravený					m²	30,000	3 120,00	93 600,00		
*objednatel zajišťí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí										
*objednatel umožní zhotoviteli bezplatný odběr elektrického proudu a vody										
*objednatel umožní zhotoviteli bezplatné používání sociálního zařízení										
V nabídce nejsou zahrnuty náklady na zimní opatření, geodetické práce, za odvoz a likvidaci spadu a odtěženého materiálu.										
Předpokládána spotřeba betonu pro danou plochu je 7 m³. Cena za nadsypěbu betonu (m³ vysřřkaného betonu, tedy včetně spadu, nad předpokládané množství 7 m³ - bude dokladováno dle dodacích listů) 12 500 Kč.										
Splatnost faktur 14 kalendářních dnů, fakturace bez zádržného dle skutečně provedených prací na základě jednotkových cen v nabídce uvedených. Platnost nabídky do 30.10.2026										
Celkem bez DPH					148 300,00 Kč			rezerva 0	jednotková cena za 1 m² je 4 943 Kč	

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(ve smyslu přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb.)

Akce	Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben
Stavebník	obec Tuklaty, Na Valech 19, 25082 Tuklaty
Lokalita	p.č. st. 34, katastrální území Tuklaty
Zakázkové číslo	170 59 – 26
Věc	Zajištění stability stávajícího základu

Obsah:

1.	Popis zjištěných skutečností	1
2.	Podklady	2
3.	Fotodokumentace	3
4.	Návrh opatření - závěr	8
5.	Sestavil	8
6.	Přílohy	8

1. Popis zjištěných skutečností

Dne 13.07.2026 a 22.07.2026 byla provedena obhlídka na místě samém.

V současné době je prováděn výkop hlavní stavební jámy. Zhotovitel provedl dvě bagrové sondy pro ověření charakteru zemin a hornin pod stávajícím základovým pasem Základní školy.

Na místě bylo zjištěno, že se pod stávajícími základy nachází hornina, kterou lze charakterizovat jako R4 – prachovec navětralý.

V provedených sondách byl ověřen sklon horninových vrstev:

- 1) v sondě kolmé k jihovýchodnímu průčelí byl zjištěn sklon horninových vrstev směrem pod základní školu – vyhovuje, pro zajištění stability a hlavně ochranu podzákladových hornin navrhujeme ochranu hornin jednak **torkretem** s kotvenou sítí SZ8/100-8/100 (KARI KY 49), kotvení 2Ø10/m² – viz přiložená skica nebo **přibetonování stěny** o tl. 150 – 180 mm z betonu C25/30 s kotvenou sítí SZ8/100-8/100 (KARI KY 49), kotvení 2Ø10/m²

3. Fotodokumentace

Pohled
do hlavní
jámy



Pohled
do hlavní
jámy



Pohled
na sondu
u
jihozápadní-
ho průčelí



Pohled
na sondu
u
jihozápadní-
ho průčelí



Pohled
na sondu
u
jihovýchodní
-ho průčelí





TUKATY

POMBA DO SANDY

TOEKRET
STP Ø100 - 8/100
KOTU 2 Ø10/100

23.07.2026 Plus

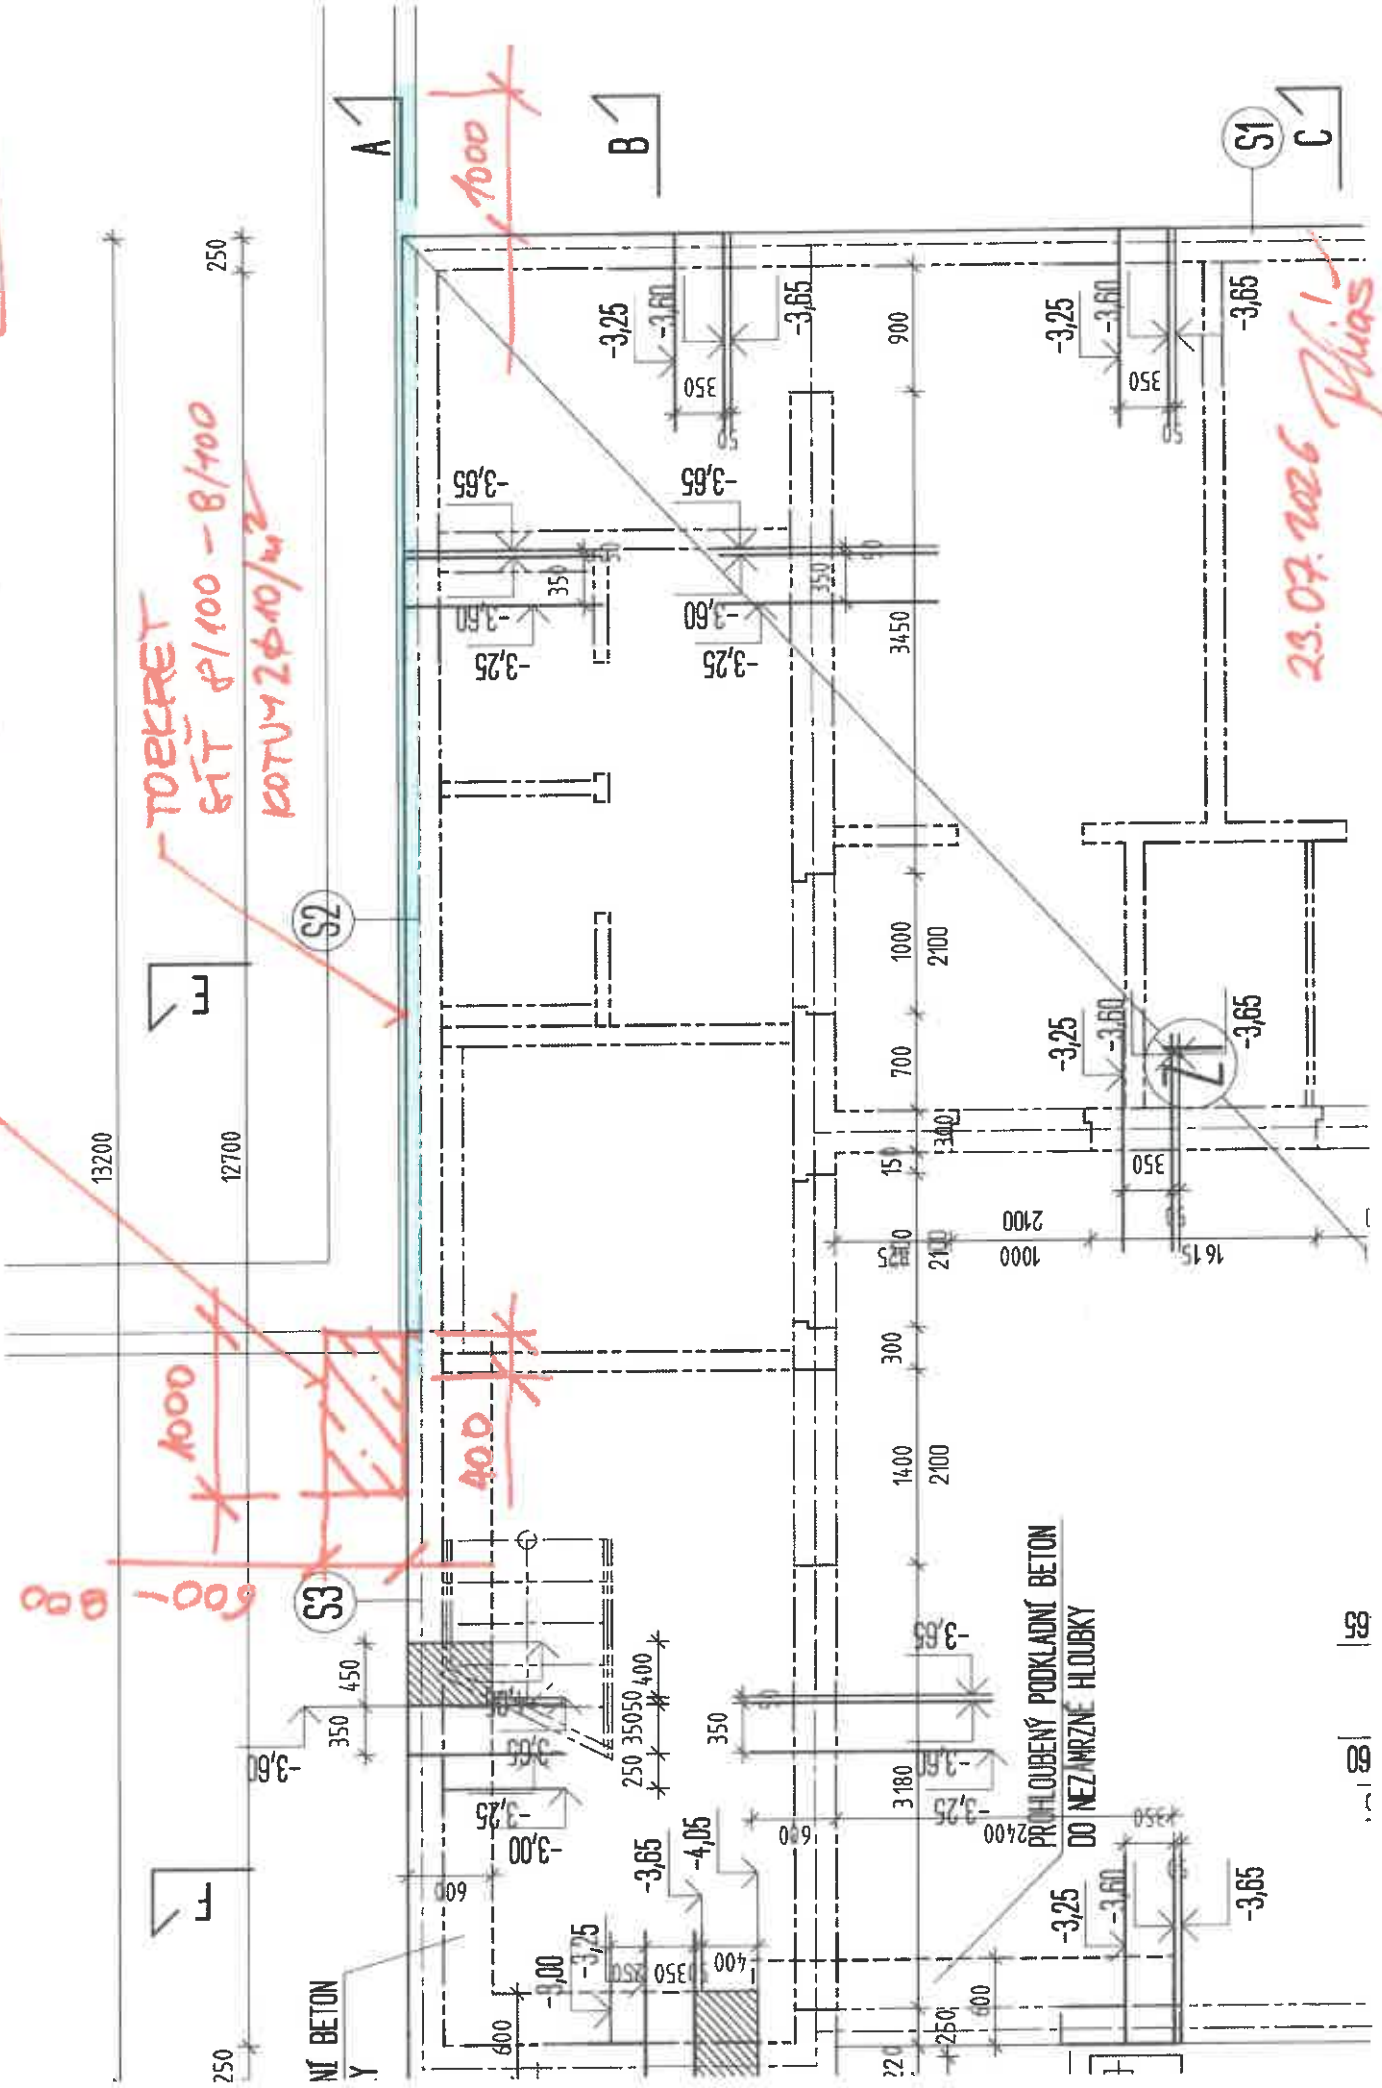

ZMENOVÝ LIST		číslo ZL : 04
Zhotovitel : BFK service a. s. Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Obec Tuklaty Na Valech 19 250 82, Tuklaty IČO : 00235822 DIČ : CZ00235822		Kontrola za TDI Dozoring s.r.o. Býchory 233 280 02 Kolin Jan Říha; jan.riha@dozoring.cz tel.: 721 711 117
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 06.08.2026		Stavba: „Základní škola Tuklaty - Přístavba tělocvičny a učeben“
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace z 02/2024 zpracovaná firmou INGARA s.r.o. Veverkova 1218 500 02 Hradec Králové Ing. Aleš Řada, GP a AD tel.: 739 207 686 Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo ze dne 28.05.2026 "ZŠ Tuklaty - přístavba tělocvičny a učeben"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: ZL04 řeší požadavek objednatele na odstranění stávajícího tenisového kurtu, včetně venkovního mobiliáře. Dále je započítána betonová plomba, včetně výkopu sondy pro ověření stavu stávajících základových pasů ZŠ Tuklaty, ke které nově bude připojena přístavba učeben a tělocvičny, viz. odkaz na ZL č. 03 dle nového řešení tzv. Torkret viz. Technická dokumentace pro provedení stavby zak. číslo 170 59 - 26, autorizovaná Ing. Zdeňkem Dobiášem, který ZL č. 03 neobsahoval a nově je připojeno v tomto ZL č. 04. Přílohou č. 1 je pasport původního stavu před demontáží tenisového kurtu a kopie vážných listků příloha č. 2 Cenové vyčíslení: Cena bez DPH 186 462,86 Kč Tento ZL č. 04 má vliv na dokončení díla		
Generální zhotovitel:  Ing. Jiří Fořt, člen představenstva		Odsouhlasení objednatelem:  Tomáš Kolínský, místostarosta obce Monika Petrisková, starostka
		Odsouhlasení TD:  Jan Říha, TDI, KOOBOZP

stavba: „Základní škola
objekty: Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben “
díl: "D1.1 - ARSČ"
díl: "vícepráce a méněpráce ZL č. 04"
objednatel: "Obec Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 05.08.2026

REKAPITULACE - ZL č. 04

"D1.1 - ARSČ"

D.1.1-ARSČ_zajištění stabilizace stávajících základů ZŠ Tuklaty

Přípočty	1 - Zemní práce	29 495,45 Kč
Přípočty	2 - Zakládání	18 138,00 Kč
Přípočty	5 - Komunikace pozemní	61 200,00 Kč
Přípočty	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	2 868,80 Kč
Přípočty	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 075,50 Kč
Přípočty	997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	53 082,93 Kč
Přípočty	998 - Přesun hmot	602,18 Kč
Přípočty	VRN6 - Územní vlivy	10 000,00 Kč

Celkem přípočty	186 462,86 Kč
Celkem odpočty	- Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 04, bez DPH	186 462,86 Kč
21% DPH	39 157,20 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 04, s DPH	225 620,06 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 222
Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

KSO: 801 32
Místo: CC-CZ: 06.08.2026
Datum:

Zadavatel:
Obec Tuklaty
IČ: 27155153
DIČ: CZ27155153

Zhotovitel:
BFK service a.s.
IČ: 06553044
DIČ:

Projektant:
INGARA s.r.o.
IČ: 06553044
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 186 462,86

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	186 462,86	39 157,20
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 225 620,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 222

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

Místo:

06.08.2026

Zadavatel:

Obec Tuklaty
BFK service a.s.

Projektant:

INGARA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

186 462,86 225 620,06

ZL04

D.1.1-ARSC_odstranění svrchní části tenisového
kurtu a ostatní

186 462,86 225 620,06

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4
Objekt: **ZL04 - D.1.1-ARSČ_odstranění svrchní části tenisového kurtu a ostatní**

KSO: 801 32
Místo:

Zadavatel: Obec Tuklaty
Zhotovitel: BFK service a.s.
Projektant: INGARA s.r.o.
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 06.08.2026
Datum:

IČ: DIČ:
IČ: 27155153
DIČ: CZ27155153
IČ: 06553044
DIČ:
IČ: 06553044
DIČ:

Cena bez DPH		186 462,86	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	186 462,86 0,00	21,00% 12,00%	39 157,20 0,00
Cena s DPH		225 620,06	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4
Objekt: ZL04 - D.1.1-ARSČ_odstranění svrchní části tenisového kurtu a ostatní
Místo:
Zadavatel: Obec Tuklaty
Zhotovitel: BFK service a.s.

Datum: 06.08.2026
Projektant: INGARA s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	29 495,45
2 - Zakládání	18 138,00
5 - Komunikace pozemní	61 200,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 868,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 075,50
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	53 082,93
998 - Přesun hmot	602,18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

Objekt:

ZL04 - D.1.1-ARSČ_odstranění svrchní části tenisového kurtu a ostatní

Místo:

Datum: 06.08.2026

Zadavatel:

Obec Tuklaty

Projektant: INGARA s.r.o.

Zhotovitel:

BFK service a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				186 462,86	
D	1		Zemní práce				176 462,86	
405	K	113204111	Vytrhání obru s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z obrubníků betonových nebo kamenných, šířky do 100 mm	m	60,000	65,70	3 942,00	CS ÚRS 2026 02
	W		"Odstranění stávajícího sportovního hřiště"		60,000			
	W		(20,00+10,00)*2*viz. skica č. 1		60,000			
	W		Součet					
103	K	122551103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3	m3	16,500	1 030,00	16 995,00	ZL01
	W		"DD pro zajištění stability stávajícího základu, zak. číslo 170 59 - 26 - nálezový stav"		16,500			
	W		(5,00*1,00)*3,30*sonda 1		16,500			
	W		Součet					
	W		"Zápis ve SD Ing. Zákostelecký - geolog"					
411	K	162251141	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m	m3	16,500	69,70	1 150,05	CS ÚRS 2026 02
	W		"DD pro zajištění stability stávajícího základu, zak. číslo 170 59 - 26 - nálezový stav"		16,500			
	W		(5,00*1,00)*3,30*sonda 1		16,500			
	W		Součet					
	W		"Zápis ve SD Ing. Zákostelecký - geolog"					
106	K	162551148	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	3,200	197,00	630,40	ZL01
	W		"DD pro zajištění stability stávajícího základu, zak. číslo 170 59 - 26 - nálezový stav"		3,200			
	W		(1,00*1,00)*3,20*sonda 1 - beton C25/30		3,200			
	W		Součet					
	W		"Zápis ve SD Ing. Zákostelecký - geolog"					
	W		"Změna vzdálenosti a skladkové dle dohody s objednatelém_06/2026"					
107	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	16,500	286,00	4 719,00	ZL01
	W		"DD pro zajištění stability stávajícího základu, zak. číslo 170 59 - 26 - nálezový stav"		3,200			
	W		(1,00*1,00)*3,20*sonda 1 - beton C25/30 - odvoz na deponii		13,300			
	W		(16,50-3,20)*zpětný zásyp		16,500			
	W		Součet					
	W		"Zápis ve SD Ing. Zákostelecký - geolog"					
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	16,500	20,00	330,00	D.1.1-Sod
	W		"DD pro zajištění stability stávajícího základu, zak. číslo 170 59 - 26 - nálezový stav"		3,200			
	W		(1,00*1,00)*3,20*sonda 1 - beton C25/30 - odvoz na deponii		13,300			
	W		(16,50-3,20)*zpětný zásyp					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16,500								
12	K	174151103	Zásyp spaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	13,300	130,00	1 729,00	D.1.1-Sod
			"DD pro zajištění stability stávajícího základu, zak. číslo 170 59 - 26 - nálezoový stav"		13,300			
			Součet		13,300			
			"Zápis ve SD Ing. Zákostelecký - geolog"					
18 138,00								
D	2		Zakládání					
410	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	3,200	4 710,00	15 072,00	CS ÚRS 2026 02
			"DD pro zajištění stability stávajícího základu, zak. číslo 170 59 - 26 - nálezoový stav"		3,200			
			Součet		3,200			
			"Zápis ve SD Ing. Zákostelecký - geolog"					
408	K	275356021	Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné zřízení	m2	4,200	582,00	2 444,40	CS ÚRS 2026 02
			"DD pro zajištění stability stávajícího základu, zak. číslo 170 59 - 26 - nálezoový stav"		4,200			
			Součet		4,200			
409	K	275356022	Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné odstranění	m2	4,200	148,00	621,60	CS ÚRS 2026 02
			"DD pro zajištění stability stávajícího základu, zak. číslo 170 59 - 26 - nálezoový stav"		4,200			
			Součet		4,200			
61 200,00								
D	5		Komunikace pozemní					
404	K	579211120.R1	Demontáž strojně litý pryzový povrch se šetrkovou vrstvou f 4-8 tl. skladby do 50mm s plochou do 300 m2	m2	200,000	306,00	61 200,00	vlastní
			"Odstranění stávajícího sportovního hřiště"		200,000			
			Součet		200,000			
2 868,80								
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
412	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýtim tlakovou vodou	m2	32,600	88,00	2 868,80	CS ÚRS 2026 02
			"DD pro zajištění stability stávajícího základu, zak. číslo 170 59 - 26 - nálezoový stav"		19,800			
			(5,00+1,00)*3,30"sonda 1		12,800			
			(3,00+1,00)*3,20"sonda 2		32,600			
			Součet					
11 075,50								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
400	K	966001211	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované	kus	4,000	739,00	2 956,00	CS ÚRS 2026 02
			"Odstranění stávajícího sportovního hřiště"		4,000			
			4"viz. skica č. 1 - odstranění stávajícího venkovního mobiliáře - lavička		4,000			
			Součet					
401	K	966001211.R1	Odstranění stolu	kus	1,000	300,00	300,00	vlastní
			"Odstranění stávajícího sportovního hřiště"		1,000			
			1"viz. skica č. 1 - odstranění stávajícího venkovního mobiliáře - stůl		1,000			
			Součet					
402	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	15,000	430,00	6 450,00	CS ÚRS 2026 02
			"Odstranění stávajícího sportovního hřiště"		15,000			
			13+2"viz. skica č. 1 - odstranění stávajícího venkovního oplocení					
			"odstranění ocel trubek a jacky fotbalových bran, které byly obetonovány"					
403	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	15,000	91,30	1 369,50	CS ÚRS 2026 02
			"Odstranění stávajícího sportovního hřiště"		15,000			
			13+2"viz. skica č. 1 - odstranění stávajícího venkovního oplocení					
			"odstranění ocel trubek a jacky fotbalových bran, které byly obetonovány"					
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				53 082,93	

IPČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění		t	25,075	133,00	3 334,98	ZL02
	VV		"Odstranění stávajícího sportovního hřiště"						
	VV		60,00*0,227"stávající záhradní obrubníky s betonovou opěrou a ložem			13,620			
	VV		(13+2)*0,183"viz. skica č. 1 - odstranění stávajícího venkovního oplocení			2,745			
	VV		(20,00*10,00)*0,04355"viz. skica č. 1 - plocha hřiště			8,710			
	VV		Součet			25,075			
202	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		t	25,075	315,00	7 898,63	ZL02
	VV		"Odstranění stávajícího sportovního hřiště"						
	VV		60,00*0,227"stávající záhradní obrubníky s betonovou opěrou a ložem			13,620			
	VV		(13+2)*0,183"viz. skica č. 1 - odstranění stávajícího venkovního oplocení			2,745			
	VV		(20,00*10,00)*0,04355"viz. skica č. 1			8,710			
	VV		Součet			25,075			
203	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		t	225,675	13,80	3 114,32	ZL02
	VV		"Odstranění stávajícího sportovního hřiště"						
	VV		60,00*0,227"stávající záhradní obrubníky s betonovou opěrou a ložem			122,580			
	VV		(13+2)*0,183"viz. skica č. 1 - odstranění stávajícího venkovního oplocení			24,705			
	VV		((20,00*10,00)*0,04355)*9"skládka 10km Český Brod			78,390			
	VV		Součet			225,675			
406	K	9970136-R	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) – objemný odpad, kód odpadu 20 03 07		t	8,710	3 690,00	32 139,90	vlastní
			Poznámka k položce						
			Řízená skládka dle platného ceníku 3 690 Kč/t, cena včetně manipulace, vážení, administrativní poplatek a uložení +15%						
	VV		"Odstranění stávajícího sportovního hřiště"			8,710			
	VV		(20,00*10,00)*0,04355"viz. skica č. 1			8,710			
	VV		Součet						
	VV		"JC vychází z aktuálního ceníku AVE + 15%"						
407	K	997013861.R2	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 - vybraná skládka		t	16,365	403,00	6 595,10	vlastní
	P		Poznámka k položce:						
	VV		Řízená skládka dle platného ceníku 350 Kč/t, cena včetně uložení a zvlázení + 15%						
	VV		"Odstranění stávajícího sportovního hřiště"						
	VV		60,00*0,227"stávající záhradní obrubníky s betonovou opěrou a ložem			13,620			
	VV		(13+2)*0,183"viz. skica č. 1 - odstranění stávajícího venkovního oplocení			2,745			
	VV		Součet			16,365			
	VV		"JC vychází z aktuálního ceníku + 15%"						
D		998	Přesun hmot					602,18	
118	K	998012102	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukci tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m		t	8,029	75,00	602,18	D.1.1-Sod
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					10 000,00	
D		VRN6	Územní vlivy					10 000,00	
413	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů		soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 02
	VV		"Odstranění stávajícího sportovního hřiště"						
	VV		1,00"návoz mechanizace			1,000			
			POLOŽKY TAKTO Označené JSOU OCEŇOVÁNY DLE ÚRS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM						

LIKVIDACE LITÉ PRYŽE SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

ZAHÁJENO 16.7.2026

PLOCHA: 200m²

TLOUŠŤKA: 40 až 50mm

POPIS LIKVIDACE: sejmutí a rozdělení na menší kry pásovým rypadlem, následný přesun do kontejneru nákladního auta a převoz kaučuku k likvidaci.



AVE Kolín s.r.o.
Shromaždiště a překladiště odpadů Kolín V
Třídvorská 1501 Kolín V
IČ 25148117 DIČ CZ25148117

SQL CALYPSO 32 v.6.5

Označení vozidla: 5SZ 8436

Vážní lístek č.: 6105235

Místo vzniku:

DESKY CZ s.r.o. Tuklaty

IČ:

DIČ:

Dodavatel:

DESKY CZ s.r.o.

SAP: 0023904516

Činnosti na ORP Kolín

ČESKÝ BRD

280 02 Kolín

IČ: 17381801

DIČ: CZ17381801

Provozovna příjemce

AVE Kolín s.r.o.

Shromaždiště a překladiště odpadů Kolín V

Třídvorská 1501 Kolín V

IČ 25148117 DIČ CZ25148117

IČZ: CZS01220

Sídlo příjemce

AVE Kolín s.r.o.

Třídvorská 1501

28002 Kolín V

IČ: 25148117

DIČ: CZ25148117

Převpravce: 2084

AVE Kolín s.r.o.

Třídvorská 1501

280 02 Kolín V

IČ: 25148117

SAP: 0022105201

DIČ: CZ25148117

Zboží: O 200307

Objemný odpad

200307 Objemný odpad

Vážení	Datum	Číslo vážení	Brutto	Netto
1. vážení	27.07.2026 10:10	119687	21,62 t	
2. vážení	27.07.2026 10:10	119688	12,91 t	8,71 t

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP, PO a riziky v areálu

Příjemce odpadu tímto potvrzuje přijetí výše uvedeného odpadu
ve výše uvedeném množství

Vystavil:

Přijal:

oberbda

Mikuš

Interní informace

Text: kont. č.1783

Poznámka:

Odvolávka 130909863

Smlouva 4516003733

Atest:

Topologie: PRENOV

Sektor: Překladiště Kolín NOVÝ

3

Rastr/Vrstva:

SAP: CKO1002

Směr pohybu: příjem

Informujeme vás, že dochází ke zpracování vašich osobních údajů skupinou firem AVE CZ, pro účely plnění smluvního vztahu.
Více o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje se dozvíte na naší webové stránce <http://www.ave.cz/cs/ochrana-udaju>

ZMENOVY LIST		číslo ZL : 05
Zhotovitel : BFK service a. s. Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Obec Tuklaty Na Valech 19 250 82, Tuklaty IČO : 00235822 DIČ : CZ00235822		Kontrola za TDI Dozoring s.r.o. Býchory 233 280 02 Kolín Jan Říha; jan.riha@dozoring.cz tel.: 721 711 117
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 28.08.2026		Stavba: „Základní škola Tuklaty - Přístavba tělocvičny a učeben“
Odkazy na dokumentaci :		Projektová dokumentace z 02/2024 zpracovaná firmou INGARA s.r.o. Veverkova 1218 500 02 Hradec Králové Ing. Aleš Řada, GP a AD tel.: 739 207 686
na rozpočet :		Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo ze dne 28.05.2026
na jednání na akci:		"ZŠ Tuklaty - přístavba tělocvičny a učeben"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: ZL05 řeší požadavek objednatele na odstranění stávajícího přístřešku k ZŠ. Toto nebylo součástí PD a rozpočtu, neboť se předpokládalo, že v době realizace stavby budou tyto dočasné objekty objednatelem odstraněny. Přílohou č. 1 je pasport původního stavu před demontáží přístavku a přílohou č. 2 je technický popis		
Cenové vyčíslení: Cena bez DPH 94 000,54 Kč		
Tento ZL č. 05 má vliv na dokončení díla		
Generální zhotovitel:  Ing. Jiří Fořt, člen představenstva		Odsouhlasení objednatelem: Tomáš Kolínský, místostarosta obce Monika Petrisková, starostka
		Odsouhlasení TD: Jan Říha, TDI, KOOBOZP

stavba: „Základní škola
objekty: Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben “
díl: "D1.1 - ARSČ"
objednatel: "vícepráce a méněpráce ZL č. 05"
"Obec Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 28.08.2026

REKAPITULACE - ZL č. 05

"D1.1 - ARSČ"

D.1.1-ARSČ_demontáž dřevostavby a ostatní

Přípočty	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 214,58 Kč
Přípočty	997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	30 276,64 Kč
Přípočty	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	746,66 Kč
Přípočty	712 - Povlakové krytiny	919,68 Kč
Přípočty	713 - Izolace tepelné	2 018,04 Kč
Přípočty	762 - Konstrukce tesařské	11 237,88 Kč
Přípočty	763 - Konstrukce suché výstavby	12 407,03 Kč
Přípočty	764 - Konstrukce klempířské	2 223,49 Kč
Přípočty	765 - Krytina skládaná	846,64 Kč
Přípočty	766 - Konstrukce truhlářské	109,90 Kč

Celkem přípočty	94 000,54 Kč
Celkem odpočty	- Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 05, bez DPH	94 000,54 Kč
21% DPH	19 740,11 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 05, s DPH	113 740,65 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 222 Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

KSO: 801 32 CC-CZ: 28.08.2026
Místo:
Zadavatel: Obec Tuklaty
Zhotovitel: BFK service a.s.
Projektant: INGARA s.r.o.
Zpracovatel: 27155153
27155153
06553044
06553044
IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		94 000,54
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 19 740,11
	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	113 740,65
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 222

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

Místo:

Datum:

28.08.2026

Zadavatel:

Obec Tuklaty
BFK service a.s.

Projektant:

INGARA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
ZL05.R1	D.1.1-ARSC_demontáž dřevostavby a ostatní	94 000,54	113 740,65
		94 000,54	113 740,65

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4
Objekt: ZL05.R1 - D.1.1-ARŠČ_demontáž dřevostavby a ostatní

KSO:	801 32	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28.08.2026
Zadavatel:	Obec Tuklaty	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	BFK service a.s.	IČ:	27155153
		DIČ:	CZ27155153
Projektant:	INGARA s.r.o.	IČ:	06553044
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	06553044
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH

94 000,54

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	94 000,54	21,00%	19 740,11
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

113 740,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4
Objekt: ZL05.R1 - D.1.1-ARŠČ_demontáž dřevostavby a ostatní
Místo:
Zadavatel: Obec Tuklaty
Zhotovitel: BFK service a.s.

Datum: 28.08.2026
Projektant: INGARA s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	94 000,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 491,22
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	33 214,58
PSV - Práce a dodávky PSV	30 276,64
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	30 509,32
712 - Povlakové krytiny	746,66
713 - Izolace tepelné	919,68
762 - Konstrukce tesařské	2 018,04
763 - Konstrukce suché výstavby	11 237,88
764 - Konstrukce klempířské	12 407,03
765 - Krytina skládaná	2 223,49
766 - Konstrukce truhlářské	846,64
	109,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

Objekt: ZL05.R1 - D.1.1-ARSČ_demontáž dřevostavby a ostatní

Místo:

Zadavatel: Obec Tuklaty

Zhotovitel: BFK service a.s.

Datum: 28.08.2026

Projektant: INGARA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	g		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
500	K	961055111	Bourání základů z betonu železobetonového	m3	2,522	8 040,00	20 276,88	CS ÚRS 2026 02
P			Poznámka k položce:					
W			odkaz na výkres skica 1					
W			"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"		2,522			
W			((3,40*3,50)-(2,20*1,00))*0,070"plocha desky /základová deska ŽB/		2,522			
W			Součet				94 000,54	
504	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,679	4 290,00	2 912,91	CS ÚRS 2026 02
W			"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"		0,679			
W			((3,40*3,50)-(2,20*1,00))*0,070"plocha desky /betonová mazaninam vč. Karí sítě 150x150x6/		0,679			
W			Součet		0,679			
505	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,679	2 390,00	1 622,81	CS ÚRS 2026 02
W			"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"		0,679			
W			((3,40*3,50)-(2,20*1,00))*0,070"plocha desky /betonová mazaninam vč. Karí sítě 150x150x6/		0,679			
W			Součet		0,679			
532	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1 920	451,00	865,92	CS ÚRS 2026 02
W			"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"		1,920			
W			1,20*1,60"stávající dvoukřídle okno		1,920			
W			Součet		1,920			
531	K	968082021	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1 890	297,00	561,33	CS ÚRS 2026 02
W			"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"		1,890			
W			0,90*2,10"stávající plastové dveře		1,890			
W			Součet		1,890			
529	K	978035127	Odstanění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%	m2	33 213	210,00	6 974,73	CS ÚRS 2026 02
W			"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"		33,213			
W			2,50*2,55+2,20*2,35+(2,20*0,25/2)+1,00*2,35+1,20*2,28+(1,20*0,25/2)+3,50*2,28+3,40*2,40+(3,40*0,25/2)" stěny + výměny		33,213			
W			"odpočet otvorů"		33,213			
W			Součet		33,213			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				30 276,64	
201	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	l	11,460	133,00	1 524,18	ZL02
W			"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"		7,577			
W			(6,053+1,494+0,030)*žlb		0,338			
W			0,338"plasty-výplně otvorů"					

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	W		0,158"směsný odpad suť		0,158			
W	W		0,072"HI proti vodě asfaltové		0,072			
W	W		(0,043+0,002)"povlakové krytiny PVC a pojistné fólie		0,045			
W	W		0,024"TI - polystyrén		0,024			
W	W		(1,526-0,024)"TI - MV		1,502			
W	W		0,692"dřevěnné kce kpl		0,692			
W	W		0,980"0,80"SDK kce bez profilů		0,784			
W	W		0,980-0,784"SDK - FeZN profily		0,196			
W	W		0,053"klempířské kce kpl		0,053			
W	W		0,019"ostatní geotextilie		0,019			
			Součet		11,460			
530	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění a separace jednotlivých kategorií ruční	t	11,460	529,00	6 062,34	CS ÚRS 2026 02
W	W		"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
W	W				11,460			
			Součet		11,460			
202	K	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,211	315,00	3 531,47	ZL02
W	W		"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
W	W		(6,053+1,494+0,030)"žlb		7,577			
W	W		0,338"plasty-výplně otvorů		0,338			
W	W		0,158"směsný odpad suť		0,158			
W	W		0,072"HI proti vodě asfaltové		0,072			
W	W		(0,043+0,002)"povlakové krytiny PVC a pojistné fólie		0,045			
W	W		0,024"TI - polystyrén		0,024			
W	W		(1,526-0,024)"TI - MV		1,502			
W	W		0,692"dřevěnné kce kpl		0,692			
W	W		0,980"0,80"SDK kce bez profilů		0,784			
W	W		0"SDK - FeZN profily		0,000			
W	W		0"klempířské kce kpl		0,000			
W	W		0,019"ostatní geotextilie		0,019			
			Součet		11,211			
203	K	997013509	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	100,899	13,80	1 392,41	ZL02
W	W		"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
W	W		(11,211)"9"skládka 10km Český Brod /Technické služby Český Brod/		100,899			
			Součet		100,899			
406	K	9970136-R	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) – objemný odpad, kód odpadu 20 03 07	t	3,634	3 690,00	13 409,46	ZL04
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W	W		Řízená skládka dle platného ceníku 3 690 Kč/t, cena včetně manipulace, vážení, administrativní poplatek a uložení +15%					
W	W		"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
W	W		0,158"směsný odpad suť		0,158			
W	W		0,338"plasty-výplně otvorů		0,338			
W	W		0,072"HI proti vodě asfaltové		0,072			
W	W		(0,043+0,002)"povlakové krytiny PVC a pojistné fólie		0,045			
W	W		0,024"TI - polystyrén		0,024			
W	W		(1,526-0,024)"TI - MV		1,502			
W	W		0,692"dřevěnné kce kpl		0,692			
W	W		0,980"0,80"SDK kce bez profilů		0,784			
W	W		0,019"ostatní geotextilie		0,019			
			Součet		3,634			
204	K	997013862.R1	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 - vybraná skládka	t	7,577	575,00	4 356,78	ZL02
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W	W		Řízená skládka dle platného ceníku 500Kč/t, cena včetně uložení a zvážení + 15%					
W	W		"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
W	W		(6,053+1,494+0,030)"žlb		7,577			
			Součet		7,577			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 509,32	
D	711		Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				746,68	
501	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přilavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé	m2	9,700	51,90	503,43 CS ÚRS 2026 02	
			Poznámka k položce: odkaz na výkres skica 1 "Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě" ((3,40*3,50)-(2,20*1,00))*plocha desky /Hl vodorovná/ Součet		9,700 9,700			
502	K	711142811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přilavených pásů NAIP z plochy svislé S jednovrstvé	m2	3,450	70,50	243,23 CS ÚRS 2026 02	
			Poznámka k položce: odkaz na výkres skica 1 "Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě" (3,40*3,50)*2*0,25*presahy desky /Hl svislá/ Součet		3,450 3,450			
D	712		Povlakové krytiny				919,68	
518	K	712363801	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do trápezového plechu nebo do dřeva	m2	11,975	76,80	919,68 CS ÚRS 2026 02	
			"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě" 11,975*plocha střechy a přesah /mechanicky kotvená PVC fólie do dřeva/ Součet		11,975 11,975			
D	713		Izolace tepelné				2 018,04	
511	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	9,700	50,00	485,00 CS ÚRS 2026 02	
			"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě" ((3,40*3,50)-(2,20*1,00))*plocha desky /TI MV pod podhledem/ Součet		9,700 9,700			
503	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	9,700	20,40	197,88 CS ÚRS 2026 02	
			Poznámka k položce: odkaz na výkres skica 1 "Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě" ((3,40*3,50)-(2,20*1,00))*plocha desky /TI podlahová/ Součet		9,700 9,700			
512	K	713130813	Odstranění tepelné izolace stěn a přiček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	33,213	40,20	1 335,16 CS ÚRS 2026 02	
			"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě" 2,50*2,55+2,20*2,35+(2,20*0,25/2)*1,00*2,35+1,20*2,28+(1,20*0,25/2)+3,50*2,28+3,40*2,28+(3,40*0,25/2)" stěny + výměny /TI MV stěny/ Součet		33,213 33,213			
D	762		Konstrukce tesařské				11 237,88	
507	K	762112811	Demontáž stěn a přiček z polohraněného řeziva nebo tyčovin	m2	33,213	90,00	2 989,17 CS ÚRS 2026 02	
			"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě" 2,50*2,55+2,20*2,35+(2,20*0,25/2)+1,00*2,35+1,20*2,28+(1,20*0,25/2)+3,50*2,28+3,40*2,28+(3,40*0,25/2)" stěny + výměny Součet		33,213 33,213			
508	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	35,300	67,10	2 368,63 CS ÚRS 2026 02	
			"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě" 4*4,00+3*1,90+(3,40+3,40)*2"střešní krokve +obvod rámu Součet		35,300 35,300			
510	K	762341832	Demontáž bednění a laťování bednění sítích rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementofaškových, dřevostěpkových apod.)	m2	11,975	75,00	898,13 CS ÚRS 2026 02	

I	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
				"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
				((3,40*3,50)-(2,20*1,00))*plocha desky /plocha střechy/		9,700			
				(3,50*0,25+3,50*0,40))*plocha střechy- přesah		2,275			
				Součet		11,975			
509	K		762431825	Demontáž obložení stěn z dřevostěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky do 15 mm	m2	66,426	75,00	4 981,95	CS ÚRS 2026 02
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
				"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
				"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
				2,50*2,55+2,20*2,35+(2,20*0,25/2)+1,00*2,28+(1,20*0,25/2)*3,50*2,28+3,40*2,28+(3,40*0,25/2)) stěny + výměny		33,213			
				/int překližka 12mm/					
				2,50*2,55+2,20*2,35+(2,20*0,25/2)+1,00*2,28+(1,20*0,25/2)*3,50*2,28+3,40*2,28+(3,40*0,25/2)) stěny + výměny		33,213			
				/ext OSB 15mm/					
				Součet		66,426			
D	763			Konstrukce suché výstavby				12 407,03	
514	K		763221811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrováknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	33,213	279,00	9 266,43	CS ÚRS 2026 02
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
				"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
				2,50*2,55+2,20*2,35+(2,20*0,25/2)+1,00*2,28+(1,20*0,25/2)*3,50*2,28+3,40*2,28+(3,40*0,25/2)) stěny + výměny		33,213			
				Součet		33,213			
515	K		763231821	Demontáž podhledu ze sádrováknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	9,575	328,00	3 140,60	CS ÚRS 2026 02
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
				"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
				((3,35*2,50)+(1,20*1,00))*plocha desky /SDK podhled/		9,575			
				Součet		9,575			
D	764			Konstrukce klempířské				2 223,49	
519	K		764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m	10,300	60,50	623,15	CS ÚRS 2026 02
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
				"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
				3,50+3,40*2)plocha střechy a přesah /dmítz závětná lišta/		10,300			
				Součet		10,300			
521	K		764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krylině povlakové	m	3,500	45,40	158,90	CS ÚRS 2026 02
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
				"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
				3,50*plocha střechy a přesah /dmítz okap plechu/		3,500			
				Součet		3,500			
524	K		764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	1,200	114,00	136,80	CS ÚRS 2026 02
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
				"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
				1,20*plocha střechy a přesah /dmítz oplechování parapetů/		1,200			
				Součet		1,200			
523	K		764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	2,500	104,00	260,00	CS ÚRS 2026 02
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
				"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
				2,50*plocha střechy a přesah /dmítz lemování zdi/		2,500			
				Součet		2,500			
525	K		764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	3,500	110,00	385,00	CS ÚRS 2026 02
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
				"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
				3,50*plocha střechy a přesah /dmítz podokapního žlabu/		3,500			
				Součet		3,500			
526	K		764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti	kusů	6,000	58,80	352,80	CS ÚRS 2026 02
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
				"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
				6"plocha střechy a přesah /dmítz háku/		6,000			
				Součet		6,000			
527	K		764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	2,400	85,60	205,44	CS ÚRS 2026 02
W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
				"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
				2,40*plocha střechy a přesah /dmítz svodu/		2,400			
				Součet		2,400			

Prč Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
528	K 764004871	Demontáž klempířských konstrukcí objímek svodu včetně upevňovacích prostředků (trnů, hmoždinek apod.) do suti	kus	3,000	33,80	101,40	CS ÚRS 2026 02
	VV	"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
	VV	3"plocha střechy a přesah /dmř objímky svodu/		3,000			
	VV	Součet		3,000			
	D 765	Krytina skládaná				846,64	
513	K 765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	11,975	18,50	221,54	CS ÚRS 2026 02
	VV	"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
	VV	11,975"plocha střechy a přesah /pojistná HI/		11,975			
	VV	Součet		11,975			
516	K 113311171.R1	Odstanění geotextilií ve skladbě střech s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	23,950	26,10	625,10	vlastní
	VV	"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
	VV	11,975"2"plocha střechy a přesah /pojistná HI+pod PVC fólii/		23,950			
	VV	Součet		23,950			
	D 766	Konstrukce truhlářské				109,90	
533	K 766691922	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2	kus	2,000	34,20	68,40	CS ÚRS 2026 02
	VV	"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
	VV	2"stávající dvoukřídlé okno		2,000			
	VV	Součet		2,000			
534	K 766691924	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy do 2 m2	kus	1,000	41,50	41,50	CS ÚRS 2026 02
	VV	"Demontáž stávající dřevostavby-chodba ke kontejnerové třídě"					
	VV	1"stávající plastové dveře		1,000			
	VV	Součet		1,000			

5. Demontáž dřevostavby – chodba ke kontejnerové třídě.

- Přístavba chodby stála na pevných základech tvořených základovou žláb deskou, hydroizolací, tepelnou izolací a vyztuženou betonovou mazaninou.
- Skladba stěn dřevostavby z interiéru: SDK, překližka 12mm, hranoly 120x80, meziprostor hranolů vyplněn minerální vatou, parotěsná fólie, OSB 15mm, lepicí stěrková hmota vyztužená sklovláknitou tkaninou, finální omítka.
- Střecha chodby PVC, překližka.
- Pultová střecha 2,55v1 a 2,88 v2, klempířské kce

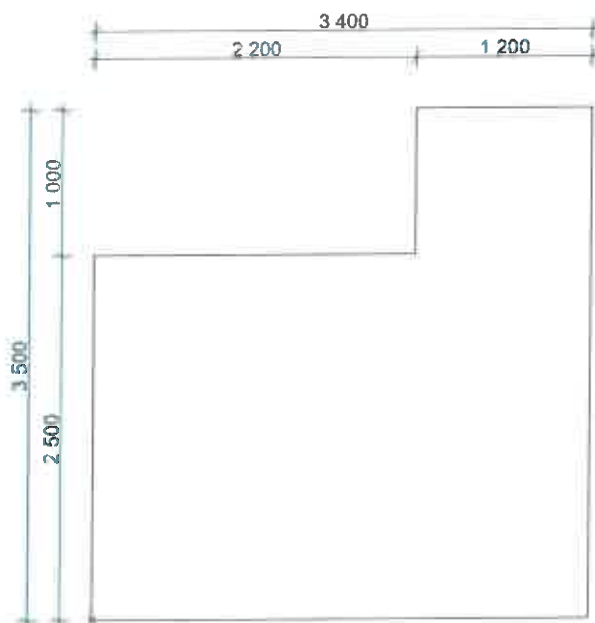

Lino	2mm
Betonová mazanina + KARI 150/150x6.	70mm
Polystyren	50mm
Hydroizolace	3mm
Betonová deska	260mm

ZMNOVY LIST		číslo ZL : 06
Zhotovitel : BFK service a. s. Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Obec Tuklaty Na Valech 19 250 82, Tuklaty IČO : 00235822 DIČ : CZ00235822	Kontrola za TDI Dozoring s.r.o. Býchory 233 280 02 Kolín Jan Říha; jan.riha@dozoring.cz tel.: 721 711 117	
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 06.08.2026		Stavba: „Základní škola Tuklaty - Přístavba tělocvičny a učeben“
Odkazy	na dokumentaci :	Projektová dokumentace z 02/2024 zpracovaná firmou INGARA s.r.o. Veverkova 1218 500 02 Hradec Králové Ing. Aleš Řada, GP a AD tel.: 739 207 686
	na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo ze dne 28.05.2026
	na jednání na akci:	"ZŠ Tuklaty - přístavba tělocvičny a učeben"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: ZL06 upravuje stav, kdy v prováděcí PD a VV je pod žlb základovou deskou lomová výsivka pro Z1 a Z11, přičemž na tuto lomovou výsivku má být provedena vodorovná asfaltová hydroizolace. S ohledem na budoucí přetížení od vrchní základové desky se skladbou by došlo k propíchnutí, tedy k nevratnému poškození a následným průsakům vody do základových kcí. Zároveň nelze provést fixaci bednění žlb do podkladu (lomové výsivky), a proto je náhrada za podkladový beton s přesahem ještě využita k tomuto účelu fixace		
Cenové vyčíslení: Cena bez DPH 290 613,57 Kč		
Tento ZL č. 06 má vliv na dokončení díla		
Generální zhotovitel:  Ing. Jiří Fořt, člen představenstva		Odsouhlasení objednatelem:  Tomáš Kolínský, místostarosta obce
		Monika Petrisková, starostka
		Odsouhlasení TD:  Jan Říha, TDI, KOBOZP

stavba: „Základní škola
objekty: Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben “
díl: "D1.1 - ARSČ"
objednatel: "vícepráce a méněpráce ZL č. 06"
"Obec Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty
zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 06.08.2026

REKAPITULACE - ZL č. 06

"D1.1 - ARSČ"

D.1.1-ARSČ_podkladový beton pod žlb desku

Přípočty	2 - Zakládání	323 833,99 Kč
Přípočty	998 - Přesun hmot	5 693,18 Kč
Odpočty	2 - Zakládání	38 913,60 Kč
Celkem přípočty		329 527,17 Kč
Celkem odpočty		38 913,60 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 06, bez DPH		290 613,57 Kč
21% DPH		61 028,85 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 06, s DPH		351 642,42 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 222

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

KSO: 801 32

Místo: CC-CZ: 06.08.2026
Datum:

Zadavatel:

Obec Tuklaty

Zhotovitel:

BFK service a.s.

Projektant:

INGARA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ: 27155153
DIČ: CZ27155153
IČ: 06553044
DIČ: 06553044
IČ: 06553044
DIČ:

Cena bez DPH

290 613,57

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
290 613,57
0,00

Výše daně
61 028,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

351 642,42

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 222

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

Místo:

06.08.2026

Zadavatel:

Obec Tuklaty
BFK service a.s.

Projektant:

INGARA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
ZL06	D.1.1-ARSČ_podkladový beton pod žlb desku	290 613,57	351 642,42
		290 613,57	351 642,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4
Objekt: ZL06 - D.1.1-ARSČ_podkladový beton pod žlb desku

KSO:	801 32	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	06.08.2026
Zadavatel:	Obec Tuklaty	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	BFK service a.s.	IČ:	27155153
		DIČ:	CZ27155153
Projektant:	INGARA s.r.o.	IČ:	06553044
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	06553044
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	290 613,57	
DPH základní snížená	Základ daně 290 613,57 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Vyše daně 61 028,85 0,00
Cena s DPH	▼ CZK	351 642,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Tukulaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4
Objekt: ZL06 - D.1.1-ARSČ_podkladový beton pod žlb desku
Místo:
Zadavatel: Obec Tukulaty
Zhotovitel: BFK service a.s.

Datum: 06.08.2026
Projektant: INGARA s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	290 613,57
2 - Zakládání	290 613,57
998 - Přesun hmot	284 920,39
	5 693,18


SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4
Objekt: ZL06 - D.1.1-ARŠČ_podkladový beton pod žilb desku
Místo:
Zadavatel: Obec Tuklaty
Zhotovitel: BFK service a.s.

Datum: 06.08.2026
Projektant: INGARA s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D	2	Zakládání						
15	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm	m3	-24,321	1 600,00	-38 913,60	D.1.1-Sod
			"Uprava spodní ochranné vrstvy pro spodní asfaltovou Hl"					
			"deska Z11"		-16,302			
			-13,2*24,7*0,05		-8,019			
			"deska Z1"		-24,321			
			-13,2*12,15*0,05					
			Součet				290 613,57	
600	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	53,506	4 440,00	237 566,64	CS ÚRS 2026 02
			"Uprava spodní ochranné vrstvy pro spodní asfaltovou Hl"					
			"deska Z11"		35,864			
			13,20*24,70*0,10		17,642			
			"deska Z1"		53,506			
			13,20*12,15*0,10					
			Součet					
601	K	273325912	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky Příplatek k cenám za úpravu povrchů desek přehlazením	m2	486,420	65,60	31 909,15	CS ÚRS 2026 02
			"Uprava spodní ochranné vrstvy pro spodní asfaltovou Hl"					
			"deska Z11"		326,040			
			13,20*24,70		160,380			
			"deska Z1"		486,420			
			13,20*12,15					
			Součet					
18	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	15,180	704,00	10 686,72	D.1.1-Sod
			"Uprava spodní ochranné vrstvy pro spodní asfaltovou Hl"					
			"deska Z1"		6,084			
			(2*13,2+2*12,15)*0,12		9,096			
			"deska Z11"		15,180			
			(2*13,2+2*24,7)*0,12					
			Součet					
19	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	15,180	286,00	4 341,48	D.1.1-Sod
			"Uprava spodní ochranné vrstvy pro spodní asfaltovou Hl"					
			"deska Z1"		6,084			
			(2*13,2+2*12,15)*0,12		9,096			
			"deska Z11"		15,180			
			(2*13,2+2*24,7)*0,12					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	273362021	Výzluž základů, desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,391	42 000,00	16 422,00	D.1.1-Sod
	VV		"Úprava spodní ochranné vrstvy pro spodní asfaltovou Hl"					
	VV		"Sít Kari SZ 4/150x150; á 1,35kg/m2"					
	VV		"deska Z11"		0,235			
	VV		(24,70+13,20+24,70+13,20)*2,00*1,35*1,15*0,001" pás široký 2,00m					
	VV		"deska Z1"		0,156			
	VV		(3,05+0,10+12,90+12,15+13,20)*2,00*1,35*1,15*0,001" pás široký 2,00m		0,391			
	VV		Součet					
602	K	801-01	Betonová pumpa 24m s výložníkem, včetně přístavění, odvoz, čištění a hodinové práce čerpadla	soubor	1,000	22 908,00	22 908,00	vlastní
			Poznámka k položce:					
			Skanska Transbeton s.r.o.					
			Čerpadlo s výložníkem 24m a hadice					
			90°30'=2 700Kč/ doprava lamizpět					
			1 250Kč/mytí 30min					
			2 800°5=14 000Kč/výkon čerpadla á 5hod/					
			625Kč/přídavek na rozjetí čerpadla/					
			200°5=1 000Kč/přídavné hadice/					
			1.250Kč/odvoz zbytkového betonu a likvidace					
			celkem: 20 825Kč +10%=> 22 908Kč					
			"Čerpání do volné hloubky betonové čerpadlo s výložníkem 24m"		1,000			
			1°cena složená viz. plný popis a poznámka		1,000			
			Součet					
	D	998	Přesun hmot				5 693,18	
118	K	998012102	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdíváním obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	75,909	75,00	5 693,18	D.1.1-Sod
			POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCENĚNY DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM					

ZMENOVY LIST		číslo ZL : 07
Zhotovitel : BFK service a. s. Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Obec Tuklaty Na Valech 19 250 82, Tuklaty IČO : 00235822 DIČ : CZ00235822		Kontrola za TDI Dozoring s.r.o. Býchory 233 280 02 Kolín Jan Říha; jan.riha@dozoring.cz tel.: 721 711 117
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 27.08.2026		Stavba: „Základní škola Tuklaty - Přístavba tělocvičny a učeben“
Odkazy na dokumentaci :		Projektová dokumentace z 02/2024 zpracovaná firmou INGARA s.r.o. Veverkova 1218 500 02 Hradec Králové Ing. Aleš Řada, GP a AD tel.: 739 207 686
na rozpočet :		Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo ze dne 28.05.2026
na jednání na akci:		"ZŠ Tuklaty - přístavba tělocvičny a učeben"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: ZL07 řeší nálezový stav, kdy při prováděných zemních pracích v místě odtěžení stavební jámy na pracovní plochu v místě budoucích základových pasů - přístavba tělocvičny byla zjištěna neúnosná zemina (rozbředlá část směrem k rybníčku). Po přizvání geologa v rámci převzetí základové spáry, následná provedená statická zkouška únosnosti fa Algeo Test s.r.o. (příloha č. 1) a následné vyhodnocení statikem byl požadavek na provedení 3 průzkumných vrtů dle skici situace (příloha č. 2), kterou zpracoval Ing. Zdeněk Dobiáš, dále viz. položkový rozpočet. Tento ZL č. 07 zohledňuje provedení 3 průzkumných vrtů do hl. 7,00m, včetně technického pažení proti závalu. V případě nedosažení únosného skalního podloží, bude tento ZL č. 07 aktualizován na skutečnou hloubku s cenovou aktualizací		
Cenové vyčíslení: Cena bez DPH 141 001,00 Kč		
Tento ZL č. 07 má vliv na dokončení díla		
Generální zhotovitel:  Ing. Jiří Fořt, člen představenstva		Odsouhlasení objednatelem:  Tomáš Kolínský, místostarosta obce
		Monika Petrisková, starostka
		Odsouhlasení TDI:  Jan Říha, TDI, KOOBOZP

stavba: „Základní škola
objekty: Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben “
díl: "D1.1 - ARSČ"
objednatel: "vícepráce a méněpráce ZL č. 07"
"Obec Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 27.08.2026

REKAPITULACE - ZL č. 07

"D1.1 - ARSČ" D.1.1-ARSČ_geologický průzkum v části tělocvičny směrem k rybníčku

Přípočty	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	141 001,00 Kč
Celkem přípočty		141 001,00 Kč
Celkem odpočty		- Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 07, bez DPH		141 001,00 Kč
21% DPH		29 610,21 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 07, s DPH		170 611,21 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 222

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

KSO: 801 32

Místo: CC-CZ: 27.08.2026

Zadavatel:

Obec Tuklaty

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BFK service a.s.

IČ: 27155153

DIČ: CZ27155153

Projektant:

INGARA s.r.o.

IČ: 06553044

DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 06553044

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

141 001,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

141 001,00

0,00

Výše daně

29 610,21

0,00

Cena s DPH

CZK

v

170 611,21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 222

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

Místo:

27.08.2026

Datum:

Zadavatel:

Obec Tuklaty
BFK service a.s.

Projektant:

INGARA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
ZL07	D.1.1-ARSC_geologický průzkum v části tělocvičny směrem k rybníčku	141 001,00	170 611,21

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

ZL07 - D.1.1-ARSČ_geologický průzkum v části tělocvičny směřem k rybníčku

KSO:

Místo:

801 32

Zadavatel:

Zhotovitel:

Obec Tuklaty

BFK service a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

INGARA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.08.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27155153

CZ27155153

IČ:

DIČ:

06553044

IČ:

DIČ:

06553044

Cena bez DPH			141 001,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	141 001,00	21,00%	29 610,21
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	170 611,21
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

Objekt:

ZL07 - D.1.1-ARSC_geologický průzkum v části tělocvičny směrem k rybníčku

Místo:

Zadavatel:

Obec Tuklaty

Zhotovitel:

BFK service a.s.

Datum:

27.08.2026

Projektant:

INGARA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

141 001,00

141 001,00

141 001,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

Objekt: ZL07 - D.1.1-ARŠČ_geologický průzkum v části tělocvičny směrem k rybníčku

Místo:

Zadavatel: Obec Tuklaty

Zhotovitel: BFK service a.s.

Datum: 27.08.2026

Projektant: INGARA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				141 001,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				141 001,00	
700	K	011114000.R1	Inženýrsko-geologický průzkum_A) geologické vrty na skalní podklad	sb	3,000	26 717,00	80 151,00	vlastní
Poznámka k položce:								
A) vrtné práce - geologické vrty na skalní podklad								
- potřeavek 3x průzkumné vrty do 7m skca Ing. Zdeněk Dobias								
- montáž a demontáž soupravy=>4 000,00Kč								
- vrtné práce 21mb x 2.000,00=>42 000,00Kč								
- technické výkony (pažení proti závalu)=>18 375,00Kč								
- přesun soupravy=>12 250,00Kč								
- doprava pracovníku a vozorku=>3 525,00Kč								
Celkem bez DPH: 80 150,00Kč								
701	K	011114000.R2	Inženýrsko-geologický průzkum_B) laboratorní zkoušky zemín, hodniny, podzemní vody	sb	1,000	22 100,00	22 100,00	vlastní
Poznámka k položce:								
B) laboratorní zkoušky zemín, hodniny, podzemní vody								
- indexové vlastnosti zemín, zkoušky pevnosti v prostém tlaku hornin, zařídění podle norem, fyzikálně-chemický rozbor vody pro stavební účely								
Celkem bez DPH: 22 100Kč								
702	K	011114000.R3	Inženýrsko-geologický průzkum_C) Vyhodnocení IG a HG průzkumu	sb	1,000	31 250,00	31 250,00	vlastní
Poznámka k položce:								
C) Vyhodnocení IG a HG průzkumu								
- náku a řešení archivních dat, dozor, řízení a vyhodnocení průzkumu, závěrečná zpráva měřicího-geologického průzkumu								
Celkem bez DPH: 31 250,00Kč								
703	K	011114000.R4	Inženýrsko-geologický průzkum_D) geodetické vytyčení polohopis a výškopis + skutečný stav - 3 průzkumné vrty	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	vlastní
Poznámka k položce:								
D) Vyhodnocení IG a HG průzkumu								
- náku a řešení archivních dat, dozor, řízení a vyhodnocení průzkumu, závěrečná zpráva měřicího-geologického průzkumu								
Celkem bez DPH: 7 500,00Kč								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 2 výjezdy					
VV			"Dodatečný geologický průzkum nad rámec PD, viz. nálezový stav neúnosné podloží pracovní plochy pro budoucí základy tělocvičny směr k rybníčku-08/2026					
VV			1,00"D) vytyčení polohopisu a výškopisu + skutečný stav - 3 průzkumné vrtý		1,000			
VV			Součet		1,000			
POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCENĚNY DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM								



PROTOKOL O ZKOUŠCE

číslo : 2026000110-01

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210

Typ zkoušky : **STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU**

Název organizace : ALGEO TEST s.r.o.

Adresa organizace : Ústecká 176/61, Praha 8, 184 00

Tel.: +420 602 671 072, +420 775 326 016

Název akce : ZŠ Tuklaty

Kód akce : 2026000110

Celkový počet stran protokolu : 3

Odběratel : BFK Service a.s.

Adresa odběratele : Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmuky

Místo provedení zkoušek : plocha v místě tělocvičny

Datum provedení zkoušek : 18.8.2026

(datum provedení jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)

Zkoušený předmět : základová spára

(podrobnější údaje viz formuláře zkoušek)

Použité zkušební postupy : **PP01**

poznámka : použitý zkušební postup PP01 je v souladu s následujícími dokumenty

ČSN 72 1006 - příloha A,B,D Kontrola zhutnění zemin a sypanin (2015)

související dokumenty :

SŽDC S4 Železniční spodek (2008)

ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek (1982)



Nejistota měření :

Za protokol odpovídá : Mgr. Aleš Jírovec - zástupce vedoucího laboratoře

Datum vydání protokolu : 19.8.2026

Prohlášení :


Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu v příslušném místě a reprezentují jeho stav v době provádění zkoušky. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol reprodukovat jinak, než celý.

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU

ČSN 72 1006, příloha A

název akce :		ZS Tuklaty		č. zkoušky : Z-0818-02	
kód akce :		2026000110		místo : plocha v místě tělocvičny - bod č.2	
datum :		18.8.2026		podloží : základová spára	
materiál pod zat. deskou (vizuální popis) : písčitoilovitá zemina (rostlý terén)					
kontaktní napětí		čtení na indikátoru - hodnota deformace			zatlačení zatěžovací desky
p (MPa)	poměrná (mm)	převodní koeficient	skutečná (mm)	průměr	Δ y (mm)
0,000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0,030	0,10	2,00	0,20	0,20	0,20
0,060	0,18	2,00	0,36	0,36	0,36
0,090	0,27	2,00	0,54	0,54	0,54
0,120	0,35	2,00	0,70	0,70	0,70
0,150	0,44	2,00	0,88	0,88	0,88
0,180	0,53	2,00	1,06	1,06	1,06
0,210	0,67	2,00	1,34	1,34	1,34
0,105	0,61	2,00	1,22	1,22	1,22
0,055	0,49	2,00	0,98	0,98	0,98
0,000	0,27	2,00	0,54	0,54	0,54
0,030	0,34	2,00	0,68	0,68	0,68
0,060	0,41	2,00	0,82	0,82	0,82
0,090	0,48	2,00	0,96	0,96	0,96
0,120	0,55	2,00	1,10	1,10	1,10
0,150	0,62	2,00	1,24	1,24	1,24
0,180	0,69	2,00	1,38	1,38	1,38
zkušební zařízení : souprava Strassentest (DIN 18 134) - měřicí souprava Z4, úchylkoměr U11					
počasí :		19°C oblačno			
poznámky :					

Závislost napětí / deformace

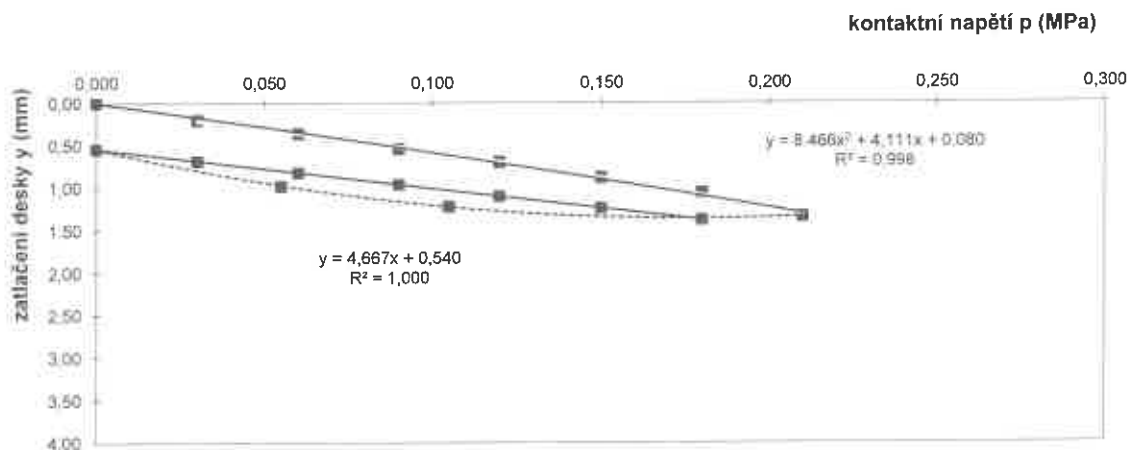

rovnice regresní křivky

$$y = a_2 \cdot p^2 + a_1 \cdot p + a_0$$

$$E_{def} = 1,5 \cdot r / (a_1 + a_2 \cdot p_{max})$$

zjišťovaná veličina		zatěžovací cyklus	
označení	rozměr	první	druhý
r	mm	150	150
p _{max}	MPa	0,210	0,180
a ₁	mm.MPa ⁻¹	4,111	4,667
a ₂	mm.MPa ⁻²	8,466	0,000
E _{def}	MPa	38,2	48,2
E _{def,2} /E _{def,1}	-	1,26	

$$E_{def,2} = 48,2 \text{ (MPa)}$$

$$E_{def,2} / E_{def,1} = 1,26$$

ALGEO TEST s.r.o. - zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210

Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8

Tel.: +420 775 326 016 , 602 671 072

Email: info@algeo.cz

zkoušku provedl : J. Vokál

protokol č. 2026000110-01

strana 3

milova 8. 2. 20. 07

Melichar Melichar

Od: Zdeněk Dobiáš <zdenek.dobias@sater-projekt.cz>
Odesláno: pátek 21. srpna 2026 12:43
Komu: Martin Linhart; Melichar Melichar
Předmět: Tuklaty - přístavba ZŠ - geologické sondy situace

Dobrý den,

prosím o 3 geologické sondy min. 1 - 2 m do skalního podloží



S pozdravem / Best regards

Ing. Zdeněk Dobiáš

jednatel

e-mail: zdenek.dobias@sater-projekt.cz

tel.: +420 321 717 202

mob.: +420 602 340 849

SATER - PROJEKT s.r.o.

Plynářská 671

280 02 Kolín IV

Czech Republic

www.sater-projekt.cz

ZMENOVY LIST		číslo ZL : 08
Zhotovitel : BFK service a. s. Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Obec Tuklaty Na Valech 19 250 82, Tuklaty IČO : 00235822 DIČ : CZ00235822		Kontrola za TDI Dozoring s.r.o. Býchory 233 280 02 Kolin Jan Říha; jan.riha@dozoring.cz tel.: 721 711 117
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 27.08.2026		Stavba: „Základní škola Tuklaty - Přístavba tělocvičny a učeben“
Odkazy na dokumentaci :		Projektová dokumentace z 02/2024 zpracovaná firmou INGARA s.r.o. Veverkova 1218 500 02 Hradec Králové Ing. Aleš Řada, GP a AD tel.: 739 207 686
na rozpočet :		Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo ze dne 28.05.2026
na jednání na akci:		"ZŠ Tuklaty - přístavba tělocvičny a učeben"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: ZL 08 řeší zajištění nového vyjádření HZS k vydané dokumentaci ke stavebnímu povolení, které bude zajištěno v rámci plné moci p. Ing. Miroslavem Keltnerem. Historicky - PBŘ k DSP bylo zpracováno v roce 01/2022 panem Ing. Zdeněk Hradecký ČKAIT 0010192. HZS Kolín vydal stanovisko 08.03.2022 k PBŘ z roku 01/2022. PBŘ k DPS bylo zpracováno v roce 04/2024 paní Ing. Iva Krumbholcová ČKAIT 0401450. K výše uvedenému zjištění je skutečnost, že HZS nemá v současné chvíli poslední platnou DSP ke které stavební úřad vydal stavební povolení, a stejně tak PBŘS z 4/2024 zpracované pí. Ing. Ivou Krumbholcovou . Lze tedy očekávat nové připomínky ze strany HZS po novém předložení aktuálně dostupné DSP, společně s posledním zpracovaném PBŘS		
Cenové vyčíslení: Cena bez DPH 4 000,00 Kč		
Tento ZL č. 08 má vliv na dokončení díla		
Generální zhotovitel:  Ing. Jiří Fořt, člen představenstva		Odsouhlasení objednatelem:  Tomáš Kolínský, místostarosta obce
		Monika Petrisková, starostka
		Odsouhlasení TD:  Jan Říha, TDI, KOBOZP

stavba: „Základní škola
objekty: Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben “
díl: "D1.1 - ARSČ"
objednatel: "vícepráce a méněpráce ZL č. 08"
"Obec Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty

zhotovitel: BFK service a. s.
dne: 27.08.2026

REKAPITULACE - ZL č. 08

"D1.1 - ARSČ"

D.1.1-ARSČ_zajištění nového stanoviška HZS k DSP

Přípočty	VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	4 000,00 Kč
Celkem přípočty		4 000,00 Kč
Celkem odpočty		- Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 08, bez DPH		4 000,00 Kč
21% DPH		840,00 Kč
CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 08, s DPH		4 840,00 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 222
Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

KSO: 801 32
Místo: CC-CZ: 27.08.2026
Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Obec Tuklaty
Zhotovitel: IČ: 27155153
BFK service a.s. DIČ: CZ27155153
Projektant: IČ: 06553044
INGARA s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ: 06553044
DIČ:

Cena bez DPH		4 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně 4 000,00 0,00
		Výše daně 840,00 0,00
Cena s DPH		4 840,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:
222

Stavba:

Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4

Místo:

27.08.2026

Zadavatel:

Obec Tuklaty

Zhotovitel:

BFK service a.s.

Projektant:

INGARA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
ZL08	D.1.1-ARSČ_zajištění nového stanoviska HZS k DSP	4 000,00	4 840,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4
Objekt: ZL08 - D.1.1-ARSČ_zajištění nového stanoviska HZS k DSP

KSO:	801 32	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	27.08.2026
Zadavatel:		IČ:	
Obec Tuklaty		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27155153
BFK service a.s.		DIČ:	CZ27155153
Projektant:		IČ:	06553044
INGARA s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	06553044
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH

4 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
4 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
840,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 840,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4
Objekt: **ZL08 - D.1.1-ARSČ_zajištění nového stanoviška HZS k DSP**
Místo:
Zadavatel: Obec Tuklaty
Zhotovitel: BFK service a.s.

Datum: 27.08.2026
Projektant: INGARA s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	4 000,00
	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben_REV4
Objekt: ZL08 - D.1.1-ARSČ_zajištění nového stanoviska HZS k DSP
Místo:
Zadavatel: Obec Tuklaty
Zhotovitel: BFK service a.s.

Datum: 27.08.2026
Projektant: INGARA s.r.o.
Zpracovatel:

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				4 000,00	
1	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby - zajištění nového stanoviska HZS k dokumentaci ke stavebnímu povolení	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní
W			"Zajištění nového stanoviska HZS k vydané dokumentaci pro stavební povolení"					
W			1,00				1,000	
W			Součet				1,000	
POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCENĚNY DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM								

Příloha č. 1 22.8.08

PLNÁ MOC

Obec Tuklaty, se sídlem Česká republika, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty, IČ: 00235822, zastoupená starostkou obce: **Monika Petrisková**, na straně zmocnitele,

uděluje plnou moc pro

zmocněnce: SATER – PROJEKT s.r.o., Plynářská 671, 280 01 Kolín IV, IČ 49615882, společnost zapsaná u MS v Praze, spisová značka C 21233, **zastoupená jednatelem: Ing. Zdeněk Dobiáš** na straně zmocnitele,

k zajištění inženýrských činností pro povolení záměru:

Základní škola Tuklaty - Přístavba tělocvičny

Jmenovitě zplnomocňuje k provedení těchto inženýrských činností.

- zajištění stanovisek k projektové dokumentaci výše uvedené stavby od právních subjektů, jejichž vyjádření bude vyžadováno povolovacími orgány při povolení záměru.

Zmocněnec je zplnomocněn k podpisu vzdání se práva odvolání, k zaplacení správních poplatků za vydaná rozhodnutí, stanoviska apod. a k převzetí jejich výsledků.

V Tuklatech dne:

**Monika
Petrisková**

Digitálně podepsal
Monika Petrisková
Datum: 2026.08.24
11:30:04 +02'00'

.....
Monika Petrisková
Starostka obce Tuklaty

Výše uvedenou plnou moc přijímám:



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Dobiáš
Datum: 2026.08.24
11:41:03 +02'00'

.....
Ing. Zdeněk Dobiáš
jednatel společnosti SATER – PROJEKT, s.r.o.

V Kolíně dne:

Za společnost SATER-PROJEKT s.r.o.
budou jednat a společnost zastupovat:
Ing. Miroslav Keltner, OP č. 217288606



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Dobiáš
Datum: 2026.08.24
11:41:20 +02'00'

.....
Ing. Zdeněk Dobiáš
jednatel společnosti SATER – PROJEKT, s.r.o.
