


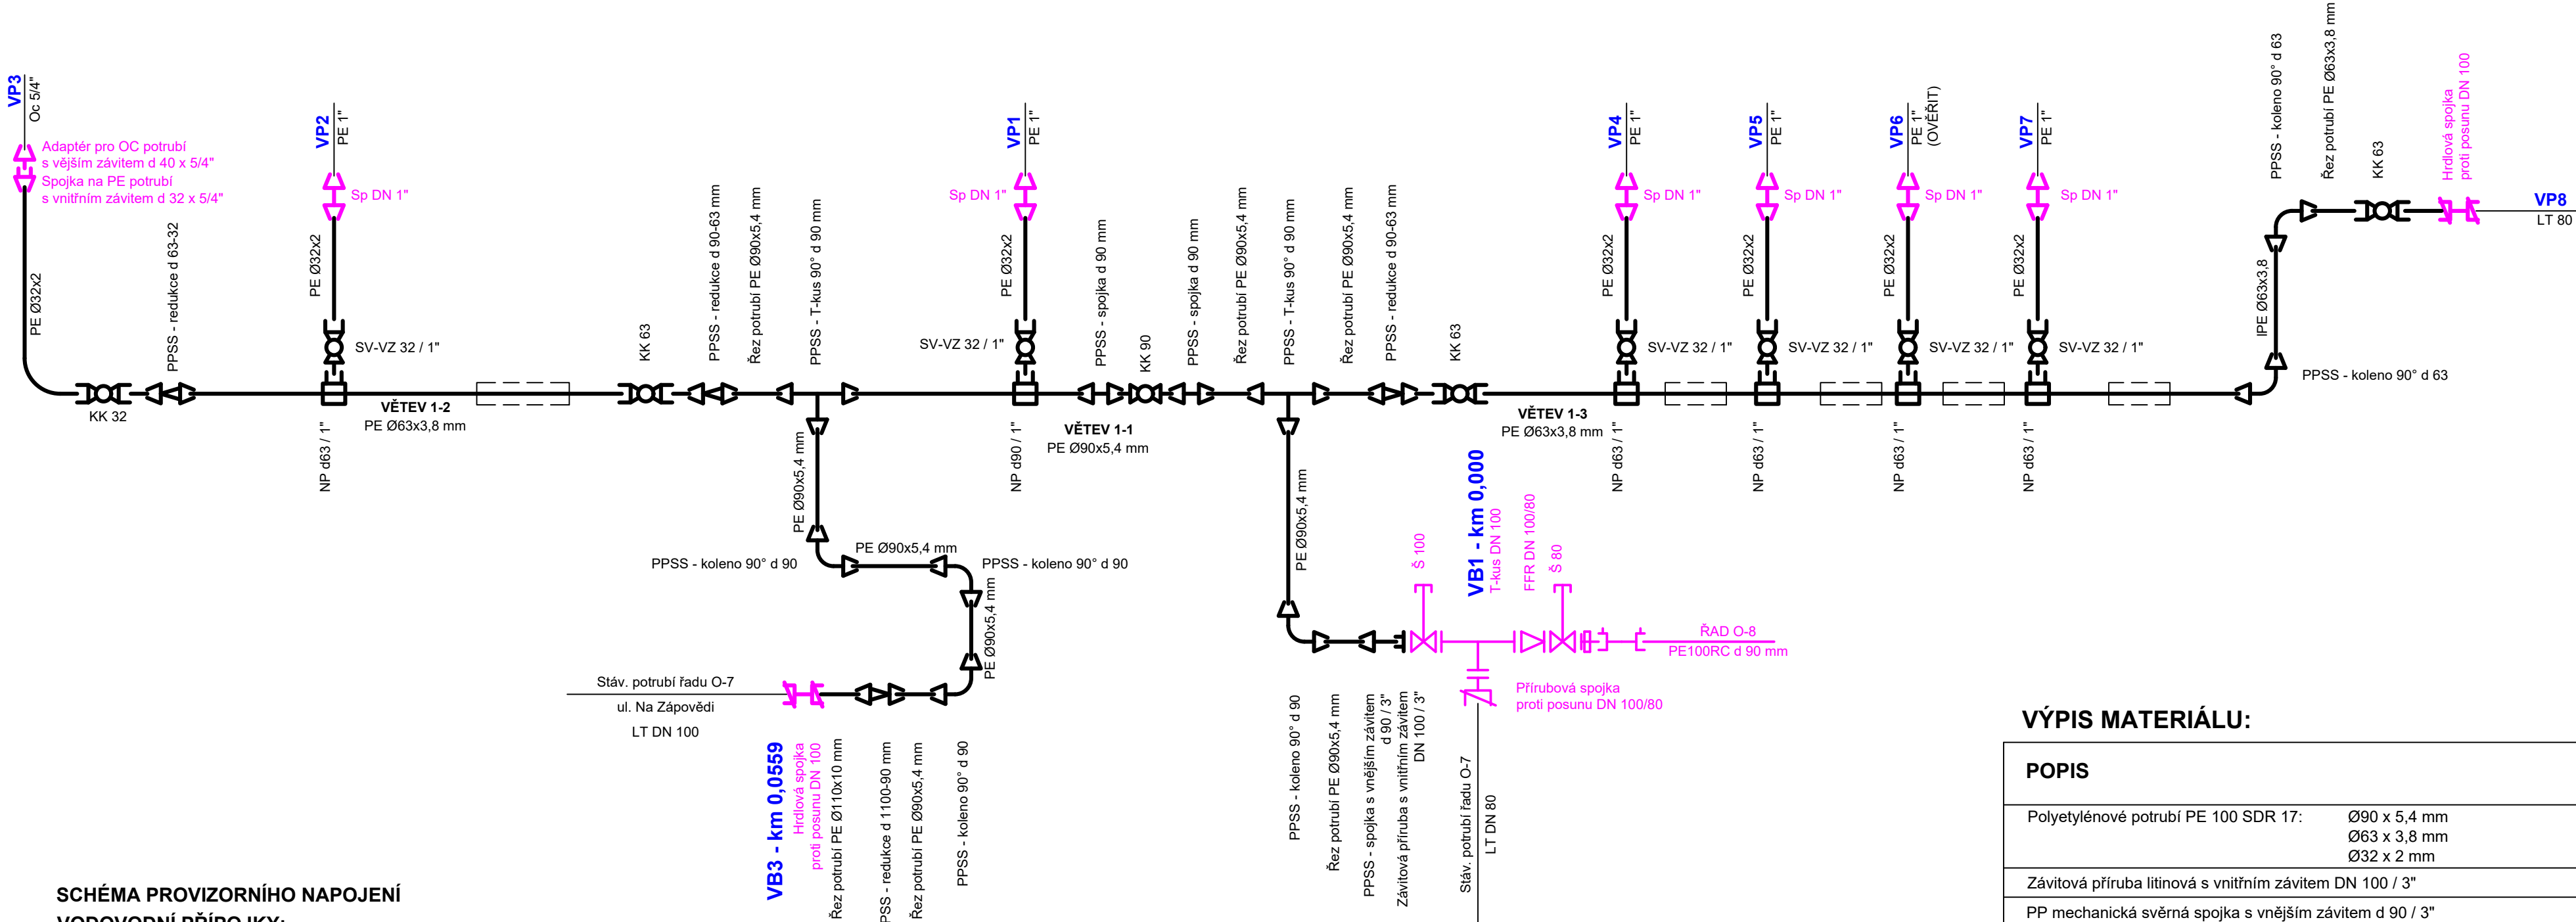


SCHÉMA PROVIZORNÍHO NAPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY:

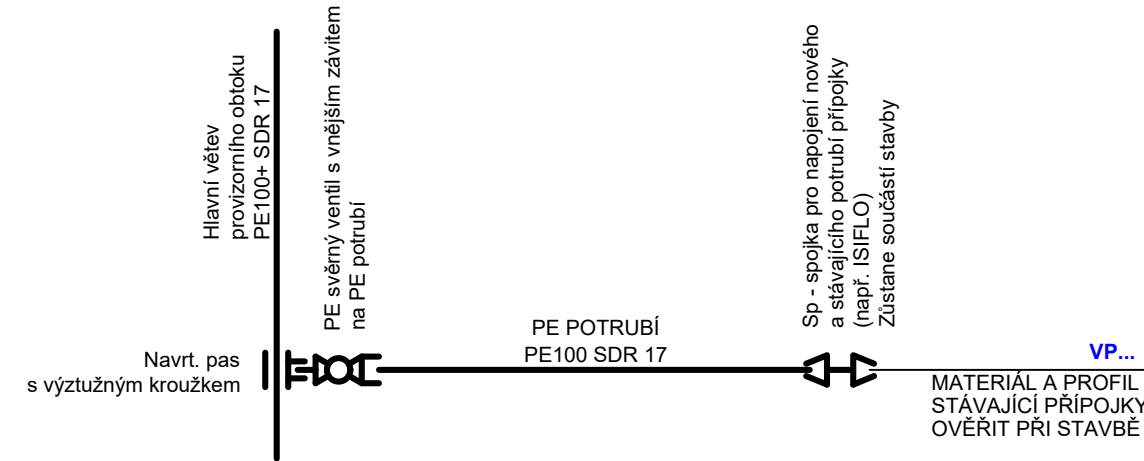

VÝPIS MATERIÁLU:

POPIS	MNOŽSTVÍ
Polyetylénové potrubí PE 100 SDR 17: Ø90 x 5,4 mm	cca 65 m
Ø63 x 3,8 mm	cca 125 m
Ø32 x 2 mm	cca 50 m
Závítová příruba litinová s vnitřním závitem DN 100 / 3"	1 ks
PP mechanická svěrná spojka s vnějším závitem d 90 / 3"	1 ks
PP mechanická svěrná spojka - koleno 90° d 90 mm	4 ks
PP mechanická svěrná spojka - koleno 90° d 63 mm	2 ks
PP mechanická svěrná spojka - T-kus d 90 mm	2 ks
PP mechanická svěrná spojka d 90 mm	2 ks
PP kulový kohout d 90 mm s prodlouženými hrdly PE100 SDR11	1 ks
PP kulový svěrný ventil na PE potrubí d 63 mm	3 ks
PP mechanická svěrná spojka - redukce 110 x 90 mm	1 ks
PP mechanická svěrná spojka - redukce 90 x 63 mm	1 ks
PP mechanická svěrná spojka - redukce 63 x 32 mm	1 ks
PE navrtávací objímka d 90x1"	1 ks
PE navrtávací objímka d 63x1"	5 ks
PP kulový svěrný ventil z PVC s vnějším závitem na PE potrubí d 32 mm	6 ks

POPIS ŘEŠENÍ PROVIZORNÍHO ZÁSOBENÍ VODOU PŘI RELIZACI STAVBY SO 01:

- Před zprovozněním potrubí provizorního zásobení vodou (suchovodu) bude potrubí připraveno na terénu (spojení, ochrana v místě křížení s komunikací a vjezdy, proplach, dezinfekce, bakteriologický rozbor).
- Při krátkodobé odstávce řadů O-7 a O-8 provést výměnu tvarovek a armatur uzlu v rušené šachtě a zříditi napojení potrubí provizorního obtoku na šoupátko DN 100 v bodě VB1 a napojit suchovod (obtok odstaveného potrubí) na potrubí ve směru do ulice Na Zápovědi. Dále přepojit vodovodní přípojky řešené v rámci SO 01 na provizorní obtok.
- Provést pokládku nového potrubí vodovodních řadů O-7, O-7-1 a O-8 na ul. Sokolská (bez dopojení na stávající řad ul. Na Zápovědi). Provedení tlakových a bakteriologických zkoušek vodovodního potrubí uloženého v rámci SO 01.
- Po úspěšném splnění zkoušek potrubí vodovodního řadu provést při krátkodobé odstávce odpojení potrubí suchovodu a dopojení nově položeného potrubí řadu O-7 na šoupátko DN 100 (v bodě VB1). Dále přepojit vodovodní přípojky na nové vodovodní potrubí.
- Zrušení suchovodu a přesun potrubí suchovodu pro stavbu SO 02.

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- POTRUBÍ, TVAROVKY A ARMATURY OSAZENÉ V RÁMCI TÉTO STAVBY NATRVALO
- POTRUBÍ, TVAROVKY A ARMATURY OSAZENÉ DOČASNĚ PRO PROVIZORNÍ ZÁSOBENÍ
- OCHRANA POTRUBÍ V MÍSTĚ ULOŽENÍ PŘES KOMUNIKACI NEBO VE VJEZDU (NAPŘ. OBSYPÁNÍM ŠTĚRKODRTÍ) - UVAŽOVÁNO 5x

VYSVĚTLIVKY:

- PPSS PP SVĚRNÁ SPOJKA
- KK KULOVÝ KOHOUT Z PVC NA PE POTRUBÍ
- Sp SPOJKA NA PROPOJENÍ NOVÉHO A STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ (NAPŘ. ISIFLO)

POZNÁMKA:

PE POTRUBÍ BUDE DODÁNO V NÁVINU.
POTRUBÍ BUDE PO DOBU STAVBY ULOŽENO VOLNĚ NA TERÉNU, V MÍSTĚ VJEZDŮ A KŘÍŽENÍ S KOMUNIKACÍ BUDE POTRUBÍ CHRÁNĚNO PROTI POŠKOZENÍ POJEZDEM (NAPŘ. OBSYPÁNÍM ŠTĚRKODRTÍ).
PŘI STAVBĚ BUDE OVĚŘEN MATERIÁL A PROFIL STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK.

VYPRACOVAL : S. Krejčí		ODP. PROJEKTANT : S. Krejčí	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025–10	STANISLAV KREJČÍ PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Dolany 601, 783 16 Dolany www.sk-projekt.cz	
STAVEBNÍK: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšavkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště					
AKCE: UHERSKÉ HRADIŠTĚ, MAŘATICE, UL. NA ZÁPOVĚDI REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH ŘADŮ O-7 A O-8				DATUM	09 / 2025
				FORMÁT	4 A4
				STUPEŇ	DPZ + DPS
				MĚŘÍTKO:	
PŘÍLOHA: SCHÉMA PROVIZORNÍHO ZÁSOBENÍ VODOU - SO 01				PŘÍLOHA Č.	PARÉ Č.
				D.5.1	
