



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond rozvoje
regionů

Provedení
základních prací


Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	14. 05. 2015
Ev.č.	ZL-061-S-Z-SO 010/9.1	Datum schválení	18. 05. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jilová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS **)	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh / SO 010/9.1 stoka B3 /navrtávka a propojení 2ks odboček		
Specifikace změny: Při realizaci stoky bylo zjištěno, že do stávající betonové stoky jsou napojeny dvě dešťové přípojky, které svádí dešťovou vodu z ul. Rybářská. Tato skutečnost není řešena v RDS. Je nutné navrtat a osadit sedla DN 200 a tak propojit přípojky do budované stoky DN 1200			
Předmětem změnového listu je:			
- 2 ks spojek - Navrtání sedla			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	12 371,60 Kč		
Stanovisko správce stavby:			
Společnost stoky s navrtáním příslušných stavebních děl a následným propojením stoky přípojky s odbočkou, provede podle svých možností dle skutečnosti a zohlední kvalitu a kvalitu a kvalitu stoky. Vzhledem k tomu, že stoka je v RDS, je nutné a existence stoky přípojky ve stoky RDS stoky zohlední problémy. Společnost stoky doporučuje tuto změnu schválit.			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy:	1) Iniciační dopis + situace 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Fotodokumentace 5) Zápisy ze stavebního deníku 6) Stanovisko Šumperské provozní vodohospodářská společnost, a.s.		




Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **)	
 SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod v ního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk – zástupce vedoucího týmu	 AQUA PRŮCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR IČ: 246964571 Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu
Datum: 14. 05. 2015	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
  IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno Brno - VHS a DS 4 Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **)  Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilová 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel.: 583 317 111 fax: 583 214 845 Ing. Petr Suchomel - manažer projektu 18. 05. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nehodící se škrtnout



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

VRV - API

Horní Pomoraví II - sever

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Krejčí Radim	krejcir@imosbrno.eu / 733623828	13.11.2014

Iniciační dopis ID-061-S-Z-SO 010/9.1 - Navrtávka a propojení 2ks odboček ul.Rybářská

Aktuální stav:

Při realizaci stoky bylo zjištěno, že do stávající betonové stoky jsou napojeny dvě dešťové přípojky, které svádí dešťovou vodu z ul. Rybářská a z areálu bývalého Ingstavu. Tato skutečnost není řešena v RDS.

Návrh řešení:

Navrtání a osazení sedla DN200 a propojení do budované stoky DN1200.

Odhad ceny: 15.000,- Kč

Žádáme zodpovědného projektanta o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Krejčí Radim

Dne 13. 11. 2014


PODCHOD ŘEŠEN PROTLAKEM
POTRUBÍ ULOŽENO V OCELOVÉ
CHRÁNICIČE 1420 x 10, DL. 4,0 m

V ŠACHTĚ ŠD BUDE PROVEDENO ZASLEPENÍ
ODBOČKY DO ŠACHTY ŠB7

ZRUŠENÍ STAV. KANALIZACE DN 1200
V DÉLCE 8,90 M

ZASTĚNÍ STOKY B3 I
VE STAVAJÍCÍ ŠACHTĚ

B3 II
50 - PP - 82.8 m
0 - PP - 966.0 m

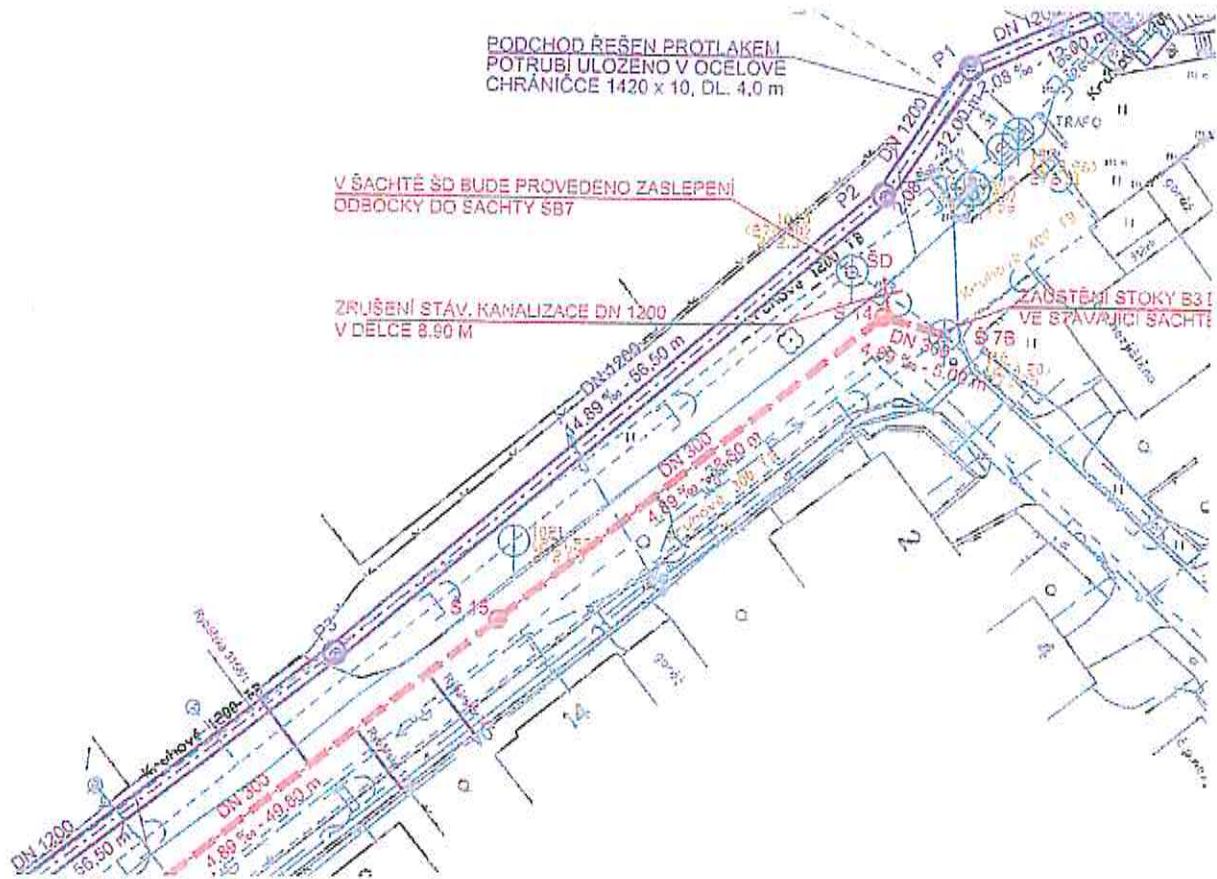

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-061-S-Z-SO 010/9.1

3. Město Zábřeh / STOKA B3

NAVRTÁVKA A PROPOJENÍ 2ks ODBOČEK

Pol.	Popis položky	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-061-S-Z-SO 3.010		
		m.j.	MN	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	MN	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	MN	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
STOKA B3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Trubní vedení												
SO 3.003/1080	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	0,00	2 706,80	0,00	2,00	2 706,80	5 413,60	2,00	5 413,60	5 413,60	0,00
SO 3.003/1081	Napojení přípojek na sklolaminátové potrubí dle DIN 19565 pomocí mechanických spojek šroubovaných do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	0,00	3 479,00	0,00	2,00	3 479,00	6 958,00	2,00	6 958,00	6 958,00	0,00
Trubní vedení celkem :					0,00		12 371,60			12 371,60	12 371,60	0,00
ZL-0161-S-Z-SO 3.010 CELKEM :					0,00		12 371,60			12 371,60	12 371,60	0,00



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 118/15/J
Datum: 9. 12. 2014
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Joki

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iniciační dopis č.: ID-061-S-Z-SO 010/9.1

Vyjádření projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky bylo zjištěno, že do stávající betonové stoky jsou napojeny dvě dešťové přípojky, které svádí dešťovou vodu z ul. Rybářská a z areálu bývalého Ingstavu. Tato skutečnost není řešena v RDS.

Zhotovitel navrhuje navrtání a osazení sedla DN 200 a propojení do budované stoky DN 1200.


Projektant s návrhem zhotovitele souhlasí, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. Napojení nalezených neznámých přípojek je nezbytné..

Za projektanta:

Datum: 9. 12. 2014

Ing. Vlastislav Kolečkář

Podpis:





IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 118-1/15/K
Datum: 9. 12. 2014
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-061-S-Z-SO SO 010/9.1

Vyjádření generálního projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky bylo zjištěno, že do stávající betonové stoky jsou napojeny dvě dešťové přípojky, které svádí dešťovou vodu z ul. Rybářská a z areálu bývalého Ingstavu. Tato skutečnost není řešena v RDS.

Zhotovitel navrhuje navrtání a osazení sedla DN 200 a propojení do budované stoky DN 1200.


Z pozice generálního projektanta s návrhem zhotovitele souhlasíme, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. Napojení nalezených přípojek je nezbytné.


Za generálního projektanta:


Datum: 9. 12. 2014

Ing. Jan Polášek

Podpis: V.Z. Kolečkář



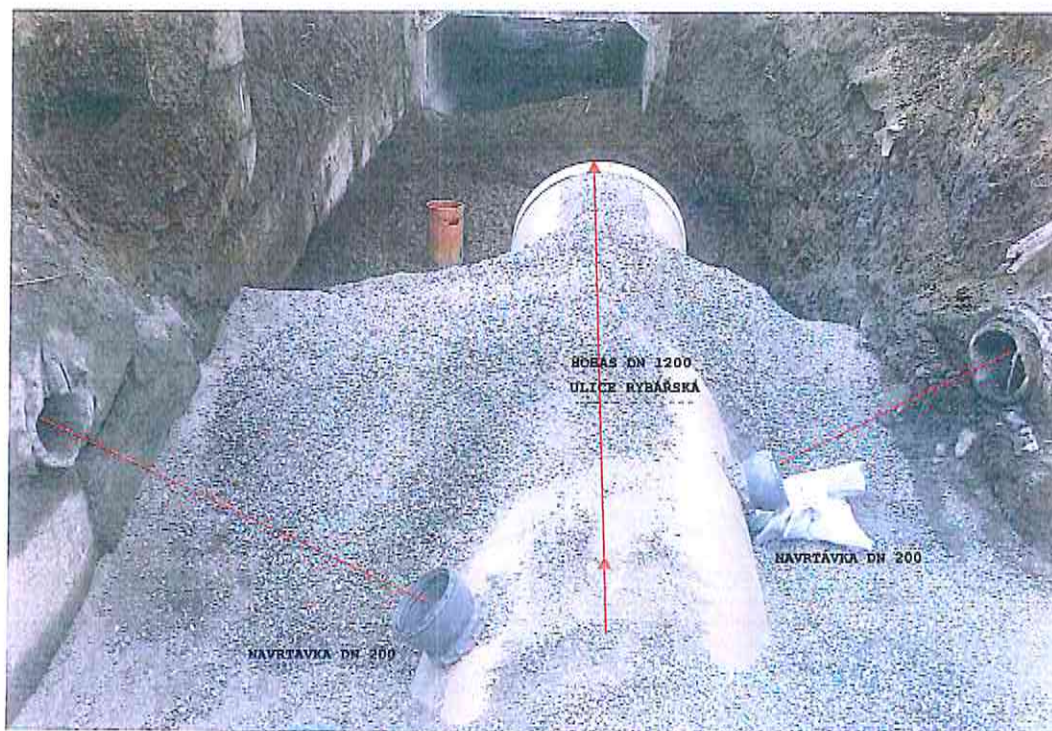

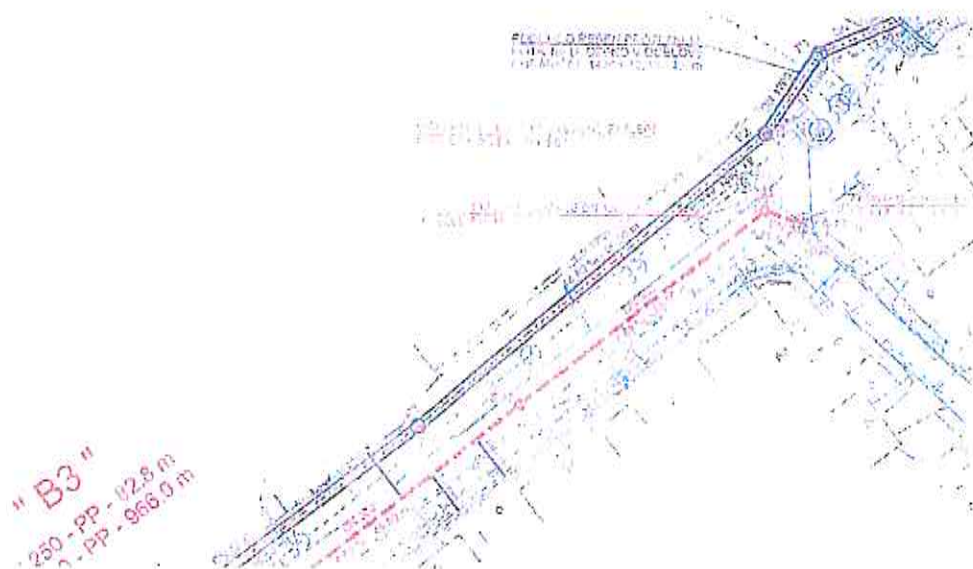

Provozovatel potvrzuje správnost podkladů.
V Šumperku dne: 17.2.2015

Šumperská provozní
vodoхозяйstvá společnost, a.s.
Šumperk, č.p. 2769, Jiliová 8, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911
-6-
