



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fundus pro životnost
Evropský fond pro regionální rozvoj

Provedení
vzduch a příroda

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze



CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	14. 05. 2015
Ev.č.	ZL-063-S-Z-SO 09.5.6	Datum schválení	18. 05. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jilová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		

Změnový list předkládá:	zhotovitel	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS **)	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh / SO 3.004/přeložka 004/6.1/ úsek ulice 28. října	
<u>Specifikace změny:</u> Při realizaci stoky 09.5.6. bylo zjištěno, že nemovitost č. p. 1790/2 na ulici Rudolfa Pavlů, kde je budována nová splašková stoka, má dvě stávající splaškové přípojky místo jedné. Proto je nutné vybudovat další novou splaškovou přípojku pro výše zmíněnou nemovitost.		
<u>Předmětem změnového listu je:</u> - Vybudování přípojky		
Finanční dopad změny:	Navýšení	
Změna ceny po schválení:	9 467,49Kč	

Stanovisko správce stavby: <i>Pro realizaci splaškové stoky 09.5.6 je nutné dvě funkční stávající přípojky. Splaškové stoky předložené ke stávajícímu přípoju a přípoju druhé přípojky ze splaškové a odpadové vody musí schválit.</i>	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis + situace 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Fotodokumentace, zaměření geodetem 5) Stavební deník 6) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.


Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **)  SPRAVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk – zástupce vedoucího týmu	 Ing. Jan Polášek – hlavní inženýr projektu
Datum: 14. 05. 2015	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
  Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **)  Ing. Petr Suchomel - manažer projektu 18. 05. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Tým správce stavby

Horní Pomoraví II - sever

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Holotík Vladimír	holotikv@imosbrno.eu / 602 713 982	5.11.2014

Iniciační dopis - ID-063-S-Z-SO 09.5.6 - Nová přípojka na stokce 09.5.6- Rudolfa Pavlů 2

Aktuální stav:

Při realizaci stoky 09.5.6. bylo zjištěno, že nemovitost na ulici Rudolfa Pavlů 2, kde je budována nová splašková stoka, má nemovitost dvě stávající splaškové přípojky.

Návrh řešení:

Vybudovat další novou splaškovou přípojku pro nemovitost Rudolfa Pavlů 2.

Žádáme zodpovědného projektanta o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Ing. Holotík Vladimír

Dne 5. 11. 2014

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-063-S-Z-SO 3.009

3. Město Zábřeh / STOKA 9.5.6

Nová přípojka na stoce 09.5.6 - Rudolfa Pavlů 2

Rozpočet dle SoD													Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-063-S-Z-SO 3.009	
Pol.	Popis položky		m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP						
SO 3.009 - LOKALITA RUDOLFOV																			
STOKA 09.5.6 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY																			
Zemní práce																			
2160	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	504,92	214,80	108 457,87	507,32	214,80	108 973,39	2,40	515,52	515,52	0,00							
1*1,6*1,5																			
2162	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1 117,90	129,60	144 880,36	1 123,90	129,60	145 657,96	6,00	777,60	777,60	0,00							
1,5*2*2																			
2163	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 117,90	26,70	29 847,93	1 123,90	26,70	30 008,13	6,00	160,20	160,20	0,00							
2164	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	252,46	22,50	5 680,35	254,86	22,50	5 734,35	2,40	54,00	54,00	0,00							
2167	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	161,07	280,60	45 196,30	163,47	280,60	45 869,74	2,40	673,44	673,44	0,00							
2169	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	384,99	86,00	33 109,14	386,79	86,00	33 263,94	1,80	154,80	154,80	0,00							
2170	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	128,13	296,70	38 015,64	128,58	296,70	38 149,15	0,45	133,51	133,51	0,00							
1*0,3*1,5																			
2173	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	161,07	109,10	17 572,74	163,47	109,10	17 834,58	2,40	261,84	261,84	0,00							
2175	Vhodný záspový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	45,71	535,90	24 494,11	47,51	535,90	25 458,73	1,80	964,62	964,62	0,00							
2176	Štěrkopisek frakce 8-16	t	237,73	276,10	65 636,87	238,57	276,10	65 867,96	0,84	231,09	231,09	0,00							
Zemní práce celkem :						512 891,31			516 817,93		3 926,62	0,00							
Přípravné a přidružené práce																			
2179	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	113,19	43,80	4 957,72	114,69	43,80	5 023,42	1,50	65,70	65,70	0,00							
2182	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	113,19	21,30	2 410,95	114,69	21,30	2 442,90	1,50	31,95	31,95	0,00							

Pol.	Popis položky	Rozpočet dle SoD				Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-063-S-z-SO 3.009	
		m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
2183	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	113,19	84,10	9 519,28	114,69	84,10	9 645,43	1,50	126,15	126,15	0,00
2184	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	88,64	169,20	14 997,34	89,81	169,20	15 195,31	1,17	197,97	197,97	0,00
2185	Poplatek za skládku stavební sutí	t	88,64	76,10	6 745,26	89,81	76,10	6 834,30	1,17	89,04	89,04	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				38 630,55			39 141,36		510,81	510,81	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce											
2186	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	28,20	795,60	22 439,10	28,35	795,60	22 558,44	0,15	119,34	119,34	0,00
	<i>1*0,1*1,5</i>											
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				22 439,10			22 558,44		119,34	119,34	0,00
	Komunikace											
2187	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recykát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	76,78	483,30	37 107,77	78,28	483,30	37 832,72	1,50	724,95	724,95	0,00
	Komunikace celkem :				37 107,77			37 832,72		724,95	724,95	0,00
	Trubní vedení											
2189	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	205,12	24,40	5 004,93	206,62	24,40	5 041,53	1,50	36,60	36,60	0,00
2191	Montáž tvarovek jednocs. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	78	70,10	5 467,80	80,00	70,10	5 608,00	2,00	140,20	140,20	0,00
2194	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	256,40	98,80	25 332,32	257,90	98,80	25 480,52	1,50	148,20	148,20	0,00
2195	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	224,20	339,00	76 002,51	225,83	339,00	76 556,78	1,64	554,27	554,27	0,00
2197	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	26,39	263,40	6 951,13	27,39	263,40	7 214,53	1,00	263,40	263,40	0,00
2201	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	26,39	2 804,90	74 021,31	27,39	2 804,90	76 826,21	1,00	2 804,90	2 804,90	0,00
	Trubní vedení celkem :				192 780,00			196 727,57		3 947,57	3 947,57	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání											
2205	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	205,80	79,40	16 340,52	208,80	79,40	16 578,72	3,00	238,20	238,20	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				16 340,52			16 578,72		238,20	238,20	0,00
	ZL-063-S-z-SO 3.009 CELKEM :				820 189,25			829 656,74		9 467,49	9 467,49	0,00



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 568-2/14/K
Datum: 9. 12. 2014
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ID-063-S-Z-SO 9.5.6

Vyjádření generálního projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky 09.5.6. bylo zjištěno, že nemovitost na ulici Rudolfa Pavlů 2, kde je budována nová splašková stoka, má nemovitost dvě stávající splaškové přípojky.

Zhotovitel navrhuje vybudovat další novou splaškovou přípojku pro nemovitost Rudolfa Pavlů 2.

Odhad ceny: 25 000 Kč


Z pozice generálního projektanta s návrhem zhotovitele souhlasíme, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. Podchycení i druhé nalezené přípojky je nezbytné.

Za generálního projektanta:

Ing. Jan Polášek

Datum: 9. 12. 2014

Podpis:



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 568-5/14/K
Datum: 9. 12. 2014
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iničiační dopis č.: ID-063-S-Z-SO 9.5.6

Vyjádření projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky 09.5.6. bylo zjištěno, že nemovitost na ulici Rudolfa Pavla 2, kde je budována nová splašková stoka, má nemovitost dvě stávající splaškové přípojky.
Zhotovitel navrhuje vybudovat další novou splaškovou přípojku pro nemovitost Rudolfa Pavla 2.
Odhad ceny: 25 000 Kč


Projektant s návrhem zhotovitele souhlasí, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. Podchycení i druhé nalezené přípojky je nezbytné.

Za projektanta:

Datum: 9. 12. 2014


Ing. Vlastislav Kolečkář

Podpis:





*Pro zjištění příjezdu do jedné nemovitosti p. komunikací potřebný prostor z důvodu
výhledu ostatních pracujících nemovitostí*

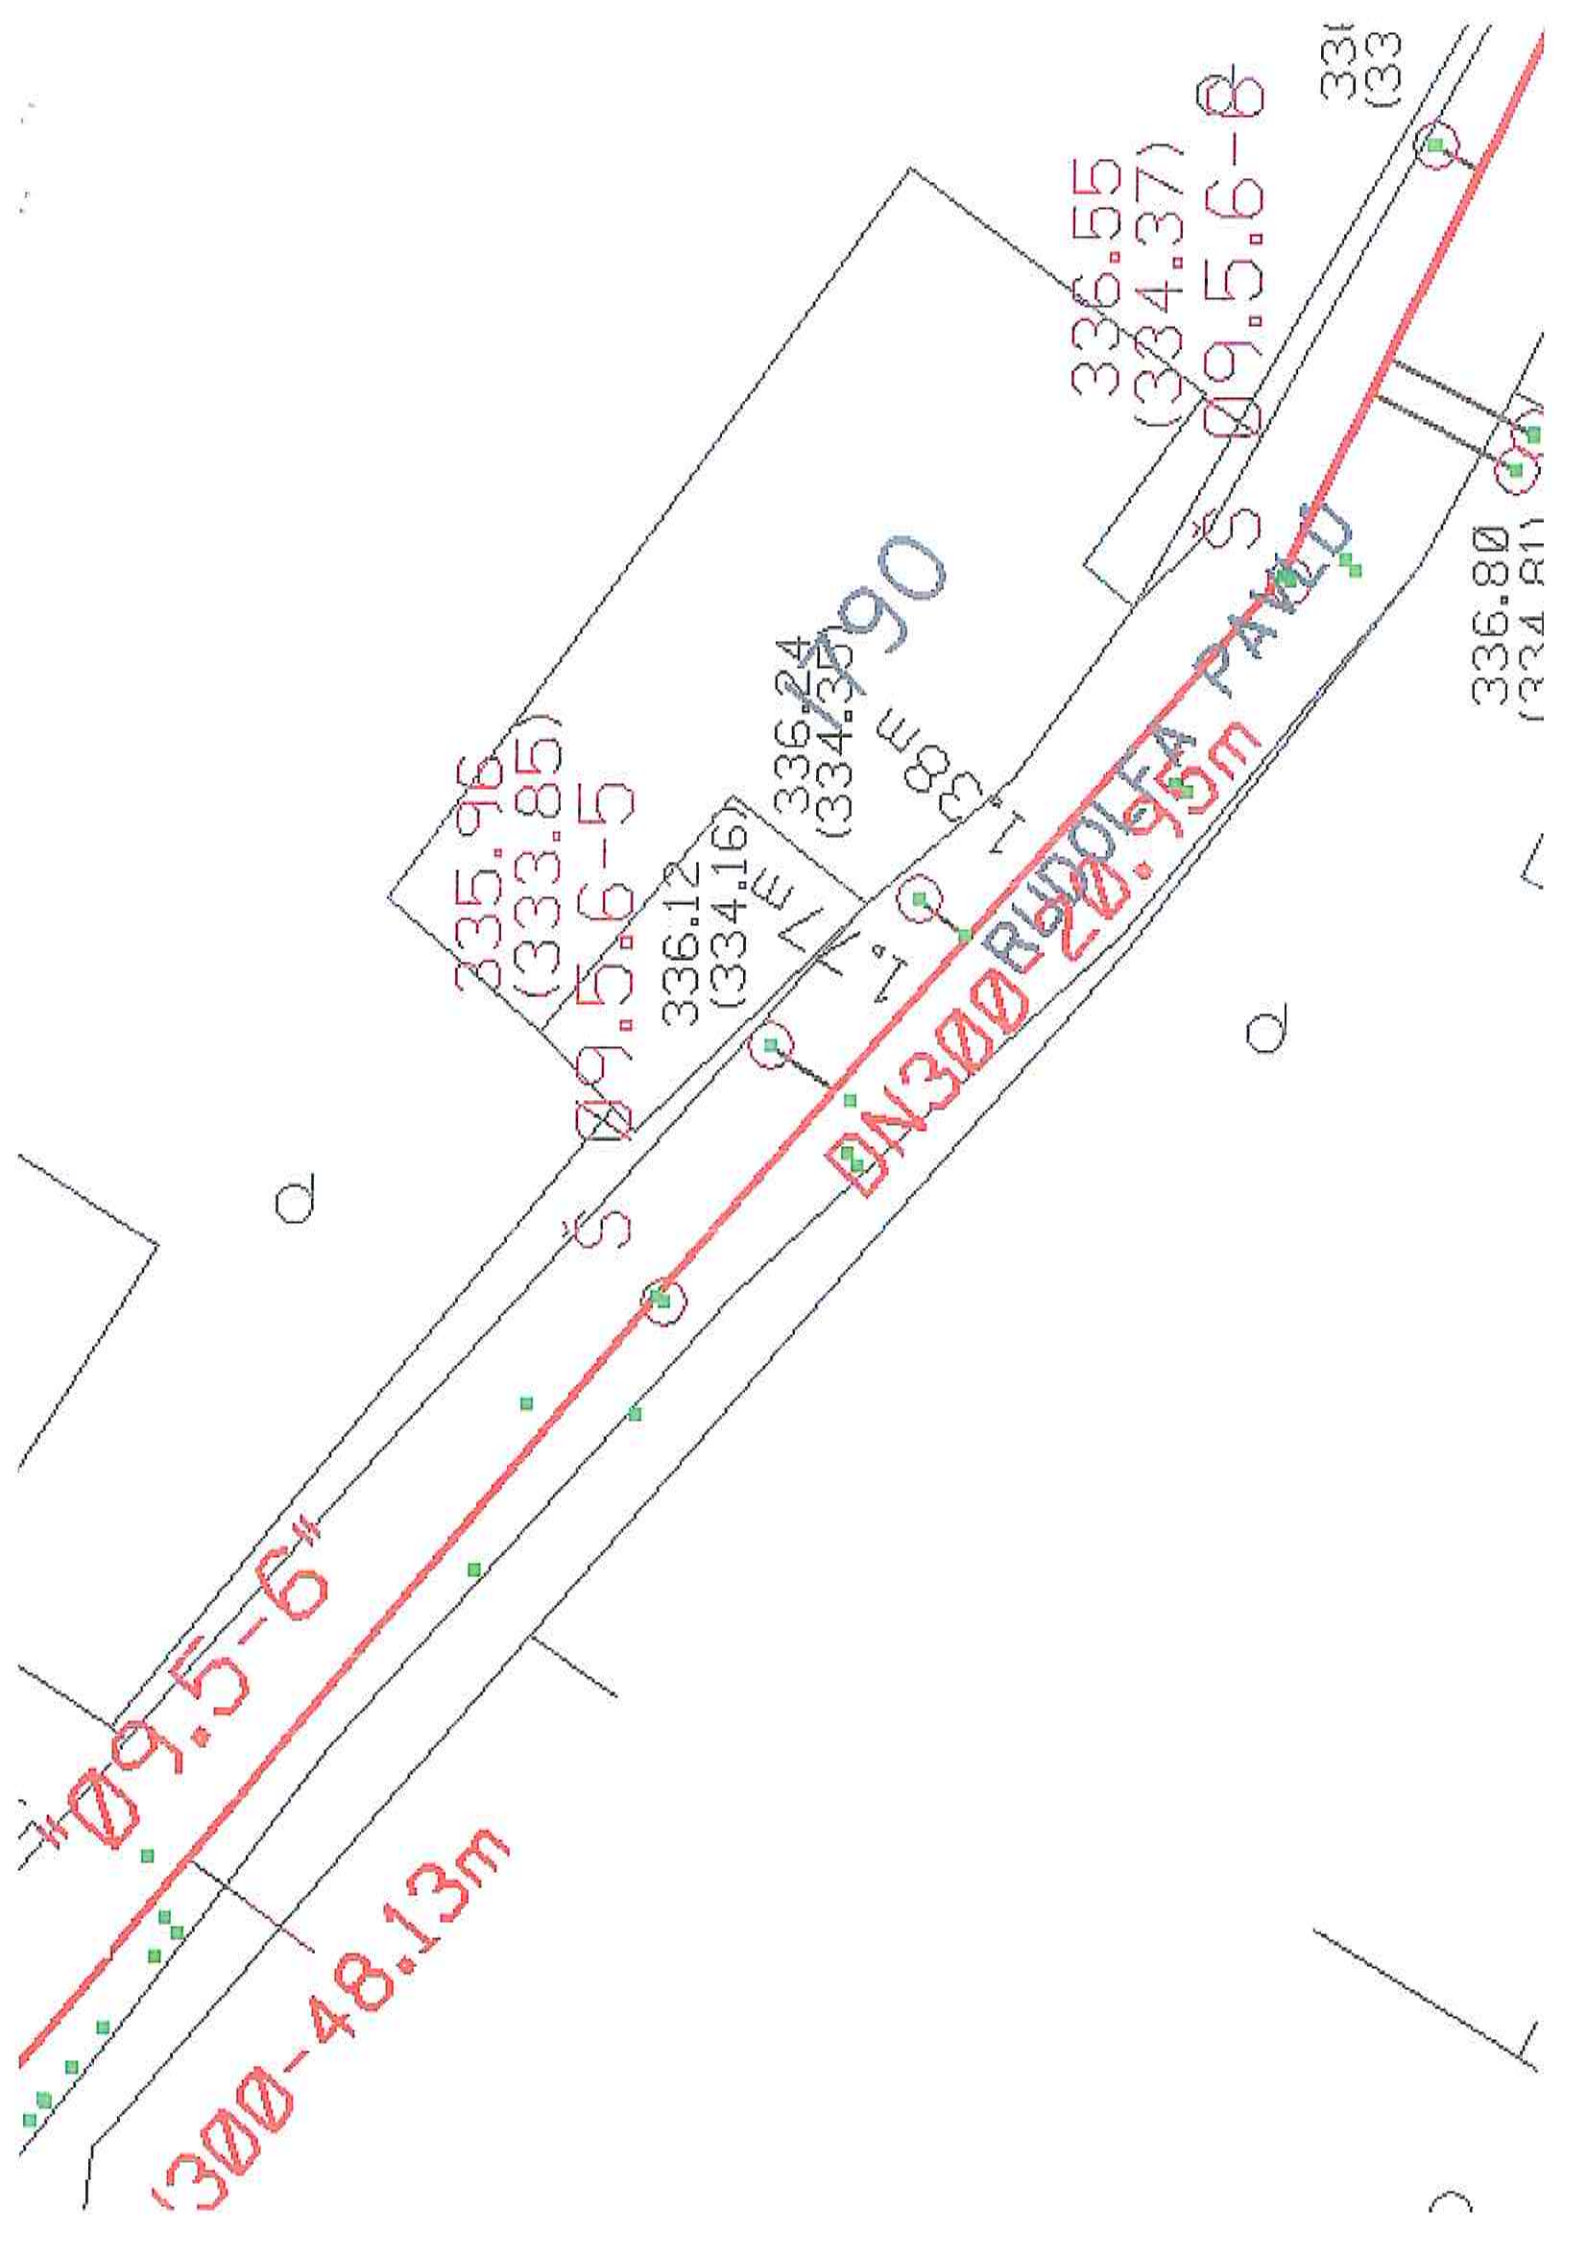

Datum

Denní záznamy stavby

7.11.2014 Zápis o změně způsobu provádění připojení ke střeše D9.T.6.1 kanalizační přípojky STALIČKA 15-1, STALIČKA 20-2, STALIČKA 23, STALIČKA 26 budou prováděny z došedou uverbovanou potrubí pro potlačen ofsetového upravení. Vyodložit se uverbovaní uverbovaná rta.

SpSt here uverbovaní - zpracovat ID

7.11.2014 Zápis o změně

Při vykopávacích pracích na střeše D9.T.6. v úseku mezi #09.5.6 - 5 až #09.5.6 - 6 bylo zjištěno, že uverbovanost má být uverbovanou připojení stávající. Z tohoto důvodu bude provedeno dle uverbovanou připojení v úseku 3 m uverbovanou uverbovanou DN400.

SpSt here uverbovaní - pokračovat dle ID, uverbovanost

7.11.2014 Zápis o změně trasy střeš. BT

Byla provedena změna trasy střeš. BT uverbovanou P2 až P1. Důvodem je odlišná uverbovanou stávající. Změna v úseku P1 až P2, která by vedla k zbytečnému objemu vykopávacích prací na střeše BT.

SpSt here uverbovaní - zpracovat ID, uverbovanost

7.11.2014 Zápis o změně trasy střeš. BT

Při vykopávacích pracích na střeše 23 uverbovanou P21 až P22 bylo zjištěno, že uverbovanou uverbovanou trasy P23 se stávající uverbovanou potrubím DN1000/2000, kde uverbovanou potrubím P23 dle uverbovanou se stávající uverbovanou potrubím. Z toho Na základě této uverbovanosti bude provedeno uverbovanou uverbovanou P23 v uverbovanou potrubím uverbovanou dle uverbovanou uverbovanou uverbovanou uverbovanou.

SpSt here uverbovaní, zpracovat ID, uverbovanost

7.11.2014 Vyjma zhotovitel

vyjma uverbovanou uverbovanou ke kontrole:

- základové spáry a uverbovanou potrubí střeš. D9.1.-01.1.

[illegible]
