

OBEC MALŠOVICE
Malšovice 16, 405 02 Děčín 2



SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
objednatele

faktury č. 202028 na vícepráce dle SoD na st. akci
Rekonstrukce antukových dvorců na hřiště s UMT povrchem ze dne 02.06. 2020

cena dle SoD: 1209544 Kč bez DPH
cena včetně víceprací: 1254618,16 Kč bez DPH (navýšení o 3,72 %)

v souladu s čl. 2 odst. 9) směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

V Malšovicích dne 03.08. 2020


1. místostarosta - Dušan Jehlička

2. místostarosta - Bc. Radovan Urban

Soupis provedených prací

Stavba						Malšovice - rozpočet rekonstrukce antukových dvorců na hřiště s UMT povrchem - vícepráce					
1.	vytěžení antukové vrstvy vč.drenážního štěrku 4cm (140/1697)=0,0825; 0,0825*86,92	t	7,1709	260,00	1 864,43						
2.	nakládka a odvoz vytěženého materiálu do 1000m	t	7,1709	255,00	1 828,58						
3.	Rovnění povrchu laser grejdr 1783,92-1697	m2	86,9200	2,00	173,84						
4.	dodávka a pokládka kameniva frakce 0/4 - včetně položení - 3cm	m2	86,9200	48,00	4 172,16						
6.	Rovnění povrchu laser grejdr	m2	86,9200	2,00	173,84						
7.	Válcování ,hutnění,rovnání povrchu	m2	86,9200	5,00	434,60						
13.	Dodávka a pokládka UMT povrchu Play Comfort 17mm vč.vsypu	m2	86,9200	435,00	37 810,20						
14.	Konstrukce lajn 634-560	bm	74,0000	90,00	6 660,00						
VP 101	460202012 - Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 20 cm, hl 20 cm, v hornině tř 1 a 2	bm	134,1000	17,00	2 279,70						
VP 102	460520172 - Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy 49,6+36,8+47,7	bm	134,1000	29,40	3 942,54						
VP 103	34571352 - trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE (49,6+36,8+47,7)*1,1; profez	bm	147,5100	37,00	5 457,87						
VP 104	174152101 - Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí 134,1*0,15*0,2	m3	4,0230	137,00	551,15						
VP 105	966008211 - Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	bm	24,0000	49,00	1 176,00						
VP 105	997013501 - Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 24*0,206	t	4,9440	192,00	949,25						
	Provedené práce celkem včetně dopravy			bez DPH	67 474,16						
	DPH 21 %				14 169,57						
	Cena celkem s DPH 21 %				81 643,74						

MALŠOVICE - ZAMĚŘENÍ PRO VÝPOČET PLOCHY

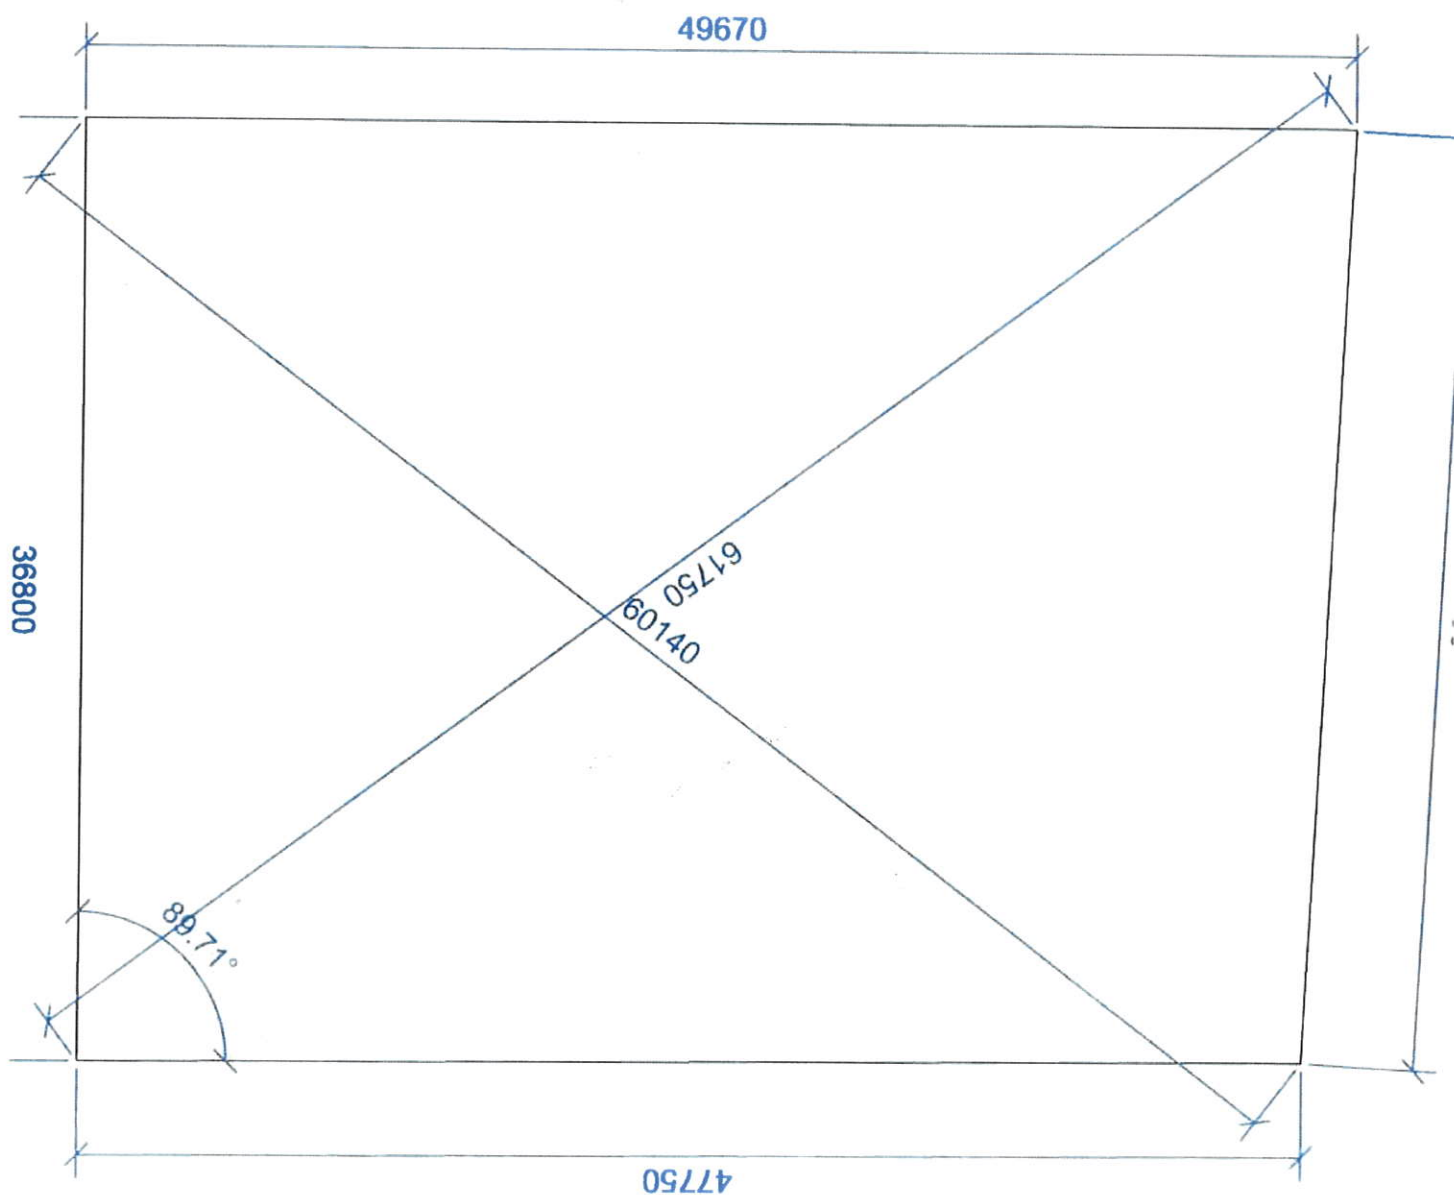

Reko antukových dvorců na hřiště s UMT povrchem – VCP

Popis změn a požadovaných víceprací:

1. Zvětšená plocha – při přejímce staveniště bylo přeměření zjištěno, že skutečná plocha hřiště je 1783,92 m² oproti 1697 m² uváděných v položkovém rozpočtu. Ve fakturaci je tedy uveden rozdíl těchto výměr, tj. 86,92 m². Týká se položek č. 1. – 13. soupisu provedených prací.
2. Lajnování – úpravou lajnování dle požadavků investora se výměra lajn zvětšila o 74 bm. Týká se položky č. 14.
3. Osazení chráničky pro budoucí rozvody osvětlení hřiště – na základě požadavku investora byly osazeny chráničky pr. 50 mm do skladby hřiště na obou delších stranách a krátké straně u silnice. Chráničky jsou ukončeny v rozích hřiště těsně pod povrchem z umělé trávy. Týká se položek č. VP 101 – VP 104.
4. Odstranění odvodňovacího žlábků – dle SoD měl být odvodňovací betonový žlab demontován objednatelem. Po dohodě byl demontován zhotovitelem. Týká se položek VP 105 – VP 106

Popis zpracoval:

Ing. Ivan Šretter


TUBEKO SPORT
spol. s r.o.
Na armádě 364
270 62 Rynholec
IČO: 49825020, DIČ: CZ49825020
