



Faktura - daňový doklad

12251055

2023/01a



QR Platba=F

Objednávka:

Odběratel

Obec Hradec-Nová Ves

Hradec-Nová Ves 12
79084 Hradec-Nová Ves
Česká republika

IČ: 00636011

DIČ: CZ00636011

Konečný příjemce

e-mail:
tel.:

Obec Hradec-Nová Ves

Hradec-Nová Ves 12
79084 Hradec-Nová Ves
Česká republikaPlatba:
Doprava:

Datum

vystavení: 18.07.2025
splatnosti: 17.08.2025
zd. plnění: 18.07.2025

Symbol

konstantní:
variabilní: 12251055
specifický:

Bankovní účet

107-9983400267

0100

Fakturuje Vám opravu místní komunikace 2c, bodové závady a sjezdy, par. č. 1000, 1059, 987 a 1044 v katastrálním území Hradec u Jeseníku, Kód 2023/01a.

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Oprava místní komunikace 2c		1,00	1 676 015,43	21 %	1 676 015,43	351 963,24	2 027 978,67

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	12 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	12 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	1 676 015,43	351 963,24	2 027 978,67
CELKEM		1 676 015,43	351 963,24	2 027 978,67

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 2 027 978,67 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 2 027 978,67

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

BAULAND TECH s.r.o.

Slovenská 1085/1a
702 00 Ostrava-Přívaz
IČ: 041 11 460, DIČ: CZ04111460
tel.: +420 773 629 000

Razítko a podpis

OBEC HRADEC - NOVÁ VES
Hradec - Nová Ves 12
790 84 Mikulovice
Tel.: 584 423 086
IČO: 00636011 DIČ: CZ00636011

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.06.2025 - 18.07.2025

Kód: 2023/01a
Stavba: Oprava místní komunikace 2c, bodové závady a sjezdy, parc. č.1000, 1059, 987 a 1044 v k.ú. Hradec u Jeseníka

Číslo faktury

Místo:

Datum: 18.07.2025

Objednatel: Obec Hradec-Nová Ves

IČ: 00636011
DIČ: CZ00636011

Zhotovitel: BAULAND TECH s.r.o.

IČ: 04111460
DIČ: CZ04111460

Celkový náklad z rozpočtu 1 676 015,43

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.06.2025 - 18.07.2025	Zůstatek
	0,00	1 676 015,43	0,00

DPH: základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 0,00	Výše daně 351 963,24	Výše daně 0,00
---------------	----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

K úhradě v CZK 2 027 978,67

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

BAULAND TECH s.r.o.
Slovenská 1085/1a
702 00 Ostrava-Přivoz
IČ: 041 11 460, DIČ: CZ04111460
tel.: +420 773 629 000

Datum a podpis:

Objednatel:

OBEC HRADEC-NOVÁ VES
Hradec - Nová Ves 12
790 84 Mikulovice
Tel.: 584 423 086
IČ: 00636011 DIČ: CZ00636011

Petr Malý
Horská 1210/2
790 01 Jeseník
IČ: 48435911
Technický dozor stavebníka

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.06.2025 - 18.07.2025

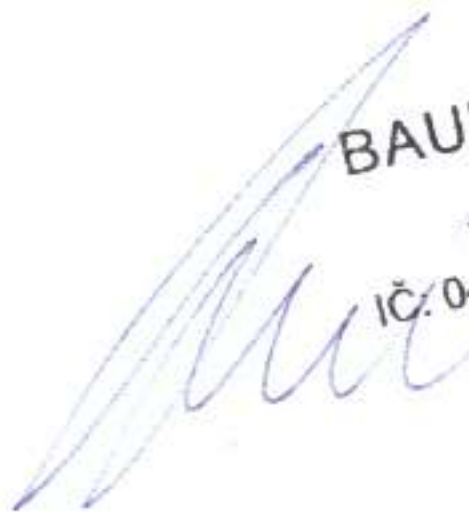
Kód: 2023/01a
 Stavba: Oprava místní komunikace 2c, bodové závady a sjezdy, parc. č.1000, 1059, 987 a 1044 v k.ú. Hradec u Jeseníka

Místo: Datum: 18.07.2025

Objednatel: Obec Hradec-Nová Ves IČ: 00636011
 DIČ: CZ00636011

Zhotovitel: BAULAND TECH s.r.o. IČ: 04111460
 DIČ: CZ04111460

Smluvní rozpočet				Prostavěno	Období (01.06. - 18.07.)	Zůstatek	Méně práce
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena	Cena	Cena
S	2023/01a	Oprava místní komunikace 2c, bodové závady a sjezdy, parc. č.1000, 1059, 987 a 1044 v k.ú. Hradec u Jeseníka	1 676 015,43	0,00	1 676 015,43	0,00	0,00
O	01	Oprava místní komunikace 2c, bodové závady a sjezdy, parc. č.1000, 1059, 987 a 1044 v k.ú. Hradec u	1 676 015,43	0,00	1 676 015,43	0,00	0,00

 BAULAND TECH s.r.o.
 Slovenská 1085/1a
 702 00 Ostrava-Přivoz
 IČ: 041 11 460, DIČ: CZ04111460
 tel.: +420 773 629 000

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.06.2025 - 18.07.2025

Kód: 2023/01a
Stavba: Oprava místní komunikace 2c, bodové závady a sjezdy, parc. č.1000, 1059, 987 a 1044 v k.ú. Hradec u Jeseníka

Místo:		Datum:	18.07.2025
Objednatel:	Obec Hradec-Nová Ves	IČ:	00636011
		DIČ:	CZ00636011
Zhotovitel:	BAULAND TECH s.r.o.	IČ:	04111460
		DIČ:	CZ04111460
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Cena bez DPH	1 676 015,43
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,0 %	1 676 015,43	351 963,24

Cena s DPH	v	CZK	2 027 978,67
------------	---	-----	--------------

Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Petr Malý
Horská 1210/2
790 01 Jeseník
IČ: 48435911
Technický dozor stavebníka

Datum a podpis:

Zhotovitel:

BAULAND TECH s.r.o.
Slovenská 1085/1a
702 00 Ostrava-Přívov
IČ: 041 11 460, DIČ: CZ04111460
tel.: +420 773 629 000

Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.06.2025 - 18.07.2025

Kód: 2023/01a
 Stavba: Oprava místní komunikace 2c, bodové závady a sjezdy, parc. č.1000, 1059, 987 a 1044 v k.ú. Hradec u Jeseníka
 Místo:
 Objednatel: Obec Hradec-Nová Ves
 Zhotovitel: BAULAND TECH s.r.o.
 Datum: 18. 07. 2025
 IČ: 00636011
 DIČ: CZ00636011
 IČ: 04111460
 DIČ: CZ04111460

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.06. - 18.07.)			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
		5 2023/01a	Oprava místní komunikace 2c, bodové závady a sjezdy, parc. č.1000, 1059, 987 a 1044 v k.ú.				1 676 015,43	0,00		0,00			1 676 015,43	0,00		0,00
		O 01	Oprava místní komunikace 2c, bodové závady a sjezdy, parc. č.1000, 1059, 987 a 1044 v k.ú.				1 676 015,43	0,00		0,00			1 676 015,43	0,00		0,00
		D HSV	Práce a dodávky HSV				1 676 015,43	0,00		0,00			1 676 015,43	0,00		0,00
		D 1	Zemní práce				36 403,50	0,00		0,00			36 403,50	0,00		0,00
1	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	65,450	40,00	2 618,00	0,00	0,000	0,00	100,00	65,450	2 618,00	0,00	0,000	0,00
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	65,450	200,00	13 090,00	0,00	0,000	0,00	100,00	65,450	13 090,00	0,00	0,000	0,00
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	104,720	150,00	15 708,00	0,00	0,000	0,00	100,00	104,720	15 708,00	0,00	0,000	0,00
4	K	181912112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	142,500	35,00	4 987,50	0,00	0,000	0,00	100,00	142,500	4 987,50	0,00	0,000	0,00
		D Z1	Doplnění severní římsy a zábradlí				40 825,00	0,00		0,00			40 825,00	0,00		0,00
5	K	317321117	Římsy ze železového betonu C 25/30	m3	0,750	2 500,00	1 875,00	0,00	0,000	0,00	100,00	0,750	1 875,00	0,00	0,000	0,00
6	K	317321191	Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonář malého rozsahu do 25 m3	m3	0,750	2 500,00	1 875,00	0,00	0,000	0,00	100,00	0,750	1 875,00	0,00	0,000	0,00
7	K	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	3,000	1 500,00	4 500,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	4 500,00	0,00	0,000	0,00
8	K	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	3,000	150,00	450,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	450,00	0,00	0,000	0,00
9	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,075	29 000,00	2 175,00	0,00	0,000	0,00	100,00	0,075	2 175,00	0,00	0,000	0,00
10	K	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms	m	5,000	990,00	4 950,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	4 950,00	0,00	0,000	0,00
11	M	55391450	svodidlo mostní jednostranné zádržnost H2	m	5,000	5 000,00	25 000,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	25 000,00	0,00	0,000	0,00
		D Z2	Doplnění šachty vodící pruh				24 500,00	0,00		0,00			24 500,00	0,00		0,00
12	K	895931111	Vpustí kanalizační horské z betonu prostého tř. C 30/37 velikosti 1200/600 mm	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	12 000,00	0,00	0,000	0,00
13	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných	m2	10,000	1 250,00	12 500,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	12 500,00	0,00	0,000	0,00
		D Z3	Rozšíření jižní krajnice u čp.34				9 787,50	0,00		0,00			9 787,50	0,00		0,00
14	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	7,500	350,00	2 625,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,500	2 625,00	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.06. - 18.07.)			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
15	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	7,500	150,00	1 125,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,500	1 125,00	0,00	0,000	0,00
16	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	17,250	350,00	6 037,50	0,00	0,000	0,00	100,00	17,250	6 037,50	0,00	0,000	0,00
D Z4 Výšková úprava kanalizační vpusti							15 730,00	0,00		0,00			15 730,00	0,00		0,00
17	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	1,000	7 420,00	7 420,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	7 420,00	0,00	0,000	0,00
18	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	8 310,00	8 310,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	8 310,00	0,00	0,000	0,00
D Z5 Ochranné opatření u štítu čp.16							23 840,52	0,00		0,00			23 840,52	0,00		0,00
19	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	3,600	900,00	3 240,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,600	3 240,00	0,00	0,000	0,00
20	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	12,000	150,00	1 800,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	1 800,00	0,00	0,000	0,00
21	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	12,000	112,00	1 344,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	1 344,00	0,00	0,000	0,00
22	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	24,000	50,40	1 209,60	0,00	0,000	0,00	100,00	24,000	1 209,60	0,00	0,000	0,00
23	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	28,800	33,40	961,92	0,00	0,000	0,00	100,00	28,800	961,92	0,00	0,000	0,00
24	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,600	2 200,00	1 320,00	0,00	0,000	0,00	100,00	0,600	1 320,00	0,00	0,000	0,00
25	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	2,400	1 250,00	3 000,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,400	3 000,00	0,00	0,000	0,00
26	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	15,000	99,00	1 485,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	1 485,00	0,00	0,000	0,00
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12,000	300,00	3 600,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	3 600,00	0,00	0,000	0,00
28	M	59217028	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	m	12,000	212,00	2 544,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	2 544,00	0,00	0,000	0,00
29	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	6,000	556,00	3 336,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	3 336,00	0,00	0,000	0,00
D Z6 Doplnění podkladu, rozšíření krajnice (stav č. 0871)							45 055,65	0,00		0,00			45 055,65	0,00		0,00
30	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	20,250	250,00	5 062,50	0,00	0,000	0,00	100,00	20,250	5 062,50	0,00	0,000	0,00
31	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	20,250	150,00	3 037,50	0,00	0,000	0,00	100,00	20,250	3 037,50	0,00	0,000	0,00
32	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	46,575	350,00	16 301,25	0,00	0,000	0,00	100,00	46,575	16 301,25	0,00	0,000	0,00
33	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	7,200	697,00	5 018,40	0,00	0,000	0,00	100,00	7,200	5 018,40	0,00	0,000	0,00
34	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	40,000	50,40	2 016,00	0,00	0,000	0,00	100,00	40,000	2 016,00	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.06. - 18.07.)			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
35	M	69311068.1	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	48,000	25,00	1 200,00	0,00	0,000	0,00	100,00	48,000	1 200,00	0,00	0,000	0,00
36	K	212532111.1	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	7,200	1 450,00	10 440,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,200	10 440,00	0,00	0,000	0,00
37	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	20,000	99,00	1 980,00	0,00	0,000	0,00	100,00	20,000	1 980,00	0,00	0,000	0,00
D 27 Oprava místní komunikace 2c							1 418 640,00	0,00		0,00			1 418 640,00	0,00		0,00
38	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	30,000	250,00	7 500,00	0,00	0,000	0,00	100,00	30,000	7 500,00	0,00	0,000	0,00
39	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	30,000	150,00	4 500,00	0,00	0,000	0,00	100,00	30,000	4 500,00	0,00	0,000	0,00
40	M	58344197	šterkodrtí frakce 0/63	t	69,000	350,00	24 150,00	0,00	0,000	0,00	100,00	69,000	24 150,00	0,00	0,000	0,00
41	K	113154543	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 500,000	45,00	67 500,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 500,000	67 500,00	0,00	0,000	0,00
43	K	567541121	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky přes 200 do 300 mm	m2	1 500,000	80,00	120 000,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 500,000	120 000,00	0,00	0,000	0,00
44	K	567532122	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrutím, zhutněním a vličením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 220 do 250 mm	m2	1 500,000	115,00	172 500,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 500,000	172 500,00	0,00	0,000	0,00
45	M	58522110	ceмент portlandský směsný CEM II 42,5MPa	t	20,700	3 900,00	80 730,00	0,00	0,000	0,00	100,00	20,700	80 730,00	0,00	0,000	0,00
46	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	103,500	400,00	41 400,00	0,00	0,000	0,00	100,00	103,500	41 400,00	0,00	0,000	0,00
47	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	1 500,000	29,00	43 500,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 500,000	43 500,00	0,00	0,000	0,00
48	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 500,000	280,00	420 000,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 500,000	420 000,00	0,00	0,000	0,00
49	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 500,000	12,80	19 200,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 500,000	19 200,00	0,00	0,000	0,00
50	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 500,000	270,00	405 000,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 500,000	405 000,00	0,00	0,000	0,00
51	K	569821112	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 90 mm	m2	60,000	99,00	5 940,00	0,00	0,000	0,00	100,00	60,000	5 940,00	0,00	0,000	0,00
52	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	30,000	99,00	2 970,00	0,00	0,000	0,00	100,00	30,000	2 970,00	0,00	0,000	0,00
53	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	30,000	125,00	3 750,00	0,00	0,000	0,00	100,00	30,000	3 750,00	0,00	0,000	0,00
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							8 452,50	0,00		0,00			8 452,50	0,00		0,00
54	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	172,500	40,00	6 900,00	0,00	0,000	0,00	100,00	172,500	6 900,00	0,00	0,000	0,00
55	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	172,500	9,00	1 552,50	0,00	0,000	0,00	100,00	172,500	1 552,50	0,00	0,000	0,00
D 998 Přesun hmot							10 580,76	0,00		0,00			10 580,76	0,00		0,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.06. - 18.07.)			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
56	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	176,346	60,00	10 580,76	0,00	0,000	0,00	100,00	176,346	10 580,76	0,00	0,000	0,00
D OST				Ostatní				37 200,00	0,00	0,00		37 200,00	0,00		0,00	0,00
57	K	02	Po dobu rekonstrukce komunikace dojde k dočasnému znemožnění průjezdu přes tuto komunikaci. Dodavatel vyřídí veškeré nutné povolení zvláštního užívání, včetně přechodného dopravní značení.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	10 000,00	0,00	0,000	0,00
58	K	02a	Zhotovitel stavby bude původcem odpadů a vzniklé odpady bude evidovat v souladu se zákonem. K předání stavby dodá potřebné doklady (atesty, prohlášení o shodě, o likvidaci odpadu, protokoly zkoušek, fotodokumentaci -před, průběh, po dokončení stavby, předávací protokol, stavební deník)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,00
59	K	03	Dynamická zatěžovací zkouška	kpl	4,000	800,00	3 200,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	3 200,00	0,00	0,000	0,00
60	K	04	Statická zatěžovací zkouška	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	6 000,00	0,00	0,000	0,00
61	K	05	Posouzení vhodnosti opravy geotechnikem	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 000,00	0,00	0,000	0,00
62	K	VRN91-81	Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,00
63	K	021103001	Geometrické zaměření skutečného provedení ploch a délek komunikací (m2,m)	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,00
D VRN				Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00
64	K	01	Vedlejší a ostatní náklady se zhotovením díla (Zařízení staveniště, provoz, odstranění a ostatní práce pro zhotovení díla)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 000,00	0,00	0,000	0,00

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
STAVBY A PROVEDENÝCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

OBJEDNATEL:

Obec Hradec-Nová Ves
Nová Ves č.p.12
790 84
IČ:00636011

ZHOTOVITEL:

BAULAND TECH s.r.o.
Slovenská 1085/1a
702 00 Ostrava-Přivoz
IČ: 041 11 460, DIČ: CZ04111460
tel.: +420 773 629 000

Název a místo díla : **Oprava MK 2c,bodové závady a sjezdy,parc. Č.
1000,1059,987 a 1044 v k.ú. Hradec u Jeseníka**

K předání díla / stavby /došlo na místě samém.

Termín zahájení díla/ předání staveniště / - dne: 13.06.2025

za objednatele: -Pavel Stejskak-starosta obce

za Technický dozor stavby: Petr Malý

za zhotovitele BAULANDTech s.r.o. - odpovědný zástupce Blaho Miroslav a jednatel společnosti

Termín předání díla:

dle uzavřené Smlouvy o dílo bude dílo předáno nejpozději do 31.08.2023

Předání díla dle skutečnosti: 18.07.2025

Soupis případných nedodělků a stanovení náhradního termínu pro předání díla:

-bez závad a nedodělků

Dnešního dne při místním šetření bylo podepsaným: zástupci zhotovitele a objednatele za účasti technického dozoru, zástupce konečného uživatele, uskutečněno předání práci a dodávek na stavbě v dobré kvalitě, bez viditelných závad a nedodělků. Práce byly provedeny v rozsahu objednávky, dle platných ČSN a jiných předpisů v předepsané kvalitě. Objednatel přejímá tyto ukončené práce bez zjevných vad a nedodělků.

v Hradci-Nové Vsi dne 18.07.2025

Za zhotovitele

Blaho Miroslav

BAULAND TECH s.r.o.
Slovenská 1085/1a
702 00 Ostrava-Přivoz
IČ: 041 11 460, DIČ: CZ04111460
tel.: +420 773 629 000

Za objednatele

Pavel Stejskal-starosta obce

OBEC HRADEC - NOVÁ VES
Hradec - Nová Ves 12
790 84 Mikulovice
Tel.: 584 423 086
IČ: 00636011 DIČ: CZ00636011

Za TDS

Petr Malý

Doba realizace díla se počítá ode dne následujícího po převzetí stavby. Protokol bude vyhotoven ve dvou provedeních z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Protokol o předání a převzetí staveniště

I. Základní údaje

Název stavby: **Oprava místní komunikace 2c, bodové závady a sjezdy, parc. č.1000, 1059, 987 a 1044 v k.ú. Hradec u Jeseníka**

Objednatel – předávající: **Obec Hradec-Nová Ves, Hradec-Nová Ves 12, 790 84 Mikulovice**

Zhotovitel – přejímající: **BAULAND TECH s.r.o., Slovenská 1085/1a, 702 00 Ostrava-Přívoz**

Technický dozor objednatele: **Petr Malý**

Datum zahájení přejímky: **8.4.2025**

Pověrný zástupce objednatele: **Obec Hradec-Nová Ves**

Pověřený zástupce zhotovitele: **Miroslav Blaho**

II. Předání dokladů:

Projektová dokumentace: Popis a soupis prací

III. Staveniště

1. Při předání staveniště byla provedena fyzická prohlídka prostoru staveniště za účelem seznámení s aktuálním stavem.
2. Hranice staveniště jsou dány projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen zajistit oplocení, osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, materiálu a techniky dopravených zhotovitelem na staveniště. Hranice staveniště je zhotovitel povinen zabezpečit způsobem určeným v realizační projektové dokumentaci při dodržení požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., po celou dobu existence staveniště
3. Sklad materiálu bude upřesněn operativně, počítá se výhradně s plochami v rámci staveniště.
4. Stavební suť bude odvážena průběžně, tak aby nebylo narušeno životní prostředí, případně bude operativně dohodnuta plocha v prostoru staveniště.
5. Plochy zabrané jako sklad materiálu, sklad sutě, zařízení staveniště (buňka, WC apod.) které nejsou předmětem projektu, budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu. Stejně tak ostatní plochy využitě dopravou stavby, případně využitě zařízení sousedních budov, budou zhotovitelem maximálně zabezpečeny proti poškození a v případě jejich poškození uvedeny do původního stavu.
6. Sociální zařízení – WC, umývárna, šatna – si zajistí zhotovitel své, mobilní na své náklady.
7. Zdroj užitkové vody a elektrické energie si zajistí zhotovitel mobilní na své náklady.
8. Seznámení s uzávěry vody, plynu, elektřiny vzhledem k povaze díla neproběhlo, ochrana sítí dle příslušných stanovisek správců a majitelů, viz PD.
9. Zhotovitel byl seznámen se specifiky pracoviště, přebírá odpovědnost za zajištění zásad BOZP a PO dle platných předpisů a norem. Zejména bude dbát na povinnosti vyplývající z zákona 309/2006 Sb., v platném znění. Při spolupráci s dalšími zhotoviteli (subdodávky) si vzájemně předá vyhodnocení rizik a opatření BOZP a zajistí seznámení všech pracovníků s plánem BOZP.
10. Další ujednání:
 - Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpadními vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi.
 - Zhotovitel je povinen udržovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech překážek. Na staveništi nebude shromažďován jakýkoliv výkopek, odpad, zbytky, kterých nebude dále využíváno nebo nebude potřebné při provádění díla.
 - Zhotovitel je povinen zajistit úklid komunikací v místě provádění díla, jestliže dojde k jejich znečištění v důsledku jeho činností při provádění díla. Komunikace musí být uklizeny po jejich znečištění bez zbytečného odkladu.
 - Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předání díla ze staveniště všechny přebytečné materiály, odpady, zbytky, montážní zařízení apod.
 - Stavební odpad bude důsledně tříděn v souladu s Vyhláškou 381/2001 Sb.

11. Všichni zúčastnění se na uvedeném shodli a potvrzují svými podpisy, že objednatel tímto staveniště předal, zhotovitel převzal.

Ve Zlatých Horách dne 8.4.2025

Pověřený zástupce objednatele – předávající:
Jméno a příjmení: **Obec Hradec-Nová Ves**

Pověřený zástupce zhotovitele – přejímající:
Jméno a příjmení: **Miroslav Blaho**

Podpis:

OBEC HRADEC - NOVÁ VES
 Hradec - Nová Ves 12
790 84 Mikulovice
Tel.: 584 423 086
IČO: 00636011 DIČ: CZ00636011

Podpis:

BAULAND TECH s.r.o.
Slovenská 1085/1a
702 00 Ostrava-Přívovz
IČ: 041 11 460, DIČ: CZ04111460
tel.: +420 773 629 000
