



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	21. 09. 2015
Ev.č.	ZL- 018-S-Z-SO 3.004	Datum schválení	29. 09. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx)		Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh / SO 3.004 - LOKALITA UL. 28. ŘÍJNA		
Specifikace změny: Při provádění protlaku technologií šnekového vrtání pro uložení ocelové chráničky DN500 došlo pode dnem křížené zatrubněné vodoteče k zastavení pilotního vrtu o pevnou překážku, která brání provedení pilotního vrtu pro technologii šnekového vrtání. Zhotovitel proto navrhuje provést protlak pod zatrubněnou vodotečí hornickým způsobem, který umožní odstranění pevné překážky a následné uložení ocelové chráničky DN 800 v délce cca. 6 m.			
Předmětem změnového listu je: - Změna technologie provádění protlaku na stoce 04.1.5.2.1			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	192 097,08 Kč		
Stanovisko správce stavby: <i>Vzhledem k níže uvedeným skutečnostem a k tomu, že se jedná o změnu, která nevede ke zvýšení ceny, doporučuji schválit.</i>			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis + situace 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Stavební deník 5) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **) SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu	 AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ48984971 Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu
Datum: 21. 09. 2015	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 09 Brno záměstí Brno - VHS a.s. 4 Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **) Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilová 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel: 583 317 111 fax: 583 214 845 Jiří Vykydal - manažer projektu 29. 09. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Aquaprocon

Ing. Vlastislav Kolečkář

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Holotík Vladimír	holotikv@imosbrno.eu / 602 713 982	26.8.2015

Iniciační dopis ID-018-S-Z-SO 3.004 - Změna technologie provádění protlaku na stoce 04.1.5.2.1


Aktuální stav: Při provádění protlaku technologií šnekového vrtání pro uložení ocelové chráničky DN 300 došlo pode dnem křížené zatrubněné vodoteče k zastavení pilotního vrtu o pevnou překážku, která brání provedení pilotního vrtu pro technologii šnekového vrtání.

Návrh řešení: Provedení protlaku pod zatrubněnou vodotečí hornickým způsobem, který umožní odstranění pevné překážky a následné uložení ocelové chráničky DN 800 v délce cca. 6 m.

Žádáme zodpovědného projektanta a provozovatele o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Ing. Holotík Vladimír

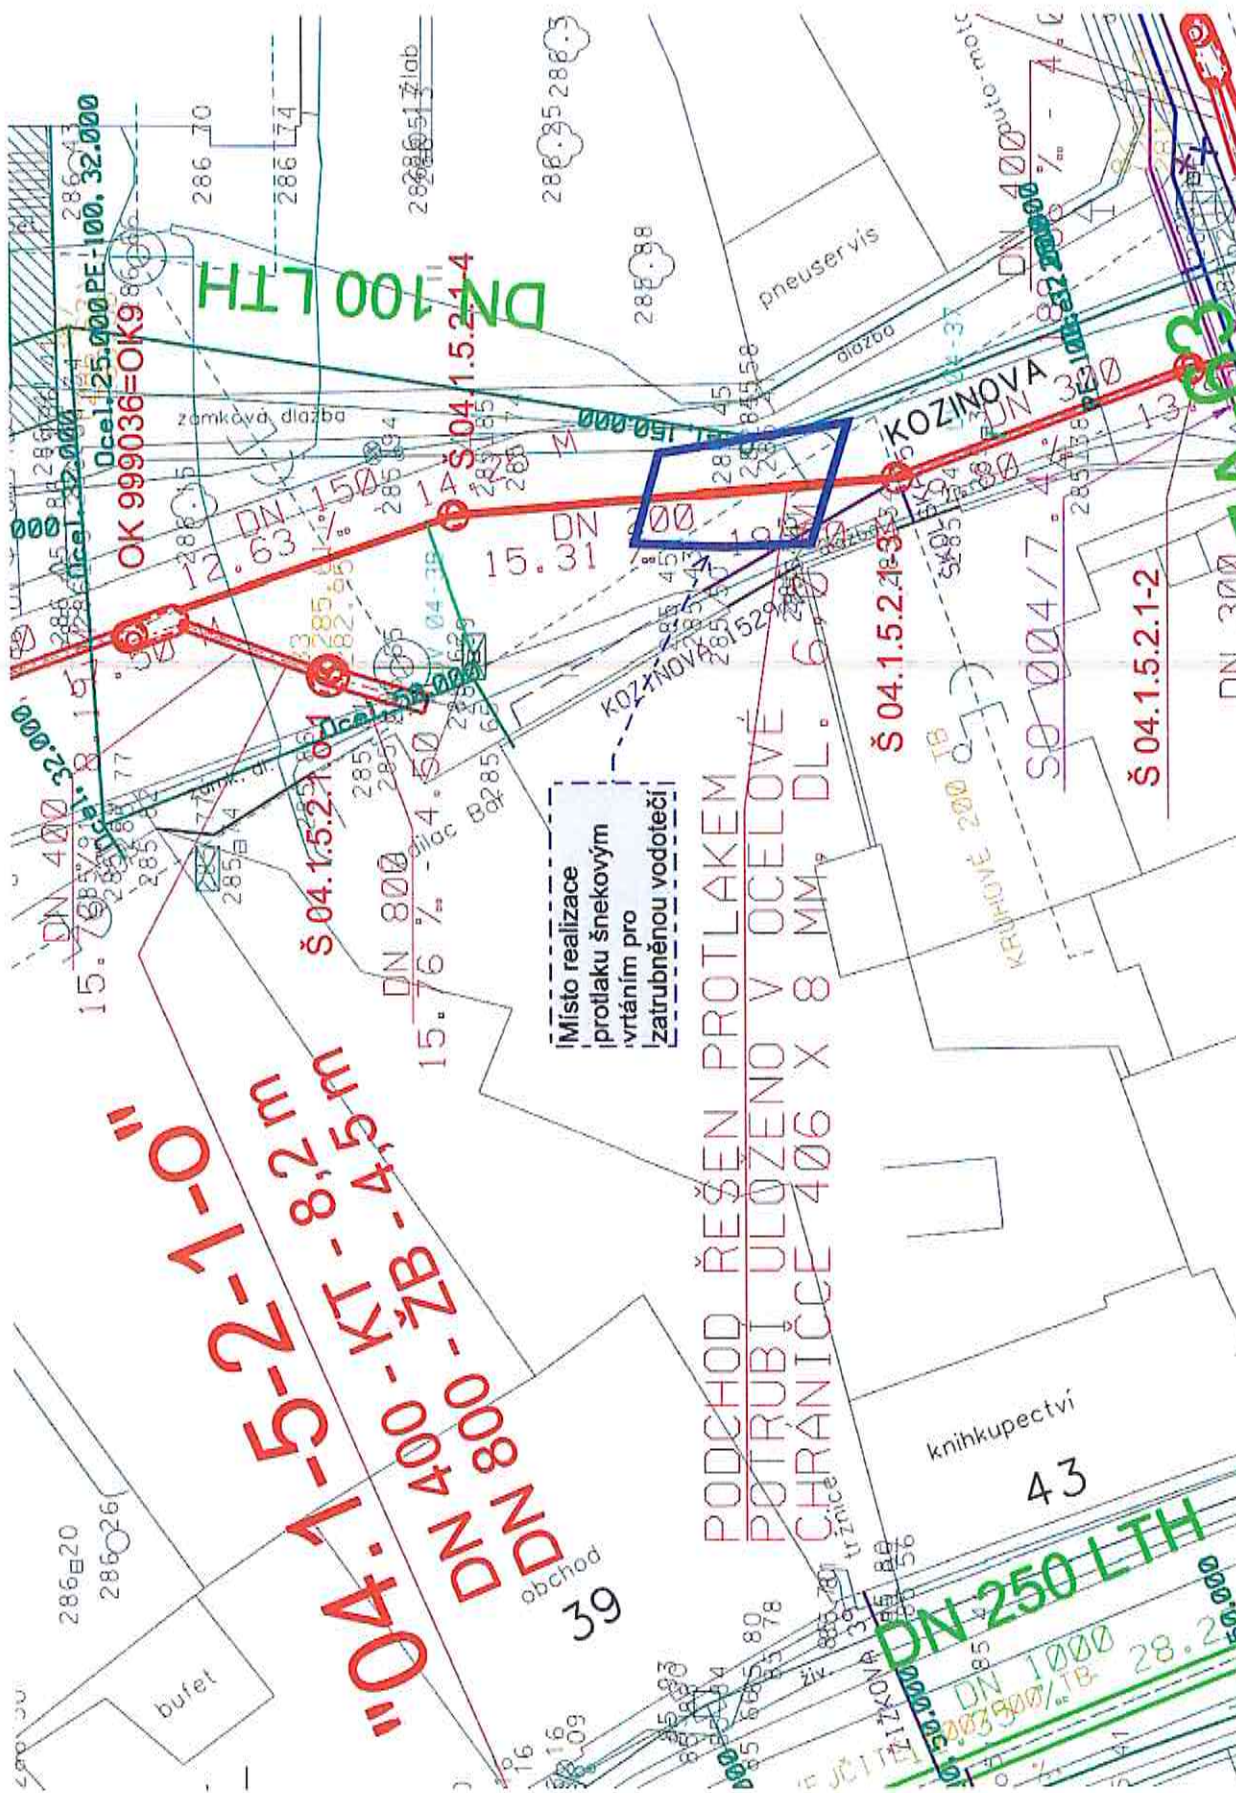

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-018-S-Z-SO 3.004

3. Město Zábřeh / stoka 04.1-5-2-1 / úsek Š3 - Š4

Změna způsobu provádění protlaku stoky 04.1-5-2-1 v úseku mezi Š3 a Š4

Pol.	Popis položky	Rozpočet dle SoD				Skutečnost				Rozdíl		ZL-018-S-Z-SO 3.004	
		m.j.	množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP	
STOKA 04.1-5-2-1 - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
1250	Protláčení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	6,00	19 963,40	119 780,40	0,00	19 963,40	0,00	-6,00	-119 780,40		-119 780,40	
8/SO 1.001	Protláčení ocelových trub délky do 100 m D nad 720 do 820 mm I stupeň ražnosti	m	0,00	41 212,90	0,00	6,00	41 212,90	247 277,40	6,00	247 277,40	247 277,40		
1268	Trubka ocelová hladká D 324x8,0 mm	m	6,60	6 343,10	41 864,46	0,00	6 343,10	0,00	-6,60	-41 864,46		-41 864,46	
9/SO 1.001	Trubka ocelová DN 800	m	0,00	16 006,90	0,00	6,60	16 006,90	105 645,54	6,60	105 645,54	105 645,54		
Zemní práce celkem :					161 644,86			352 922,94	191 278,08		352 922,94	-161 644,86	
Trubní vedení													
1282	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 200 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	6,00	2 273,30	13 639,80	0,00	2 273,30	0,00	-6,00	-13 639,80		-13 639,80	
42/SO 1.001	Nasunutí trubní sekce do chráničky DN 800, včetně kluzných objímek, uzavření čel chráničky	m	0,00	2 409,80	0,00	6,00	2 409,80	14 458,80	6,00	14 458,80	14 458,80		
Trubní vedení celkem :					13 639,80			14 458,80	819,00		14 458,80	-13 639,80	
ZL-018-S-Z-SO 3.004 CELKEM :					175 284,66			367 381,74	192 097,08		367 381,74	-175 284,66	



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 465/15/K
Datum: 26. 8. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Joki

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

**Iniciační dopis č.: ID-018-S-Z-SO 3.004 Změna technologie provádění
protlaku na stoce 04.5.2.1**

Vyjádření projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při provádění protlaku technologií šnekového vrtání pro uložení ocelové chráničky DN 300 bylo zjištěno, že pode dnem křížené zatrubněné vodoteče došlo k zastavení pilotního vrtu o pevnou překážku, která brání provedení pilotního vrtu pro technologii šnekového vrtání. Zhotovitel navrhuje provést protlak pod zatrubněnou vodotečí hornickým způsobem, který umožní odstranění pevné překážky, s uložení ocelové chráničky DN 800 v délce cca 6 m.

Projektant s návrhem zhotovitele souhlasí, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. Bez provedení protlaku hornickým způsobem nelze stoku 04.5.2.1 dokončit.

Za projektanta:

Ing. Vlastislav Kolečkář

Datum:

Podpis:





IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 465-1/15/K
Datum: 26. 8. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-018-S-Z-SO 3.004 Změna technologie provádění protlaku na stoce 04.5.2.1

Vyřádění generálního projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při provádění protlaku technologií šnekového vrtání pro uložení ocelové chráničky DN 300 bylo zjištěno, že pode dnem křížené zatrubněné vodoteče došlo k zastavení pilotního vrtu o pevnou překážku, která brání provedení pilotního vrtu pro technologii šnekového vrtání. Zhotovitel navrhuje provést protlak pod zatrubněnou vodotečí hornickým způsobem, který umožní odstranění pevné překážky, s uložení ocelové chráničky DN 800 v délce cca. 6 m.

Za generálního projektanta s návrhem zhotovitele souhlasíme, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. Bez provedení protlaku hornickým způsobem nelze stoku 04.5.2.1 dokončit.

Za generálního projektanta:

Ing. Jan Polášek

Datum:

Podpis:





Šumerská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Šumperk, čp. 2769, Jilová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

☎ 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603-841/0100

AQUA Procon s.r.o.
Ing. Kolečkář V.
Palackého tř. 12,
612 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

e-mail

Vyřizuje/
Heitmar Petr

Šumperk
14.9.2015

0 959- 50000/2015

heitmar@spvs.cz

Věc: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“

Týká se: „ Horní Pomoraví II sever, Město Zábřeh „

Šumerská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk jako provozovatel obdržela od zhotovitele stavby fa: IMOS BRNO, a.s. žádost o vyjádření k předloženému stanovisku (Iniciační dopis ID-018-S-Z-SO 3.004 – Změna technologie provádění protlaku na stoce 04.1.5.2.1).

Šumerská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk k předloženému návrhu konstatuje následující:

- S navrženým řešením souhlasíme.

S pozdravem

Šumerská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jilová 6, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911

Ing. Pavel Paloncý
technický ředitel
