



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	4. 12. 2015
Ev.č.	ZL-113-S-Z-SO 3.004	Datum schválení	7. 12. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx)		Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh / SO 3.004 - LOKALITA UL. 28. ŘÍJNA		
<u>Specifikace změny:</u> V ZDS navržené přeložky NTL plynovodu 004/6.2 a 004/6.3 po upřesnění podkladů od RWE byly změněny v RDS na STL plynovodní přeložky 004/6.2 a 004/6.3 d 225/12,8. Tímto dochází ke změně v technologii propojování plynovodů, v tzv. 2-násobného balonování středotlakého plynovodu. Zhotovitel navrhuje pro bezpečné odstavení plynovodu během provádění propoje přeložky plynu provést 2-násobné balonování stávajícího potrubí - speciální uzavření plynovodu.			
<u>Předmětem změnového listu je:</u> - Propojení plynovodní přeložky 004/6.2 a 004/6.3			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	372 200,00 Kč		
Stanovisko správce stavby:	<i>Shodou s touto přílohou viz. stav na stavbě a vzhledem k RWE, navržený je provedení sklonů. Doporučuji objednateli navržené řešení ke schválení.</i>		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis + situace 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Fotodokumentace 5) Stavební deník		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přehled

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji-schválit **) SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu	 AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ46984971 Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu
Datum: 4. 12. 2015	Datum:
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 IMOS Brno, a.s. Olešnická 174, 602 00 Brno závod Brno - VHS a DS Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **) Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilová 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel.: 583 317 111 fax: 583 214 845 Jiří Vykydal - manažer projektu 7. 12. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Tým Správce stavby

Horní Pomoraví II - sever

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Martin Spáčil	spacilm@imosbrno.eu / 739 391 653	30.10.2015

Iniciační dopis ID-113-S-ZO-SO 3.004 - Propojení plynovodní přeložky 004/6.2 a 004/6.3

Aktuální stav:

Navržená přeložka NTL plynovodu 004/6.2 a 004/6.3 po upřesnění podkladů od RWE, byla provedena změna v PD na STL plynovod přeložek 004/6.2, 004/6.3 d 225/12,8.

Tímto dochází ke změně v technologii propojování plynovodů, v tzv. 2-násobného balonování středotlakého plynovodu.


Návrh řešení:

Pro bezpečné odstavení plynovodu během provádění propoje přeložky plynu provést 2-násobné balonování stávajícího potrubí - speciální uzavření plynovodu.

Žádáme tým správce stavby o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Martin Spáčil

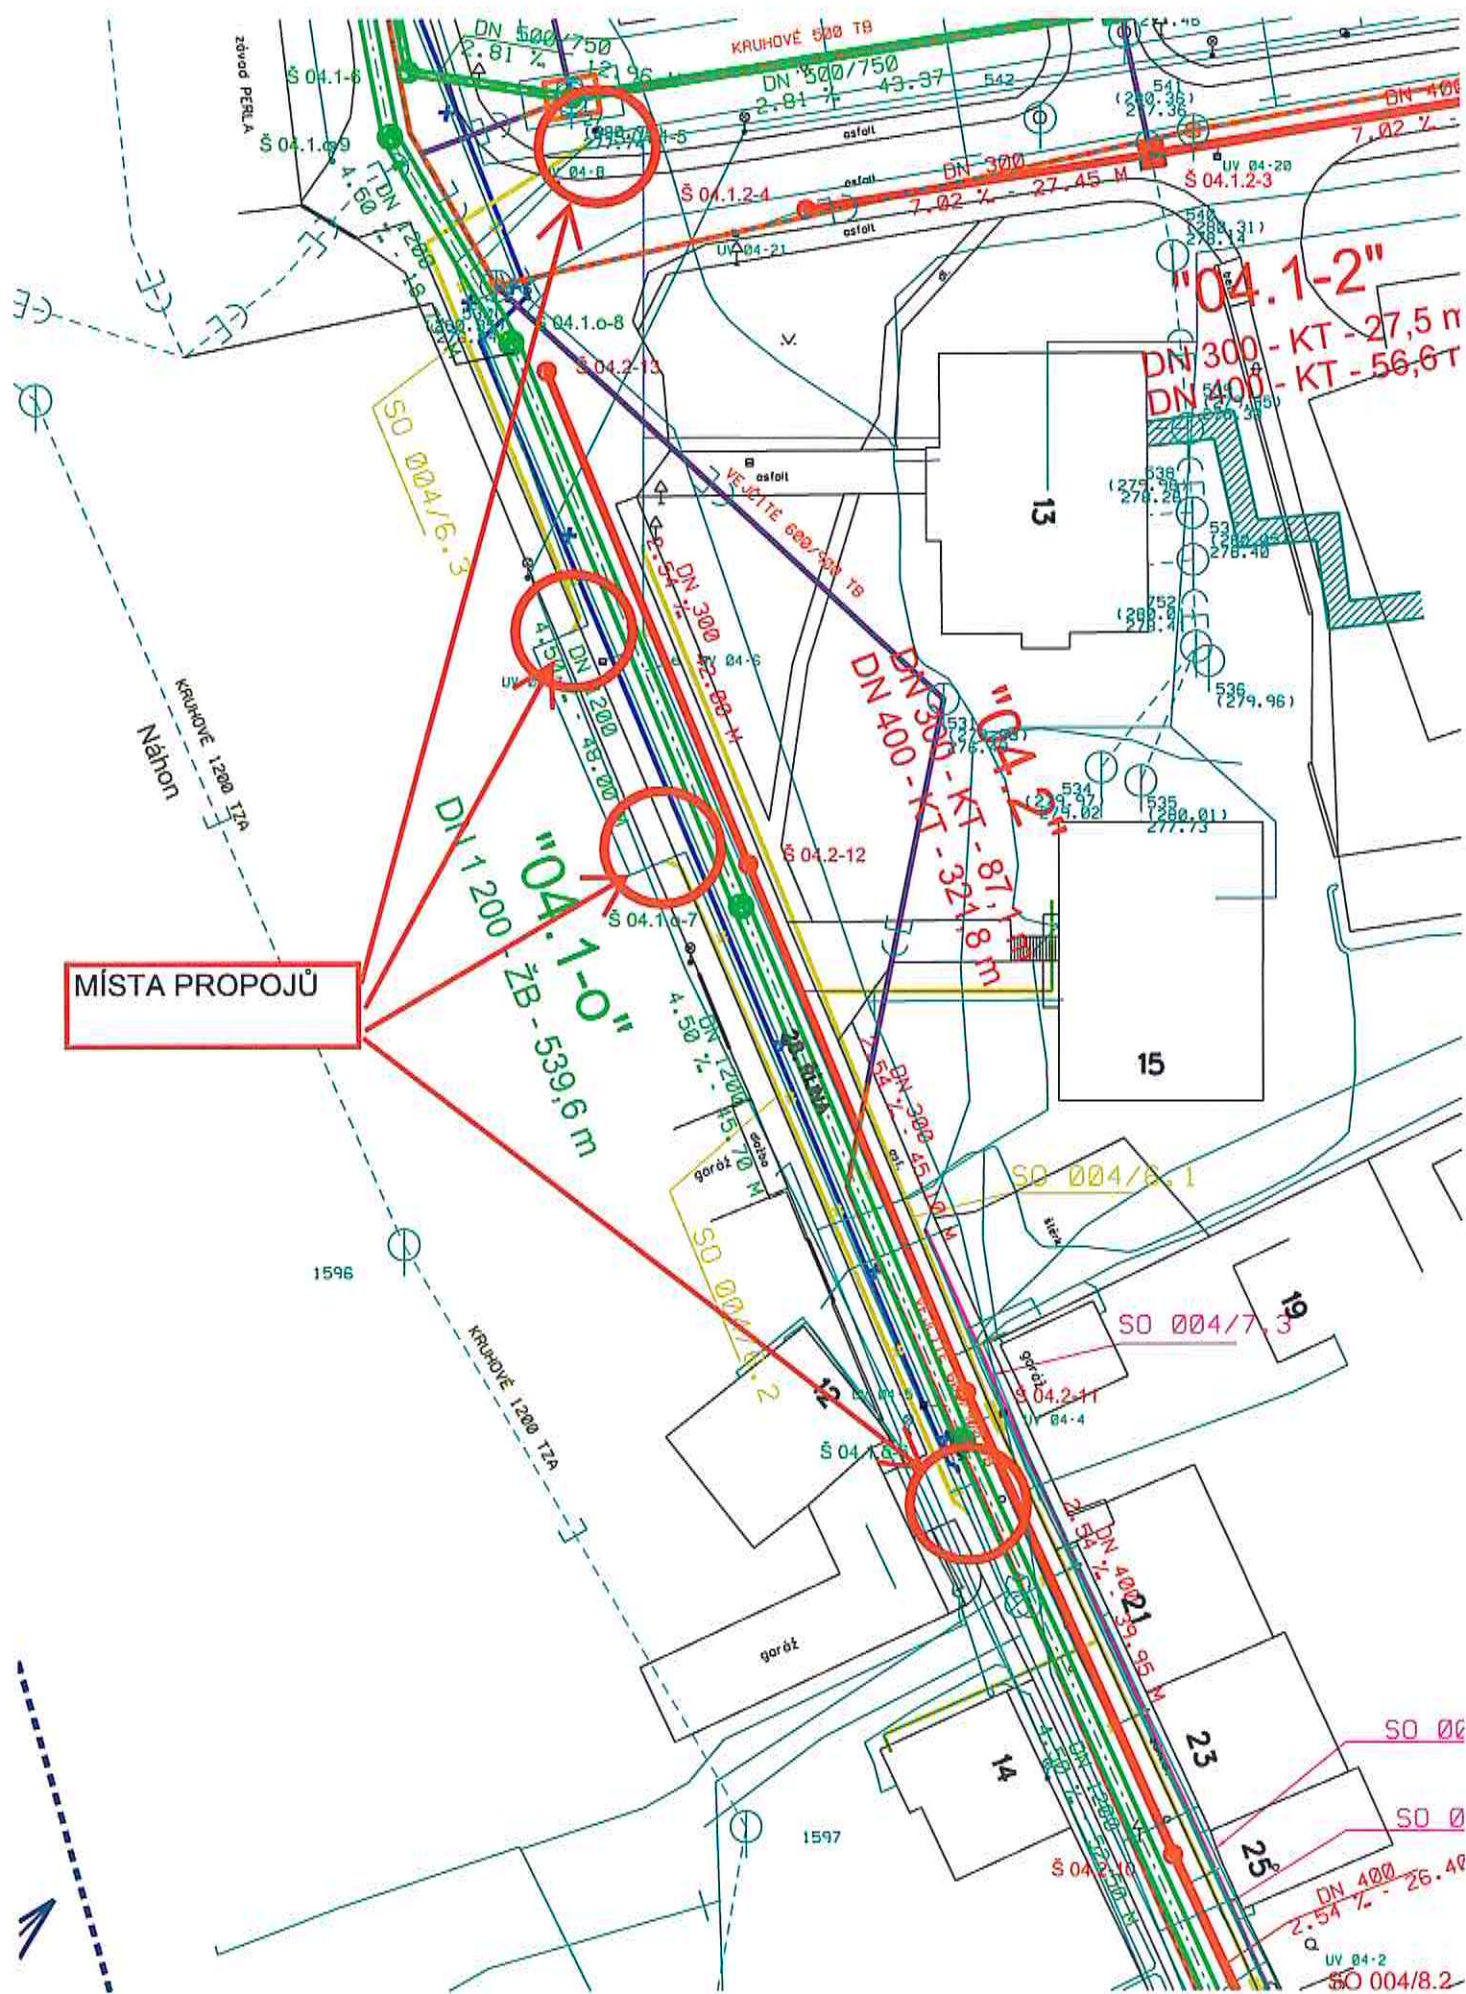

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-113-S-Z-SO 3.004

3. Město Zábřeh / SO 3.004

Propojení plynovodní přeložky 004/6.2 a 004/6.3

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-113-S-Z-SO 3.004		
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP	
SO 3.004 - LOKALITA 28 ŘÍJNA													
Propojení plynovodní přeložky 004/6.2 a 004/6.3													
1	Navrtání DN 200 (4x 3 komory)	ks	0,00	15 930,00	0,00	12,00	15 930,00	191 160,00	6,00	191 160,00	191 160,00	0,00	
2	Balonování hrdla (4x 3 komory)	ks	0,00	6 480,00	0,00	12,00	6 480,00	77 760,00	7,00	77 760,00	77 760,00	0,00	
3	Schuck DN 200	ks	0,00	22 320,00	0,00	4,00	22 320,00	89 280,00	8,00	89 280,00	89 280,00	0,00	
4	Doprava Fasira	kpl	0,00	14 000,00	0,00	1,00	14 000,00	14 000,00	9,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
Propojení plynovodní přeložky 004/6.2 a 004/6.3 celkem :					0,00			372 200,00			372 200,00	0,00	
ZL-113-S-Z-SO 3.004 CELKEM :													
					0,00			372 200,00			372 200,00	0,00	



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 716/15/K
Datum: 30. 10. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iniciační dopis č.: ID- 113-S-ZO-SO 3.004 - Propojení plynovodní přeložky 004/6.2 a 004/6.3

Vyjádření projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při výkopových pracích na v lokalitě 3.004 v ulici 28. října bylo zjištěno, že v místě navržených přeložek plynovodu 004/6.2 a 004/6.3 se nachází stávající plynovod v tlakovém pásmu STL. V zadávací dokumentaci jsou přeložky navrženy v tlakovém pásmu NTL.

Zhotovitel doporučuje provést 2-násobné balonování - speciální uzavření plynovodu.

Projektant s návrhem souhlasí, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. V podkladech provozovatele plynovodu bylo uvedeno, že se jedná o tlakové pásmo NTL. Bez provedení výše navržených úprav není možné dokončit přeložky plynovodu.

Za projektanta:

Ing. Vlastislav Kolečkář

Datum:

Podpis:





IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 716-1/15/K
Datum: 30. 10. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

**Změnový list č.: ZL- 113-S-ZO-SO 3.004 - Propojení plynovodní přeložky
004/6.2 a 004/6.3**

Vyjádření generálního projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při výkopových pracích na v lokalitě 3.004 v ulici 28. října bylo zjištěno, že v místě navržených přeložek plynovodu 004/6.2 a 004/6.3 se nachází stávající plynovod v tlakovém pásmu STL. V zadávací dokumentaci jsou přeložky navrženy v tlakovém pásmu NTL.

Zhotovitel doporučuje provést 2-násobné balonování - speciální uzavření plynovodu.

Z pozice generálního projektanta s návrhem souhlasíme, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. V podkladech provozovatele plynovodu bylo uvedeno, že se jedná o tlakové pásmo NTL. Bez provedení výše navržených úprav není možné dokončit přeložky plynovodu.


Za generálního projektanta:

Ing. Jan Polásek

Datum:

Podpis:



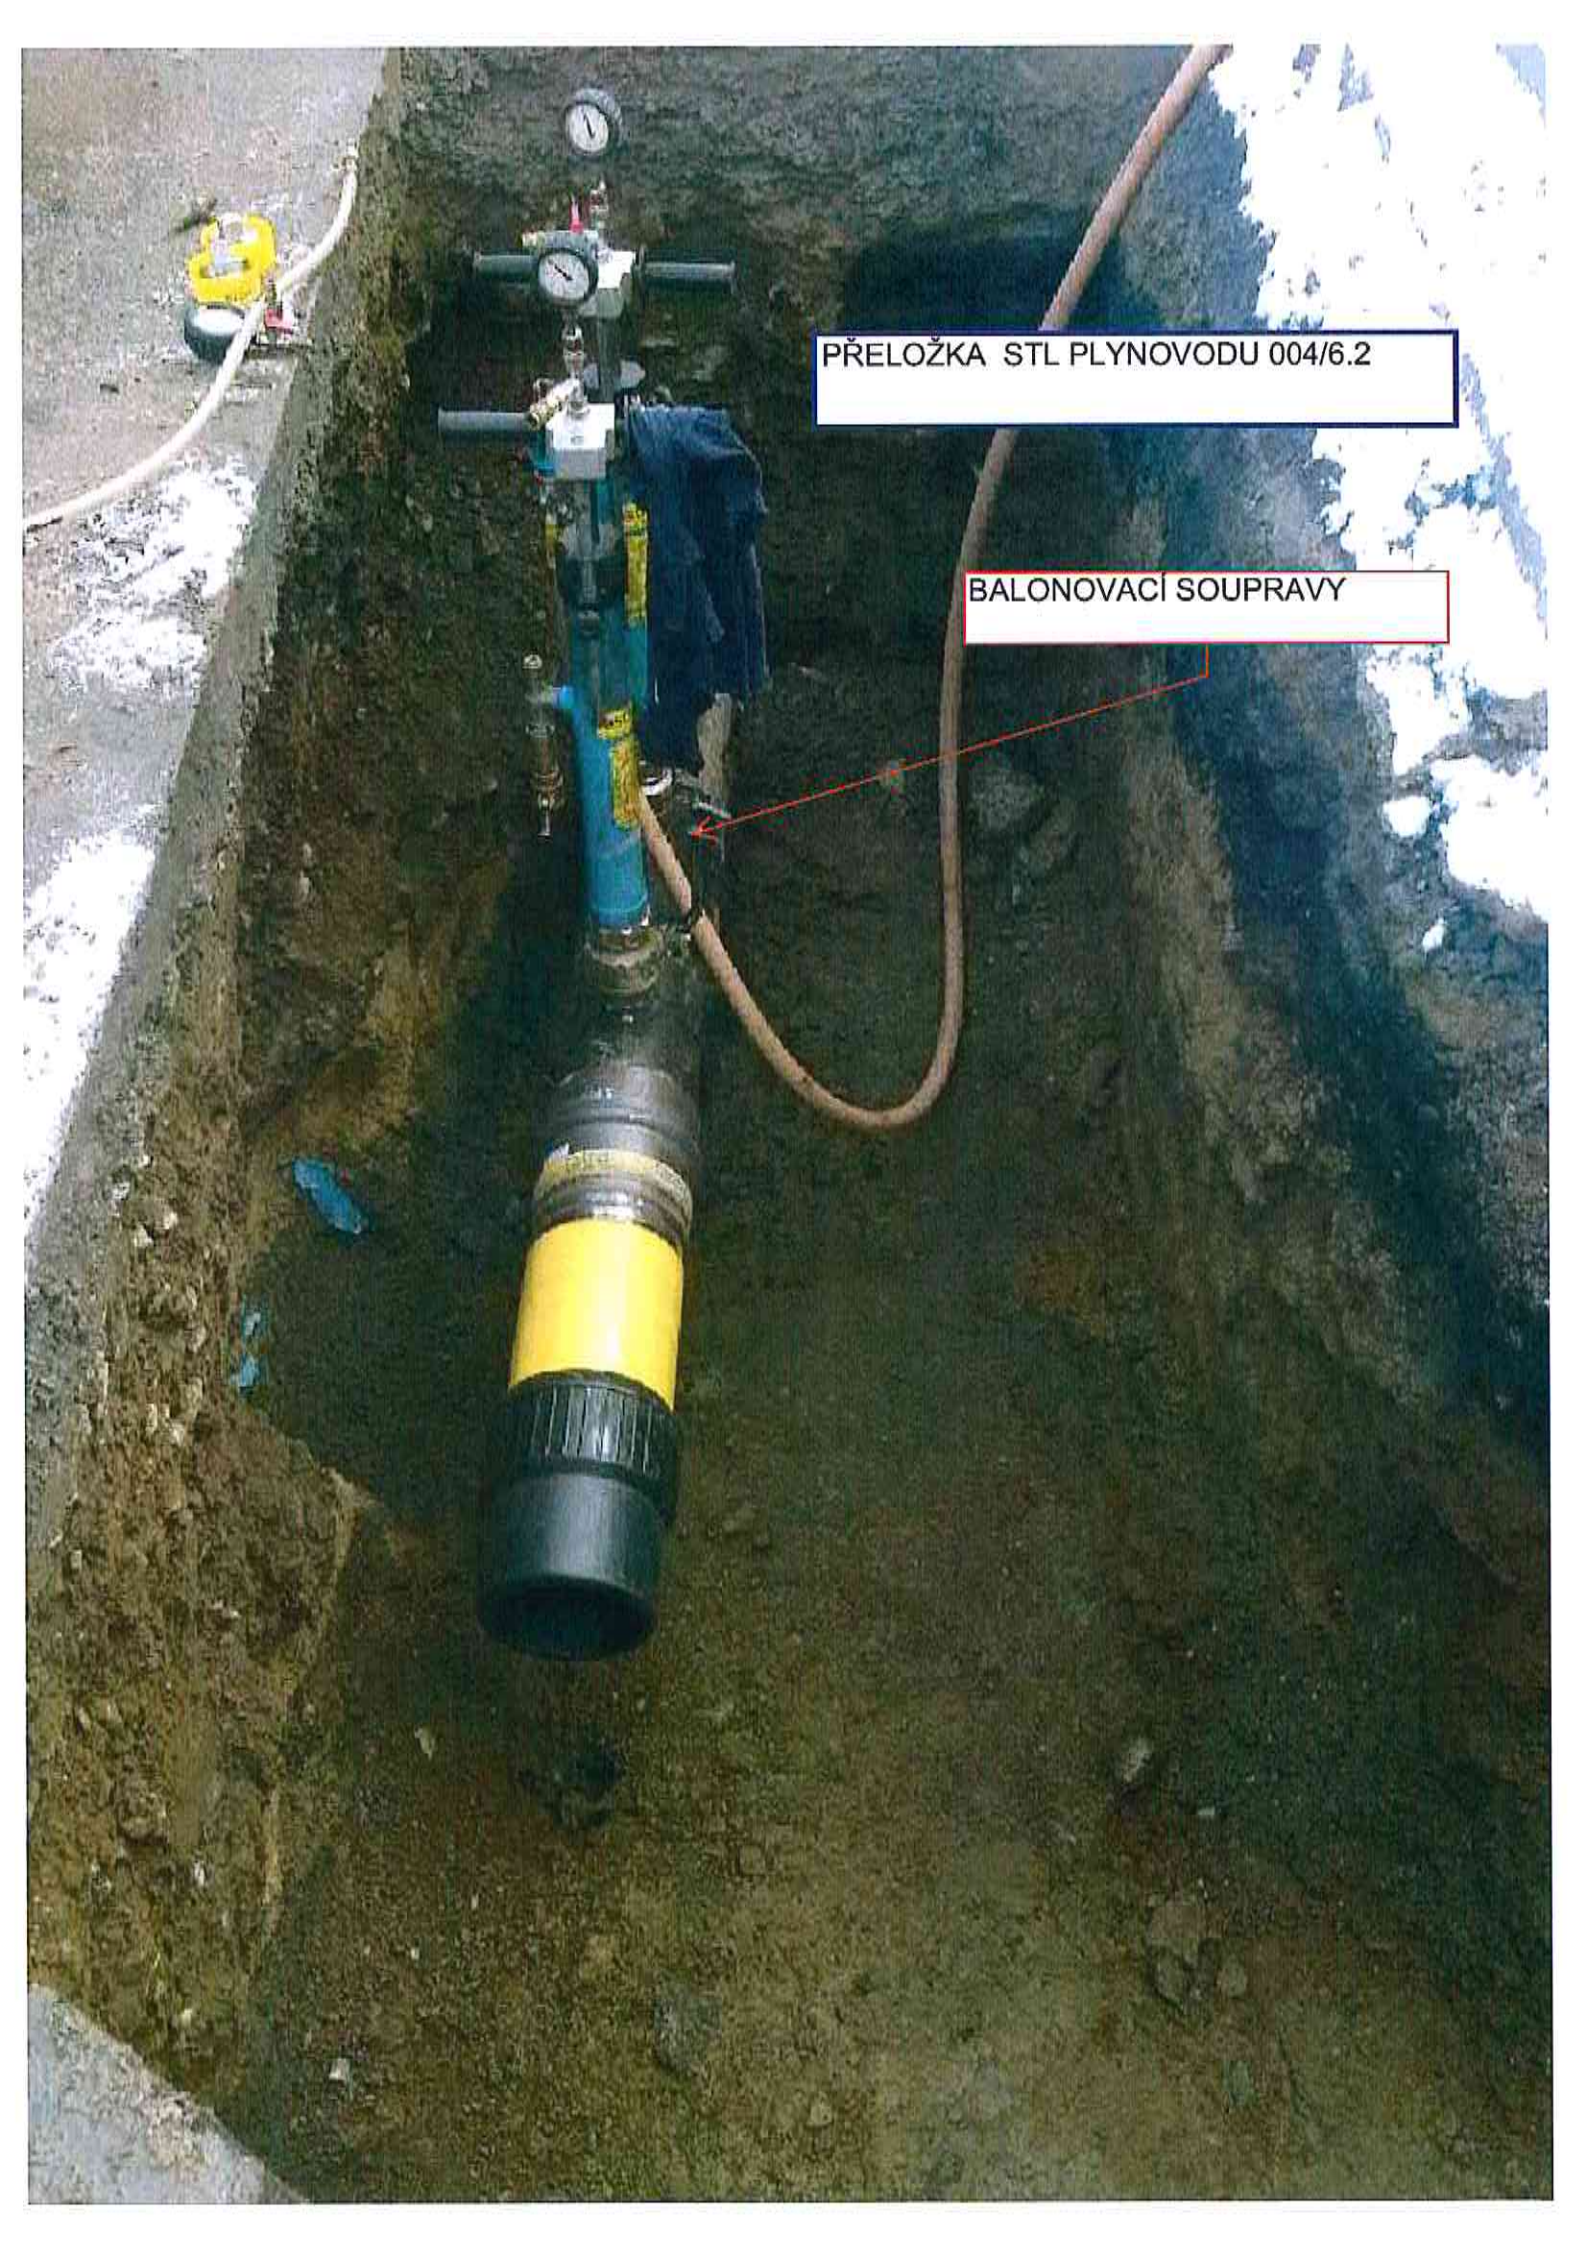

PŘELOŽKA STL PLYNOVODU 004/6.2

BALONOVACÍ SOUPRAVY

PŘELOŽKA STL PLYNOVODU 004/6.3

BALONOVACÍ SOUPRAVY



Datum

Denní záznamy stavby

30.10.

ZÁPIS:

TRÍ PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮCH PRACÍ NA
 ŠTACE 03.1 BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE VÝKOP
 SE ZVOMNĚ, HLIVITO - TISÍCÍ AŽ TISÍCÍ,
 NEVHODNÝ PRO ZÁSTUPY.

ZÁPIS:

TRÍ PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮCH PRACÍ
 NA ŠTACI 04.1: 04.1-0, 04.1-5
 BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE VÝKOP SE ZVOMNĚ
 HLIVITO - TISÍCÍ AŽ TISÍCÍ, NEVHODNÝ PRO ZÁSTUPY.

ZÁPIS:


TRÍ PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮCH PRACÍ
 NA ŠTACI 08.1-16 BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE VÝKOP
 SE ZVOMNĚ HLIVITO - TISÍCÍ AŽ TISÍCÍ,
 NEVHODNÝ PRO ZÁSTUPY.



30.10.

ZÁPIS:

NAVRŽENÍ TĚLOŠŮ TUNELŮV NIL 004/6.2, 004/6.3
 DLE ZAD. DOKUMENTACE JSOU VE SKUTČNOSTI
 ŠTĚ TUNELŮV. TYTO TĚLOŠY SE BUDOU
 PROPODÁVAT 2-KOTOVNÍ PŘECHEPNÍM PŘI FASTRA



30.10.15

Spisovatel: Zdravotník o výkopu ID 2
 Malánský J. (malánský@vse.cz) udrží cenu 20000.

