



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu


Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	22. 07. 2015
Ev.č.	ZL-015-S-Š-SO 2.005	Datum schválení	24. 07. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	Zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS **)		Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	2. Město Šumperk / stoka Dolonostudentská / úsek mezi šachtami D8, D9, D10		
<u>Specifikace změny:</u> Při vytyčení navržené trasy kanalizace bylo zjištěno, že šachta D9 má být vystavěna uprostřed vjezdu do stavebnin a šachta D10 vychází do nedávno vybudované opěrné stěny. Šachta D9 nemůže být vystavěna uprostřed vjezdu do areálu stavebnin SART, neboť nelze zachovat průjezd do stavebnin, pro který je to jediný vjezd přes který probíhá zásobování. Dále je vjezd nově vydlážděn z žulových kostek a po obou stranách vystavěna nová opěrná stěna z žulových kvádrů, která z pravé strany drží parkovací plochy stavebnin. Vzhledem ke zvýšené intenzitě provozu nákladních zásobovacích aut do areálu firmy SART je nutné posunutí šachet mimo tento vjezd. Zhotovitel navrhuje v tomto případě posunutí šachty D9 mimo vjezd směrem cca o 37 metrů dál k drážnímu objektu Českých drah, neboť sondou u ocelové haly po levé straně bylo zjištěno, že nebude dostatečný výškový rozdíl (vznikl by protispád, trasa kanalizace zůstane na pozemku dle SP). Proto se výškově přeměřila stávající šachta vpravo u objektu Českých drah a byl přepočítán a upraven podélný sklon tak, aby při prodloužení stoky byl zachován gravitační průtok splašků v prodloužené trase ŽB potrubí DN 600 s ČV. Tímto řešením bude zachován vjezd do stavebnin a jeho zásobování a zároveň bude provedena kanalizace v dostatečném spádu pro odtok splaškových vod (nevznikne protispád). Jako méněpráce dojde ke zkrácení trasy kanalizace v úseku mezi šachtami D7 – D8, dále pak ke zkrácení protlaku v úseku mezi šachtami D8 – D9, ale jako vícepráce dojde k prodloužení úseku D9 – místo napojení na drážní kanalizaci včetně hloubení a pažení v místě napojení. V návaznosti na tuto skutečnost musí být posunuta i přeložka vody č. 5.1. Tuto přeložku je nutné provést v předstihu.			
<u>Předmětem změnového listu je:</u> - Posunutí šachty D9 do nezpevněné plochy, posunutí umístění šachet D8 a D10 - Upravení umístění přeložky vodovodu			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	145 714,92 Kč		
Stanovisko správce stavby: z důvodů uvedených ve stanoviskách GP, AD, přílohách na místě SART, SPST považuje navržené řešení za správné. Jedná se o okolnost kterou zadavatel jednal s náležitou péčí a nemohl přemýšlet. Proto SPST doporučuje objednateli změnu schválit.			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy:	1) Popis změny – iniciační dopis, situace a podélný profil 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Fotodokumentace, výpis z katastru nemovitostí, dopis od firmy SART 5) Zápisy ze stavebního deníku 6) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.		



OPERAČNÍ VÝVOJ
PRŮMYSLU



EVROPSKÁ UNIE

ROK 2015

EVROPSKÝ FOND ROZVOJE OBLASTÍ

PRŮMYSL

OPERAČNÍ VÝVOJ

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **)	
 SPRAVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod v povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Ing. Martin Staněk – zástupce vedoucího týmu 612 00 Brno	 AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ345964371 Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu
Datum: 22. 07. 2015	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 602 00 Brno Brno - VHS a DS 4 Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilová 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel.: 583 317 411 fax: 583 214 845 Jiří Vykydal - manažer projektu 24. 07. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nehodící se škrtně

VRV - API

Horní Pomoraví II - sever

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
František Rauscher	rauscherf@imosbrno.eu / 733623829	10.12.2014

ID-015-S-Š-SO 2.005 - lokalita Česká Čtvrť - stoka Dolnostudénská-posunutí šachet D8, D9, D10

Aktuální stav:

Při vytýčení navržené trasy kanalizace bylo zjištěno, že šachta D9 má být vystavěna uprostřed vjezdu do stavebnin a šachta D10 vychází do nedávno vybudované opěrné stěny. Šachta D9 nemůže být vystavěna uprostřed vjezdu do areálu stavebnin SART, neboť nelze zachovat průjezd do stavebnin, pro který je to jediný vjezd přes který probíhá zásobování stavebnin. Dále je vjezd nově vydlážděn z žulových kostek a po obou stranách vystavěna nová opěrná stěna z žulových kvádrů, která z pravé strany drží parkovací plochy stavebnin. Vzhledem ke zvýšené intenzitě provozu nákladních zásobovacích aut do areálu firmy SART je nutné posunutí šachet mimo tento vjezd.

Návrh řešení:

Zhotovitel navrhuje v tomto případě posunutí šachty D9 mimo vjezd směrem cca o 37 metrů dál k drážnímu objektu Českých drah, neboť sondou u ocelové haly po levé straně bylo zjištěno, že nebude dostatečný výškový rozdíl (vznikl by protispád). Proto se výškově přeměřila stávající šachta vpravo u objektu Českých drah a byl přepočítán a upraven podélný sklon tak, aby při prodloužení stoky byl zachován gravitační průtok splašků v prodloužené trase ŽB potrubí DN 600 s ČV. Tímto řešením bude zachován vjezd do stavebnin a jeho zásobování. Jako méněpráce dojde ke zkrácení trasy kanalizace v úseku mezi šachtami D7 – D8, dále pak ke zkrácení protlaku v úseku mezi šachtami D8 – D9, ale jako vícepráce dojde k prodloužení úseku D9 – místo napojení na drážní kanalizaci včetně hloubení a pažení v místě napojení. V návaznosti na tuto skutečnost musí být posunuta i přeložka vody č. 5.1. Tuto přeložku je nutné provést v předstihu.

Žádáme projektanta o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem




František Rauscher



2201

02/2015

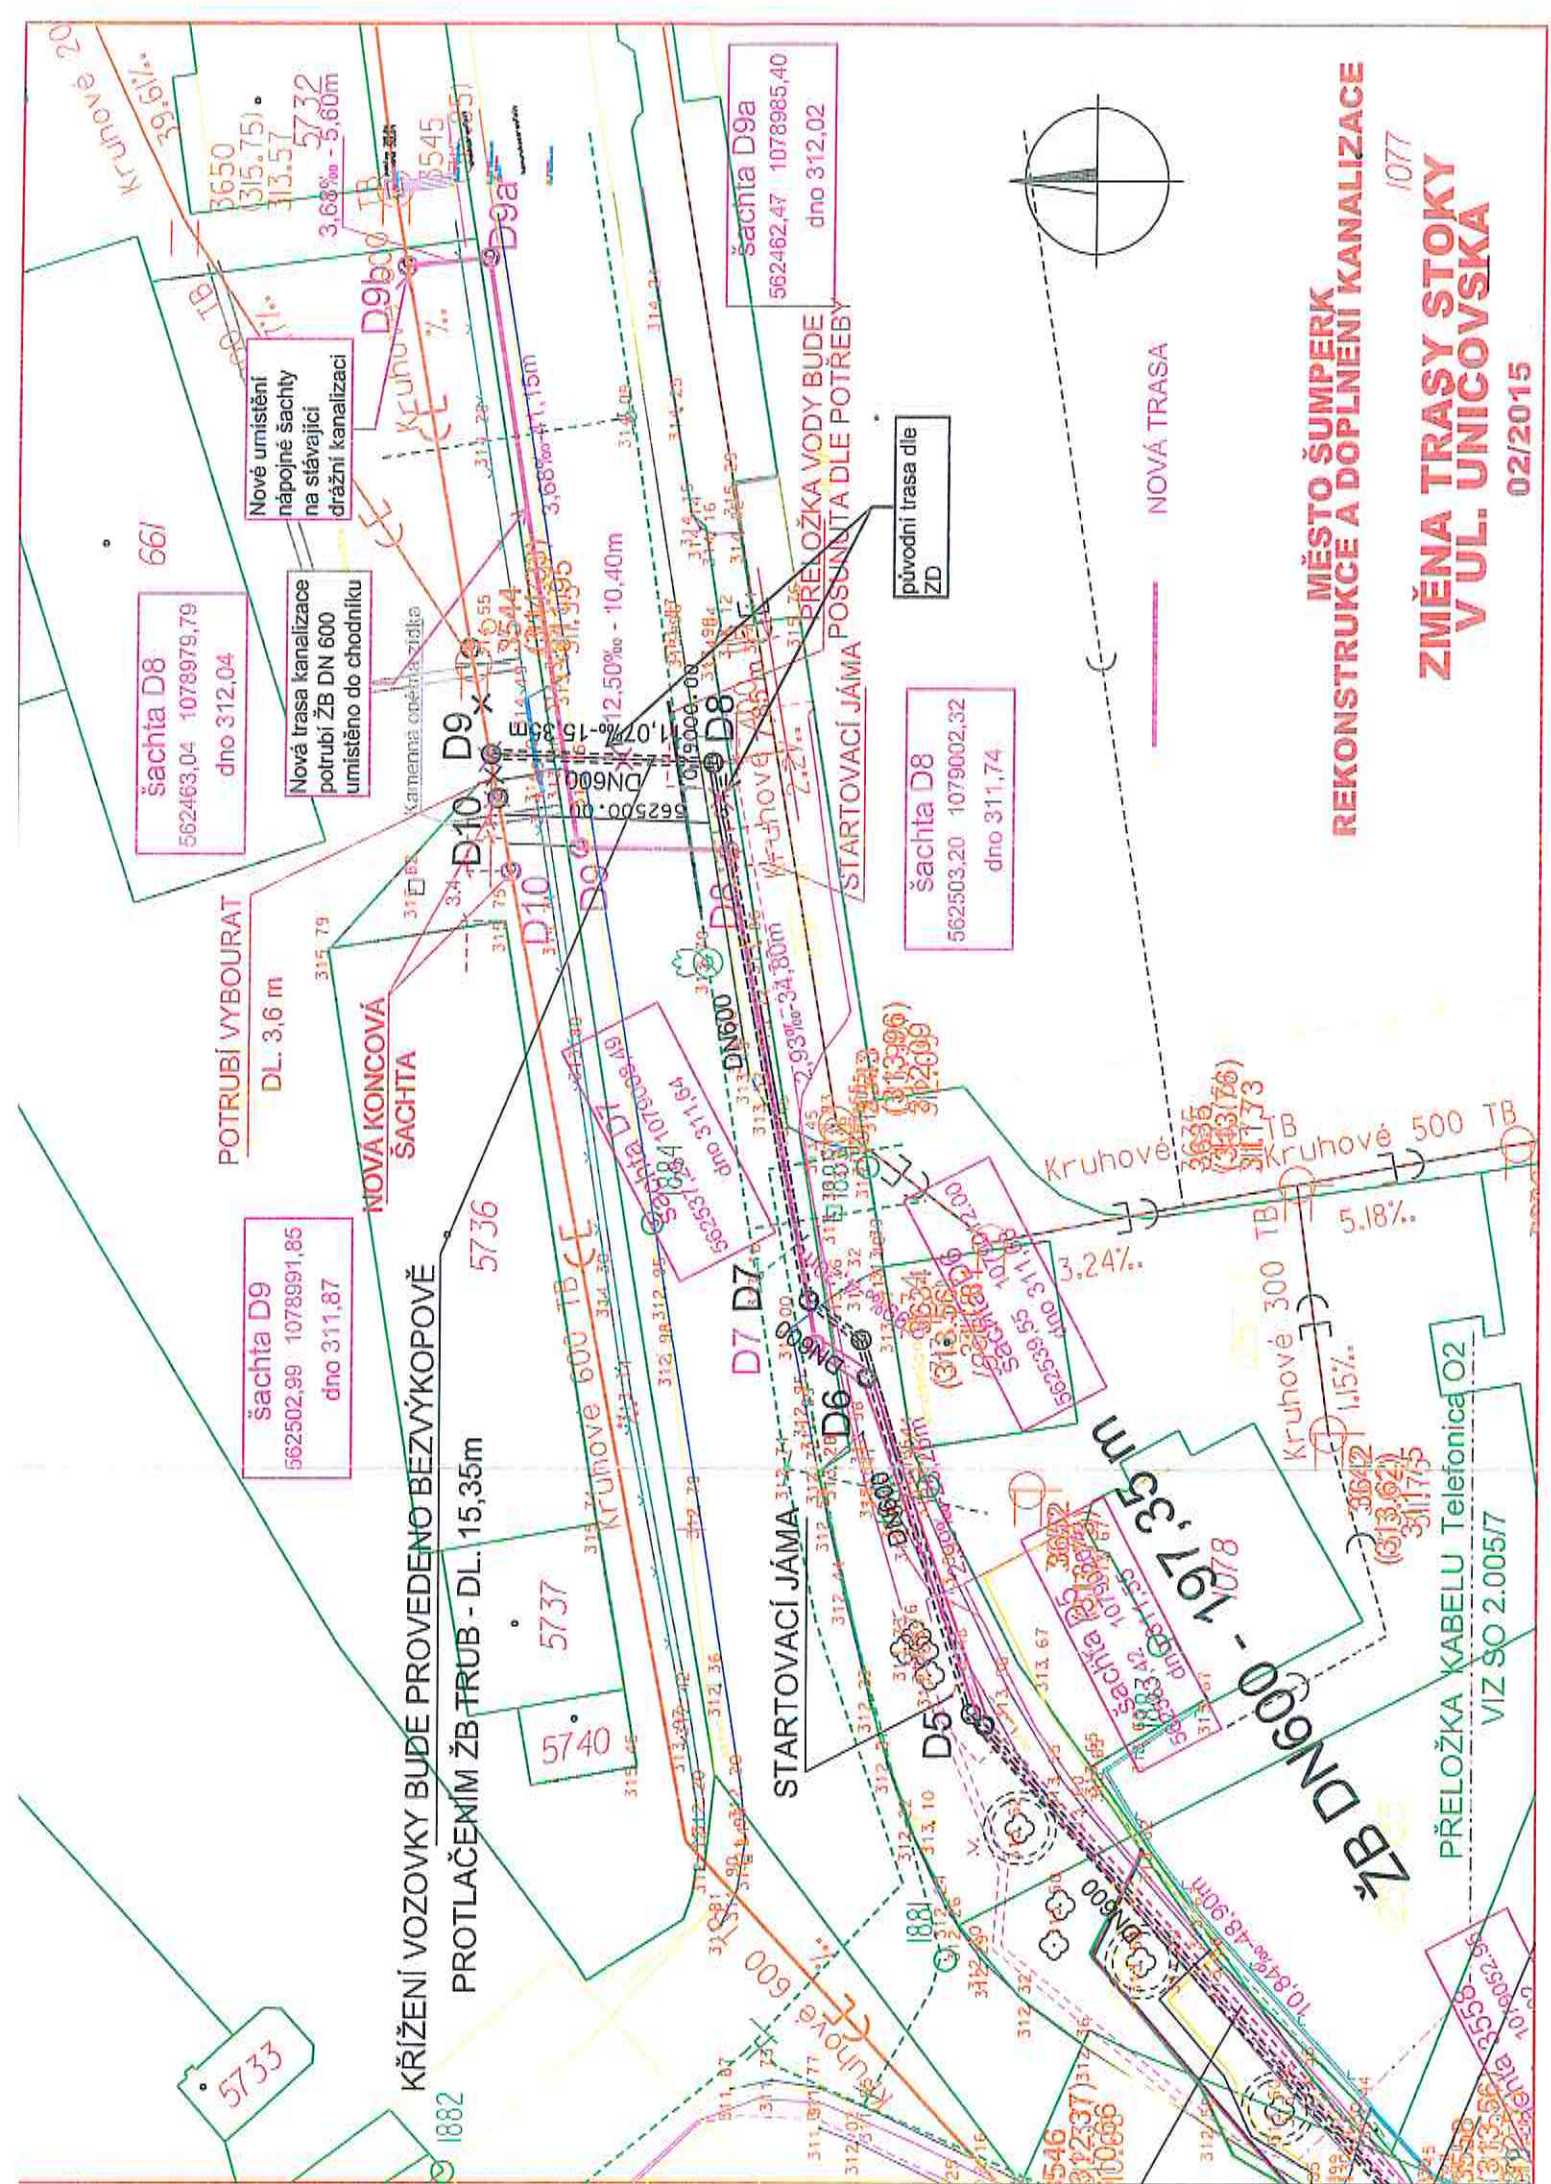

ÚZEMÍ

POVRCH ÚZEMÍ
VZDÁLENOST ŠACHET
NÁZVY ŠACHET


Šachet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.80	31.00	25.25	31	34.80	10.40	41.15	5.60			



ŠACHTA S MONOLITICKÝM DNEM

Podélný profil stoky Dolnostudénská - SART

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100

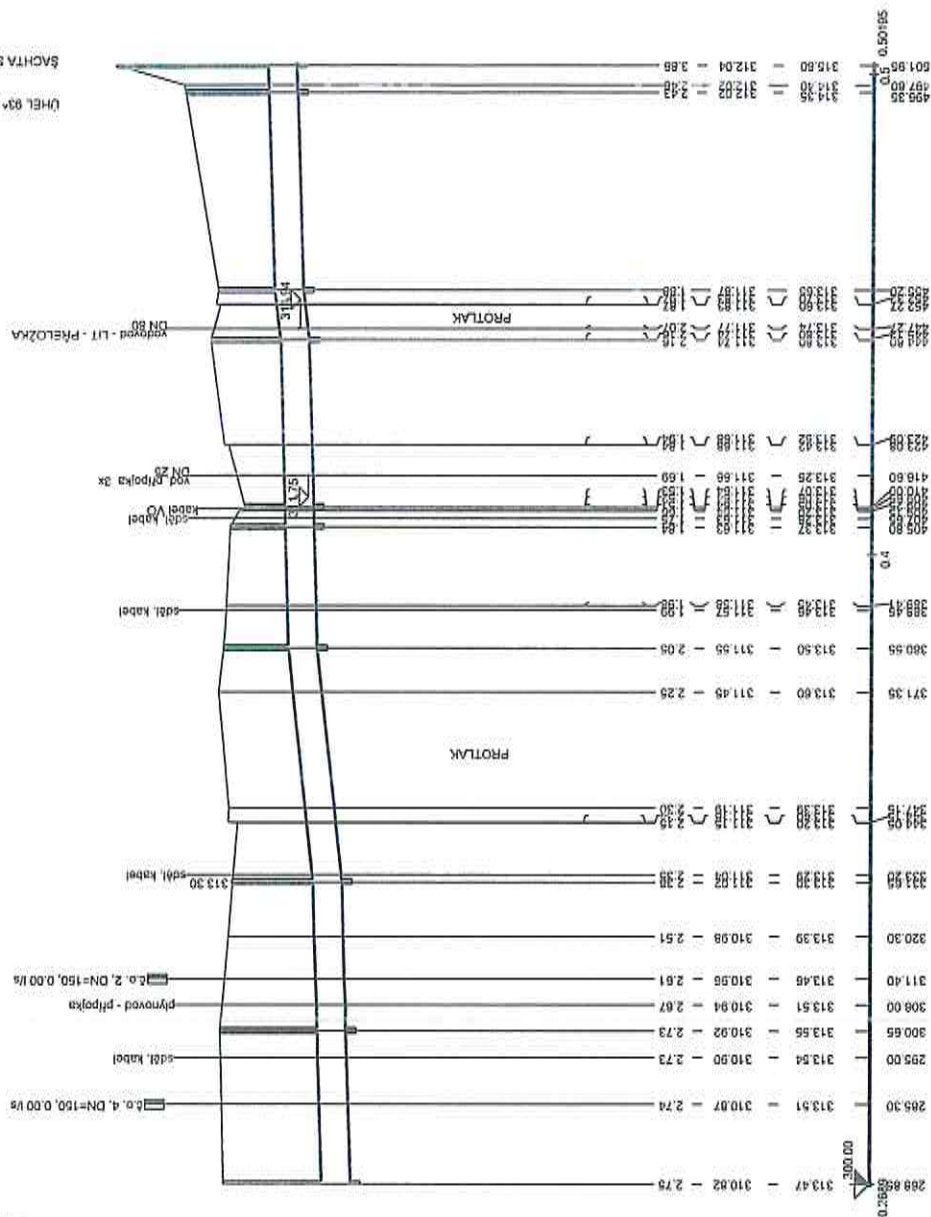

KÓTA TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANICOVÁNÍ [km] [m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]
KAPACITA [ls] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colibrosk)

3.18 - 62.80	10.84 - 48.90	2.99 - 29.45	2.93 - 34.80	8	3.54 - 46.75
600 - 2B - 62.80	600 - PROTLAČENÍ - 48.90	600 - 2B svařep - 54.25	600 - 2B - 46.75	6	600 - 2B - 46.75
322.57 - 1.14	595.04 - 2.11	312.52 - 1.11	360.33 - 1.09	7	344.76 - 1.22

VERZE 02/2015

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-015-S-Š-SO 2.005

2. Město Šumperk / Dolnostudénská

Prodloužení kanalizace, náhrada za protlak

Pol.		Popis položky	Rozpočet dle SoD				Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-015-S-Š-SO 2.005	
			m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
SO 2.005 LOKALITA 5-ČESKÁ ČTVŘTĚ													
DOLNOSTUDÉNSKÁ - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
6		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 789,37	221,70	396 703,42	1 933,13	221,70	428 575,01	143,76	31 871,59	31 871,59	0,00
7		Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1 945,60	133,80	260 320,74	2 118,24	133,80	283 419,98	172,64	23 099,24	23 099,24	0,00
8		Odstránění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 945,60	27,60	53 698,45	2 118,24	27,60	58 463,31	172,64	4 764,86	4 764,86	0,00
9		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	984,15	38,70	38 086,75	1 063,22	38,70	41 146,68	79,07	3 059,93	3 059,93	0,00
11		Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	1 215,84	104,40	126 933,22	1 299,47	104,40	135 665,00	83,64	8 731,78	8 731,78	0,00
13		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	805,37	88,80	71 516,74	853,92	88,80	75 828,46	48,56	4 311,72	4 311,72	0,00
14		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	486,09	306,30	148 890,78	540,97	306,30	165 698,74	54,87	16 807,96	16 807,96	0,00
16		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 215,84	112,60	136 903,07	1 299,47	112,60	146 320,68	83,64	9 417,61	9 417,61	0,00
18		Vhodný záspový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	153,33	520,60	79 825,00	140,48	520,60	73 134,93	-12,85	-6 690,07	0,00	-6 690,07
19		Štěrkopisek frakce 0-8 C	t	901,89	268,20	241 885,64	1 003,70	268,20	269 191,62	101,81	27 305,98	27 305,98	0,00
Zemní práce celkem :									1 677 444,41		122 680,60	129 370,67	-6 690,07
Přípravné a přidružené práce													
20		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	76,22	77,80	5 929,92	54,98	77,80	4 277,44	-21,24	-1 652,48	0,00	-1 652,48
23		Odstránění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	407,23	25,60	10 425,09	471,38	25,60	12 067,33	64,15	1 642,24	1 642,24	0,00
24		Odstránění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	252,69	50,10	12 659,77	231,45	50,10	11 595,65	-21,24	-1 064,12	0,00	-1 064,12
26		Odstránění podkladu nad 200 m2, živiniého tl.15 cm	m2	407,23	66,00	26 877,18	471,38	66,00	31 111,08	64,15	4 233,90	4 233,90	0,00
28		Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč.uložení	t	356,12	62,10	22 115,29	379,74	62,10	23 582,06	23,62	1 466,77	1 466,77	0,00

29	Poplatek za skládku stavební suti	t	356,12	78,60	27 991,33	379,74	78,60	29 847,82	23,62	1 856,49	1 856,49	0,00
	Přípravné a přídrúžené práce celkem :				105 998,58			112 481,38		6 482,80	9 199,40	-2 716,60
Podkladní a vedlejší konstrukce												
30	Lože pod potrubí ze štiřkopišku do 63 mm	m3	17,98	762,40	13 707,95	18,76	762,40	14 303,77	0,78	595,82	595,82	0,00
31	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	250	45,80	11 450,00	284,00	45,80	13 007,20	34,00	1 557,20	1 557,20	0,00
32	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	5,04	2 723,40	13 712,32	5,20	2 723,40	14 150,79	0,16	438,47	438,47	0,00
33	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	214,63	2 723,40	584 533,69	236,58	2 723,40	644 312,32	21,95	59 778,63	59 778,63	0,00
34	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	10,32	289,80	2 989,29	10,84	289,80	3 139,98	0,52	150,69	150,69	0,00
36	Podkladní betonový pražec C 12/15 600/150/100	kus	107,06	86,70	9 282,10	141,40	86,70	12 259,38	34,34	2 977,28	2 977,28	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				635 675,35			701 173,44		65 498,09	65 498,09	0,00
Trubní vedení												
40	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600	m	132,00	497,90	65 722,80	173,80	497,90	86 535,02	41,80	20 812,22	20 812,22	0,00
41	Montáž trub ŽB bezvýkopové DN 600 včetně dodávky trub s CV 180°	m	65,40	64 083,60	4 191 067,44	59,30	64 083,60	3 800 157,48	-6,10	-390 909,96	0,00	-390 909,96
319	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	0,00	29,50	0,00	11,00	29,50	324,50	11,00	324,50	324,50	0,00
46	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	5,00	101,90	509,50	16,00	101,90	1 630,40	11,00	1 120,90	1 120,90	0,00
47	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	197,40	162,60	32 097,24	233,10	162,60	37 902,06	35,70	5 804,82	5 804,82	0,00
50	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	6	35 369,70	212 218,20	8,00	35 369,70	282 957,60	2,00	70 739,40	70 739,40	0,00
51	Šachta z betonových dílců pro DN 500 a DN 600 výška vstupu 3,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	43 397,30	86 794,60	0,00	43 397,30	0,00	-2,00	-86 794,60	0,00	-86 794,60
SO 2.002 /49	Šachta z betonových dílců pro DN 500 a DN 600 výška vstupu 4,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0	48 640,50	0,00	1,00	48 640,50	48 640,50	1,00	48 640,50	48 640,50	0,00
55	Kamerové zkoušky potrubí	m	309,20	42,80	13 233,76	351,00	42,80	15 022,80	41,80	1 789,04	1 789,04	0,00
324	Univerzální spojka pro napojení přípojek DN200	kus	0	2 792,80	0,00	1,00	2 792,80	2 792,80	1,00	2 792,80	2 792,80	0,00
327	Roura PP kanalizační DN200 SN8	m	0,00	555,90	0,00	12,02	555,90	6 683,59	12,02	6 683,59	6 683,59	0,00
63	Trouba železobet hrdlová 600/2500 CV 180°	m	133,32	5 905,50	787 321,26	175,54	5 905,50	1 036 639,66	42,22	249 318,40	249 318,40	0,00
	Trubní vedení celkem :				5 388 964,80			5 319 286,41		-69 678,39	408 026,17	-477 704,56
Ostatní konstrukce, bourání												
66	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	132,73	69,70	9 251,28	214,32	69,70	14 938,10	81,59	5 686,82	5 686,82	0,00
SO 3.003 /1036	Demontáž a zpětná montáž stávajícího optocení	m	0,00	578,10	0,00	2,50	578,10	1 445,25	2,50	1 445,25	1 445,25	0,00
SO 3.001 /75	Optocení drátěné s beton.základem- demontáž+montáž	m	0,00	2 158,70	0,00	2,50	2 158,70	5 396,75	2,50	5 396,75	5 396,75	0,00
ZL 014/ URS184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	0,00	0,00	0,00	40,00	19,50	780,00	40,00	780,00	780,00	0,00
MAT1	Coloneaster hor.Variegatis (skalník)	ks	0,00	0,00	0,00	40,00	130,00	5 200,00	40,00	5 200,00	5 200,00	0,00
ZL 014/ URS189911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	0,00	0,00	0,00	65,00	25,10	1 631,50	65,00	1 631,50	1 631,50	0,00

Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-015-S-Š-SO 2.005

ZL 014/ URS605970030	Mulčovací kůra volně ložená	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	130,00	591,50	4,55	591,50	591,50	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :						9 251,28			29 983,10		20 731,82	20 731,82	0,00
ZL-015-S-Š-SO 2.005 CELKEM :						7 694 653,82			7 840 368,74		145 714,92	632 826,15	-487 111,23

Slepý rozpočet

Stavba :	2852 ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ MC	Rozpočet: 01c
Objekt :	2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť	Dolnostud.-kan.stoky-ZL-015-S-Š-SO 2.005-PLATNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	kpl	1,00		
2	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	6,22		
		Vodovod:2,35*1		2,35		
		Vodovod:2,1*1		2,10		
		Plynovod:1,77*1		1,77		
3	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	18,83		
		sděl. kabel:2,35*1		2,35		
		kabel VN:2,35*1		2,35		
		kabel NN:2,35*1		2,35		
		kabel VO:2,35*2		4,70		
		sděl. kabel:1,77*3		5,31		
		kabel VO:1,77*1		1,77		
4	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	120,68		
		sděl. kabel:2,0*2,35*2,77		13,02		
		kabel VN:2,0*2,35*2,55		11,99		
		kabel NN:2,0*2,35*2,9		13,63		
		kabel VO:2,0*2,35*2,9*2		27,26		
		sděl. kabel:2,0*1,77*(2,74+2,1+1,6-0,23-0,45)		20,39		
		kabel VO:2,0*1,77*(1,61-0,45)		4,11		
		Vodovod:2,0*2,35*2,5		11,75		
		Vodovod:2,0*2,1*2,35		9,87		
		Plynovod:2,0*1,77*2,45		8,67		
5	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	28,76		
		DN300:146,0*3,1416*(0,215*0,215-0,15*0,15)		10,88		
		DN400:84,0*3,1416*(0,265*0,265-0,2*0,2)		7,98		
		DN600:4,0*3,1416*(0,392*0,392-0,3*0,3)		0,80		
		šachty:3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*2,5*8		8,44		
		konus:0,22*3		0,66		
6	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	1 933,13		
		II.-III.-IV.tř. horn - 7-81-12%:				
		ŽB1000:				
		Stoka Dolnostudénská:135,6*2,35*3,0		955,98		
		rozš. pro Š:3,0*(3,0-2,35)*3,38*2		13,18		
		rozš. pro Š s mon. dnem:3,2*(3,2-2,35)*3,65*3		29,78		
		ŽB800:				
		Stoka Dolnostudénská:41,6*2,1*2,85		248,98		
		rozš. pro Š atyp:4,0*3,7*3,74*1		55,35		
		ŽB600:				
		Stoka Dolnostudénská:132*1,77*2,5		584,10		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2,55*6		27,92		
		rozš. pro Š s mon. dnem:2,7*(2,7-1,77)*4,15*1		10,42		
		rozš. pro Š s mon. dnem:2,7*2,7*4,15*1		30,25		
		rozšíření pro protlak:5,0*3,5*2,5*2,5*(2,5-1,77)*2,55*2		78,19		
		přepojení UV:5,0*1,1*2,3		12,65		
		bourání konusu:2,0*2,0*0,75*3		9,00		
		Mezisoučet		2 055,81		
		odpočet povrchu:				
		KK-asfalt:-15,0*2,35*0,5		-17,63		
		MK-asf.-5,0*2,35*0,45		-5,29		
		chodník-asfalt:-110,0*2,35*0,23		-59,46		
		MK-asf.-6,0*2,35*0,45		-6,35		

Slepý rozpočet

Stavba :	2852 ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ MC	Rozpočet: 01c
Objekt :	2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť	Dolnostud.-kan.stoky-ZL-015-S-Š-SO 2.005-PLATNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		MK-asf:-12,0*2,1*0,45		-11,34		
		chodník-asfalt:-32,0*2,1*0,23		-15,46		
		MK-asf:-50,0*1,77*0,45		-39,83		
		chodník-dlažba:-16,0*1,77*0,25		-7,08		
		chodník-asfalt:-33,0*1,77*0,23		-13,43		
		MK-asf:-15,0*1,77*0,45		-11,95		
		chodník-dlažba:-25,0*1,77*0,25		-11,06		
		Mezisoučet		-198,86		
		odpočet stávající kanalizace:				
		DN300:-146,0*3,1416*0,215*0,215		-21,20		
		DN400:-84,0*3,1416*0,265*0,265		-18,53		
		DN600:-4,0*3,1416*0,392*0,392		-1,93		
		šachty:-3,1416*0,62*0,62*2,5*8		-24,15		
		konus:-3,1416*0,5*0,5*0,75*3		-1,77		
		Mezisoučet		-67,59		
		RDS - změna v úseku 4 - D9b:				
		Stoka Dolnostudénská - ŽB600:				
		ZD:-647,54		-647,54		
		RD:791,30		791,30		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		Stoka Dolnostudénská - ŽB600:132*1,77*2,5		584,10		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2,55*6		27,92		
		rozš. pro Š s mon. dnem:2,7*(2,7-1,77)*4,15*1		10,42		
		rozš. pro Š s mon. dnem:2,7*2,7*4,15*1		30,25		
		rozšíření pro protlak:5,0*3,5*2,5*2-2,5*(2,5-1,77)*2,55*2		78,19		
		odpočet povrchu:				
		MK-asf:-50,0*1,77*0,45		-39,83		
		chodník-dlažba:-16,0*1,77*0,25		-7,08		
		chodník-asfalt:-33,0*1,77*0,23		-13,43		
		MK-asf:-15,0*1,77*0,45		-11,95		
		chodník-dlažba:-25,0*1,77*0,25		-11,06		
		Mezisoučet		143,76		
		RD:				
		Stoka Dolnostudénská - ŽB600:				
		31,8*1,77*(2,89+2,87)/2		162,10		
		31,0*1,77*(2,87+2,52)/2		147,87		
		25,25*1,77*(2,19+1,98)/2		93,18		
		4,2*1,77*(1,98+1,67)/2		13,57		
		34,8*1,77*(1,67+2,3)/2		122,27		
		41,15*1,77*(2,02+2,57)/2		167,16		
		5,6*1,77*(2,57+4,0)/2		32,56		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2,5*8		36,50		
		rozš. pro Š s mon. dnem D9b:2,7*(2,7-1,77)*4,41*1		11,07		
		rozšíření pro protlak:5,0*3,5*2,5*2-2,5*(2,5-1,77)*2,48*2		78,45		
		odpočet povrchu:				
		MK-asf:-65,0*1,77*0,45		-51,77		
		chodník-asfalt:-68,0*1,77*0,23		-27,68		
		chodník-dlažba:-29,0*1,77*0,25		-12,83		
		přepojení vnitroareálové kanalizace:				
		DN200:11,0*1,1*1,6		19,36		
		chodník:-2,0*1,1*0,23		-0,51		

Slepý rozpočet

Stavba :	2852 ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ MC	Rozpočet: 01c
Objekt :	2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť	Dolnostud.-kan.stoky-ZL-015-S-Š-SO 2.005-PLATNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet				
		0				
		Konec provozního součtu		1 438,84		
7	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	2 118,24		
		ŽB1000:				
		Stoka Dolnostudénská:135,6*2*3,0		813,60		
		rozš. pro Š:2*(3,0-2,35)*3,38*2		8,79		
		rozš. pro Š s mon. dnem:2*(3,2-2,35)*3,65*3		18,62		
		ŽB800:				
		Stoka Dolnostudénská:41,6*2*2,85		237,12		
		rozš. pro Š atyp:(2*4,0+2*3,7-2,1)*3,74*1		49,74		
		ŽB600:				
		Stoka Dolnostudénská:132*2*2,5		660,00		
		rozš. pro Š:2*(2,5-1,77)*2,55*6		22,34		
		rozš. pro Š s mon. dnem:2*(2,7-1,77)*4,15*1		7,72		
		rozš. pro Š s mon. dnem:4*2,7*4,15*1		44,82		
		rozšíření pro protlak:(2*5,0+2*3,5-2*1,77)*2,5*2-2*(2,5-1,77)*2,55*2		59,85		
		přepojení UV:5,0*2*2,3		23,00		
		Mezisoučet		1 945,60		
		RDS - změna v úseku 4 - D9:				
		Stoka Dolnostudénská - ŽB600:				
		ZD:-794,73		-794,73		
		RD:967,37		967,37		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		Stoka Dolnostudénská - ŽB600:132*2*2,5		660,00		
		rozš. pro Š:2*(2,5-1,77)*2,55*6		22,34		
		rozš. pro Š s mon. dnem:2*(2,7-1,77)*4,15*1		7,72		
		rozš. pro Š s mon. dnem:4*2,7*4,15*1		44,82		
		rozšíření pro protlak:(2*5,0+2*3,5-2*1,77)*2,5*2-2*(2,5-1,77)*2,55*2		59,85		
		Mezisoučet		172,64		
		RD:				
		Stoka Dolnostudénská - ŽB600:				
		31,8*2*(2,89+2,87)/2		183,17		
		31,0*2*(2,87+2,52)/2		167,09		
		25,25*2*(2,19+1,98)/2		105,29		
		4,2*2*(1,98+1,67)/2		15,33		
		34,8*2*(1,67+2,3)/2		138,16		
		41,15*2*(2,02+2,57)/2		188,88		
		5,6*2*(2,57+4,0)/2		36,79		
		rozš. pro Š:2*(2,5-1,77)*2,5*8		29,20		
		rozš. pro Š s mon. dnem D9b:2*(2,7-1,77)*4,41*1		8,20		
		rozšíření pro protlak:(2*5,0+2*3,5-2*1,77)*2,5*2-2*(2,5-1,77)*2,48*2		60,06		
		přepojení vnitroareálové kanalizace:				
		DN200:11,0*2*1,6		35,20		
		Mezisoučet				
		0				
		Konec provozního součtu		1 762,10		
8	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	2 118,24		
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1 063,22		

Slepý rozpočet

Stavba :	2852 ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ MC	Rozpočet: 01c
Objekt :	2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť	Dolnostud.-kan.stoky-ZL-015-S-Š-SO 2.005-PLATNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		hl. 2,5-4m = 55%:1789,3704*0,55		984,15		
		Konec provozního součtu		984,15		
		RD:				
		hl. 2,5-4m = 55%:1933,1304*0,55		1 063,22		
10	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	28,76		
		bourání:				
		DN300:146,0*3,1416*(0,215*0,215-0,15*0,15)		10,88		
		DN400:84,0*3,1416*(0,265*0,265-0,2*0,2)		7,98		
		DN600:4,0*3,1416*(0,392*0,392-0,3*0,3)		0,80		
		šachty:3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*2,5*8		8,44		
		konus:0,22*3		0,66		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 299,47		
		Začátek provozního součtu				
		ZD obsyp:486,0946		486,09		
		Konec provozního součtu		486,09		
		RD obsyp:540,9688		540,97		
		lože ŠD:				
		Začátek provozního součtu				
		ZD lože ŠP:17,98		17,98		
		Konec provozního součtu		17,98		
		RD lože ŠP:18,76		18,76		
		Začátek provozního součtu				
		ZD desky podkladní:5,035		5,04		
		Konec provozního součtu		5,04		
		RD desky podkladní:5,2		5,20		
		Začátek provozního součtu				
		ZD sedlové lože:214,6338		214,63		
		Konec provozního součtu		214,63		
		RD sedlové lože:236,58		236,58		
		potrubí:				
		Začátek provozního součtu				
		ZD DN600:3,1416*0,392*0,392*132,0		63,72		
		Konec provozního součtu		63,72		
		RD DN600:3,1416*0,392*0,392*173,8		83,90		
		DN800:3,1416*0,53*0,53*41,6		36,71		
		DN1000:3,1416*0,66*0,66*135,6		185,57		
		šachty:				
		rozš. pro Š:3,1416*0,9*0,9*(3,38-0,23-0,3-1,32-0,15-0,25)*2		5,75		
		rozš. pro Š s mon. dnem:3,1416*1,0*1,0*(3,65-0,5-0,3-1,32-0,15-0,25)*1		3,55		
		rozš. pro Š s mon. dnem:3,1416*1,0*1,0*(3,65-0,23-0,3-1,32-0,15-0,25)*1		4,40		
		rozš. pro Š s mon. dnem:3,1416*1,0*1,0*(3,65-0,45-0,3-1,32-0,15-0,25)*1		3,71		
		rozš. pro Š atyp:2,75*2,5*(3,74-0,23-0,3-1,32-0,15-0,25)*1		10,24		
		Začátek provozního součtu				
		ZD rozš. pro Š:3,1416*0,62*0,62*(2,55-0,45-0,3-0,784-0,15-0,25)*2		1,49		
		ZD rozš. pro Š:3,1416*0,62*0,62*(2,55-0,24-0,3-0,784-0,15-0,25)*4		3,99		

Slepý rozpočet

Stavba :	2852 ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ MC	Rozpočet: 01c
Objekt :	2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť	Dolnostud.-kan.stoky-ZL-015-S-Š-SO 2.005-PLATNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ZD rozš. pro Š s mon. dnem:3,1416*0,65*0,65*(4,15-0,3-0,784-0,15-0,25)*1		3,54		
		ZD rozš. pro Š s mon. dnem:3,1416*0,65*0,65*(4,15-0,25)*1		5,18		
		Konec provozního součtu		14,19		
		rozš. pro Š:3,1416*0,62*0,62*(2,5-0,45-0,3-0,784-0,15-0,25)*2		1,37		
		rozš. pro Š:3,1416*0,62*0,62*(2,5-0,25-0,3-0,784-0,15-0,25)*2		1,85		
		rozš. pro Š:3,1416*0,62*0,62*(2,5-0,23-0,3-0,784-0,15-0,25)*2		1,90		
		rozš. pro Š:3,1416*0,62*0,62*(2,5-0,3-0,784-0,15-0,25)*2		2,45		
		rozš. pro Š s mon. dnem D9b:3,1416*0,65*0,65*(4,41-0,3-0,784-0,15-0,25)*1		3,88		
		Mezisoučet		1 146,79		
		zásyp v KK:26,2356		26,24		
		Začátek provozního součtu				
		ZD zásyp v MK:138,0132		138,01		
		Konec provozního součtu		138,01		
		zásyp v MK:138,0132-96,1651+84,5983		126,45		
		Mezisoučet		152,68		
12	162701153R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 8000 m	m3	28,76		
		bourání:28,7629		28,76		
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	853,92		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		vytěžená zemina:1789,3704		1 789,37		
		vytlačená zemina:-1051,5866		-1 051,59		
		objem stávající kanalizace:67,5849		67,58		
		Konec provozního součtu		805,37		
		0				
		vytěžená zemina:1933,1304		1 933,13		
		vytlačená zemina:-1 146,7912		-1 146,79		
		objem stávající kanalizace:67,5849		67,58		
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	540,97		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		ŽB DN600:132,0*1,77*(0,3+0,784+0,15)		288,31		
		Odpočet:				
		potrubí:-3,1416*0,392*0,392*132,0		-63,72		
		sedlo 120°:-((132,0*1,77*0,35-132,0*0,392*0,392*0,6142)		-69,32		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		155,27		
		ŽB DN800:41,6*2,1*(0,3+1,06+0,15)		131,91		
		Odpočet:				
		potrubí:-3,1416*0,53*0,53*41,6		-36,71		
		sedlo 120°:-((41,6*2,1*0,41-41,6*0,53*0,53*0,6142)		-28,64		
		0				
		ŽB DN1000:135,6*2,35*(0,3+1,32+0,15)		564,03		
		Odpočet:				
		potrubí:-3,1416*0,66*0,66*135,6		-185,57		
		sedlo 120°:-((135,6*2,35*0,48-135,6*0,66*0,66*0,6142)		-116,68		
		0				
		přepojení UV:5,0*1,1*(0,3+0,15)		2,48		
		Mezisoučet		330,82		
		RD:				

Slepý rozpočet

Stavba :	2852 ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ MC	Rozpočet: 01c
Objekt :	2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť	Dolnostud.-kan.stoky-ZL-015-S-Š-SO 2.005-PLATNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ŽB DN600:173,8*1,77*(0,3+0,784+0,15)		379,61		
		Odpočet:				
		potrubí:-3,1416*0,392*0,392*173,8		-83,90		
		sedlo 120°:-(173,8*1,77*0,35-173,8*0,392*0,392*0,6142)		-91,27		
		přepojení vnitroareálové kanalizace:				
		plast DN200:11,0*1,1*(0,2+0,3)-3,1416*0,1*0,1*11,0		5,70		
15	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	63,28		
		28,7629*2,2		63,28		
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 299,47		
17	58310007	Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace	m3	29,15		
		26,2356*1,1*1,01		29,15		
		Začátek provozního součtu				
		KK-asfalt:15,0*2,35*(3,0-0,5-0,3-1,32-0,15)		25,73		
		rozš. pro Š:3,2*(3,2-2,35)*(3,62-0,5-0,25)*1-3,1416*0,9*0,9*2,87*1		0,50		
		0				
		Konec provozního součtu		26,24		
18	58310008	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace	m3	140,48		
		138,0132*1,1*1,01		153,33		
		Začátek provozního součtu				
		MK-asf:5,0*2,35*(3,0-0,45-0,3-1,32-0,15)		9,17		
		MK-asf:6,0*2,35*(3,0-0,45-0,3-1,32-0,15)		11,00		
		rozš. pro Š s mon. dnem:3,2*(3,2-2,35)*(3,65-0,45-0,25)*1-				
		3,1416*0,9*0,9*2,95		0,52		
		MK-asf:12,0*2,1*(2,8-0,45-0,3-1,06-0,15)		21,17		
		MK-asf:50,0*1,77*(2,5-0,45-0,3-0,784-0,15)		72,22		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*(2,55-0,45-0,25)*2-3,1416*0,62*0,62*1,85*2		2,28		
		MK-asf:15,0*1,77*(2,5-0,45-0,3-0,784-0,15)		21,66		
		Mezisoučet		153,33		
		Konec provozního součtu		138,01		
		RDS - změna v úseku 4 - D9:				
		Stoka Dolnostudenská - ŽB600:				
		ZD:-96,1651*1,1*1,01		-106,84		
		RD:84,5983*1,1*1,01		93,99		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		MK-asf:50,0*1,77*(2,5-0,45-0,3-0,784-0,15)		72,22		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*(2,55-0,45-0,25)*2-3,1416*0,62*0,62*1,85*2		2,28		
		MK-asf:15,0*1,77*(2,5-0,45-0,3-0,784-0,15)		21,66		
		Mezisoučet		-12,65		
		RD:				
		MK-asf:65,0*1,77*(2,4-0,45-0,3-0,784-0,15)		82,38		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*(2,5-0,45-0,25)*2-3,1416*0,62*0,62*1,8*2		2,22		
		Mezisoučet				
		0				
		Konec provozního součtu		180,76		
19	58337320	Štěrkopísek frakce 0-8 C	t	1 003,70		
		Začátek provozního součtu				
		Obsyp ZD:486,0946*1,67*1,01*1,1		901,89		
		Konec provozního součtu		901,89		

Slepý rozpočet

Stavba :	2852 ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ MC	Rozpočet: 01c
Objekt :	2.005 Lokality 5 - Česká čtvrť	Dolnostud.-kan.stoky-ZL-015-S-Š-SO 2.005-PLATNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Obsyp:540,9688*1,67*1,01*1,1		1 003,70		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
20	113106121V01	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho bez odvozu sutí	m2	54,98		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		chodník-dlažba:16,0*1,77		28,32		
		chodník-dlažba:25,0*1,77		44,25		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2		3,65		
		Konec provozního součtu		76,22		
		RD:				
		chodník-dlažba:29,0*1,77		51,33		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2		3,65		
21	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	37,97		
		KK-asfalt:15,0*2,35		35,25		
		rozš. pro Š:3,2*(3,2-2,35)*1		2,72		
22	113107212R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	214,44		
		KK-asfalt:15,0*2,35		35,25		
		rozš. pro Š:3,2*(3,2-2,35)*1		2,72		
		Mezisoučet		37,97		
		MK-asf:5,0*2,35		11,75		
		MK-asf:6,0*2,35		14,10		
		rozš. pro Š s mon. dnem:3,2*(3,2-2,35)*1		2,72		
		MK-asf:12,0*2,1		25,20		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		MK-asf:50,0*1,77		88,50		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2		3,65		
		MK-asf:15,0*1,77		26,55		
		Konec provozního součtu		118,70		
		bourání kónusu:2,0*2,0*1		4,00		
		Mezisoučet		57,77		
		RD:				
		MK-asf:65,0*1,77		115,05		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2		3,65		
23	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	471,38		
		chodník-asfalt:110,0*2,35		258,50		
		rozš. pro Š:3,0*(3,0-2,35)*1		1,95		
		rozš. pro Š s mon. dnem:3,2*(3,2-2,35)*1		2,72		
		chodník-asfalt:32,0*2,1		67,20		
		rozš. pro Š atyp:4,0*3,7*1		14,80		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		chodník-asfalt:33,0*1,77		58,41		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2		3,65		
		Konec provozního součtu		62,06		
		RD:				
		chodník-asfalt:68,0*1,77		120,36		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2		3,65		
		přepojení vnitroareál.kan.:2,0*1,1		2,20		
24	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	231,45		

Slepý rozpočet

Stavba :	2852 ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ MC	Rozpočet: 01c
Objekt :	2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť	Dolnostud.-kan.stoky-ZL-015-S-Š-SO 2.005-PLATNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		MK-asf:5,0*2,35		11,75		
		MK-asf:6,0*2,35		14,10		
		rozš. pro Š s mon. dnem:3,2*(3,2-2,35)*1		2,72		
		MK-asf:12,0*2,1		25,20		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		MK-asf:50,0*1,77		88,50		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2		3,65		
		MK-asf:15,0*1,77		26,55		
		Konec provozního součtu		118,70		
		bourání kónusu:2,0*2,0*1		4,00		
		RD:				
		MK-asf:65,0*1,77		115,05		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2		3,65		
		Mezisoučet		176,47		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		chodník-dlažba:16,0*1,77		28,32		
		chodník-dlažba:25,0*1,77		44,25		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2		3,65		
		Konec provozního součtu		76,22		
		RD:				
		chodník-dlažba:29,0*1,77		51,33		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2		3,65		
		Mezisoučet		54,98		
25	113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	214,44		
		KK-asfalt:15,0*2,35		35,25		
		rozš. pro Š:3,2*(3,2-2,35)*1		2,72		
		Mezisoučet		37,97		
		MK-asf:5,0*2,35		11,75		
		MK-asf:6,0*2,35		14,10		
		rozš. pro Š s mon. dnem:3,2*(3,2-2,35)*1		2,72		
		MK-asf:12,0*2,1		25,20		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		MK-asf:50,0*1,77		88,50		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2		3,65		
		MK-asf:15,0*1,77		26,55		
		Konec provozního součtu		118,70		
		bourání kónusu:2,0*2,0*1		4,00		
		RD:				
		MK-asf:65,0*1,77		115,05		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2		3,65		
26	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.15 cm	m2	471,38		
		chodník-asfalt:110,0*2,35		258,50		
		rozš. pro Š:3,0*(3,0-2,35)*1		1,95		
		rozš. pro Š s mon. dnem:3,2*(3,2-2,35)*1		2,72		
		chodník-asfalt:32,0*2,1		67,20		
		rozš. pro Š atyp:4,0*3,7*1		14,80		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		chodník-asfalt:33,0*1,77		58,41		

Slepý rozpočet

Stavba :	2852 ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ MC	Rozpočet: 01c
Objekt :	2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť	Dolnostud.-kan.stoky-ZL-015-S-Š-SO 2.005-PLATNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2		3,65		
		Konec provozního součtu		62,06		
		RD:				
		chodník-asfalt:68,0*1,77		120,36		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2		3,65		
		přepojení vnitroareál.kan.:2,0*1,1		2,20		
27	113151114R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	214,44		
		KK-asfalt:15,0*2,35		35,25		
		rozš. pro Š:3,2*(3,2-2,35)*1		2,72		
		Mezisoučet		37,97		
		MK-asf:5,0*2,35		11,75		
		MK-asf:6,0*2,35		14,10		
		rozš. pro Š s mon. dnem:3,2*(3,2-2,35)*1		2,72		
		MK-asf:12,0*2,1		25,20		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		MK-asf:50,0*1,77		88,50		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2		3,65		
		MK-asf:15,0*1,77		26,55		
		Konec provozního součtu		118,70		
		bourání kónusu:2,0*2,0*1		4,00		
		RD:				
		MK-asf:65,0*1,77		115,05		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2		3,65		
28	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	379,74		
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	379,74		
	Celkem za	11 Přípravné a přídružené práce				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
30	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	18,76		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		rozš. pro Š:2,5*2,5*0,15*6		5,63		
		rozš. pro Š s mon. dnem:2,7*2,7*0,15*2		2,19		
		Konec provozního součtu		7,81		
		rozš. pro Š:3,0*3,0*0,15*2		2,70		
		rozš. pro Š s mon. dnem:3,2*3,2*0,15*3		4,61		
		rozš. pro Š atyp:4,0*3,85*0,15*1		2,31		
		přepojení UV:5,0*1,1*0,1		0,55		
		Mezisoučet		10,17		
		RD:				
		rozš. pro Š:2,5*2,5*0,15*8		7,50		
		rozš. pro Š s mon. dnem D9b:2,7*2,7*0,15*1		1,09		
31	452111111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	284,00		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		ŽB DN600 - 132,0/2,5*2:106		106,00		
		Konec provozního součtu		106,00		
		ŽB DN800 - 41,6/2,5*2:34		34,00		
		ŽB DN1000 - 135,6/2,5*2:110		110,00		
		Mezisoučet		144,00		
		RD:				
		ŽB DN600 - 173,8/2,5*2:140		140,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	2852 ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ MC	Rozpočet: 01c
Objekt :	2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť	Dolnostud.-kan.stoky-ZL-015-S-Š-SO 2.005-PLATNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	5,20		
		podklad pod šachty:				
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		rozš. pro Š:1,5*1,5*0,1*6		1,35		
		rozš. pro Š s mon. dnem:1,7*1,7*0,1*2		0,58		
		Konec provozního součtu		1,93		
		rozš. pro Š:2,0*2,0*0,1*2		0,80		
		rozš. pro Š s mon. dnem:2,2*2,2*0,1*3		1,45		
		rozš. pro Š atyp:3,0*2,85*0,1*1		0,86		
		Mezisoučet		3,11		
		RD:				
		rozš. pro Š:1,5*1,5*0,1*8		1,80		
		rozš. pro Š s mon. dnem D9b:1,7*1,7*0,1*1		0,29		
33	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu B 12,5	m3	236,58		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		DN600 - sedlo 120°:132,0*1,77*0,35-132,0*0,392*0,392*0,6142		69,32		
		Konec provozního součtu		69,32		
		DN800 - sedlo 120°:41,6*2,1*0,41-41,6*0,53*0,53*0,6142		28,64		
		DN1000 - sedlo 120°:135,6*2,35*0,48-135,6*0,66*0,66*0,6142		116,68		
		Mezisoučet		145,32		
		RD:				
		DN600 - sedlo 120°:173,8*1,77*0,35-173,8*0,392*0,392*0,6142		91,27		
34	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	10,84		
		podklad pod šachty:				
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		rozš. pro Š:4*1,5*0,1*6		3,60		
		rozš. pro Š s mon. dnem:4*1,7*0,1*2		1,36		
		Konec provozního součtu		4,96		
		rozš. pro Š:4*2,0*0,1*2		1,60		
		rozš. pro Š s mon. dnem:4*2,2*0,1*3		2,64		
		rozš. pro Š atyp:(2,95+2,0+1,35+2,75+2,1)*0,1*1		1,12		
		Mezisoučet		5,36		
		RD:				
		rozš. pro Š:4*1,5*0,1*8		4,80		
		rozš. pro Š s mon. dnem D9b:4*1,7*0,1*1		0,68		
35	460510243RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	36,83		
		sděl. kabel:(1,0+2,35+1,0)*1		4,35		
		kabel VN:(1,0+2,35+1,0)*1		4,35		
		kabel NN:(1,0+2,35+1,0)*1		4,35		
		kabel VO:(1,0+2,35+1,0)*2		8,70		
		sděl. kabel:(1,0+1,77+1,0)*3		11,31		
		kabel VO:(1,0+1,77+1,0)*1		3,77		
36	PC4501	Podkladní betonový pražec C 12/15 600/150/100	kus	141,40		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		ŽB DN600 - 132,0/2,5*2:106*1,01		107,06		
		Konec provozního součtu		107,06		

Slepý rozpočet

Stavba :	2852 ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ MO	Rozpočet: 01c
Objekt :	2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť	Dolnostud.-kan.stoky-ZL-015-S-Š-SO 2.005-PLATNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		RD:				
		ŽB DN600 - 173,8/2,5*2:140*1,01		141,40		
37	PC4502	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100	kus	145,44		
		ŽB DN800 - 41,6/2,5*2:34*1,01		34,34		
		ŽB DN1000 - 135,6/2,5*2:110*1,01		111,10		
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
38	5PC	Provizorní oprava místní komunikace - Šumperk	m2	172,47		
		MK-asf:5,0*2,35		11,75		
		MK-asf:6,0*2,35		14,10		
		rozš. pro Š s mon. dnem:3,2*(3,2-2,35)*1		2,72		
		MK-asf:12,0*2,1		25,20		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		MK-asf:50,0*1,77		88,50		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2		3,65		
		MK-asf:15,0*1,77		26,55		
		Konec provozního součtu		118,70		
		RD:				
		MK-asf:65,0*1,77		115,05		
		rozš. pro Š:2,5*(2,5-1,77)*2		3,65		
39	5PC1	Provizorní oprava krajské komunikace	m2	37,97		
		KK-asfalt:15,0*2,35		35,25		
		rozš. pro Š:3,2*(3,2-2,35)*1		2,72		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
40	822442111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600	m	173,80		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		ŽB DN600:132,0		132,00		
		Konec provozního součtu		132,00		
		RD:				
		ŽB DN600:173,8		173,80		
41	822442111RT2	Montáž trub ŽB bezvýkopově DN 600 včetně dodávky trub s CV 180°	m	59,30		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		ŽB600:65,4		65,40		
		Konec provozního součtu		65,40		
		RD:				
		ŽB600:48,9+10,4		59,30		
42	822472111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	41,60		
43	822492111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1000	m	135,60		
44	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	5,00		
		přepojení UV:5,0		5,00		
45	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	11,00		
		RD:				
		přepojení vnitroareálové kanalizace:				
		plast DN200:11,0		11,00		
46	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	5,00		
		přepojení UV:				
		koleno 30°:5		5,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	2852 ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ MO	Rozpočet: 01c
Objekt :	2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť	Dolnostud.-kan.stoky-ZL-015-S-Š-SO 2.005-PLATNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	16,00		
		přepojení UV:5,0		5,00		
		Mezisoučet		5,00		
		RD:				
		přepojení vnitroareálové kanalizace:				
		plast DN200:11,0		11,00		
48	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	233,10		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		ŽB DN600:132,0		132,00		
		bezvýkopové:65,4		65,40		
		Konec provozního součtu		197,40		
		RD:				
		ŽB DN600:173,8		173,80		
		bezvýkopové:59,3		59,30		
49	892671111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 800, vodou	m	41,60		
50	892681111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 1000, vodou	m	135,60		
51	894410060T02	Šachta z betonových dílců pro DN 600 výška vstupu do 3,5 m	kus	8,00		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:6		6,00		
		Konec provozního součtu		6,00		
		RD:8		8,00		
52	894410060T30	Šachta z betonových dílců pro DN 600 výška vstupu do 3,5 m, monolitické dno	kus			
		Začátek provozního součtu				
		ZD:2		2,00		
		Konec provozního součtu		2,00		
		RD:0				
53	894410060T40	Šachta z betonových dílců pro DN 600 výška vstupu do 4,5 m, monolitické dno	kus	1,00		
		RD:				
		Š mon.dno D9b:1		1,00		
54	894410072T01	Šachta z betonových dílců pro DN 1000 výška vstupu do 3,0 m	kus	2,00		
55	894410072T30	Šachta z betonových dílců pro DN 1000 výška vstupu do 3,0 m, monolitické dno	kus	2,00		
56	894410072T40	Šachta z betonových dílců pro DN 1000 výška vstupu do 4,0 m, monolitické dno	kus	1,00		
57	892600000	Kamerové zkoušky	m	351,00		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		DN600:132,0		132,00		
		Konec provozního součtu		132,00		
		DN800:41,6		41,60		
		DN1000:135,6		135,60		
		Mezisoučet		177,20		
		RD:				
		ŽB DN600:173,8		173,80		
58	PC	Napojení stoky ŽB do stávající šachty	kus	1,00		
59	PC	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	1,00		
		RD:				
		přepojení vnitroareálové kanalizace:				

Slepý rozpočet

Stavba :	2852 ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ MC	Rozpočet: 01c
Objekt :	2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť	Dolnostud.-kan.stoky-ZL-015-S-Š-SO 2.005-PLATNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		plast DN200:1		1,00		
60	PC	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	5,00		
		přepojení UV:5		5,00		
61	PC	Napojení přípojky na ŽB	kus	5,00		
		přepojení UV:5		5,00		
62	PC-Š3557	Š3557 - Atypická šachta	kus	1,00		
63	28611727.U2	Roura PP kanalizační Ultra Rib 2 DN150x3000 mm SN8	m	5,47		
		přepojení UV:5,0*1,093		5,47		
64	28611728.U1	Roura PP kanalizační ULTRA-RIB2 DN200x6000 mm SN8	m	12,02		
		RDS - změna v úseku 4 - D9b:				
		přepojení vnitroareálové kanalizace:				
		plast DN200:11,0*1,093		12,02		
65	28650660.U	Koleno kanalizační PP Ultra Rib 2 DN150/30°	kus	5,08		
		přepojení UV:5*1,015		5,08		
66	59222543.D	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV 180°	m	42,02		
		41,6*1,01		42,02		
67	59222543a	Trouba železobet hrdlová 600/2500 CV 180°	m	175,54		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		ŽB DN600:132,0*1,01		133,32		
		Konec provozního součtu		133,32		
		Mezisoučet				
		RD:				
		ŽB DN600:173,8*1,01		175,54		
68	59222544.2	Trouba železobet hrdlová 1000/2500 CV 180°	m	136,96		
		135,6*1,01		136,96		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
69	910101000T00	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	36,05		
		DN600:115,0*3,1416*0,3*0,3		32,52		
		Š:3,1416*0,5*0,5*1,5*3		3,53		
70	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	214,32		
		chodník-asfalt:32,0*2		64,00		
		rozš. pro Š atyp:2*3,7*1		7,40		
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		chodník-asfalt:33,0*1,77		58,41		
		rozš. pro Š:2*(2,5-1,77)*2		2,92		
		Konec provozního součtu		61,33		
		RD:				
		chodník-asfalt:68,0*2		136,00		
		rozš. pro Š:2*(2,5-1,77)*2		2,92		
		přepojení vnitroareál.kan.:2,0*2		4,00		
71	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	212,32		
		KK-asfalt:15,0*2		30,00		
		rozš. pro Š:2*(3,2-2,35)*1		1,70		
		Mezisoučet		31,70		
		MK-asf:5,0*2		10,00		
		MK-asf:6,0*2		12,00		
		rozš. pro Š s mon. dnem:2*(3,2-2,35)*1		1,70		
		MK-asf:12,0*2		24,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	2852 ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ MC	Rozpočet: 01c
Objekt :	2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť	Dolnostud.-kan.stoky-ZL-015-S-Š-SO 2.005-PLATNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		ZD:				
		MK-asf:50,0*2		100,00		
		rozš. pro Š:2*(2,5-1,77)*2		2,92		
		MK-asf:15,0*2		30,00		
		Konec provozního součtu		132,92		
		RD:				
		MK-asf:65,0*2		130,00		
		rozš. pro Š:2*(2,5-1,77)*2		2,92		
72	9PC	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	349,00		
		vybourání stáv.kanal.:				
		DN300:146,0		146,00		
		DN400:84,0		84,00		
		DN600:4,0		4,00		
		0				
		zalití stáv.kanal. - betonem:				
		0				
		zalití stáv.kanal. - popíl. směsí:				
		DN600:115,0		115,00		
73	PC01	Demontáž a zpětná montáž stávajícího oplocení	m	2,50		
		RD:				
		Stoka Dolnostuděnská - ŽB600:2,5		2,50		
74	PC02	Demontáž a zpětná montáž stávajícího oplocení s podezdívkou	m	2,50		
		RD:				
		přepojení vnitroareál.kan.DN200:2,5		2,50		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
75	976085211R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	11,00		
		vybourané:				
		šachty:8		8,00		
		konus:3		3,00		
76	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,26		
77	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,26		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				



Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ID-015-S-Š-SO 2.005

Vyjádření projektanta

Při projednání umístění šachty D9 s vlastníkem pozemku ve vjezdu do firmy SART na ulici Uničovské bylo zjištěno, že od doby ZD došlo k úpravě prostoru včetně vjezdu a vlastník (firma SART) nyní nesouhlasí s tímto umístěním.

Proto se přistoupilo k návrhu změny umístění šachty mimo prostor vjezdu. Nejbližším vhodným místem je sousední zelená plocha mezi dlážděným vjezdem a ocelovou průmyslovou halou. Pomocí sondy byla zjištěna skutečná hloubka uložení stávající stoky v uvedeném místě. Hloubka bohužel neumožňuje napojení nové stoky stávající stoka je uložena níže, než je položena nová stoka. Hloubka uložení nové stoky vychází jednak z podkladu (údaj o šachtě výše na stoce, avšak ve skutečnosti pravděpodobně potrubí staré stoky nemá jednotný podélný sklon), jednak z možností daných terénem a hloubkou nápojného bodu na dolním konci – hlubší uložení není možné.

Proto se navrhuje změna umístění šachty D9 pro napojení nového úseku na stávající, a to o cca 37 m výše na hranici pozemků fy SART a SŽDC.

Vzhledem k novému umístění přepojení původní stoky do nového úseku byl na návrh projektanta proveden kamerový průzkum úseku stávající stoky mezi původním a novým umístěním šachty D9. Z důvodu částečného zborcení a překážek ve dně nebylo možné celý úsek prozkoumat a není proto známo, zda se v daném úseku nenachází případné napojení kanalizačních přípojek. Proto se navrhuje neprovedení šachty D10, která měla původně ukončit stávající šachtu v místě vjezdu do fy SART.


Projektant s uvedeným řešením souhlasí.

Za projektanta:

Datum: 20. 3. 2015

Ing. Milan Jokl

Podpis:





Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-015-S-Š-SO 2.005

Vyjádření generálního projektanta

Projektová dokumentace Město Šumperk – rekonstrukce a doplnění kanalizace byla vypracována v roce 2009 na základě vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení. V dokumentacích pro tato povolení a shodně s nimi i v zadávací dokumentaci byla navržena trasa stoky Dolnostuděnská s napojením na stávající stoku v ulici Uničovské. Toto napojení bylo navrženo ve vjezdu do areálu firmy SART. Od doby odevzdání ZD do realizace uplynulo 5 let. Mezitím došlo k úpravám ve vjezdu, kde byly navrženy dvě kanalizační šachty a také je zde zvýšená intenzita provozu nákladních aut. Proto je nutná změna umístění šachty pro napojení nové stoky na stávající mimo prostor vjezdu. Nejbližším vhodným místem je sousední zelená plocha mezi dlážděným vjezdem a ocelovou průmyslovou halou. Pomocí sondy byla zjištěna skutečná hloubka uložení stávající stoky v uvedeném místě. Hloubka bohužel neumožňuje napojení nové stoky stávající stoka je uložena níže, než je položena nová stoka. Hloubka uložení nové stoky vychází jednak z podkladů (údaj o šachtě výše na stoece, avšak ve skutečnosti pravděpodobně potrubí staré stoky nemá jednotný podélný sklon), jednak z možností daných terénem a hloubkou nápojného bodu na dolním konci – hlubší uložení není možné.

Proto se navrhuje změna umístění šachty D9 pro napojení nového úseku na stávající, a to o cca 37 m výše na hranici pozemků fy SART a SŽDC.

Vzhledem k novému umístění přepojení původní stoky do nového úseku byl na návrh projektanta proveden kamerový průzkum úseku stávající stoky mezi původním a novým umístěním šachty D9. Z důvodu částečného zborcení a překážek ve dně nebylo možné celý úsek prozkoumat a není proto známo, zda se v daném úseku nenachází případné napojení kanalizačních přípojek. Proto se navrhuje neprovedení šachty D10, která měla původně ukončit stávající šachtu v místě vjezdu do fy SART.

Z pozice generálního projektanta s uvedeným řešením souhlasíme. Jedná se o stav, který nebylo možné předvídat, poněvadž při zpracování ZD neexistoval nynější stav, nebylo známo, že dojde ke stavebním úpravám a nebyly znalosti o zjištěných odlišnostech v hloubce uložení.

Za generálního projektanta:


Datum: 20. 3. 2015

Ing. Jan Polásek

Podpis:




Posun šachty D9 ze středu příjezdové komunikace

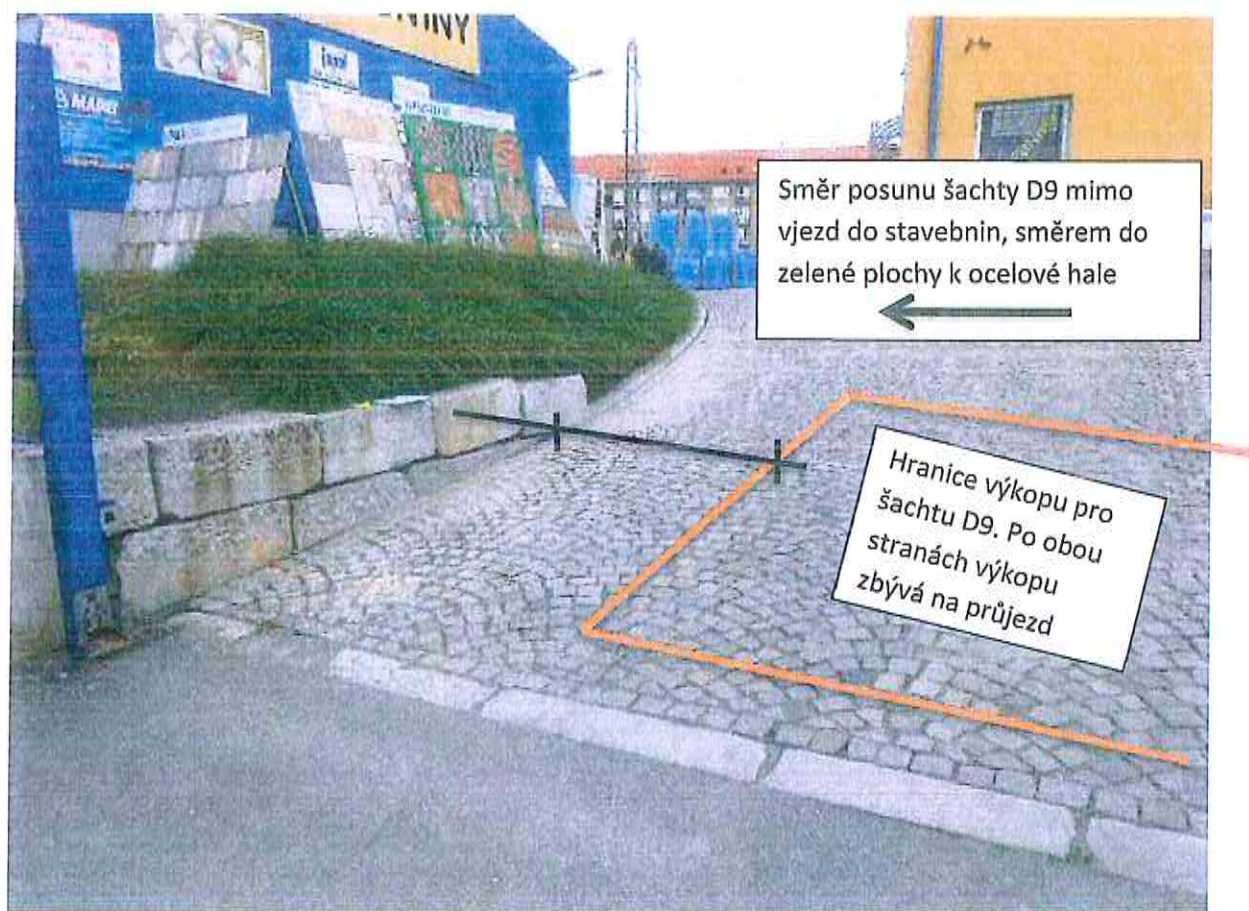

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 661
Obec:	Šumperk I5237041
Katastrální území:	Šumperk I7642641
Číslo LV:	9414
Výměra [m ²]:	602
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

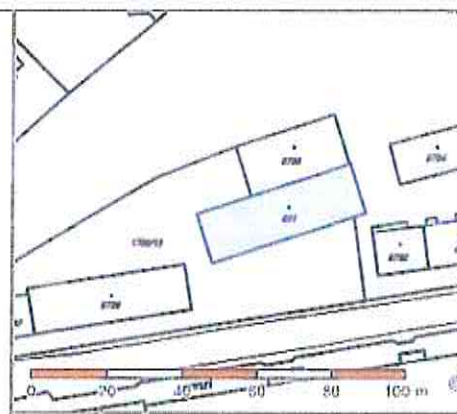

Součástí je stavba

Budova s číslem popisným:	Šumperk I4146031 ; č.p. 2944; stavba pro dopravu
Stavba stojí na pozemku:	p.č. st. 661
Stavební objekt:	č.p. 2944
Ulice:	Uničovská
Adresní místa:	Uničovská 2944/1B

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
SART-stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1b, 78701 Šumperk	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk](#).


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.11.2014 08:10:09.

© 2004 - 2014 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy 18211 Praha 8, cuzk@cuzk.cz
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.1.0 build 1

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1799/13
Obec:	Šumperk 15237041
Katastrální území:	Šumperk 17642641
Číslo LV:	9414
Výměra [m ²]:	2539
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha

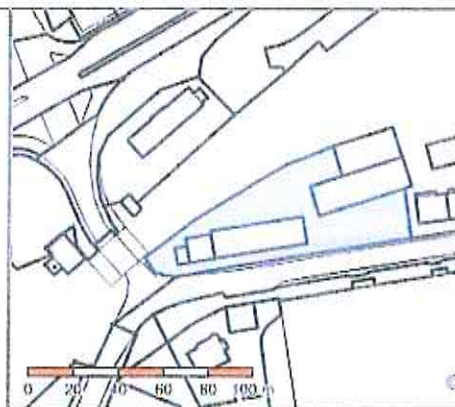

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
SART-stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1b, 78701 Šumperk	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.11.2014 08:10:09.

© 2004 - 2014 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy 18211 Praha 8, cuzk@cuzk.cz
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.1.0 build 1

Dobrý den,

šachta ve vjezdu nemůže být provedena z důvodu, že v areálu se nachází prodejna stavebnin, do které vjíždí zákazníci a naváží se zboží. Mimo osobní auta není možný příjezd odjinud. V areálu se nachází garáže pro těžkou stavební techniku, kdy vjezd a odjezd je možný jen přes bránu.

Vzhledem k harmonogramu výstavby šachty bychom museli zastavit provoz firmy po dobu výstavby.

O umístění šachty ve vjezdu s námi nikdy nikdo nejednal až 19. 6. 2014. Děkuji za pochopení situace.

Ing. Václav Ston

předseda představenstva

mobil: 602 739 649, e-mail: ston@sart.cz



SART – stavby a rekonstrukce a.s.

Uničovská 2944/1B

787 01 Šumperk

IČ: 25898671

DIČ: CZ25898671

Datum	Denní záznamy stavby
	přípravy, leželo jsem samostatně do sádky. Pan. Hubička přeprogramoval RPS.
18. 7. 14	VCP Útulek Dobruška: při zahájení práce při startování jím pro provádění práce ke č.p. 10, bylo ve výhledu systému namontováno střecha. přikrýt DN 100 val a namontovat kabel vložený v bet. stěbě. Ke kabelu se nikdo nemohl. stále ještě systém byl v provozu a odpojit. radama a přívodům. Mělo se schvít minulejší střež. ŽB DN 800 o 20 cm v sádku 3555 - 3557.
11. 8. 14	Útulek Dobruška: další náležitosti přípravy ke jednotlivým č.p. je nutné provést přeprogramování pro polovinu ležícího levého se schvít. úst. 3557 - 3558. 4 ks
18. 8. 14	VCP Útulek Přerov: 4+6: směrem spíše provádění úst. úst. přikrýt. bude provedeno vyložení DN 300. Útulek Přerov: 6: - systém, se ve stěbě. není v sádku přikrýt DN 300 ale DN 400 (sádku přikrýt vložit), stále pak nutné asen. sádky v sádku v sádku stěba a dříve provedené propojení střež.
18. 8. 14	Útulek Dobruška: 2: - směrem umístění sádky D9 mimo střed výhledu přes SART do levé směru k ocel. hale. Přikrýt přípoje ke k. v sádku posunutá i přikrýtá v sádku.



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jilová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

☎ 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603-841/0100

AQUA Procon s.r.o.
Ing. Jolík M.
Palackého tř. 12,
612 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

16.3.2015

Naše značka
50000/2015

e-mail
heitmar@spvs.cz

Vyřizuje/
Heitmar Petr

Šumperk
12.6.2015

Věc: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“

Týká se: „ Horní Pomoraví II sever, Město Šumperk – doplnění kanalizace „

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk jako provozovatel obdržela dne 8.6. 2015 od zhotovitele stavby fa: IMOS BRNO, a.s. žádost o vyjádření k předloženému stanovisku (Iniciační dopis ID-015-S-Š-SO 2.005 - lokalita Česká čtvrť – stoka Dolnostudénská – posunutí šachet D8,D9,D10). Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk k předloženému návrhu konstatuje následující:

- Souhlasíme s předloženým řešením.

S pozdravem

Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jilová 6, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911
-6-

Ing. Pavel Paloncý
technický ředitel
