



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	10. 11. 2015
Ev.č.	ZL-141-S-Z-SO 3.002	Datum schválení	13. 11. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS **)	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh / SO 3.002 - LOKALITA UL. U DRAHY / STOKA 02.2		
Specifikace změny: Při realizaci bezvýkopových oprav stoky 02.2 byl zjištěn odlišný profil sanovaného potrubí, než je uvedeno v podkladech. Profil uvedených v podkladech je 1680/1000, skutečný profil je DN 1000. Tato změna se týká úseku v délce 101,75 m a to mezi šachtami Š02.2-4 až Š02.2-5. Provést bezvýkopovou opravu stoky DN 1000 sanací vodotěsnou maltou.			
Předmětem změnového listu je: - Změna profilu sanované stoky 02.2			
Finanční dopad změny:	Snížení		
Změna ceny po schválení:	-70 431,35 Kč		
Stanovisko správce stavby: <i>Společnost stoky, součástí je návrhový územní a dopravní projekt. Profil je možné ověřit až po realizaci sanace.</i>			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis + situace 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Stavební deník 5) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.		




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Průvoda
Vedoucí a příruční


Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **)  SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu	 AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ46984971 Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu
Datum: 10. 11. 2015	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 09 Brno závod Brno - VHS a.s. Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **)  Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilová 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel.: 583 312 111 fax: 563 214 845 Jiří Vykydal - manažer projektu 13. 11. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

***) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Aquaprocon

Ing. Vlastislav Kolečkář

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Holotík Vladimír	holotikv@imosbrno.eu / 602 713 982	28.10.2015

Iniciační dopis ID-141-S-Z-SO 3.002 - Změna profilu sanované stoky 02.2

Aktuální stav:

Při realizaci bezvýkopových oprav stoky 02.2 byl zjištěn odlišný profil sanovaného potrubí než je uvedeno v podkladech. Profil uvedených v podkladech je 1680/1000 skutečný profil je DN 1000 tato změna se týká úseku v délce 101,75 m a to mezi šachtami Š02.2-4 až Š02.2-5.

Návrh řešení:


Provést bezvýkopovou opravu stoky DN1000 sanací vodotěsnou maltou.

Žádáme zodpovědného projektanta a provozovatele o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Ing. Holotík Vladimír

v2. 

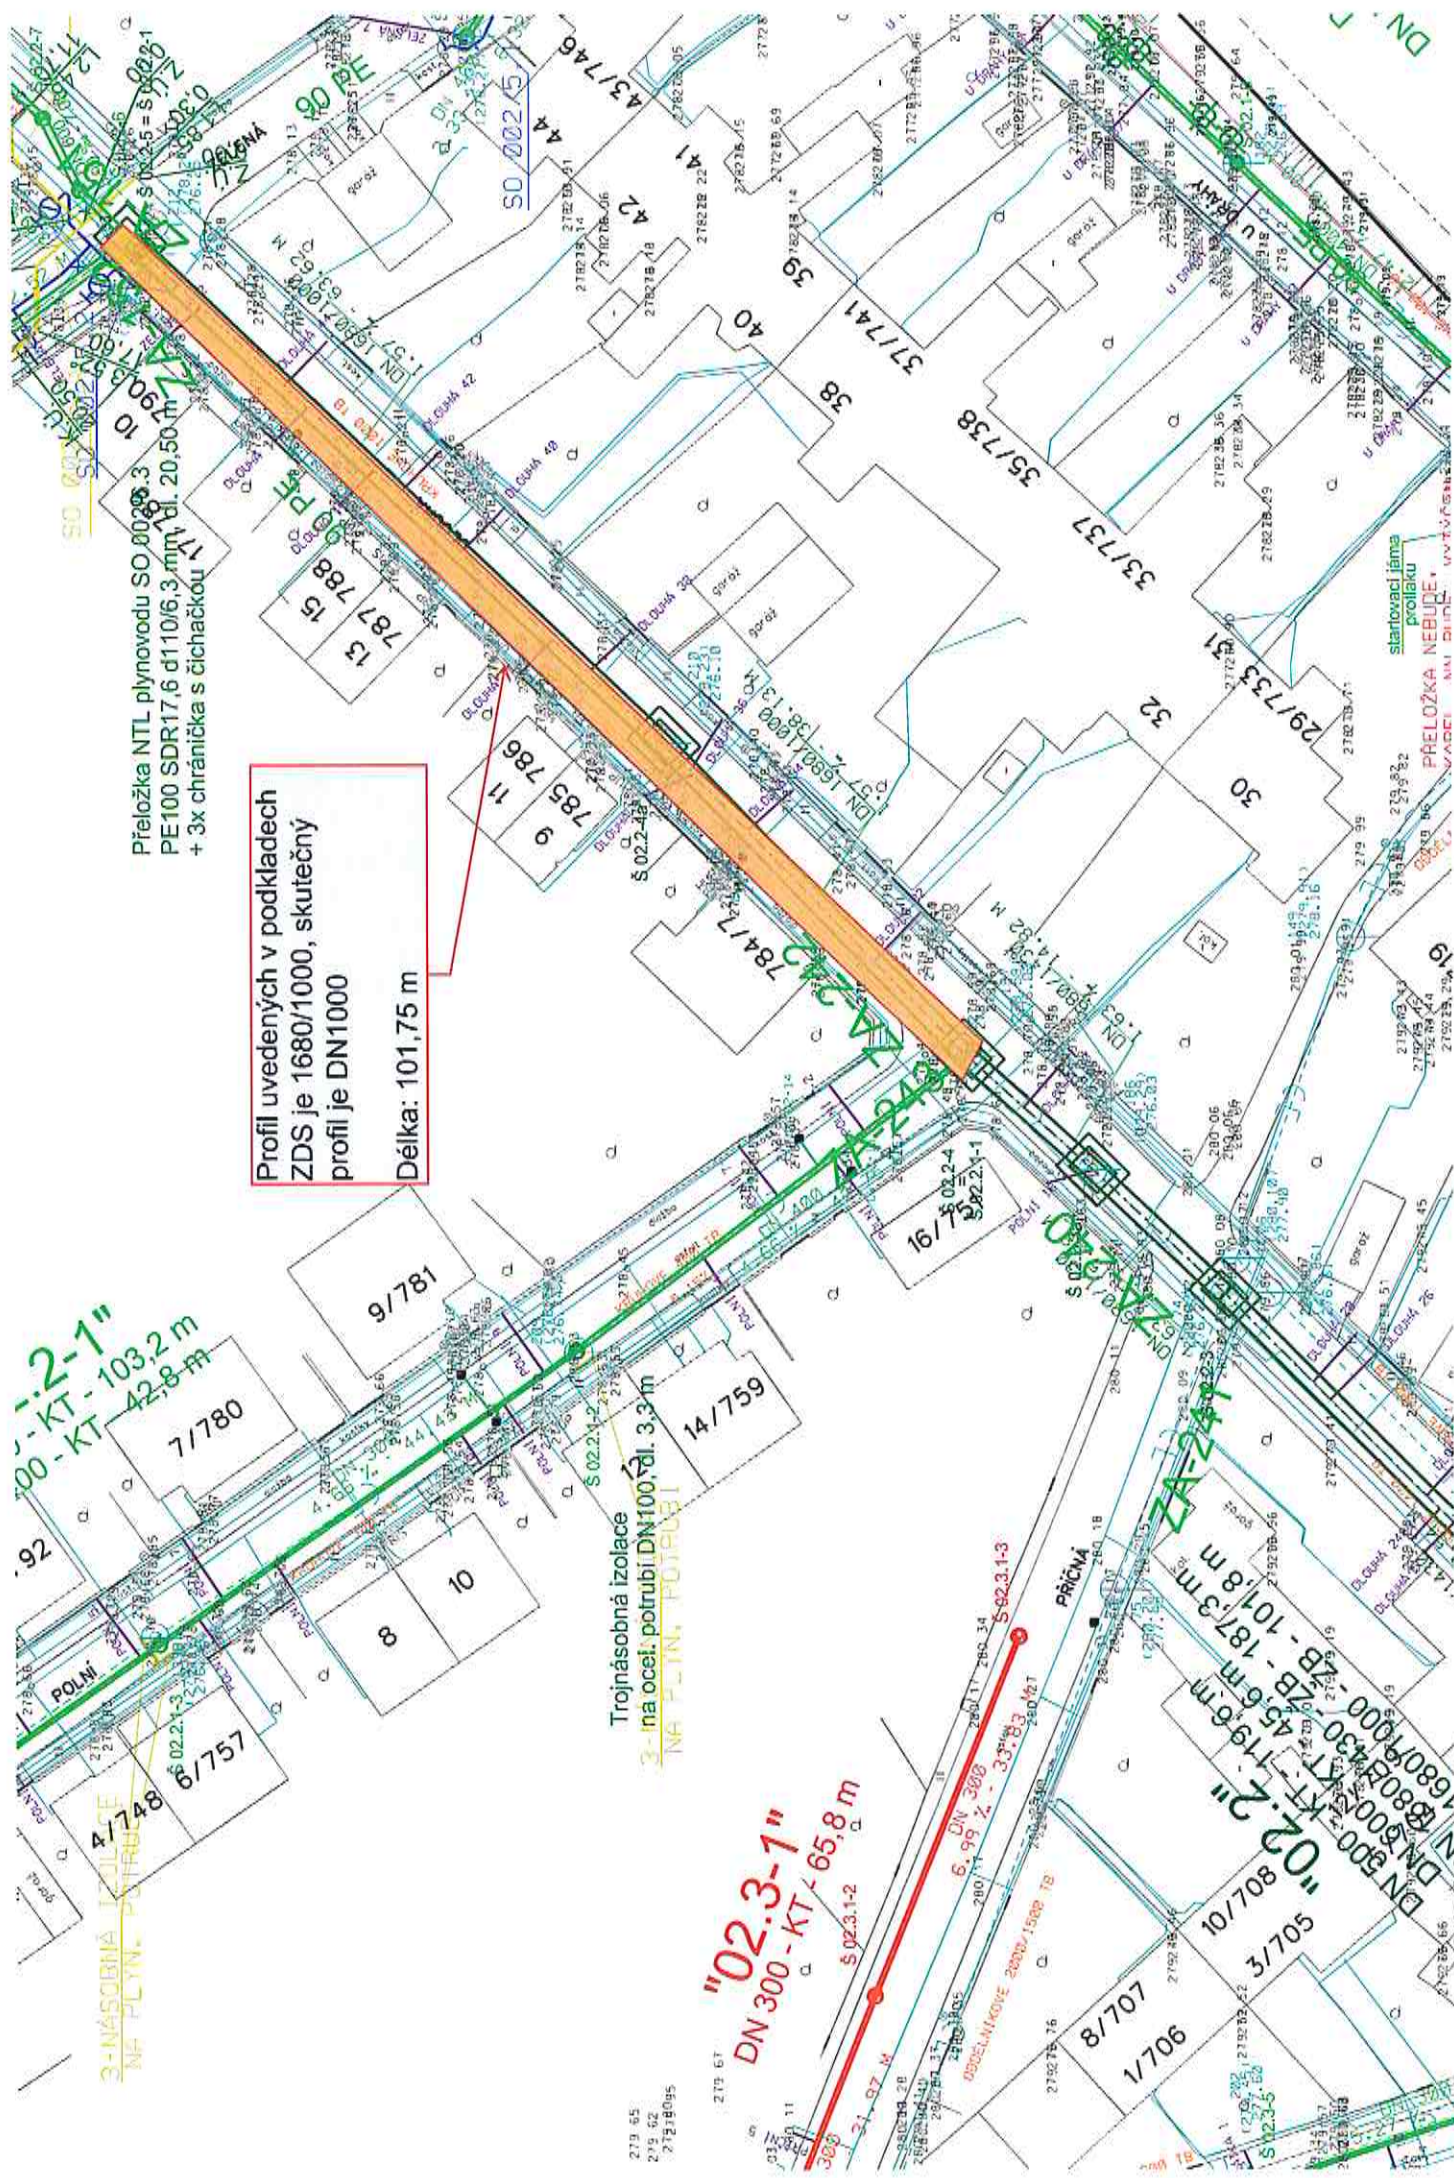

Příložka NTL plynovodu SO 002.3
PE100 SDR17,6 d110/6,3 mm d1. 20.50 m
+ 3x chránička s čístačkou

Profil uvedených v podkladech
ZDS je 1680/1000, skutečný
profil je DN1000
Délka: 101,75 m

Trojnásobná izolace
3- na ocel. potrubí DN100, d1. 3,3 m
NA PLYN. POTRUBÍ

"02.3-1"
DN 300 - KT - 65,8 m
S02.3.1-2

6 DN 300
S02.3.1-3
PŘÍČNÁ
10/708
1/706
8/707

"02.2-2"
DN 300 - KT - 119,6 m
10/708
3/705

startovací jáma
proluku
PRELOŽKA NEBUDE.

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-141-S-Z-SO 3.002

3. Město Zábřeh / SO 3.002

Změna profilu sanované stoky 02.2

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-141-S-Z-SO 3.002	
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
SO 3.002 - LOKALITA UL. U DRÁHY												
STOKA 02.2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Trubní vedení												
385	Zednická oprava štol DN1600/1000	m	101,75	5 729,10	582 935,93	0,00	5 729,10	0,00	-101,75	-582 935,93	0,00	-582 935,93
n1	Zednická oprava štol DN1000	m	0,00	5 036,90	0,00	101,75	5 036,90	512 504,58	101,75	512 504,58	512 504,58	0,00
Trubní vedení celkem :					582 935,93		512 504,58			-70 431,35	512 504,58	-582 935,93
ZL-141-S-Z-SO 3.002 CELKEM :												
								512 504,58		-70 431,35	512 504,58	-582 935,93



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 632/15/K
Datum: 29. 10. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iniciační dopis č.: ID-141-S-Z-SO 3.002 Změna profilu sanované stoky 02.2

Vyjádření projektanta

Při realizaci bezvýkopových oprav stoky 02.2 byl zjištěn odlišný profil sanovaného potrubí, než je uvedeno v podkladech. Profil uvedených v podkladech je 1680/1000 skutečný profil je DN 1000 tato změna se týká úseku v délce 101,75 m a to mezi šachtami Š02.2-4 až Š02.2-5.


Provést bezvýkopovou opravu stoky DN 1000 sanací vodotěsnou maltou.

Projektant s návrhem změny souhlasí, neboť vzniklou situaci nebylo možno předvídat. Profil předmětné stoky bylo možno ověřit až po zahájení sanace. Bez realizace navržené úpravy nelze zajistit sanaci předmětné stoky.

Za projektanta:

Datum:

Ing. Vlastislav Kolečkář





IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 632-1/15/K
Datum: 29. 10. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-141-S-Z-SO 3.002 Změna profilu sanované stoky 02.2

Vyjádření generálního projektanta

Při realizaci bezvýkopových oprav stoky 02.2 byl zjištěn odlišný profil sanovaného potrubí, než je uvedeno v podkladech. Profil uvedených v podkladech je 1680/1000 skutečný profil je DN 1000 tato změna se týká úseku v délce 101,75 m a to mezi šachtami Š02.2-4 až Š02.2-5.


Provést bezvýkopovou opravu stoky DN 1000 sanací vodotěsnou maltou.

Z pozice generálního projektanta s návrhem změny souhlasíme, neboť vzniklou situaci nebylo možno předvídat. Profil předmětné stoky bylo možno ověřit až po zahájení sanace. Bez realizace navržené úpravy nelze zajistit sanaci předmětné stoky.

Za generálního projektanta:

Datum:

Ing. Jan Polášek



Datum	Denní záznamy stavby
28.10.2015	Práci zhotovitele - Jasně vlož 0.2.2 - při realizaci vlož vlož 0.2.2 v úseku mezi RD.2.2 - 4 až RD.2.2.5 byl zjištěn odlišný profil vlož od uvažované podkladě. Pro podkladě uvaž. byt profil vlož 81681/1000 skutečně je DN 1000. <i>Hofbauer</i>
28.10.2015	Počasí: 7-14°C Pátek
H	Pracovní doba: 7⁰⁰ - 14⁰⁰
	Pracovníci:
	11000 KTD, 201 KTD, 11000, 161 HTP
	110000 KTD, 710000, 11000, 21 HTP
	11000 KTD, 41 KTD, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 21 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP
	11000 KTD, 11000, 11000, 11 HTP



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jilová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

☎ 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603-841/0100

AQUA Procon s.r.o.
Ing. Kolečkář
Palackého tř. 12,
612 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
424 - 50000/2015

e-mail
heitmar@spvs.cz

Vyřizuje/
Heitmar Petr

Šumperk
5.11.2015

Věc: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“

Týká se: „Horní Pomoraví II sever, Město Zábřeh „

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk jako provozovatel obdržela od zhotovitele stavby fa: IMOS BRNO, a.s. žádost o vyjádření k předloženému stanovisku (Iniciační dopis ID-141-S-Z-SO 3.002 – Změna profilu sanované stoky 02.2). Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk k předloženému návrhu konstatuje následující:

- S navrženým řešením souhlasíme.

S pozdravem

Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jilová 6, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911

Ing. Pavel Paloncý
technický ředitel
