

Strana : 1

Tiskeno dne :

Databáze:

Nabídka číslo:

položkový rozpis**Stavba:****CHODNÍKY PODÉL SILNICE III-35724 BOROVA - VÍCEPRÁCE**

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	265,950 t		63,00	16 754,85
2	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	411,900 t		65,20	26 855,88
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	132,980 m3		115,70	15 385,79
4	120001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	98,200 m3		411,00	40 360,20
5	171201201	Uložení sypaniny na skládce	132,980 m3		11,70	1 555,87
6	181102301	Úprava pláňe v zářezech bez zhutnění	886,500 m2		16,50	14 627,25
7	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	886,500 m2		55,00	48 757,50
8	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tř 150 mm	886,500 m2		94,10	83 419,55

STAVBA CELKEM

Sazba DPH

21,00

DPH celkem

52 020,57

Odbytová cena bez DPH :

247 716,99

Odbytová cena s DPH :

299 737,56

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

**SWIETELSKY®**

odštěpné zásměrka (DIN 1053)

PROTOKOL Č. DB22-551
Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006 - příloha A

list 1/1

Zkoušeno dne : 15.08.22

Stavba : **REKONSTRUKCE SILNICE III/35724 BORO VÁ - OLDŘÍŠ - CHODNÍKY**

Zkoušený materiál : hlínitopisčitá zemina

Místo zkoušky : CHODNÍK zhuťněná pláň km 0,520 osa


Podmínky zkoušky

Zatěžovací deska D mm : 300

Teploty: vzduch 26 °C

podklad 22 °C

Zkouška

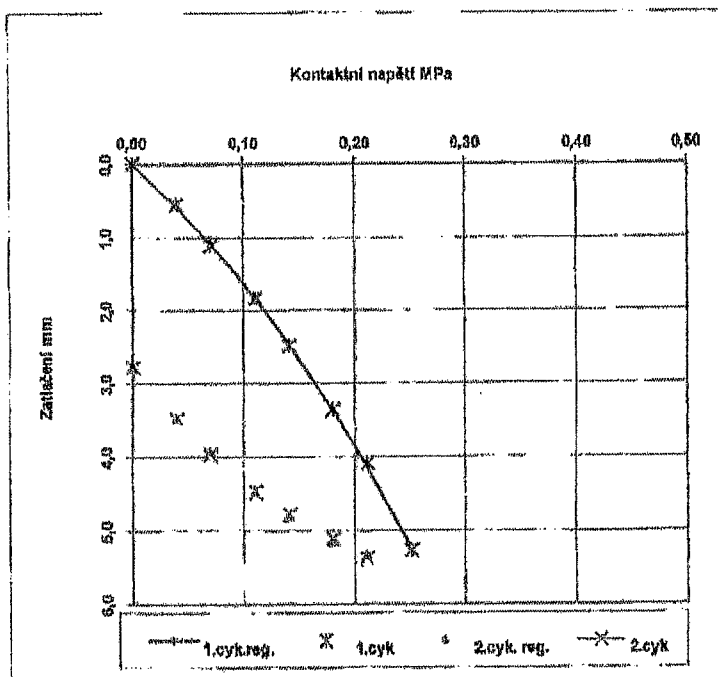

1. zatěžovací cyklus

	p MPa	y mm
1		
2	0,04	0,55
3	0,07	1,10
6	0,11	1,83
5	0,14	2,48
6	0,18	3,36
7	0,21	4,09
8	0,25	5,26

Odlehčení

	p MPa	y mm
9	0,14	4,94
10	0,07	4,66
11		2,77

2. zatěžovací cyklus

	p MPa	y mm
12		2,77
13	0,04	3,49
14	0,07	3,98
15	0,11	4,47
16	0,14	4,78
17	0,18	5,11
18	0,21	5,37

Výsledky zkoušky

	Hodnoty (MPa)
	požadované stanovené
E_{def1}	10,7
E_{def2}	min. 30 15,6
E_{def2} / E_{def1}	max. 2,5 1,73

Výsledek zkoušky nesplňuje požadovaná kritéria

Hodnoty regresního výpočtu	1. cyklus	2. cyklus
Konstanta	a_0 -0,005	2,785
Koeficienty	a_1 13,262	18,814
	a_2 30,711	-31,723

Údaje o zkoušce

Objednatel zkoušky: **SWIETELSKÝ stavební s.r.o.**

Zkoušel : **BELINA D.**

Schválil : **Ing. BELINA D.**

Protokol uzavřen : **15.08.22**

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ DB

Ing. Darius Belina

Král. vršek 56, 586 02 Jihlava

IČ: 47832851 DIČ: CZ5903012555

Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře
Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty

PROTOKOL Č. DB22-552
Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006 - příloha A

list 1/1

Zkoušeno dne: 15.08.22

Stavba: **REKONSTRUKCE SILNICE III/35724 BOROVÁ - OLDŘÍŠ - CHODNÍKY**

Zkoušený materiál: hlinitopísčité zemina

Místo zkoušky: CHODNÍK zhutněná pláň km 0,280 osa


Podmínky zkoušky

Zatěžovací deska D mm: 300

Teploty: vzduch 26 °C

podklad 22 °C

Zkouška

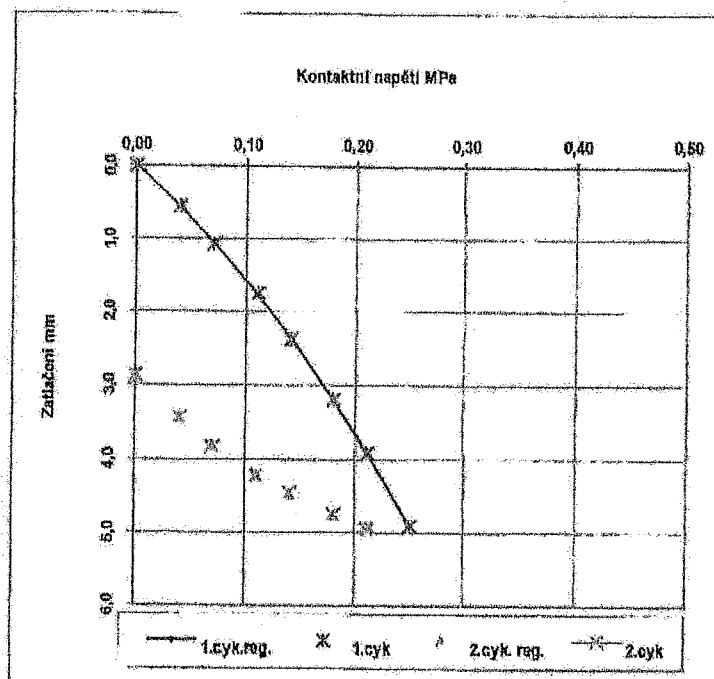

1. zatěžovací cyklus

	p MPa	y mm
1		
2	0,04	0,55
3	0,07	1,07
4	0,11	1,74
5	0,14	2,38
6	0,18	3,20
7	0,21	3,91
8	0,25	4,90

Odlahčení

9	0,14	4,77
10	0,07	4,47
11		2,87

2. zatěžovací cyklus

12		2,87
13	0,04	3,45
14	0,07	3,84
15	0,11	4,23
16	0,14	4,46
17	0,18	4,74
18	0,21	4,96

Výsledky zkoušky

	Hodnoty (MPa)	
	požadované	stanovené
E_{def1}		11,4
E_{def2}	min. 30	23,3
E_{def2} / E_{def1}	max. 2,5	2,04

Výsledky zkoušky nesplňují požadovaná kritéria

Hodnoty regresního výpočtu	1. cyklus	2. cyklus
Konstanta	a_0 -0,023	2,886
Koeficienty	a_1 13,588	14,924
	a_2 24,402	-24,926

Údaje o zkoušce

Objednatel zkoušky: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Zkoušel: **BELINA D.**

Schválil: **Ing. BELINA D.**


Protokol uzavřen: **15.08.22**

Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře
Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty


ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ DB
Ing. Darius Belina

Král. v
IČ: 470222222, DIČ: CZ5803012555

VZOR 1:50



— VZOR —
— 1:50 —



SPONSAČI ROVINA
m. n. m.

VÝPIS Z USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Borová konaného dne 14.12.2022

Usnesení č. 107

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Borová – VO SO 401 a chodník SO 103 podél silnice III/35724“ uzavřenou mezi SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599 a Obcí Borová, kde předmětem dodatku jsou vícepráce dle položkového rozpisu, který je přílohou tohoto dodatku.

Hlasování: pro: 13 (přítomno 13 z 15 členů zastupitelstva obce)
proti: 0
zdrželo se: 0

Usnesení bylo schváleno.

V Borové dne 30.12.2022

Za správnost výpisu:

Mgr. Lenka Tlustá
starostka

OBEC BOROVÁ

539 82 Borová č.p. 100
IČO - 00276430, tel. 461 743 268
e-mail: obec@borova.cz
www.borova.cz
