SCHODIŠTĚ SCH01 – ŘEZ A-A
M1:50

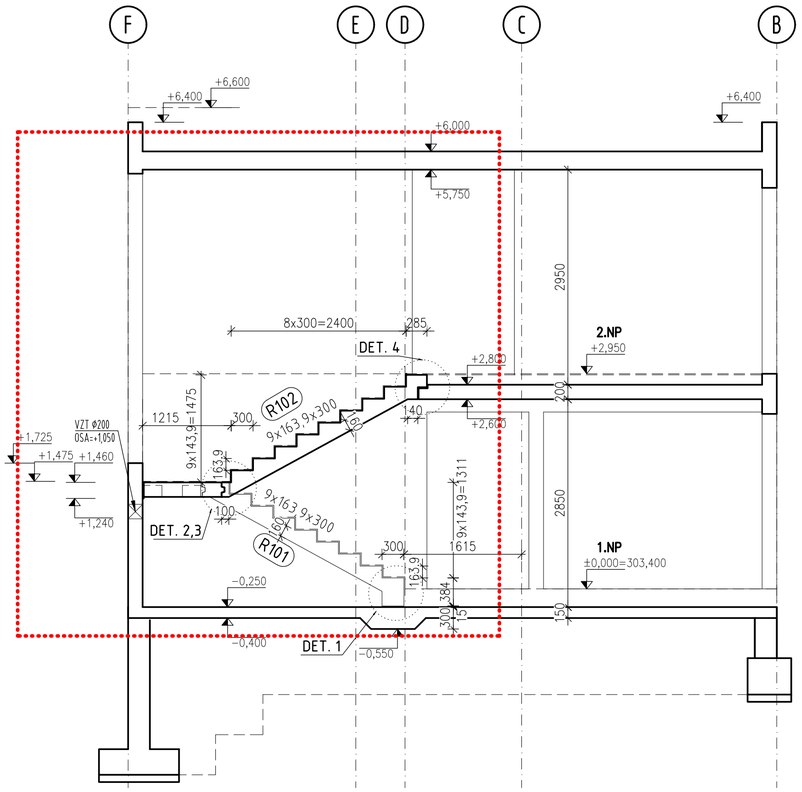

STROP NAD 1.NP–TVAR
M1:50

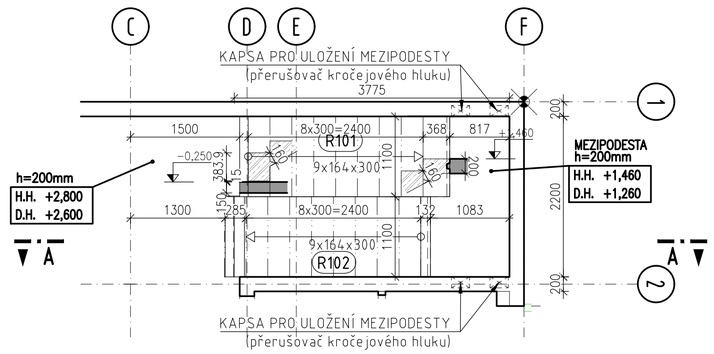

DETAIL 1
ULOŽENÍ RAMENE NA ZÁKLADOVOU DESKU
M 1:25

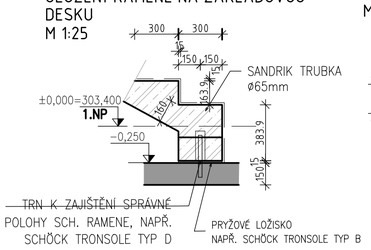

DETAIL 2
DETAIL RAMENE A MEZIPODESTY
M 1:25



DETAIL 3
DETAIL RAMENE A MEZIPODESTY
M 1:25



DETAIL 4
DETAIL RAMENE A PODESTY
M 1:25



BETON DLE ČSN EN 206-1
FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI DLE ČSN EN 1992-1-1 (EUROKÓD 2)
(PEVNOST V TLAKU A TAHU, MODUL PRUŽNOSTI, SOUČINITELÉ SMRŠŤOVÁNÍ A DOTVAROVÁNÍ)

C25/30 – XC1 (F.1.1)
- Cl 0,4 - Dmax 22mm - S4
- Modul pružnosti Ecm=31 GPa podle ČSN ISO 1920-10
- MONOLITICKÉ MEZIPODESTY

C30/37 – XC1 (F.1.1)
- Cl 0,4 - Dmax 22mm - S4
- Modul pružnosti Ecm=33 GPa podle ČSN ISO 1920-10
- PREFABRIKOVANÁ RAMENA

VÝKAZ ZABETONOVANÝCH PRVKŮ

INDEX	POPIS	ÚNOSNOST	KS
T01	PRVEK PRO ZVUKOVOU IZOLACI PODESTY NAPŘ.TRONSOLE SCHÖCK TYP Z OSAZOVANÝ DO PREFABRIKOVANÉ MEZIPODESTY SE SCHODIŠŤOVÝM RAMENEM	V_{Rd}=40kN	4

VÝKAZ PREFABRIKÁTŮ

INDEX	OBJEM [m³]	VÁHA [kg]	VÝZTUŽ OZUBŮ	KS
R101	0,836	2090	ØR8/100	1
R102	0,808	2025	ØR8/100	1

LEGENDA
- ŽB PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE
- ŽB MONOLITICKÁ KONSTRUKCE V ŘEZU

SCHEMA VÝZTUŽE
R101,R102



CHARAKTERISTICKÉ ZATÍŽENÍ NA SCHODIŠTĚ
dle ČSN 1991-1-1 (bez vlastní hmotnosti):
proměnné kategorie A= 3,0kN/m2

VÝZTUŽ PREFA RAMEN JE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE PŘÍSLUŠNÉHO VÝROBCE.
FIRMA SKÁLA A VÍT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA KONTROLU NAVRŽENÉ VÝZTUŽE.

DETAIL
1:1
VŠECHNY POHLEDOVÉ HRANY ZKOSIT VIZ. DETAIL



POHLEDOVÝ BETON PB3 DLE TP ČBS 03 (2018)
Povrch viditelných betonových konstrukcí bude proveden v kvalitě vzájemně odsouhlasené mezi zhotovitelem a objednatelem.

Pohledový beton s úpravou U11 – viz. příloha v technické zprávě stavební části projektu.

POZNÁMKA:
- NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1
- PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM A GP.
- H.H. – HORNÍ HRANA, S.H. – SPODNÍ HRANA.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JSOU VÝKRESY TVARŮ PŘILEHLÝCH K-CÍ
- PREFA RAMENA SE ZMONOLITNÍ S DODATEČNĚ BETONOVANOU MEZIPODESTOU
- PRO PREFABRIKOVANÁ RAMENA JE NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KERAMICKÁ DLAŽBA NA LEPIDLO TL. 15mm (PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. STAVEBNÍ ČÁST)
- VŠECHNY HRANY PREFA. RAMEN KROMĚ HRAN STUPNŮ BUDOU ZKOSENY 10 MM
- PŘI PROVÁDĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE ČSN-EN-13670 - PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 3
- TŘÍDA OŠETŘOVÁNÍ 3
- GEOMETRICKÁ TOLERANCE TŘÍDA 1

PROJEKT JE VE SMYSLU § 2 AUTORSKÉHO ZÁKONA AUTORSKÝM DÍLEM. ÚDAJE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU DŮVĚRNÉ, OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE PŘEDMĚTEM OCHRANY OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ, OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OSOBNOSTNÍCH PRÁV A AUTORSKÝCH PRÁV. BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZHOTOVITELE PD JE ZAKÁZÁNO POUŽITÍ, KOPÍROVÁNÍ NEBO ŠÍŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VČETNĚ JEJÍCH PŘÍLOH, ZPŘÍSTUPNĚNÍ JEJÍHO OBSAHU NEBO POUŽITÍ PRO JINÝ NEŽ URČENÝ ÚČEL, A TO V JAKÉKOLI PODOBĚ (LISTINA, TECHNICKÝ VÝKRES, GRAF, HMOTNÝ VZOREK, ELEKTRONICKÁ DATA). ELEKTRONICKÁ DATA VE ZDROJOVÉ PODOBĚ (SOUBORY *.DWG, *.DOC, *.XLS APOD.) JSOU VÝHRADNÍM MAJETKEM ZHOTOVITELE A I V PŘÍPADĚ, ŽE JE ZHOTOVITEL POSKYTNE TŘETÍ OSOBĚ JAKO PODKLAD PRO JEHO ČINNOST, NESMÍ BÝT JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM DÁLE ŠÍŘENA.

±0,000 = 303,400 m n.m. (BpV)

ZMĚNY
ZL 01 – NOVOSTAVBA TECHNICKÝCH SLUŽEB

ZL01

OBLAST ZMĚN

INVESTOR
OBEC PRŮHONICE
KVĚTNOVÉ NÁMĚSTÍ 73, 252 43 PRŮHONICE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
A32
A 32, spol. s r.o. | V Štíhlách 2031/12 | 142 00 Praha 4 | T +420 222 322 422 | F +420 222 322 432 | IČ: 251 556 28 | www.a32.cz

NÁZEV AKCE
HASIČSKÁ ZBROJNICE PRŮHONICE
PRŮHONICE

ZPRACOVATEL ČÁSTI
Skála & Vít s r.o. | Opletalova 328 | 500 03 Hradec Králové | Tel: +420 495 515 365 | +420 604 230 286 | E-mail: projekt@skala-vit.cz

NÁZEV ČÁSTI
SO 01 - HASIČSKÁ ZBROJNICE
D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKT	HIP	PROJEKTANT ČÁSTI
ING. ARCH. IVAN KOLÁŘ	ING. MARTIN FOŘT	Ing. J.Štamberg Ing. P.Kubečková

OBSAH
SCHODIŠTĚ - SKLADBA

POČET FORMÁTŮ	MĚŘÍTKO	DATUM	Č. ZAKÁZKY	ČÁST	Č. PŘÍLOHY	Č. KOPIE
8 x A4	1 : 50	02/2025	12522160	D.1.2	104_01	

DRUH DOKUMENTACE
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
