



ROZŠÍŘENÍ ČOV V PELHŘIMOVĚ

CZ.1.02/1.1.00/08.02010

ZMĚNOVÝ LIST (ZL)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE <u>Sdružení firem s názvem:</u> „Sdružení rozšíření ČOV v Pelhřimově“ <u>Vedoucí člen sdružení:</u> Metrostav a.s. sídlo: Koželužská 2248 180 00 Praha 8 IČ: 00014915 DIČ: CZ 00014915 Smlouva o dílo ze dne: 12. 6. 2013	Číslo ZL: 5 Datum vydání ZL: 13.8.2014
Název změny: Rozšíření repase PS 03 – dodávka nového zařízení položky 03.02 - PS 03. Následující změny budou po projednání a odsouhlasení investorem začleněny formou dodatku k výše uvedené SOD	
Položka, popis: Pol. 03.02 – Výměna pohonu a převodovky, úprava spojky – rozšíření repase o výměnu míchacího soustrojí.	Zdůvodnění: Viz. samostatné vyjádření projektanta – příloha č. 1
Přílohy ZL: 1. Zdůvodnění změny projektantem 2. Popis změny v seznamu strojů a zařízení 3. Cenová nabídka na rozšíření repase zařízení. 4. Obecný výkaz výměr navržené změny 5. Fotodokumentace stávajícího stavu	Vliv na cenu stavební dodávky: Navýšení : 925.000 ,- Kč
Vyvolává změnu stavebního povolení: NE Dopady do celkového harmonogramu stavby: NE celkový počet dní: 0	
Podpis zástupce zhotovitele:  VHZ-DIS 3 Mírová 25, 618 00 Brno Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0649)	
Datum: _____	
Podpis zástupce projektanta: DUIS s.r.o. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno 	
Datum: _____	
Podpis zástupce mandátáře investora (TDI):  VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nápočtů 4 180 56 Praha 5 25-	
Datum: _____	
Podpis zástupce investora: _____	
Datum: _____	





DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 BRNO

projektové a inženýrské služby pro vodohospodářskou výstavbu

IČO: 47916311 DIČ: 290-47916311

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně,
oddíl C, vložka 10329



CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti potvrzuje pro firmu DUIS s.r.o. shodu systému řízení jakosti pro projektovou činnost v investiční výstavbě a pro související inženýrskou a expertní činnost s normou ČSN EN ISO 9001:2009

Metrostav a.s., Divize 6

Fibichova 939/4

586 01 Jihlava

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

Brně dne:

Va/38414

Ing.Vach

18.08.2014

☒ Věc:

ROZŠÍŘENÍ ČOV V PELHŘIMOVĚ

CZ.1.02/1.1.00/08.02010

Rozšíření repase PS03 – ZL05

Pol. 03.02 – výměna pohonu a převodovky; úprava spojky

Pro stanovení rozsahu repase položek strojního zařízení bylo vycházeno z hodnocení reálného stavu zařízení v době tvorby koncepce technologického procesu pro ČOV (dokumentace pro stavební povolení 08/2008). Vzhledem k tomu, že míchací zařízení je pevně spojeno se zařízením umístěným pod hladinou vody v nádrži III. stupně ČOV a vzhledem k tomu, že míchání je pro funkci III.stupně čištění zásadní tak tato nádrž na stávající čistírně nemohla být vyřazena z provozu rozsah repase byl stanoven dle všech dostupných a viditelných znaků. V průběhu prací v roce 2014 bylo možno nádrž odstavit z provozu a provést detailní rekognoskaci stavu pohonů a zhodnotit reálný stav strojů. Z tohoto posouzení vyplynulo, že životnost dalších částí zařízení byla již vyčerpána a technický stav se stal nevyhovujícím. Tato situace nemohla být tedy v průběhu prací na zadávací dokumentaci předpokládána. Výše uvedená změna má pozitivní vliv na kvalitu a užité vlastnosti ČOV.

S pozdravem,

CO: DUIS

DUIS s.r.o.

Projektové a inženýrské služby
Srbská 1546/21, 612 00 Brno

Ing. Antonín Vach

prokurista a vedoucí divize 01 projekce

Změnový list č.5 – Příloha 2: Popis změny v seznamu strojů a zařízení

Aktualizace rozsahu nutných repasí níže uvedených položek PS 03.

Nový text :

Pol. 03.02. Nabídka na rozšíření repase o výměnu míchacího soustrojí :

- Demontáž stávajících míchadel – 4 dvojice míchadel
- Demontáž pohonných jednotek míchadel – 4 ks
- Dodávka repasovaných míchadel materiál 1.4301/PP – 4 dvojice míchadel
- Dodávka nových ložisek
- Dodávka nového prostupového těsnění betonovou nádrží
- Montážní práce výše uvedeného zařízení
- Doprava zařízení
- Uvedení do provozu



VHZ-DIS, spol. s r.o., Mírová 25, 618 00 Brno
tel.: 548 129 011, fax: 548 129 044
e-mail: vhz-dis@vhz-dis.cz, http://www.vhz-dis.cz
IČO: 46961445, DIČ: CZ46961445
bank. spoj.: ČSOB – pobočka Brno, č. ú. 382332923/0300

Držitel certifikátu jakosti
ČSN EN ISO 9001:2000
ČSN EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:1999

váš dopis značky / ze dne:

naše značka:

vyřizuje:

v Brně dne:

Ing. Fabian

13/8/2014

věc: **ČOV Pelhřimov – repase zařízení.**

Předáváme Vám cenovou nabídku na :

Pol. 03.02. Nabídka na rozšíření repase o výměnu míchacího soustrojí :

- Demontáž stávajících míchadel – 4 dvojice míchadel
- Demontáž pohonných jednotek míchadel – 4 ks
- Dodávka repasovaných míchadel materiál 1.4301/PP – 4 dvojice míchadel
- Dodávka nových ložisek
- Dodávka nového prostupového těsnění betonovou nádrží
- Montážní práce výše uvedeného zařízení
- Oprava zařízení
- Uvedení do provozu

Cena rozšíření repase celkem : 925.000,- Kč za 4 sady

Cena za 1 sadu : 231.250,- Kč 1 sada = dvojice míchadel

Uvedené ceny zahrnují materiál, práci a dopravu. Ceny nezahrnují DPH.

Termín realizace dle vzájemné dohody.

Platnost nabídky do 30.10..2014.

S pozdravem

Ing. Libor Šebesta
Jednatel a ředitel společnosti
VHZ-DIS, spol. s r.o.
Mírová 25, 618 00 Brno



VHZ-DIS

3

Mírová 25, 618 00 Brno

Změnový list č.5 – Příloha 4 : Obecný výkaz výměr navržené změny

Aktualizace rozsahu nutných repasí níže uvedených položek PS 03.

Nový text :

Pol. 03.02. Nabídka na rozšíření repase o výměnu míchacího soustrojí :


- Demontáž stávajících míchadel – 4 dvojice míchadel
- Demontáž pohonných jednotek míchadel – 4 ks
- Dodávka repasovaných míchadel materiál 1.4301/PP – 4 dvojice míchadel
- Dodávka nových ložisek
- Dodávka nového prostupového těsnění betonovou nádrží
- Montážní práce výše uvedeného zařízení
- Doprava zařízení
- Uvedení do provozu

Cena rozšířené repase celkem : 925.000,- Kč za 4 sady


Cena za 1 sadu : 231.250,- Kč 1 sada = dvojice míchadel

Vliv na cenu : Navýšení 925.000,- Kč


Změnový list č.5 – Příloha 5 : Fotodokumentace

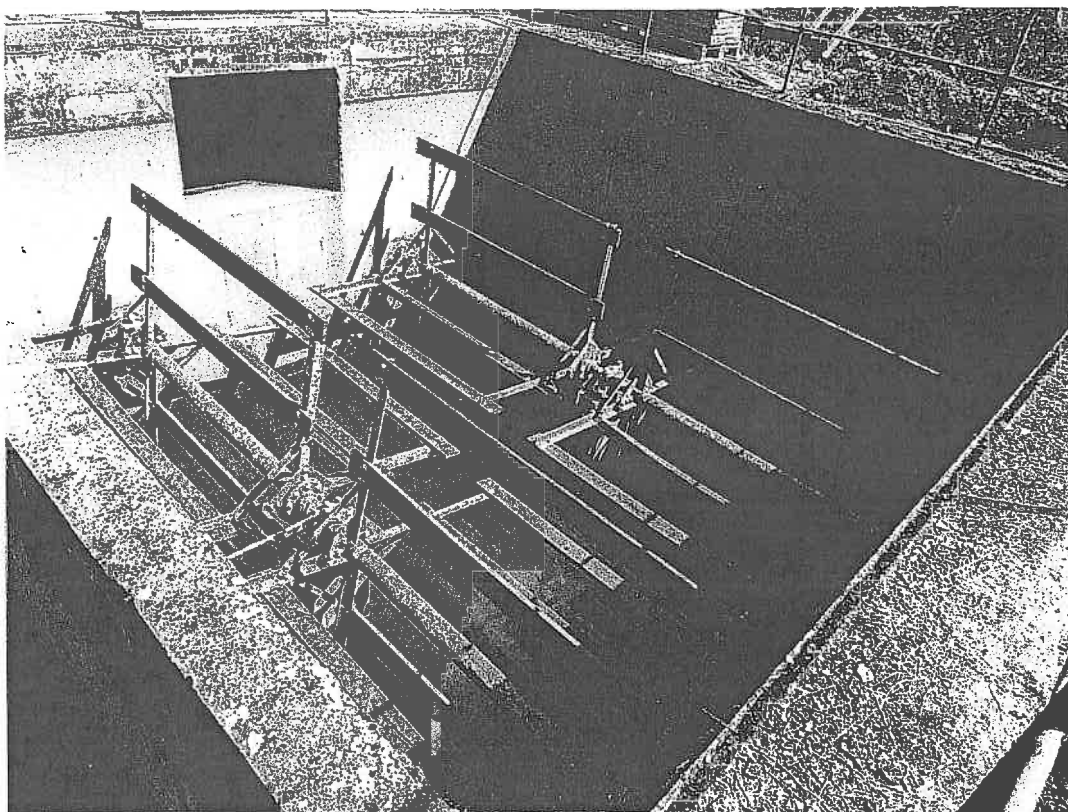

Stávající stav pomaluběžných míchadel v terciárním čištění.

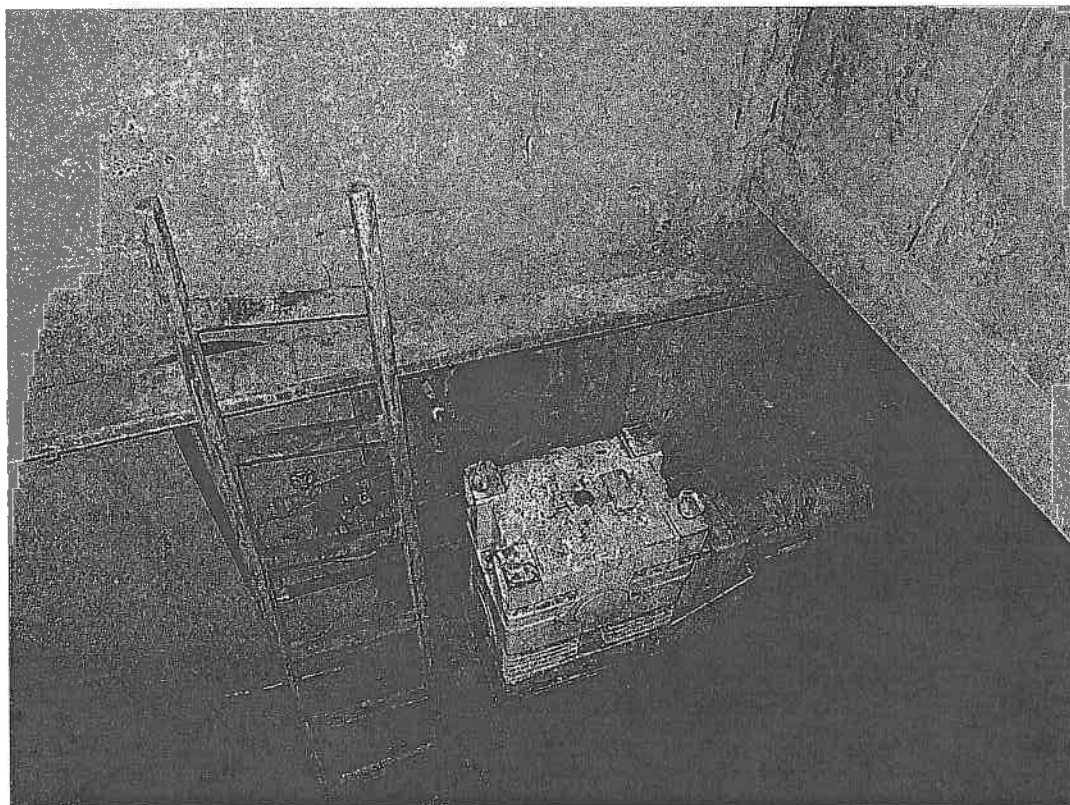

Stávající stav pohonné jednotky pomaluběžných míchadel .

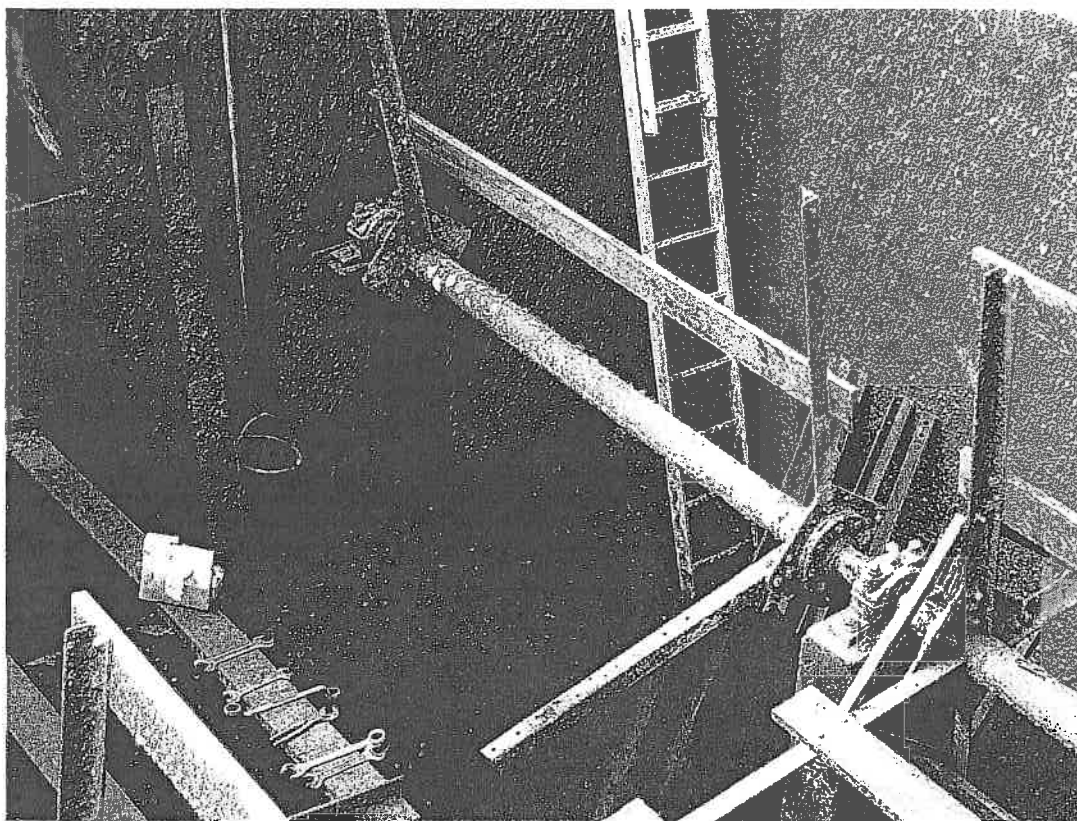

Pomaluběžná míchadla v terciárním čišťení – při poslední opravě.

