

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 0056110500022.02 (SPP 2956)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 201013301/1099/10/VHSaDS

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67
zastoupené Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
K podpisu tohoto dodatku smlouvy byl pověřen:
Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland N.V.
pobočka Brno, Hilleho 6, 602 00 Brno
Číslo účtu: 7510006666/5400
Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně oddíl B, vložka 1479
Zastoupená: Ing. Arne Žurkem, CSc., generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Josef Luňáček, technický ředitel
Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: účastníci „Sdružení RN Jeneweinova“

Vedoucí účastník sdružení: **IMOS Brno, a.s.**, Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zastoupený: Ing. Oldřichem Štercem, předsedou představenstva

IČ: 25 32 22 57

DIČ: CZ25322257

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

Účastník sdružení: **OHL ŽS, a.s.**, Burešova 938/17, 660 02 Brno

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Pacitem, ředitelem sekce Silnice a mosty závodu Dopravní stavby OHL
ŽS, a.s., na základě Plné moci ze dne 17.09.2010

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

Účastník sdružení: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**, Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČ: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Adresa pro doručování a fakturaci :

IMOS Brno, a.s, vedoucí účastník sdružení „Sdružení RN Jeneweinova“,

se sídlem : Olomoucká 174, 627 00 Brno

Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.: 2106024640/2700

IČ : 25322257

DIČ : CZ25322257

Telefon : 548 129 111, 532 173 111

Fax : 548 129 285, 532 173 285

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 6. 1. 2011 smlouvu o dílo s předmětem smlouvy: kompletní zhotovení stavby „**RN Jeneweinova a vodovod Komárov**“.

Vzhledem k četnému výskytu vod pod základovou konstrukcí nádrže, které nebylo možno předpokládat, a které vyvolaly potřebu dodatečných prací oproti původní smluvní dokumentaci a vzhledem potřebám objednatele zajistit plynulé financování díla se smluvní strany dohodly po proběhlém jednání řízení bez uveřejnění na následujících úpravách předmětu a ceny díla a dále na úpravě platebních podmínek a na to navazujících úpravách harmonogramů a dílčích termínů plnění.

Tímto dodatkem č. 2 k uvedené smlouvě se mění a doplňují níže uvedené články smlouvy a přílohy smlouvy následovně:

čl. II. Předmět smlouvy - v souladu s čl. IV, odst. 4 se text čl. II doplňuje následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce specifikované v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí dodatku č.2 smlouvy o dílo jako jeho příloha č. 2

čl. III. Čas plnění – text odst. 3 se nahrazuje novým textem, který zní:

Termíny dílčích plnění předmětu smlouvy (*díla*) :

- Retenční nádrž – dokončení betonáže stropu: do 656 kalendářních dnů od předání staveniště
- Vodovody – dokončení vodovodů a přípojek: do 706 kalendářních dnů od předání staveniště.

čl. IV. Cena díla - – text odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vychází z nabídkového rozpočtu zhotovitele a činí:

původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	483 724 500,- Kč
vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH	5 665 733,- Kč
cena dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	489 390 233,- Kč
DPH 20 %	97 878 047,- Kč
cena dle dodatku č. 2 celkem vč. DPH	587 268 280,- Kč

čl. V. Platební podmínky – na konci textu odst. 4 se doplňují dvě věty které zní:

Splatnost dílčích faktur vystavených za měsíce červenec až listopad 2011 se prodlužuje do 31.1.2012.
Splatnost dílčích faktur vystavených za měsíce únor až říjen 2012 se sjednává do 31.1.2013.

V návaznosti na zajištění financování předmětu díla a prodloužení doby splatnosti faktur se upravuje harmonogram postupu prací, který je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č.1, nový harmonogram je součástí dodatku č. 2 jako příloha č.1 a plně nahrazuje harmonogram, který byl přílohou smlouvy o dílo.

Účastníci sdružení na straně zhotovitele se svým podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo zavazují, že budou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou – realizací díla dle tohoto dodatku smlouvy, zavázáni společně a nerozdílně a to po celou dobu plnění veřejné zakázky – realizace díla i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky – realizace díla.

Účastníci sdružení se zavazují, že jejich společná a nerozdílná odpovědnost bude trvat po celou dobu plnění závazku založeného tímto dodatkem ke smlouvě o dílo uzavřeném na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky až do vypořádání všech nároků objednatele a třetích osob, a že jejich vzájemná práva a povinnosti spojené s realizací předmětu díla dle tohoto dodatku se řídí smlouvou o sdružení ze dne 23.9.2010.

Všechna ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo byl vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a tři zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Přílohy:	č.1	harmonogram postupu prací	1xA4
	č.2	položkový rozpočet	3xA4

Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/049 dne 14. 12. 2011.

V Brně dne 27-12- 2011
Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 29.12.2011
Za zhotovitele:

IMOS® IMOS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Štercl

předseda představenstva a generální ředitel




za IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva


OHL ŽS

410

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno - střed
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



za OHL ŽS, a.s.
Ing. Jaroslav Paclt
ředitel sekce Silnice a mosty



za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva


firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 * 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 * DIČ: CZ25317628

Harmonogram postupu prací RN Jeneweinova a vodovod Komárov



STAVEBNÍ NÁKLADY		Termín zahájení	Termín dokončení	poč. měs.
D. 01	Vodovodní přípojky řadu A „A1,A2 + ŘADY	1.3.2012	20.12.2012	9,8
D. 02	Nová vodovodní přípojka pro RN Jeneweinova	27.6.2012	16.8.2012	1,7
D. 03	Řad A3	17.7.2012	17.9.2012	2,1
D. 04	Vodovodní přípojky řadu A 3	27.7.2012	1.10.2012	2,2
D. 01	Retenční nádrž	1.4.2011	27.12.2012	21,2
	Zakládání RN	1.4.2011	27.12.2011	9,0
	Retenční nádrž MONOLITY	2.1.2012	31.10.2012	10,1
	Domek obsluhy	2.8.2012	29.3.2013	8,0
D. 02	Odlehčení na kmenové stoce B	1.3.2012	30.4.2013	14,2
D. 03	Propojovací objekty	1.3.2012	15.10.2012	7,6
D. 04	Kanalizační přípojka	13.7.2012	27.8.2012	1,5
D. 05	Vodovodní přípojka	14.5.2012	27.7.2012	2,5
D. 06	Shybka pod stokou Komárovské nábreží	13.7.2012	14.1.2013	6,2
D. 11	Stavební elektroinstalace	27.9.2012	27.12.2012	3,0
D. 12	Větrání	27.12.2012	29.3.2013	3,1
D. 14	Obslužná komunikace	29.3.2011	27.5.2013	26,3
D. 15	Oplocení	26.4.2013	26.6.2013	2,0
D. 16	Zabezpečení objektů	1.1.2013	1.5.2013	4,0
D. 17	Sadové úpravy	26.4.2013	26.6.2013	2,0
D. 18	Napojení VN	15.10.2012	14.1.2013	3,0
D. 20	Přeložka sdělovacích kabelů ČD Telematika	15.5.2011	31.5.2011	0,5
D. 21	Přeložka sdělovacích kabelů O2 Telefonika	15.5.2011	28.2.2013	21,8
D. 22	Přeložka sdělovacích kabelů GTS Novera	15.5.2011	31.5.2011	0,5
D. 23	Přeložka sdělovacích kabelů MAXPROGRES	15.5.2011	31.5.2011	0,5
D. 24	Přeložka sdělovacích kabelů EON	15.5.2011	31.5.2011	0,5
D. 25	Příprava území demolice	1.3.2011	31.3.2011	1,0
D. 26	Příprava území - kácení zeleně	1.3.2011	31.3.2012	13,2
E 01.1	Technologická část strojní	22.5.2012	22.4.2013	11,2
E 01.2	Technologická část- elektro -motorové rozvody	13.12.2012	12.7.2013	7,0
E 01.3	Technologická část měření a regulace, přenos dat	14.1.2013	12.7.2013	6,0
E 01.4	Rozvodna VN	13.12.2012	12.7.2013	7,0

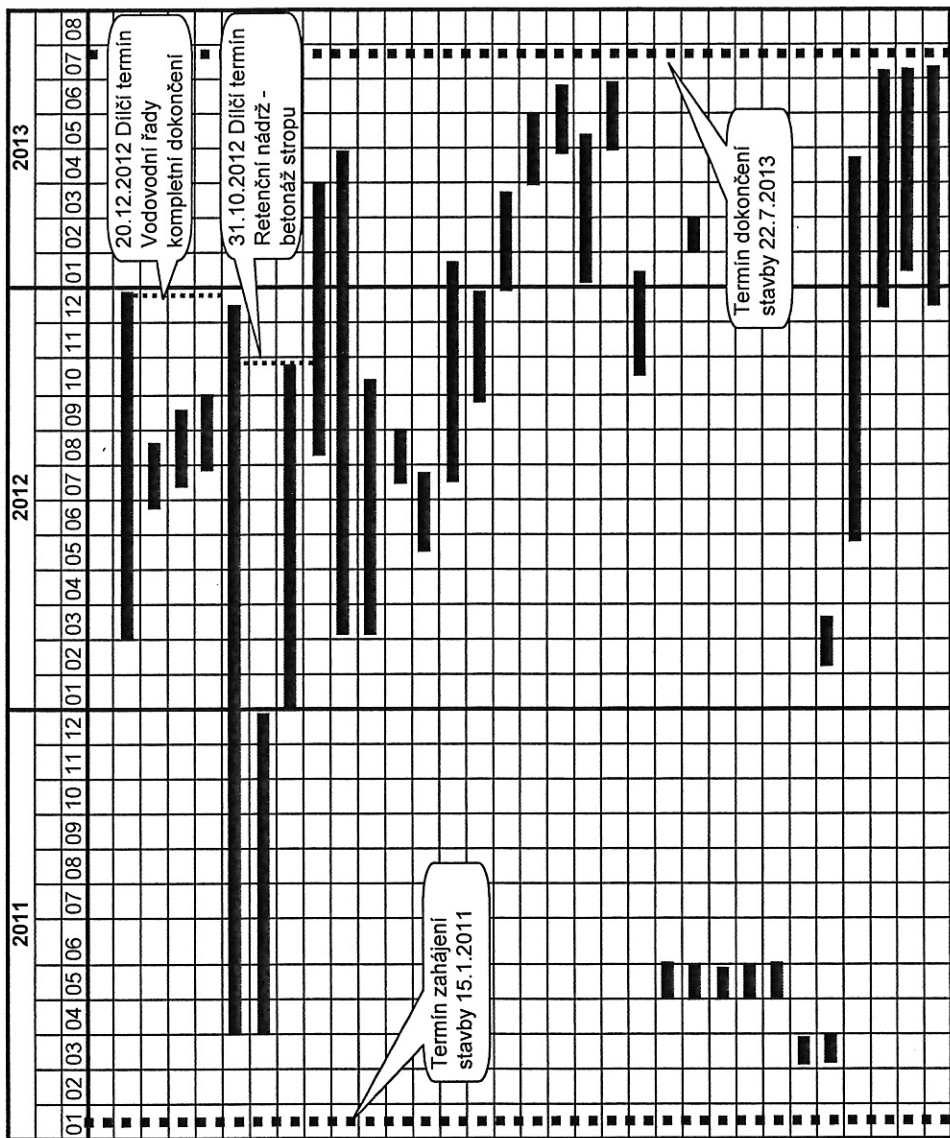

Datum: 2.12.2011

za sdružení "Sdružení RN Jeneweinova"
vedoucí výstavby
Josef Kalus

Položkový rozpočet víceprací

Rozpočet	D.01.2.1d1	RN-zakládání-trysková injektáž pod	JKSO	
Objekt			SKP	
D.01	SO 06-27-30.1	Retenční nádrž	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
7499/3041	RN Jenewainova a vodovod Komárov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	5 665 733	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	5 665 733	Zařízení staveniště		0
		Provozní vlivy		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	5 665 733	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 665 733	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	20,0 %		5 665 733 Kč	
DPH	20,0 %		1 133 147 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 798 880 Kč	

Poznámka :

Příloha č. 2, str. 2

Stavba :	7499/3041 RN Jenewainova a vodovod Komárov	Rozpočet : D.01.2.1d1
Objekt :	D.01 SO 06-27-30.1 Retenční nádrž	RN-zakládání-trysková injektáž pod dnem

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Zakládání	5 665 733	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 665 733	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provozní vlivy			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet víceprací

Stavba :	7499/3041 RN Jenewainova a vodovod Komárov	Rozpočet: D.01.2.1d1
Objekt :	D.01 SO 06-27-30.1 Retenční nádrž	RN-zakládání-trysková injektáž pod dnem RN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Zakládání				
4	262203472	Vrty pro injektáž svislé povrchové D do 195 mm hl do 25 m hor. II	m	654,18	1 229,00	803 987,22
6	282612111	Trysková injektáž vzestupná z povrchu území tlakem do 100 MPa	m	654,18	4 918,00	3 217 257,24
7	281611117	Dodání hmot pro injektování nízkotlaké - cement struskoportlandský SPC 325	t	314,67	5 226,00	1 644 488,54
	Celkem za	2 Zakládání				5 665 733,00
