

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 11.01.2024 na zhotovení díla

Kanalizace a ČOV II. etapa**Obec Malšovice**

se sídlem: Malšovice 6, 40502, okr. Děčín

IČO: 00261548

bankovní spojení: 6027431/0100

ID datové schránky: scya9wq

zastoupené ve věcech smluvních: Jiří Krpálek, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

„SDR Malšovice POHL-TEL“

se sídlem: Na Pomezí 2483, 25263 Roztoky

firem

1) POHL cz, a.s.

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 4943

bankovní spojení: 117569233/0300

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Rafael Moreno, člen představenstva

zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Masár, vedoucí výroby

2) TELKONT s.r.o.

se sídlem: U pivovaru 136, Trnovany, 41501 Teplice

IČ: 25467069

DIČ: CZ25467069

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 19503

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

I.

Smluvní strany se na základě změn (rozšíření dvou otvorů ve stropní konstrukci s osazením nerezových rámu a nerezových poklopů o rozměru v objektu ČOV-požadavek investora; přesun potrubních rozvodů dmychadel a rozšíření řídící místnosti uvnitř objektu ČOV-požadavek investora; zkapacitnění el. přípojky ČOV nad rámec stávajícího výkazu výměr; geodetické práce z důvodu přeložky dešťové kanalizace stoky A; doplnění dvou frekvenčních měničů el. rozvodů ČSOV 2+dodání většího pilíře (rozvodnice)-požadavek investora; vypuštění položek rozpočtu - 61 K 894200011, 62 K 894200012, 63 K 894200013 v rámci realizace SO 04.1 – přípojky-požadavek investora) dohodly na změně v článku V. „Cena za dílo, platební podmínky“ smlouvy takto:

Vícepráce: +340815,05 Kč bez DPH

Méněpráce: - 660936 Kč bez DPH

Celkem - 320120,95 Kč bez DPH

změna sjednané ceny díla:

69003523,68 Kč bez DPH

II.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Malšovice dne 25.06.2025 usnesením č. 25/85/1286.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy – změnové listy č. 6, 7, 8, 9, 10, 11.

V Malšovicích, dne 26.06.2025

V Roztokách, dne2025


.....
Obec Malšovice
Jiří Krpálek


.....
SDR Malšovice POHL-TEL
Ing. Rafael Moreno



POHL cz, a. s.
Na Pomezí 2483
252 63 Roztoky
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
+420 233 089 411
roztoky@pohl.cz



-53-

Změnový list

NÁVRH ZMĚNY ZL6				číslo: 06/2025							
Zhotovitel:		SDR Malšovice POHL-TEL									
Objednatel: Obec Malšovice				Datum: 12.05.2025							
Název akce: Malšovice – Kanalizace a ČOV II. etapa											
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem: 12.05.2025	Faxem:	osobně							
Odkazy: na elektronický stavební deník, specifikaci:		Stavební deník									
na výkresy:											
na rozpočtové podklady:		Nabídkový rozpočet									
na jinou část smlouvy:											
Popis a zdůvodnění změny: Rozšíření dvou otvorů ve stropní konstrukci s osazením nerezových rámců a nerezových poklopů o rozměru 1000x1000 mm.											
Ocenění změny: <table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>72.700,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0.00,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Celkem méněpráce x vícepráce:</td> <td>72.700,- Kč bez DPH</td> </tr> </table>						Vícepráce:	72.700,- Kč bez DPH	Méněpráce:	0.00,- Kč bez DPH	Celkem méněpráce x vícepráce:	72.700,- Kč bez DPH
Vícepráce:	72.700,- Kč bez DPH										
Méněpráce:	0.00,- Kč bez DPH										
Celkem méněpráce x vícepráce:	72.700,- Kč bez DPH										
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůta dokončení díla:								
69.396.344,63,- Kč bez DPH			N/A								
Charakter změny: Rozšíření dvou otvorů ve stropní konstrukci s osazením nerezových rámců a nerezových poklopů o rozměru 1000x1000 mm.											
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1											
Zástupce zhotovitel: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.											
Podpis:			Datum: 12.05.2025								

2a TAS dne 12.5.2025

Rozšíření otvorů ve stropní desce s osazením poklopů

Varianta - nerez						
Popis		MJ	Množství		Jednotková cena	Celkem
Stavební úpravy		1Kpl	2		8000	16 000,00
Poklop + rám 1000x1000		Ks	2		28350	56 700,00
					Celkem	72 700,00



Změnový list

NÁVRH ZMĚNY ZL7				číslo: 07/2025	
Zhotovitel:		SDR Malšovice POHL-TEL			
Objednatel: Obec Malšovice			Datum: 12.05.2025		
Název akce: Malšovice – Kanalizace a ČOV II. etapa					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem: 12.05.2025	Faxem:	osobně
Odkazy: na elektronický stavební deník, specifikaci:		Stavební deník			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Nabídkový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o provizorní přesun potrubních rozvodů dmychadel nad rámec projektové dokumentace a výkazu výměr z důvodu nutného rozšíření řídicí místnosti uvnitř objektu ČOV.					
Ocenění změny:					
Vícepráce:				43.986,- Kč bez DPH	
Méněpráce:				0.00,- Kč bez DPH	
Celkem méněpráce x vícepráce:				43.986,- Kč bez DPH	
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůta dokončení díla:		
69.440.330,63,- Kč bez DPH			N/A		
Charakter změny: Jedná se o provizorní přesun potrubních rozvodů dmychadel nad rámec projektové dokumentace a výkazu výměr z důvodu nutného rozšíření řídicí místnosti uvnitř objektu ČOV.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitel: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis:			Datum: 12.05.2025		

za TSD dne 26.5.2025

Změnový list

NÁVRH ZMĚNY ZL8				číslo: 08/2025	
Zhotovitel:		SDR Malšovice POHL-TEL			
Objednatel: Obec Malšovice			Datum: 12.05.2025		
Název akce: Malšovice – Kanalizace a ČOV II. etapa					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem: 12.05.2025	Faxem:	osobně
Odkazy: na elektronický stavební deník, specifikaci:		Stavební deník			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Nabídkový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Rozšíření prostor řídicí místnosti uvnitř objektu ČOV na žádost investora.					
Ocenění změny:					
Vícepráce:				45.206,29,- Kč bez DPH	
Méněpráce:				0.00,- Kč bez DPH	
Celkem méněpráce x vícepráce:				45.206,29,- Kč bez DPH	
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůta dokončení díla:		
69.485.536,92,- Kč bez DPH			N/A		
Charakter změny: Rozšíření prostor řídicí místnosti uvnitř objektu ČOV na žádost investora.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitel: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis:			Datum: 12.05.2025		

2a TAS dne 26.5.2025

Náklady soupisu celkem

45 206,29

36 467,26

11 642,67

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce

D	HSV									
D	3									
1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	6,371	765,00	4 873,82	CS ÚRS	2025 01	
	VV		2,500*3,100-(0,700*1,970)		6,371					
2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	5,425	1 050,00	5 696,25	CS ÚRS	2025 01	
	VV		1,750*3,100		5,425					
3	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	6,200	173,00	1 072,60	CS ÚRS	2025 01	
	VV		3,100*2		6,200					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 199,29			
4	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do trelu	m2	25,778	296,00	7 630,29	CS ÚRS	2025 01	
	VV		(1,750*3,100)+(2,500*3,100)+(1,400*3,100)+(1,650*3,100)+(2,350*3,100)		29,915					
	VV		-(0,700*1,970)*3		-4,137					
	VV		Součet		25,778					
5	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	569,00	569,00	CS ÚRS	2025 01	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 009,60			
6	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	CS ÚRS	2025 01	
7	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	3,000	263,00	789,00	CS ÚRS	2025 01	
8	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	CS ÚRS	2025 01	
9	K	962032254	Bourání zdiva z tvárnic betonových na jakoukoli maltu přes 1 m3	m3	1,180	1 170,00	1 380,60	CS ÚRS	2025 01	
	VV		(1,750*3,100)*0,100		0,543					
	VV		(2,500*3,100)*0,100		0,775					

VV
VV
-(-0,700*1,970)*0,100
Součet

-0,138
1,180

D 997 Doprava suť a vybouraných hmot

8 777,22

10	K	997013211	Vnitrostavební doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,451	998,00	2 446,10	CS ÚRS 2025 01
11	K	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,451	301,00	737,75	CS ÚRS 2025 01
12	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,360	2 190,00	5 168,40	CS ÚRS 2025 01
13	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,091	4 670,00	424,97	CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot

1 838,48

14	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,938	1 960,00	1 838,48	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	-------------------

D PSV Práce a dodávky PSV

5 343,03

D 763 Konstrukce suché výstavby

5 343,03

15	K	763131461	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,840	1 230,00	4 723,20	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------------------

VV
2,400*1,600

3,840
3,840

16 K 763164822 Demontáž SDK obkladu kovových kci opláštění dvojité

VV
1,800*1,600

2,880

16	K	763164822	Demontáž SDK obkladu kovových kci opláštění dvojité	m2	2,880	140,00	403,20	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------------------

17 K 998763331 Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m

0,087

17	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,087	2 490,00	216,63	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	-------------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

3 396,00

18	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	6,000	566,00	3 396,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	---------	-------------------------------------	-----	-------	--------	----------	-------------------

Změnový list


NÁVRH ZMĚNY ZL9				číslo: 09/2025							
Zhotovitel:		SDR Mašovice POHL-TEL									
Objednatel: Obec Mašovice				Datum: 12.05.2025							
Název akce: Mašovice – Kanalizace a ČOV II. etapa											
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem: 12.05.2025	Faxem:	osobně							
Odkazy: na elektronický stavební deník, specifikaci:		Stavební deník									
na výkresy:											
na rozpočtové podklady:		Nabídkový rozpočet									
na jinou část smlouvy:											
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o zkapacitnění přípojky ČOV. Nad rámec stávajícího výkazu výměr bude dodáno: Výměna jističe v RE 63A/3B Výměna pojistek v HDS, 80A PN000 Úprava elektroměrové rozvaděče, nová svorkovnice 35mm ² Přívod z elektroměrového rozvaděče do RM - CYKY 4Jx35mm ² +FeZn (celkem 36 m), ve výkazu výměr pouze 22 m Revize elektroměrové skříň RE (nutné pro zaplombování, nelze spojit s revizí ČOV)											
Ocenění změny: <table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>33.118,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0.00,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Celkem méněpráce x vícepráce:</td> <td>33.118,- Kč bez DPH</td> </tr> </table>						Vícepráce:	33.118,- Kč bez DPH	Méněpráce:	0.00,- Kč bez DPH	Celkem méněpráce x vícepráce:	33.118,- Kč bez DPH
Vícepráce:	33.118,- Kč bez DPH										
Méněpráce:	0.00,- Kč bez DPH										
Celkem méněpráce x vícepráce:	33.118,- Kč bez DPH										
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůta dokončení díla:								
69.518.654,92,- Kč bez DPH			N/A								
Charakter změny: Jedná se o zkapacitnění přípojky ČOV. Nad rámec stávajícího výkazu výměr bude dodáno: Výměna jističe v RE 63A/3B Výměna pojistek v HDS, 80A PN000 Úprava elektroměrové rozvaděče, nová svorkovnice 35mm ² Přívod z elektroměrového rozvaděče do RM - CYKY 4Jx35mm ² +FeZn (celkem 36 m), ve výkazu výměr pouze 22 m Revize elektroměrové skříň RE (nutné pro zaplombování, nelze spojit s revizí ČOV)											
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1											
Zástupce zhotovitel: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.											

Podpis:



Datum: 12.05.2025

2a TDS dne 26.5.2025



Změnový list

NÁVRH ZMĚNY ZL10				číslo: 10/2025							
Zhotovitel:		SDR Malšovice POHL-TEL									
Objednatel: Obec Malšovice				Datum: 22.05.2025							
Název akce: Malšovice – Kanalizace a ČOV II. etapa											
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem: 22.05.2025	Faxem:	osobně							
Odkazy: na elektronický stavební deník, specifikaci:		Stavební deník									
na výkresy:											
na rozpočtové podklady:		Nabídkový rozpočet									
na jinou část smlouvy:											
Popis a zdůvodnění změny: Geodetické práce – podklad pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby – Stoka A a přeložky stávající dešťové kanalizace.											
Ocenění změny: <table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>6.600,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Celkem méněpráce:</td> <td>0.00,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Celkem méněpráce x vícepráce:</td> <td>6.600,- Kč bez DPH</td> </tr> </table>						Vícepráce:	6.600,- Kč bez DPH	Celkem méněpráce:	0.00,- Kč bez DPH	Celkem méněpráce x vícepráce:	6.600,- Kč bez DPH
Vícepráce:	6.600,- Kč bez DPH										
Celkem méněpráce:	0.00,- Kč bez DPH										
Celkem méněpráce x vícepráce:	6.600,- Kč bez DPH										
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůta dokončení díla:								
69.525.254,92,- Kč bez DPH			N/A								
Charakter změny: Geodetické práce – podklad pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby – Stoka A a přeložky stávající dešťové kanalizace.											
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1											
Zástupce zhotovitel: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.											
Podpis: 				Datum: 22.05.2025							

20 TAS cluz 26.5.2025



Změnový list

ČOV Mašovice

Vícepráce - geodetické práce - podklad pro PD stoka
A a přeložka dešťové kanalizace

		Popis	množství		j.c. Kč	Celkem cena Kč
R	N	Geodetické práce	1	kpl	6600	6600
						6600

PROTOKOL O KONTROLNÍM ZAMĚŘENÍ, TECHNICKÁ ZPRÁVA

TELEFANT s.p.a.u. Přivazov 136 12.5.2025 4.9 12.5.2025

Kontrolní záznamy přelobkování linky o stávajícíhoškové koncovce
v rámci aktivy - telefonátu - koncovce o CDP katedra - 30 02 CDP

14.5.2025

Podleby po záznamu

Vzhledu kby přelobku


Pozor vzhledu kby H

Kontrolní záznam

Kontrolní záznam

Zaznamáná byla provedena metodou GMS R16, přístrojem Trilobita R16A,
výrobci čísla 542000054, s použitím transformátoru zadání zprávného globální transformace
Trilobita 2019 verze 10 achyleného CÚK po měření na L2038.

e.d.	souř.1	souř.2	výška	poznámka
329	550062.15	958718.21	140.77	otok ze stávající šachty
330	550062.15	958718.21	142.35	stávající šachta poklop
331	550062.15	958718.21	140.00	nový vyústění kanalizace do potoka
332	550048.23	958724.81	142.07	vstřek desky římsy
333	550048.23	958725.76	142.07	vstřek desky římsy
334	550048.23	958725.76	142.07	otvor pro bezpečnostní potrubí
335	550045.23	958727.31	140.85	otvor pro bezpečnostní přepad
336	550045.23	958727.31	142.07	vstřek desky římsy
337	550045.09	958726.15	142.07	vstřek desky římsy
338	550045.53	958725.78	142.07	vstřek desky římsy
339	550049.47	958727.42	142.06	otvor pro bezpečnostní potrubí
340	550047.86	958729.51	140.89	otvor pro výtlak kanalizace
341	550046.70	958727.96	142.06	otvor pro litinový poklop
342	550046.70	958727.96	142.06	otvor pro litinový poklop
343	550046.58	958727.06	142.06	otvor pro litinový poklop
344	550046.58	958727.06	142.06	otvor pro litinový poklop
345	550046.58	958727.06	142.06	otvor pro litinový poklop
346	550046.58	958727.14	142.07	otvor pro litinový poklop
347	550046.10	958728.03	142.06	otvor pro litinový poklop
348	550046.10	958727.90	142.06	otvor pro litinový poklop
349	550046.99	958727.00	142.06	otvor pro litinový poklop
350	550047.59	958726.92	142.06	otvor pro litinový poklop
351	550047.70	958727.81	142.06	otvor pro litinový poklop
352	550047.70	958727.81	142.06	otvor pro litinový poklop
353	550047.70	958727.81	142.06	otvor pro litinový poklop
354	550045.77	958726.74	142.07	otvor pro litinový poklop
355	550045.77	958726.74	142.07	otvor pro litinový poklop
356	550048.00	958725.34	142.07	otvor pro litinový poklop
357	550048.00	958730.57	140.36	potrubí výtlak kanalizace
358	550048.63	958732.58	140.36	potrubí výtlak kanalizace

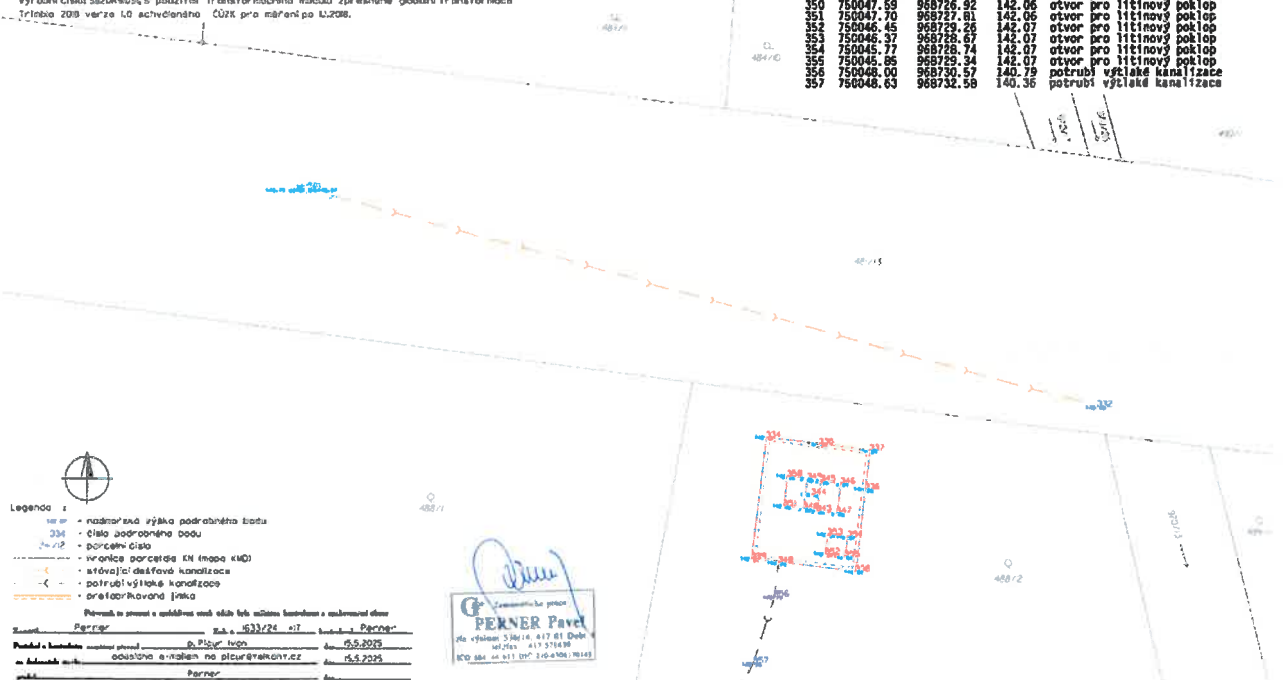

NÁVRH ZMĚNY ZL11				číslo: 11/2025							
Zhotovitel:		SDR Malšovice POHL-TEL									
Objednatel: Obec Malšovice				Datum: 04.06.2025							
Název akce: Malšovice – Kanalizace a ČOV II. etapa											
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem: 04.06.2025	Faxem:	osobně							
Odkazy: na elektronický stavební deník, specifikaci:		Stavební deník									
na výkresy:											
na rozpočtové podklady:		Nabídkový rozpočet									
na jinou část smlouvy:											
Popis a zdůvodnění změny: Ve zpracované projektové dokumentaci byly uvedeny informace o dodávce a montáži plastového pilíře o rozměrech 800x400x2000 mm. Ve výkazu výměr byly uvedeny informace o zděném pilíři z bílých cihel bez bližších rozměrů. Dle vzájemné domluvy byla zvolena varianta dodávky a montáže pilíře plastového o rozměru 1400x1970x320 mm s dostatečnou prostorovou kapacitou pro instalaci potřebného el. vybavení. Dále dle předchozích jednání s investorem budou dodány a instalovány 2 ks frekvenčních měničů dle domluvy s ČEZ Distribuce a.s.											
Ocenění změny: <table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>139.204.76,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Celkem méněpráce:</td> <td>- 37.537.90,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Celkem méněpráce x vícepráce:</td> <td>101.666,86,- Kč bez DPH</td> </tr> </table>						Vícepráce:	139.204.76,- Kč bez DPH	Celkem méněpráce:	- 37.537.90,- Kč bez DPH	Celkem méněpráce x vícepráce:	101.666,86,- Kč bez DPH
Vícepráce:	139.204.76,- Kč bez DPH										
Celkem méněpráce:	- 37.537.90,- Kč bez DPH										
Celkem méněpráce x vícepráce:	101.666,86,- Kč bez DPH										
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůta dokončení díla:								
69.626.921,78,- Kč bez DPH			N/A								
Charakter změny: Ve zpracované projektové dokumentaci byly uvedeny informace o dodávce a montáži plastového pilíře o rozměrech 800x400x2000 mm. Ve výkazu výměr byly uvedeny informace o zděném pilíři z bílých cihel bez bližších rozměrů. Dle vzájemné domluvy byla zvolena varianta dodávky a montáže pilíře plastového o rozměru 1400x1970x320 mm s dostatečnou prostorovou kapacitou pro instalaci potřebného el. vybavení. Dále dle předchozích jednání s investorem budou dodány a instalovány 2 ks frekvenčních měničů dle domluvy s ČEZ Distribuce a.s.											
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1											

Zástupce zhotovitel:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis:

**POHL cz, a. s.**

Na Pomezí 2483

252 63 Roztoky

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

+420 233 089 411

roztoky@pohl.cz

-30-

Datum: 18.06.2025

ČOV Malšovice**Vícepráce - elektro ČSOV 02 - PVC pílře ESTA a frekvenční měniče**

Vícepráce

	Popis	množství		j.c. Kč	Celkem cena Kč
N	Plastový pílř ESTA (1400x1970x320)	1	ks	51 764,76	51 764,76
N	Frekvenční měnič	2	ks	43 720,00	87 440,00
					139 204,76

Méněpráce

K02	Bet. základ do bednění s prostupy – chráničky 3x HDPE 90	m3	1,00	-10 725,10	-10 725,10
	Zděný pílř bílé cihly, otvory pro skříně, izolace, vnitřní dutiny, betonová stříška, oplechování	ks	1,00	-20 109,60	-20 109,60
K02	rozměry podle výkresu	ks	1,00	-6 703,20	-6 703,20
					-37 537,90

Celkem Vícepráce X méněpráce**101 666,86**

NÁVRH ZMĚNY ZL12				číslo: 12/2025							
Zhotovitel:		SDR Malšovice POHL-TEL									
Objednatel: Obec Malšovice				Datum: 18.06.2025							
Název akce: Malšovice – Kanalizace a ČOV II. etapa											
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem: 18.06.2025	Faxem:	osobně							
Odkazy: na elektronický stavební deník, specifikaci:		Stavební deník									
na výkresy:											
na rozpočtové podklady:		Nabídkový rozpočet									
na jinou část smlouvy:											
Popis a zdůvodnění změny: Na základě vznesené žádosti zástupce investora se nebudou práce na malé domovní čerpací stanice a výtlačku pro domovní ČS DN 50 PEHD PN 16 z části stavby SO 04.1 - přípojky provádět.											
Ocenění změny: <table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>0.00,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Celkem méněpráce:</td> <td>- 623.398,10,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Celkem méněpráce x vícepráce:</td> <td>- 623.398,10,- Kč bez DPH</td> </tr> </table>						Vícepráce:	0.00,- Kč bez DPH	Celkem méněpráce:	- 623.398,10,- Kč bez DPH	Celkem méněpráce x vícepráce:	- 623.398,10,- Kč bez DPH
Vícepráce:	0.00,- Kč bez DPH										
Celkem méněpráce:	- 623.398,10,- Kč bez DPH										
Celkem méněpráce x vícepráce:	- 623.398,10,- Kč bez DPH										
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůta dokončení díla:								
69.003.523,68,- Kč bez DPH			N/A								
Charakter změny: Na základě vznesené žádosti zástupce investora se nebudou práce na malé domovní čerpací stanice a výtlačku pro domovní ČS DN 50 PEHD PN 16 z části stavby SO 04.1 - přípojky provádět.											
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1											
Zástupce zhotovitel: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.											
Podpis:				Datum: 18.06.2025							

2x 71251  9.7.2025

61	K	894200011	Malá domovní čerpací stanice - šachta vč. elektr. rozváděče DOD+MTŽ	kpl	2,00	40 219,20	80 438,40
62	K	894200012	MTŽ domovní ČS vč. výkopu a stavebních prací	kpl	2,00	20 109,60	40 219,20
63	K	894200013	výtlač pro domovní ČS DN 50 PEHD PN 16 (vč. zemních prací) - 44,5+62,5 m	kpl	1,00	502 740,50	502 740,50
