



Dodatek č 1 smlouvy o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Obec Chleby
sídlo: Průběžná 100, 28901 Bobnice
IČ: 00876071
zastoupen: Filipem Michlem, starostou obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 36920191, kód banky: 0100

– dále jen jako „objednatel“ –

a

- 1.2. **Zhotovitel:** StavoSport s.r.o.
sídlo: Přehradní 233, 763 16 Fryšták
IČ: 292 78 481
DIČ: CZ29278481
zastoupen: Marek Šmach
bankovní spojení: ČS
č.ú.: 5442205399, kód banky: 0800
doručovací adresa: Přehradní 233, 763 16 Fryšták

– dále jen jako „zhotovitel“ –

– společně dále jako „smluvní strany“ –

Dodatek smlouvy je vyhotoven z důvodu karanténních opatření souvisejících s epidemií nemoci COVID19 a pro nepříznivé klimatické podmínky mající vliv na kvalitu prováděných prací v souladu článku VI, bodu 6.2.3.1., 6.2.3.2. a 6.2.3.3

Níže uvedeným se mění body ve smlouvě o dílo ze dne

Článek VI. Doba plnění

6.1. **Termíny plnění předmětu smlouvy:**

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

- c) **termín dokončení díla:** do 5 měsíců od zahájení díla + dny kdy průměrná venkovní teplota klesla pod 5°C. dle dat veřejné meteorologické stanice (Poděbrady). Nejzazší termín dokončení k 31.5.2021.

Článek VIII. Cena za splnění předmětu smlouvy





Veřejná zakázka:

„Víceúčelové sportovní hřiště – místo aktivního odpočinku“



- 8.1. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla dle projektové dokumentace dle Přílohy č. 1 a položkového rozpočtu díla dle Přílohy č. 2, vyplývá z nabídkové ceny dle nabídky předložené zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného výběrového řízení a na základě změnového listu č.1 .
- 8.2. Tato celková cena za splnění předmětu této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvyšší přípustná, a to v následující výši:

Cena celkem bez DPH 1.176.590,99, - Kč

DPH 247.084,11- Kč

Cena celkem včetně DPH 1.423.675,10- Kč

(slovy: jedenmiliončtyřístadvacetřítisícšestsetšedesátpět korun českých deset haléřů)

(dále také jako „celková cena“)

Ostatní ujednání smlouvy se nemění

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Grafy teplot stanice Poděbrady

Příloha č. 2 Změnový list č.1

Za zhotovitele:

Ve Fryštáku dne


StavoSport s.r.o.
Přehradní 233
763 16 Fryšták
IČ: 29278481 DIČ: CZ29278481
tel.: 777 691 740

Marek Šmach
Jednatel

Za objednatele:

V Chlebech dne 26. 4. 2021




Filip Michl,
starosta obce



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Veřejná zakázka:

„Víceúčelové sportovní hřiště – místo aktivního odpočinku“




Poděbrady

50.14°N / 15.12°E 170m. n. m.
(12 x 12 km)

2020-12-01 - 2020-12-31
31 denní

meteoblue

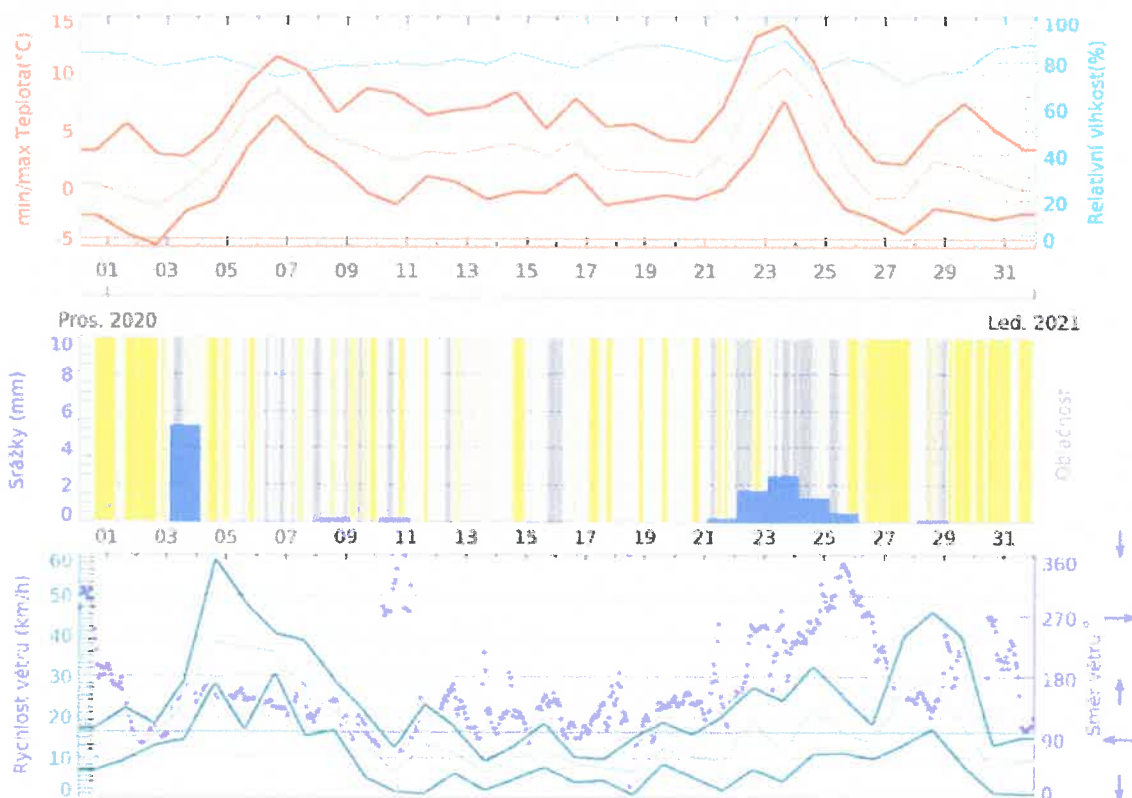


Poděbrady

50.14°N / 15.12°E 170m. n. m.
(12 x 12 km)

2021-01-01 - 2021-01-31
31 denní

meteoblue

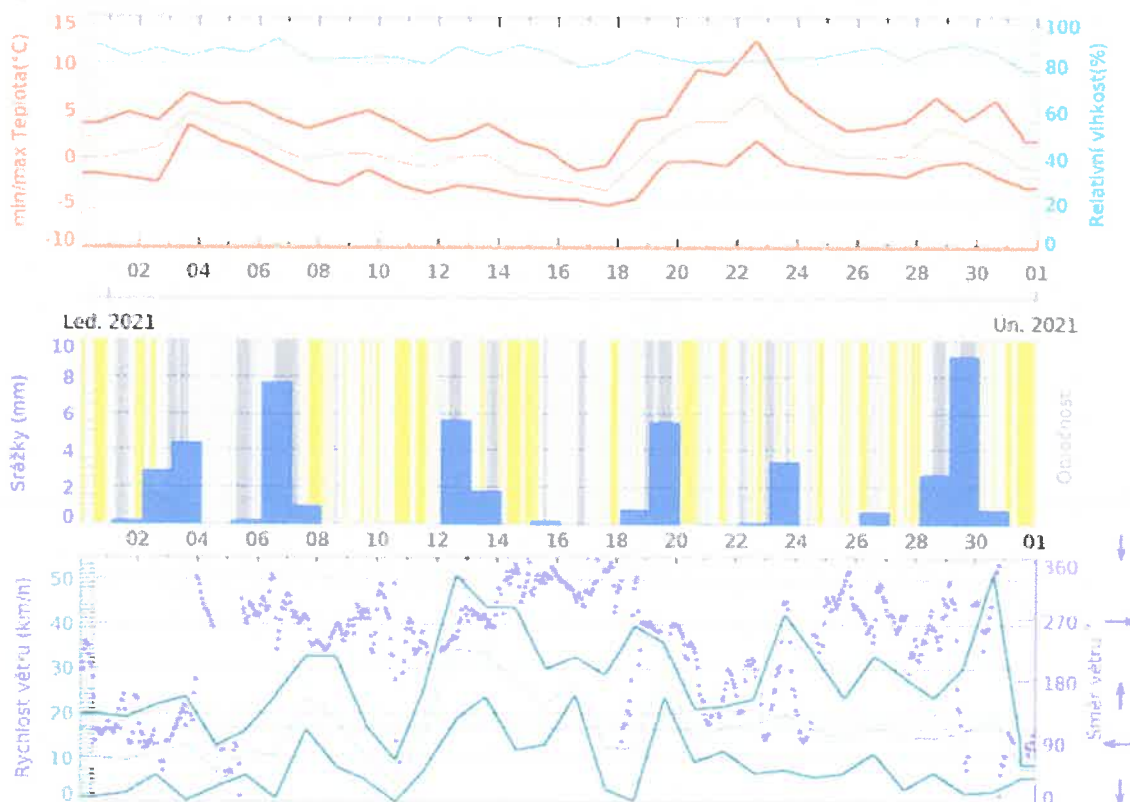

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Veřejná zakázka:

„Víceúčelové sportovní hřiště – místo aktivního odpočinku“




Poděbrady

50.14°N / 15.12°E 170m. n. m.
(12 x 12 km)

2021-02-01 - 2021-02-28

28 denní

meteoblue

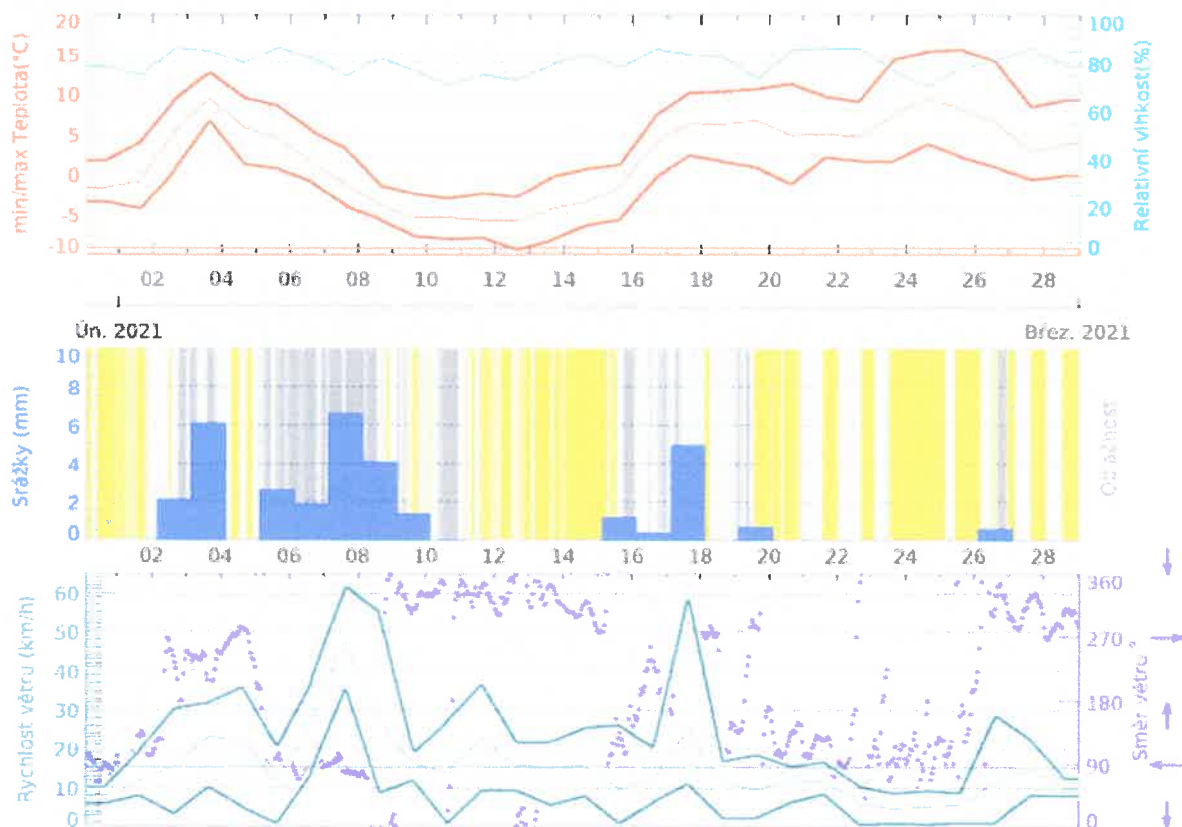


Poděbrady

50.14°N / 15.12°E 170m. n. m.
(12 x 12 km)

2021-02-27 - 2021-03-28

30 denní

meteoblue

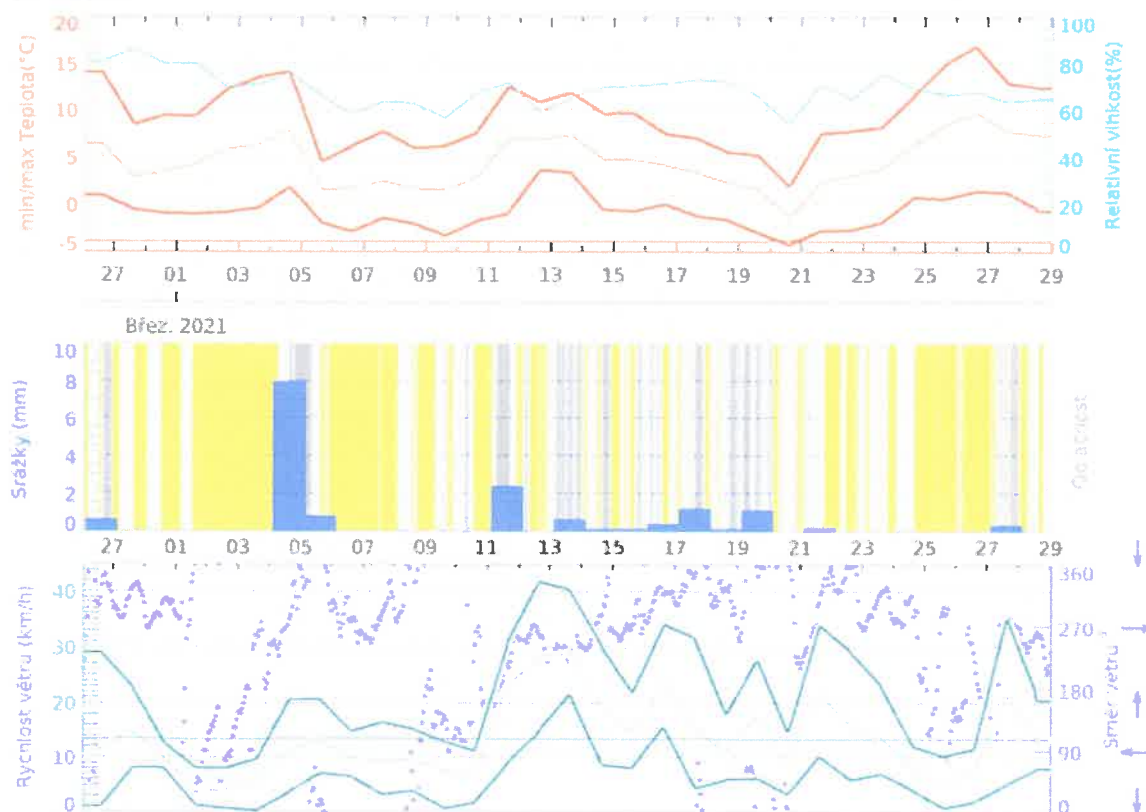

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list č.1 - ROZPOČET

Stavba:

Víceúčelové sportovní hřiště - místo aktivního odpočinku

Datum: 8.4.2021

Místo:

na pozemku parc.č.430/35 v obci a kat.ú. Chleby

Objednatel:

Obec Chleby, Průběžná 100, 289 31 Chleby

Zpracovatel: Šmach Marek

Zhotovitel:

StavoSport s.r.o., Přehradní 233, 763 16 Fryšták

Popis změny:

Změna nivelety po zaměření staveniště: Objednatel dále požaduje nerealizovat položku č.2 Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 z důvodu změny nivelety plochy hřiště po zaměření vůči okolnímu terénu. Celá položka č.2 bude odečtena.

Doplnění pláně

kamenivem: Na základě zaměření staveniště požaduje objednatel doplnění pláně kamenivem 0/63, tak aby plocha hřiště byla v rovině. Doplnění kameniva je provedeno položkou č.60

Doplnění ochranných sítí na podélných stranách hřiště: Objednatel požaduje doplnění ochranných sítí na podélných stranách hřiště tak, aby míče neodskakovaly při hře mimo sportoviště. Doplnění ochranných sítí postihuje změny v položkách č.4, č.11, č.15, č.16, č.17, č.19, č.20, č.21 a č.22.

Rozšíření zpevněných ploch: Objednatel požaduje rozšíření zpevněných ploch u vstupu na sportoviště a pod přístřeškem. Rozšíření zpevněných ploch postihuje změny v položkách č.28, č.34, č.35, č.36 a č.37.

Doplnění

sportovního vybavení o basketbalové koše: Objednatel požaduje doplnit víceúčelové hřiště o basketbalové koše, položka č.61

Změna ceny proti

nabídkovému rozpočtu:

Navýšení ceny o vícepráci ve výši 106.260,54-Kč bez DPH

P.č.		Typ	Kód	Popis	MJ	Rozpočet dle uzavřené SOD č.3/2020 ze dne 25.9.2020			Změnový list č.1		
						množství	J.cena [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	množství	J.cena [CZK]	Cena bez DPH [CZK]

Náklady z rozpočtu celkem

1 126 682,90 Kč

1 176 590,99 Kč

HSV - Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

778 503,05 Kč

65 456,40 Kč

828 411,14 Kč

50 602,24 Kč

1	K	121100001	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1km (32,00+0.50*2+1.00*2)*(15,00+0.50*2+1.00*2)*0.20 (2,00*2.00+2.00*5,00)*0.20	m3	128,80	125,00 Kč	128,80	125,00 Kč	125,00 Kč	16 100,00 Kč
					126,00		126,00			
					2,80		2,80			

2	K	122100010	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz, uložení na skládku, poplatek (16,00*33,00+2,00*5,00)*(0,33-0,20)	m3	69,94	260,00 Kč	18 184,40 Kč	0,00	260,00 Kč	- Kč
					69,94			69,94		

3	K	131100010	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4 naložení, odvoz, uložení na skládku, poplatek 2,00*2,00*(2,50-0,20)	m3	9,20	450,00 Kč	4 140,00 Kč	9,20	450,00 Kč	4 140,00 Kč
---	---	-----------	--	----	------	-----------	-------------	------	-----------	-------------

4	K	133100010	Hloubení šachet v hornině 1-4 naložení, odvoz, uložení na skládku, poplatek 0,15*0,15*3,14*1,2*20 0,10*0,10*3,14*0,80*12	m3	2,00	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč	4,22	1 500,00 Kč	6 330,24 Kč
					1,70			4,22		
					0,30			0,30		

5	K	132200010	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 60cm v hornině 1-4 naložení, odvoz, uložení na skládku, poplatek (32,50*2+8,00)*0,30*0,40	m3	8,76	450,00 Kč	3 942,00 Kč	8,76	450,00 Kč	3 942,00 Kč
					8,76			8,76		

6	K	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50m	m3	1,20	250,00 Kč	300,00 Kč	1,20	250,00 Kč	300,00 Kč
---	---	-----------	--	----	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

		2.00*2.00*(2.50-0.50)		1,20		1,20			
7	K	174100050	Zásyp jam, rýh a šachet šěrkortrí (Vsakovac jímka)	m3	8,00	250,00 Kč	2 000,00 Kč	8,00	250,00 Kč
		2.00*2.00*(2.50-0.50)		8,00				8,00	
8	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 16.00*33.00	m2	528,00	25,00 Kč	13 200,00 Kč	528,00	25,00 Kč
				102,00		45,00 Kč	4 590,00 Kč	102,00	45,00 Kč
9	K	181300012	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti do 1km, osetí travou	m2	4,00			4,00	
		2.00*2.00 (33.00*2)+(16.00*2)		98,00				98,00	
D 2 Základy a zvláštní zakládání									
10	K	272353102	Bednění kotev otvorů klenob do 0.01 m2, hl. 0.50 m	kus	32,00	25,00 Kč	800,00 Kč	32,00	25,00 Kč
11	K	275313611	Beton základových patek prostý C 16/20 (B20)	m3	2,20	3 500,00 Kč	7 700,00 Kč	5,72	3 500,00 Kč
D 21 Úprava podloží a základ.spáry									
12	K	212561111	Výplň odvodňovacích trativodů kamen. hrubé drcené 16mm (32.50*2+8.00)*(0.30*0.40-0.05*0.05*3.14)	m3	8,19	1 100,00 Kč	9 009,00 Kč	8,19	1 100,00 Kč
13	K	212755114	Trativody z drenážních trubek DN 10cm bez lože Trubka PVC-U drenážní flexibilní včetně tvarovek 32.5*2+8.00	m	73,00	200,00 Kč	14 600,00 Kč	73,00	200,00 Kč
				73,00				73,00	
14	K	289970113	Vrstva geotextilie 500g/m2 16.00*33.00 1.50*4*1.50+1.50*1.50*2	m2	541,50	50,00 Kč	27 075,00 Kč	541,50	50,00 Kč
				528,00				528,00	
				13,50				13,50	
D 3 Svěslé a kompletní konstrukce									
15	K	338171131	Osazení sloupků plot. ocelových do 5,0 m, zalitím MC Sloupky sítě:20 Vzpěra:6 Sloupky mantinel:22 Kotva pergola:6	kus	89,00	200,00 Kč	17 800,00 Kč	54,00	200,00 Kč
								370 682,00 Kč	
16	M	55346468.A	Sloupky ocelové d 78/3.6 mm, zinkované, poplast. H= 5.80m vč.držáků sítě	kus	20,00	3 500,00 Kč	70 000,00 Kč	40,00	2 850,00 Kč
17	M	55346469.A	Vzpěra ocelová d 78/3.6 mm, zinkovaná, poplast. H = 4.95m vč.kotevnicích a příchytých prvků	kus	6,00	2 500,00 Kč	15 000,00 Kč	8,00	1 800,00 Kč
18	M	003 00-0001	Kotva ocelová zinkovaná pro zabetonování, pro uchycení dř.hranolu 120*120	kus	6,00	500,00 Kč	3 000,00 Kč	6,00	500,00 Kč
19	K	767995101	Dodávka a montáž kovových atyp.konstrukcí do 6kg -kotevní desky tl. 3mm pro uchycení mantinelu, zinkováno 57*1.0*0.15*24	kg	205,20	120,00 Kč	24 624,00 Kč	151,20	120,00 Kč
				205,20				151,20	
20	K	762132135	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná, montáž mantinelu (32.00*1.05+15.00*1.05)*2	m2	95,50	450,00 Kč	42 975,00 Kč	92,40	450,00 Kč
				95,50				41 580,00 Kč	
21	M	60515804	Hranol konstrukční masivní KVH SI 40*180 mm (32*2*5*0.18*0.04+15*2*5*0.18*0.04)*1.06		3,59	12 500,00 Kč	44 875,00 Kč	3,36	12 500,00 Kč
				3,59				3,36	
22	K	783626200	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x 94.00*5*(0.18*2+0.04*2)	m2	206,80	120,00 Kč	24 816,00 Kč	193,60	120,00 Kč
				206,80				193,60	
								23 232,00 Kč	

23	K	003 00-0002	Dodávka a montáž polyamid. sítě pro oplocení 45/45/3 zelená, vč.karabin a napínacích lanek	m2	282,00	200,00 Kč	56 400,00 Kč	376,00	200,00 Kč	75 200,00 Kč
24	K	767920230	(32.00+15.00)*2*3.00		282,00			282,00		
25	M	55342605	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	2,00	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč	2,00	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
26	M	55342605	Vrátka ocelová h = 2000 mm š = 1000 mm	kus	1,00	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	1,00	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
27	K	998767101	Vrátka ocelová dvoukřídlá h = 2000 mm š = 2000 mm	kus	1,00	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	1,00	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce výšky do 6 m	t	2,90	1 500,00 Kč	4 350,00 Kč	2,90	1 500,00 Kč	4 350,00 Kč
D 5 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch										
28	K	564752115	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl.19 cm	m2	503,71	220,00 Kč	110 816,20 Kč	539,61	220,00 Kč	118 714,20 Kč
			(32.00-0.05*2)*(15.00-0.05*2)		475,31			475,31		
29	K	564811111	(2*5)+(2*2)+(16*0.9) pod zámkovou dlažbu	m2	28,40			64,30		
			Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm, tl. 5 cm	m2	475,31	55,00 Kč	26 142,05 Kč	475,31	55,00 Kč	26 142,05 Kč
30	K	564801112	(32.00-0.05*2)*(15.00-0.05*2)	m2	475,31			475,31		
			Podklad z kameniva drceného vel.4-8 mm, tl. 3 cm	m2	475,31	40,00 Kč	19 012,40 Kč	475,31	40,00 Kč	19 012,40 Kč
			(32.00-0.05*2)*(15.00-0.05*2)		475,31			475,31		
31	K	564801111	Podklad z kameniva drceného vel.0-4 mm tř.A-zakalení, tl. 3 cm, ruční zpracování	m2	475,31	100,00 Kč	47 531,00 Kč	475,31	100,00 Kč	47 531,00 Kč
			(32.00-0.05*2)*(15.00-0.05*2)		475,31			475,31		
32	K	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15cm	m2	28,40	185,00 Kč	5 254,00 Kč	28,40	185,00 Kč	5 254,00 Kč
			(2*5)+(2*2)+(16*0.9) pod zámkovou dlažbu		28,40			28,40		
33	K	998222012	Přesun hmot.zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	520,92	75,00 Kč	39 069,00 Kč	520,92	75,00 Kč	39 069,00 Kč
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce										
34	K	631571005	Násyp z kameniva těž. Praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	14,09	900,00 Kč	12 681,00 Kč	8,67	900,00 Kč	7 803,00 Kč
			(32.00+0.45*2+30.00)*0.45*0.33		14,09			8,67		
D 91 Doplňující práce na komunikaci										
35	K	916561111	Osazení záhon.obrubníku do oře z B 12.5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4-5 50/5/25cm	m	244,60	195,00 Kč	47 697,00 Kč	223,15	195,00 Kč	43 514,25 Kč
			(32.00+0.50+15.00+0.50)*2		96,00			98,00		
			(32.00+15.00)*2		94,00			72,25		
			(2.1+5.1+16.1+1.0+2.0+1.0)*2		54,60			52,90		
36	K	596811221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100m2	m2	30,00	250,00 Kč	7 500,00 Kč	52,90	250,00 Kč	13 225,00 Kč
			(2.00*5.00)+(16.00*1.00)+(2.00*1.00*2)		30,00			52,90		
37	M	592451090	Dlažba skladebná Holland HBB 20*10*8 cm přírodní	m2	30,00	220,00 Kč	6 600,00 Kč	52,90	220,00 Kč	11 638,00 Kč
			(2.00*5.00)+(16.00*1.00)+(2.00*1.00*2)		30,00			52,90		
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	24,80	150,00 Kč	3 720,00 Kč	24,80	150,00 Kč	3 720,00 Kč

PSV - Práce a dodávky PSV

589 Kryty sportovních hřišť

339 179,85 Kč
204 690,35 Kč339 179,85 Kč
204 690,35 Kč

D	K	589312112	Kryt ploch z umělé trávy výšky 20 mm dvojbarevný včetně lajnování (v rozsahu PD (32,00-0,05*2)*(15,00-0,05*2))	m2	475,31	420,00 Kč	475,31	420,00 Kč	199 630,20 Kč
40	K	557 28-9011	Dodávka a montáž pouzder pro sloupky	kus	8,00	500,00 Kč	8,00	500,00 Kč	4 000,00 Kč
41	K	559 20-6500	Dodávka a zapracování záspy křemičitým písekem na hřiště	t	16,31	65,00 Kč	16,31	65,00 Kč	1 060,15 Kč

742 Elektromontáže

36 000,00 Kč

36 000,00 Kč

42	M	742 00-0001	Dodávka venk.svítilna se solárními panelem 2000lm	kus	6,00	4 500,00 Kč	6,00	4 500,00 Kč	27 000,00 Kč
43	K	742 00-0002	Montáž solárního svítidla na sloupek	kus	6,00	1 500,00 Kč	6,00	1 500,00 Kč	9 000,00 Kč

762 Konstrukce tesařské

49 700,00 Kč

49 700,00 Kč

44	K	762 00-0001	Výroba dřevěné konstrukce pergoly 2.00m*3.00m*2.50m z KVH profilů včetně povrch.nátěru lazuru 2x	m3	1,25	10 000,00 Kč	1,25	10 000,00 Kč	12 500,00 Kč
45	K	762 00-0002	Montáž pergoly 2.00m*3.00m*2.50m, vč. kotvení a spoj.m.	kus	1,00	5 000,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
46	K	762 00-0003	Dodávka a montáž zástřešení pergoly krytinou asf.šindel barva černá, včetně oplechování okapnicí	m2	6,00	450,00 Kč	6,00	450,00 Kč	2 700,00 Kč
47	K	762 00-0004	Výroba a montáž dřevěné kolny 2.00m*2.00m*2.00m s dveřmi š.80cm, včetně nátěru lazuru 2x a krytinou asf.šindel barva černá, vč.oplechování okapnicí	kpl	1,00	25 000,00 Kč	1,00	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
48	K	762 00-0005	Výroba a montáž dřevěné lavice 2.00m*0.50mm*0.50 vč.povrchového nátěru ext.lazuru 2x	kus	1,00	4 500,00 Kč	1,00	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč

94 Lešení a stavební výtahy

2 439,50 Kč

2 439,50 Kč

49	K	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3.5m 40.66*1.20*2	m2	97,58	25,00 Kč	97,58	25,00 Kč	2 439,50 Kč
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-------	----------	-------------

955 Vybavení sportovišť

46 350,00 Kč

46 350,00 Kč

50	M	955 00-0001	Sloupky pro tenis	pár	1,00	8 500,00 Kč	1,00	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
51	M	955 00-0002	Volejbalové sloupky - zinkované ext. Do pouzder, D 102mm	pár	1,00	8 500,00 Kč	1,00	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
52	M	955 00-0003	Sít na tenis zdvojená vč. Středové pásky a kotvení	kus	1,00	1 850,00 Kč	1,00	1 850,00 Kč	1 850,00 Kč
53	M	955 00-0004	Singlyčka Alu	kus	2,00	500,00 Kč	2,00	500,00 Kč	1 000,00 Kč
54	M	955 00-0005	Sít na volejbal s lančkem vč.antének (2x)	kus	1,00	1 500,00 Kč	1,00	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
55	M	955 00-0006	Branka malá kopaná - zinkováno ext., vč.sítě	kus	2,00	12 500,00 Kč	2,00	12 500,00 Kč	25 000,00 Kč

VRN - Vedejší rozpočtové náklady

9 000,00 Kč

9 000,00 Kč

56		30001000	Zařízení staveniště		1,00	5 000,00 Kč	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
57		30001001	Výhotovení provozního řádu		1,00	1 500,00 Kč	1,00	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
58		60001000	Územní vlivy		1,00	1 500,00 Kč	1,00	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
59		70001000	Provozní vlivy		1,00	1 000,00 Kč	1,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč

1 117 682,90 Kč

1 176 590,99 Kč
