



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	3. 11. 2015
Ev.č.	ZL-145-S-Z-SO 3.003	Datum schválení	6. 11. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx)	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh / SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD		
<u>Specifikace změny:</u> Při výstavbě stoky 03.2-4 byla zjištěna kolize se stávajícím vodovodem PE d90. Zhotovitel navrhuje realizovat přeložku stávajícího vodovodu PE d90 v délce 2,5 m s hydrantem (vzdušník).			
<u>Předmětem změnového listu je:</u> - Vynucená přeložka vodovodu na ul. Zelená, stoka 03.2-4			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	52 932,20 Kč		
Stanovisko správce stavby: <i>Spíše stoky souhlasí s naměřenými rozměry, bez nutnosti měřit úroveň podzemní vody v této době. Doporučení: dle skutečnosti schválit provedení práce.</i>			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Fotodokumentace 5) Stavební deník 6) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji-schválit xx) SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu	 AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ46964371 Ing. Jan Polášek - hlavní inženýr projektu
Datum: 3. 11. 2015	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění xx) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno závod Brno - VHS a.s. 4 Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji xx) Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Hlávova 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel: 583 317 111 fax: 583 214 845 Jiří Vykydal - manažer projektu
	6. 11. 2015

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

xx) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Tým Správce stavby

Horní Pomoraví II - sever

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Martin Spáčil	spacilm@imosbrno.eu / 739 391 635	26.3.2015

Iniciační dopis - ID-145-SO-3.003 - Vynucená přeložky vodovodu na ul. Zelená, stoka 03.2-4

1) Aktuální stav:

Při realizaci stoky 03.2-4 bylo nutné provést přeložku vodovodního řadu PE d90, z důvodu kolize s projektovanou stokou.

2) Návrh řešení:

Provedení přeložky vodovodu PE d90 s hydrantem (vzdušník). Délka 2,5 m.

Žádáme projektanta a tým správce stavby o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Martin Spáčil

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-145-S-Z-SO 3.003

3. Město Zábřeh / SO 3.003

Vynucená přeložka vodovodu na ul. Zelená, stoka 03.2-4

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-145-S-Z-SO 3.003	
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
SO 3.003 - LOKALITA SEVEROVÝCHOD												
STOKA 03.2-4 - PŘEL.INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Trubní vedení												
203	Přeložka vodovodu z PE D90x5,4mm vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	0,00	4 734,00	0,00	2,50	4 734,00	11 835,00	2,50	11 835,00	11 835,00	0,00
SO 3.004/182	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	0	40 358,40	0,00	1,00	40 358,40	40 358,40	1,00	40 358,40	40 358,40	0,00
408	Demontáž slávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	0	738,80	0,00	1,00	738,80	738,80	1,00	738,80	738,80	0,00
Trubní vedení celkem :								52 932,20		52 932,20	52 932,20	0,00
ZL-145-S-Z-SO 3.003 CELKEM :								52 932,20		52 932,20	52 932,20	0,00



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 533/15/K
Datum: 2. 4. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Joki

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iniciační dopis č.: ID-145-S-Z-SO 3.003 Vynucená přeložka odvodu na ul. Zelené, stoka 03.2-4

Vyjádření projektanta


Zhotovitel upozorňuje, že při výstavbě stoky 03.2-4 byla zjištěna kolize se stávajícím vodovodem PE d90.

Zhotovitel navrhuje realizovat přeložku stávajícího vodovodu PE d90 s hydrantem (vzdušník). Délka přeložky je 2.5 m.

Projektant s návrhem souhlasí. Vzniklou situaci nebylo možno předvídat, neboť v době zpracování zadávací i realizační dokumentace nebyla známa skutečná poloha stávajícího vodovodu. Teprve po zahájení zemních prací byl ověřen skutečný stav. Bez provedení přeložky vodovodu není možné dokončit stoku 03.2-4.

Za projektanta:

Datum:

Ing. Vlastislav Kolečkář
Podpis: 
AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno, ČR
DIČ: CZ46964371



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 533-1/15/K
Datum: 2. 4. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jolík

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-145-S-Z-SO 3.003 Vynucená přeložka odvodu na ul. Zelené, stoka 03.2-4

Vyjádření generálního projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při výstavbě stoky 03.2-4 byla zjištěna kolize se stávajícím vodovodem PE d90.

Zhotovitel navrhuje realizovat přeložku stávajícího vodovodu PE d90 s hydrantem (vzdušník). Délka přeložky je 2,5 m.


Z pozice generálního projektanta s návrhem souhlasíme. Vzniklou situaci nebylo možno předvidat, neboť v době zpracování zadávací i realizační dokumentace nebyla známa skutečná poloha stávajícího vodovodu. Teprve po zahájení zemních prací byl ověřen skutečný stav. Bez provedení přeložky vodovodu není možné dokončit stoku 03.2-4.

Za generálního projektanta:

Ing. Jan Polášek

Datum:


Podpis:



VÝŠKOVÁ KOLIZE S VODOVODNÍM ŘÁDEM A
PROJEKTOVANOU KANALIZACÍ, ULICE ZELENÁ, STOKA 03.2-4

PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘÁDU $d\ 90$.

TRASA PROJEKTOVANÉ KANALIZACE

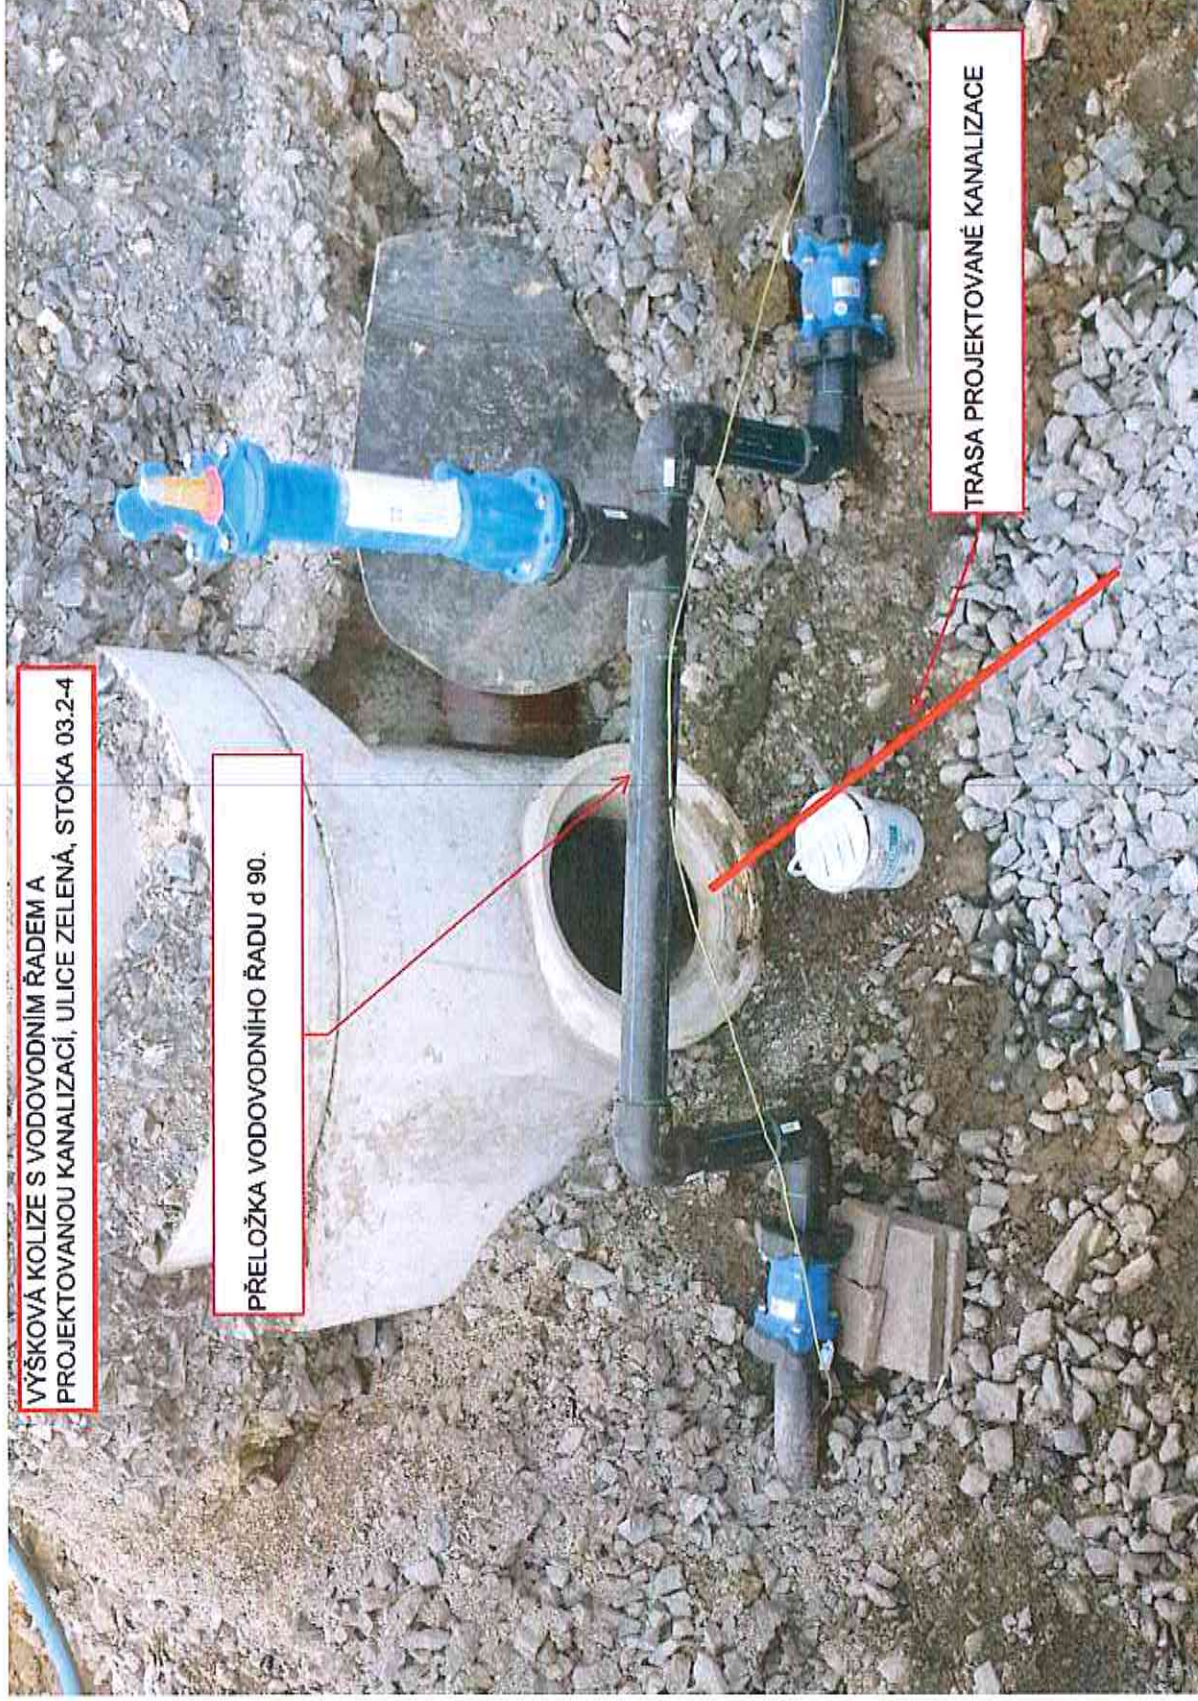

Datum

Denní záznamy stavby

09.4.4 - 2-4 - možná realizace korytnky DK-9

05.4 - výkop pažnic plynů v ulici č. 5. SC
pokladka žeb. do 200 do tří odhad
obnovit základy a hřebíky

005 | 5.4. realizace vodovodní přípojky LTT do RD

009 | 5.2. realizace vodovodní přípojky LTT do RD

03.2-4

TRÍ REALIZACE KANALIZACE CÍKRY K DO 200
TAKA ZÁKLADY KOLIZE S VODOVODNÍM RÁDKEM PŘED RD

28.8.15

Zápis z jednání

Zhotovitel se setkává na místě pracoviště, připravován Hrubel,
odměny, příloha PZZP, dohled z pohledu stavebního
a příloha příloha PZZP.Předseda stavebního úřadu zveřejní v zápisu o jednání
Hrubel, příloha PZZP, dohled z pohledu stavebního
a příloha PZZP. L. Hrubel se pro přílohu PZZP, dohled z pohledu
stavebního úřadu zveřejní v zápisu o jednání.



Šumerská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

☎ 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603-841/0100

AQUA Procon s.r.o.
Ing. Kolečkář
Palackého tř. 12,
612 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
4185 - 50000/2015

e-mail
heitmar@spvs.cz

Vyřizuje/
Heitmar Petr

Šumperk
19.10.2015

Věc: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“

Týká se: „ Horní Pomoraví II sever, Město Zábřeh „

Šumerská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk jako provozovatel obdržela od zhotovitele stavby fa: IMOS BRNO, a.s. žádost o vyjádření k předloženému stanovisku (Iniciační dopis ID-145-S-Z-SO 3.003 – Vynucená přeložka vodovodu na ul. Zelená, stoka 03.2-4).

Šumerská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk k předloženému návrhu konstatuje následující:

- S navrženým řešením souhlasíme.

S pozdravem

Šumerská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911


Ing. Pavel Paloncý
technický ředitel
