

DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 8. 6. 2009, mezi níže uvedenými smluvními stranami

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

adresa: Jílová 6, 787 01 Šumperk
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
Č.bank.úctu: 3783258/0300
jednající: Ing. Liborem Dostálem, předsedou představenstva
Zápis v OR vedeném u KS Ostrava sp.zn. B 714

Osoby oprávněné k jednání:
RNDr. Jan Závěšický, ředitel společnosti
tel. 583211875, e-mail vhz@vhz.cz

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

sdružení „Horní Pomoraví II – jih“

OHL ŽS, a.s.

adresa: Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00
IČ: 46342796
DIČ: CZ 46342796
Č.bank.úctu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.:
2110037444/2700
zastupovaném: Ing. Jaromírem Pelinkou, v plné moci
jako vedoucím partnerem sdružení

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

adresa: Brno, Vídeňská 108, PSČ 619 00
IČ: 00219169
DIČ: CZ 00219169
zastupovaném: vedoucím partnerem sdružení

Metrostav, a.s.

adresa: Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915
zastupovaném: vedoucím partnerem sdružení

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé.

I.

- 1.1 Dne 8. 6. 2009 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo na stavbu „**Horní Pomoraví II – jih**“ v rámci projektu "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze" a následně dodatky č. 1, 2, 3 a 4 k této smlouvě o dílo.

Projekt "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze" je z podstatné části financován z Operačního programu Životní prostředí a spolufinancován z Fondu soudržnosti EU. K zajištění finančních prostředků pro tento projekt z Operačního programu Životního prostředí v souladu s čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo došlo vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace („RoPD“) ze dne 28. 4. 2014, které obdržel objednatel dopisem dne 7. 5. 2014, č. j. 073567/2014. Tímto aktem bylo umožněno plné zahájení realizace sjednaného díla. Vzhledem k časové limitaci využití dotačních prostředků je nezbytné, aby bylo celé dílo realizováno do konce roku 2015, jinak hrozí ztráta přislíbeného dotačního obnosu. S datem 31. 12. 2015 se také pojí ukončení celého Operačního programu Životního prostředí.

- 1.2 Vzhledem k výše uvedenému má objednatel zájem na tom, aby dílo bylo dokončeno dříve, než v původně sjednané lhůtě výstavby, která byla vysoutěžena v roce 2009, a proto zhotoviteli navrhl uzavření tohoto dodatku.

- 1.3 Po podpisu smlouvy o dílo ze dne 8. 6. 2009 byly postupně uzavřeny dodatky č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, jejichž hlavním účelem bylo především smluvně vyřešit stav, kdy objednatel neměl zajištěno financování díla v důsledku toho, že nebyl dokončen proces schvalování poskytnutí dotačních prostředků pro realizaci projektu, zejména nebylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotačních prostředků Evropskou komisí. Vydáním RoPD, které zahrnuje i rozhodnutí Evropské komise o poskytnutí prostředků k projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“, pominuly důvody některých relevantních ustanovení dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 smlouvy o dílo ze dne 8. 6. 2009.

- 1.4 Po dohodě smluvních stran započal zhotovitel s předčasnými pracemi při provádění díla (tj. mimo režim sjednaný v odst. 8.1 obchodních podmínek) na časově nejexponovanějších částech stavby, a to na těchto stavebních objektech:

a) **Město Mohelnice – doplnění kanalizace**

- SO 4B.010 Splašková kanalizace Dolní Krčmy – stoka D, D2
- SO 4B.011 Splašková kanalizace Horní Krčmy – stoka H, úsek ŠH28 – ŠH29
- SO 4B.011 Splašková kanalizace Horní krčmy – stoka H, úsek od Š29
- SO 4B.006 Rekonstrukce kanalizace Mohelnice jih – stoka U – po křížení s ul. Masarykovou

b) **Město Loštice – rekonstrukce a doplnění kanalizace**

- SO 5.007 Čerpací stanice ČS1
- SO 5.009 Přípojky NN pro ČS01
- PS 101 Strojně technologická část
- PS 102 elektrotechnologická část
- PS 103 dispečink a rádiový přenos

- c) Provedena 1. část realizační dokumentace (ve smyslu svazku 2.1, přílohy 5 smlouvy o dílo). Tato byla správcem stavby schválena, viz tabulka kontrolních termínů v čl. 8.3 obchodních podmínek, milník č. 1.

II.

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I. je uzavírán tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo, v němž se smluvní strany dohodly na následujících změnách aktuálního znění smlouvy o dílo ve znění jejích příloh:

2.1 V ustanovení článku 2.5 obchodních podmínek se poslední odstavec:

„Nároky objednatele na zaplacení smluvní pokuty podle čl. 8.7 (smluvní pokuty za prodlení) zanikají v případě, dokončí-li zhotovitel dílo řádně a včas a předá jej objednateli bez vad bránících řádnému užívání díla. V takovém případě opětovně nastane zhotoviteli nárok na zaplacení peněžitých pohledávek vůči objednateli, které podmíněně zanikly započtením nároků objednatele z prodlení zhotovitele dle čl. 8.7 obchodních podmínek.“

ruší a nahrazuje se zněním:

„Dokončí-li zhotovitel dílo bez vad bránících řádnému užívání díla v termínu do 30. listopadu 2015, zanikají nároky objednatele na zaplacení smluvních pokut podle čl. 8.7. (smluvní pokuty za prodlení), a to i tehdy, pokud již byly uhrazeny nebo započteny. V takovém případě má zhotovitel nárok na vrácení uhrazené smluvní pokuty, jakož i na zaplacení své pohledávky, proti které byla smluvní pokuta započtena. Stejně platí i v případě, že termín 30. listopadu 2015 bude překročen z důvodů majících dle obchodních podmínek za následek přerušení nebo prodloužení prací.“

2.2 Ustanovení čl. 6.5 obchodních podmínek:

„Na staveništi nebude realizována pracovní činnost, která by mohla rušit noční klid, pracovní činnost ve dnech pracovního klidu ani pracovní činnost mimo obvyklou pracovní dobu specifikovanou v příloze k obchodním podmínkám, ledaže by:

- a) ve smlouvě o dílo bylo uvedeno jinak;*
- b) dal k tomu souhlas správce stavby;*
- c) jednalo by se o činnosti nezbytné k odvrácení nebezpečí aktuálně hrozícího životu a zdraví osob nebo vznikem škody na majetku nebo ohrožením životního prostředí; v těchto případech je zhotovitel povinen za použití veškerých dostupných komunikačních prostředků informovat správce stavby“*

se ruší a nahrazuje se zněním:

„Na staveništi nebude realizována pracovní činnost, která by mohla rušit noční klid. Zhotovitel je oprávněn provádět práce ve všech dnech v době od 6:00 do 20:00 hodin. V odůvodněných případech (např. v době plánovaných akcí, poutí apod.) může správce stavby tuto dobu upravit.“

Ustanovení PŘÍLOHY k obchodním podmínkám:

<i>Normální pracovní doba</i>	6.5	<i>pondělí až pátek – 07:00 do 15:30, v případě směn od 06:00 do 20:00</i>
-------------------------------	-----	--

se ruší a nahrazuje se zněním:

<i>Normální pracovní doba</i>	6.5	<i>pondělí až neděle – 06:00 do 20:00</i>
-------------------------------	-----	---

2.3 Ustanovení čl. 8.1 obchodních podmínek se odstavec druhý:

„Zhotovitel ne zahájí realizaci zhotovovacích prací dříve, než objednatel zajistí dostatečné zdroje k financování realizace předmětu díla v rozsahu aktuálně sjednané ceny díla. O této skutečnosti vystaví čestné prohlášení a toto čestné prohlášení předá zhotoviteli; v čestném prohlášení objednatel uvede jednoznačné konstatování o skutečnosti, že má k dispozici dostatečné finanční zdroje k úhradě aktuálně sjednané ceny díla a stručně nastíní strukturu těchto finančních zdrojů (tj. jedná-li se o finanční zdroje z veřejných prostředků, resp. z jakých, z bankovního úvěru apod).“

ruší a nahrazuje se zněním:

„Zhotovovací práce (provádění díla) nad rámec předčasných prací dle čl. 1.2 tohoto dodatku č. 5 budou zahájeny na pokyn správce stavby. Při podpisu tohoto dodatku byl zhotoviteli předán pokyn správce stavby k zahájení provádění díla nad rámec předčasných prací dle čl. 1.2 tohoto dodatku č. 5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 dnů od podpisu dodatku č. 5.“

A odstavec třetí téhož článku, tj. čl 8.1 obchodních podmínek:

„Správce stavby oznámí zhotoviteli datum zahájení zhotovovacích prací, nejméně sedm dní před tímto datem; správce stavby učiní tento úkon teprve po datu doručení prohlášení objednatele dle předchozího odstavce. Zhotovitel zajistí realizaci zhotovovacích prací bez zbytečného odkladu po oznámení data zahájení těchto prací a bude dílo realizovat bez nedůvodných prodlev.“

se taktéž ruší a nahrazuje se zněním:

„Zhotovovací práce budou zahájeny na základě pokynu správce stavby, předaného zhotoviteli při podpisu dodatku č. 5, a to dnem předání a převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 dnů od podpisu dodatku č. 5.“

Ustanovení bodu 1.1.3.1 obchodních podmínek

„Datum zahájení zhotovovacích prací“ znamená datum zahájení zhotovovacích prací oznámené podle článku 8.1 (zahájení prací“)

se ruší a nahrazuje se zněním:

„Datum zahájení zhotovovacích prací“ znamená datum zahájení zhotovovacích prací dohodnuté postupem podle článku 8.1(zahájení prací“)

Ustanovení PŘÍLOHY k obchodním podmínkám:

<i>Datum zahájení zhotovovacích prací</i>	<i>1.1.3.2 & 8.1</i>	<i>do 28 dní od data, kdy objednatel identifikuje zhotovitel osobu správce stavby</i>
---	--------------------------	---

se ruší a nahrazuje se zněním:

<i>Datum zahájení zhotovovacích prací</i>	<i>1.1.3.1 & 8.1</i>	<i>Datum předání a převzetí staveniště</i>
---	--------------------------	--

2.4 Ustanovení čl. 8.2 obchodních podmínek se na jeho konec doplňuje následující věta:

„Doba zkušebního provozu ČOV nevchází do lhůty pro dokončení zhotovovacích prací dle smlouvy o dílo a obchodních podmínek.“

2.5 V čl. 8.3 obchodních podmínek se věta:

„Zhotovitel předá správci stavby do 28 dnů po zahájení zhotovovacích prací o dílo návrh podrobného harmonogramu (programu) prací na celou dobu realizace předmětu díla vycházející z předběžného harmonogramu prací poskytnutého objednatelem v rámci zadávacího řízení a zohlední požadavky objednatele na součinnost s provozem a na součinnost s dalšími subjekty uvedenou v technických specifikacích.“

se ruší a nahrazuje se zněním

„Zhotovitel předá správci stavby při předání staveniště harmonogram prací v rozsahu prvních 40 % (tj. milníky 1 až 4), a to v podrobnostech nezbytných pro zahájení zhotovovacích prací. Návrh podrobného harmonogramu (programu) prací na celou dobu realizace předmětu díla předá zhotovitel správci stavby do 56 dnů od zahájení zhotovovacích prací. V tomto podrobném harmonogramu budou zohledněny požadavky objednatele na součinnost s provozem a na součinnost s dalšími subjekty uvedenou v technických specifikacích.“

V článku 8.3 – Harmonogram prací se stávající tabulka kontrolních termínů od milníku č. 2 nahrazuje nově aktualizovanou tabulkou těchto kontrolních termínů:

Milník č.	Kontrolní bod – od data zahájení zhotovovacích prací nebo konkrétní datum	Ukazatel
2	Do 4 měsíců	2. část realizační dokumentace schválená správcem stavby
3	Do 3 měsíců	10 % zhotovovacích prací
4	Do 8 měsíců	40 % zhotovovacích prací
5	Do 15 měsíců	Zahájit zkušební provoz ČOV
6	Do 17 měsíců	Kolaudace staveb kanalizací, resp. připravenost staveb ke kolaudaci dle svazku č. 3 – Technická

		specifikace (příloha č. 2 smlouvy o dílo)
7	Do 17 měsíců	Ukončení všech zhotovovacích prací (odstranění všech vad bránících řádnému užívání díla dle čl. 2.5. obchod.podmínek), vydán protokol o převzetí díla

Ustanovení PŘÍLOHY k obchodním podmínkám:

<i>Lhůta pro dokončení díla</i>	1.1.3.3 & 8.2	<i>do 24 měsíců od zahájení zhotovovacích prací</i>
---------------------------------	---------------	---

se ruší a nahrazuje se zněním:

<i>Lhůta pro dokončení díla</i>	1.1.3.3 & 8.2	<i>do 17 měsíců od zahájení zhotovovacích prací</i>
---------------------------------	---------------	---

V čl. 8.3 obchodních podmínek se v písm. a) obchodních podmínek za středník doplňuje následující text:

„součástí harmonogramu prací bude vyznačení ucelených částí, které budou předmětem dílčích přejímek.“

2.6 Ustanovení čl. 10.2 obchodních podmínek se doplňuje o následující odstavec:

„Pokud objednatel převezme část díla včetně jeho uvedení do předčasného užívání, nemá toto převzetí vliv na běh záruční doby uvedené v ustanovení čl. III odstavce 8 smlouvy o dílo. Záruční doba počíná běžet převzetím celého díla, tj. od vydání protokolu o převzetí díla.“

2.7 Do kapitoly 10 obchodních podmínek se vkládá nový čl. 10.5 obchodních podmínek v následujícím znění:

„Kolaudací staveb kanalizací“ se rozumí, že zhotovitel dovede tyto stavby a připraví dokumentaci, kterou má o nich dle svazku III zadávacích podmínek – technické specifikace předkládat, do stavu, ve kterém budou způsobilé ke kolaudaci, nebo k předčasnému užívání dle stavebně právních předpisů.

Bude-li dílo nebo jeho ucelená část uvedena do provozu před konečným převzetím objednatelem, hradí náklady na provoz objednatel.“

2.8 Do článku 14.5 obchodních podmínek se na jeho konec doplňuje věta:

„Veškeré nesrovnalosti zjištěné při potvrzování dílčích plateb musí být vyřešeny nejpozději na nejbližším kontrolním dni. Budou-li opatření přijatá v této souvislosti na kontrolním dni splněna do 5-ti pracovních dnů, má se za to, že objednatel (resp. správce stavby) ke dni splnění daných podmínek zhotovitelem vydal potvrzení dílčí platby ve smyslu čl. 14.5 a 14.6 obchodních podmínek. Neuplatnění vzniklé nesrovnalosti na kontrolním dnu však nebude mít za následek zánik práva tuto nesrovnalost později namítat.“

2.9 V článku 14.6 obchodních podmínek se odstavec:

„Splatnost všech nároků zhotovitele uplatněných fakturací (není-li mezi účastníky smlouvy sjednáno nebo obsahem smluvních dokumentů stanoveno jinak) činí 90 dnů od zaslání prohlášení k fakturaci správci stavby, pokud bylo zhotoviteli správce stavby ve lhůtě 28 dnů vydáno potvrzení dílčí platby dle článku 14.5 (Vydání potvrzení dílčí platby). Pokud nebylo vydáno toto potvrzení, má se za to, že splatnost fakturované částky dosud nenastala a nová 90-ti denní lhůta splatnosti začne běžet po obdržení věcně a formálně správné žádosti o potvrzení dílčí platby dle článku 14.2 (Žádost o potvrzení dílčí platby)“.

upřesňuje a nahrazuje se tak zněním:

„Splatnost všech nároků zhotovitele uplatněných fakturací (není-li mezi účastníky smlouvy sjednáno nebo obsahem smluvních dokumentů stanoveno jinak) činí 90 dnů od zaslání prohlášení k fakturaci správci stavby, pokud bylo zhotoviteli správce stavby vydáno potvrzení dílčí platby dle článku 14.5 (Vydání potvrzení dílčí platby). Pokud nebylo vydáno toto potvrzení z důvodu věcně a formálně nesprávné žádosti o potvrzení dílčí platby, má se za to, že splatnost fakturované částky dosud nenastala a nová 90-ti denní lhůta splatnosti začne běžet po obdržení věcně a formálně správné žádosti o potvrzení dílčí platby dle článku 14.2 (Žádost o potvrzení dílčí platby)“.

III.

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě následujících lhůt obchodních podmínek:

- 3.1 Lhůty pro vyjádření nebo schválení ze strany správce stavby uvedené v čl. 4.4 obchodních podmínek se z původních 14 dnů zkracují na 7 dnů.
- 3.2 Lhůta „kontrolního období“ uvedená v čl. 4.5 odst. 6 obchodních podmínek se z původních 21 dnů zkracuje na 14 dnů.
- 3.3 Lhůta pro změnu pokynu správce na základě námitek zhotovitele uvedená v čl. 4.5 obchodních podmínek se z původních 14 dnů nahrazuje lhůtou 7 dnů.
- 3.4 Lhůta pro oznámení předpokládaného data zahájení prací podzhotovitelem uvedená v čl. 5.1 obchodních podmínek se z původních 28 dnů mění na 14 dnů.
- 3.5 Lhůta pro připomínky správce stavby k harmonogramu prací uvedená v čl. 8.3 obchodních podmínek se z původních 14 dnů zkracuje na 7 dnů.
- 3.6 Lhůta pro oznámení nedostatků harmonogramu uvedená v čl. 8.3 obchodních podmínek se z původních 21 dnů zkracuje na 7 dnů.

IV.

Ve smyslu ustanovení čl. I., odst. 5 dodatku ke smlouvě o dílo č. 4 přikročil zhotovitel k obměně osob odpovědných za zakázku včetně organizačního schématu. Vyžadované dokumenty včetně nového organizačního schématu jsou přílohou tohoto dodatku.

V.

Pro účely čl. 5.2 obchodních podmínek platí aktualizovaný formulář identifikace předpokládaných subdodavatelů, který je přílohou dodatku č. 5.

VI.

Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu po dokončení díla, nabídne dílo k převzetí objednateli. Doba přebírání díla objednatelem se nezapočítává do Lhůty pro dokončení díla.

VII.

Účastníci uzavírají tento dodatek jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních stejnopisech, přičemž jeden originální stejnopis obdrží zhotovitel a jeden originální stejnopis objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1: Formulář: Předpokládané subdodávky, organizační schéma – podzhotovitelé ČOV MOHELNICE

Příloha č. 2: Formulář: Předpokládané subdodávky, organizační schéma – podzhotovitelé kanalizace MOHELNICE

Příloha č. 3: Formulář: Předpokládané subdodávky, organizační schéma – podzhotovitelé kanalizace LOŠTICE

Příloha č. 4: Organizační schéma realizačního týmu – sdružení „Horní Pomoraví II – jih“

Příloha č. 5: Profesní životopis

Příloha č. 6: VŠ diplom

Datum 23.6.2014

OBJEDNATEL:

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.


Ing. Libor Dostál
předseda představenstva



Datum 20.6.2014

ZHOTOVITEL:

sdružení „Horní Pomoraví II – jih“

OHL ŽS, a.s.

adresa: Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00
IČ: 46342796
DIČ: CZ 46342796
zastupované: Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize 3,
Závod pozemní stavitelství, v plné moci

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

adresa: Brno, Videňská 108, PSČ 619 00
IČ: 00219169
DIČ: CZ 00219169
zastupované: vedoucím partnerem sdružení

Metrostav, a.s.

adresa: Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915
zastupované: vedoucím partnerem sdružení

ze které jedná
Ing. Jaromír Pelinka
ředitel Divize 3
Závod pozemní stavitelství
za sdružení „Horní Pomoraví II – jih“



OHL ŽS

172

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Formulář: Předpokládané subdodávky, organizační schéma

Plánuje-li zhotovitel zadat část zakázky jako subdodávku – je povinen subdodavatele následujícím způsobem identifikovat:

dílčí podprojekt	4A MĚSTO MOHELNICE - INTENZIFIKACE ČOV
------------------	--

Pořadové číslo Druhu prací, které hodlá zadavatel zadat	Práce, které zhotovitel hodlá zadat jako subdodávku jiným osobám ¹	Identifikace subdodavatele ²	Zkušenosti subdodavatele v obdobných zakázkách ³	Dílčí stavební objekt potenciální realizace subdodávky ⁴	Objem subdodávky v % z nabídkové ceny ⁵
1	Elektroinstalace stavební v ČOV	ELPREMO, spol. s r.o. IČO: 42869951 Jan Skřivan Přemysl Obdržálek	Česká Třebová – kanalizace a ČOV – dále viz příloha	SO 4A.016 SO 4A.017	0,6%
2	Elektroinstalace stavební v ČOV	Svatoslav Mička IČO: 18499261 Svatoslav Mička	ČOV Karlovice – dále viz příloha	SO 4A.016 SO 4A.017	0,6%
3	Elektroinstalace technologická v ČOV	ELPREMO, spol. s r.o. IČO: 42869951 Jan Skřivan Přemysl Obdržálek	Česká Třebová – kanalizace a ČOV – dále viz příloha	PS 4A.015 PS 4A.016	0,8%

¹ Osoba podzhotovitele uvedená v seznamu potenciálních podzhotovitelů musí odpovídat podmínkám uvedeným ve smlouvě o dílo

² Uvedení úplné identifikace předpokládaného podzhotovitele, včetně statutárních zástupců. V příloze formuláře bude k předpokládanému subdodavateli přiloženo jeho čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči státním institucím, bezúhonnosti, ekonomické způsobilosti... (viz formulář uvedený v zadávacím řízení na zhotovitele - svazek č. 1)

³ Součástí formuláře a dokumentů uvedených při identifikaci zadavatele – viz poznámka 2), bude uveden základní list referencí potenciálního subdodavatele s uvedením referencí vztahujících se k předpokládanému druhu a rozsahu prací subdodávky (je možno uvést i reference klíčových pracovníků subdodavatele z odlišných společností. Součástí předpokládaných referencí bude soupis základního vybavení předpokládaného podzhotovitele, které bude využito při realizaci předpokládané subdodávky.

⁴ Bude uvedena přiměřená identifikace stavebních objektů (podle identifikačního označení uvedeného v rozpočtu akce – přílohy uzavřené smlouvy

⁵ Bude uvedeno procento zaokrouhlené na 1 desetinné místo z celkového finančního objemu zakázky (tj. celé dílčí stavby – buď „JH“ nebo „SEVER“ v cenách odpovídajících smluvní ceně zhotovitele (bez započítání rezerv). Pokud bude uvažováno o více potenciálních podzhotovitelích, je objem subdodávky platný pro součet všech potenciálních subdodavatelů uvedených k identifikovanému druhu prací, které hodlá zhotovitel zadat

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke SMLouvě o dílo

4	Elektroinstalace technologická v ČOV	BMS SERVIS, s.r.o. IČO: 27723364 Ing. Josef Musil Marek Zelinka	Teplárny Brno – dále viz příloha	PS 4A.015 PS 4A.016	0,1%
5	Kontaktní zateplovací systém, fasáda na budovách v ČOV	Experior, s.r.o. IČO: 28577132 Daniel Kašpar Luděk Purkert	Česká Třebová – kanalizace a ČOV – dále viz příloha	SO 4A.003 SO 4A.004 SO 4A.008 SO 4A.014 SO 4A.015 SO 4A.021 SO 4A.027	0,15%
6	Plastové výplně otvorů v ČOV	STUDIO OKEN s.r.o. IČO: 28569865	Kaskádový dům Hejčín, objekt A a B – dále viz příloha	SO 4A.003 SO 4A.004 SO 4A.008 SO 4A.014 SO 4A.015 SO 4A.021 SO 4A.027	0,05%
7	Sanace betonových kcí - tryskání	SANACOR s.r.o. IČO: 27677613 Radim Ušel	ČOV Pardubice – dále viz příloha	SO 4A.001 SO 4A.002 SO 4A.003 SO 4A.004 SO 4A.005 SO 4A.006 SO 4A.007 SO 4A.009 SO 4A.011 SO 4A.021	0,03%
8	Sanace betonových kcí - tryskání	VYKO - stavební, spol. s r.o. IČO: 00528161 Jan Vykydal Antonín Vykydal	ČOV Chrudim – dále viz příloha	SO 4A.001 SO 4A.002 SO 4A.003 SO 4A.004 SO 4A.005 SO 4A.006 SO 4A.007 SO 4A.009 SO 4A.011 SO 4A.021	0,03%
9	Střešní kce	SOPAT CZ, s.r.o. IČO: 25857282 Milan Svoboda Pavel Papula Petr Můčka	Slovanské gymnázium Olomouc – dále viz příloha	SO 4A.003 SO 4A.004 SO 4A.008 SO 4A.014 SO 4A.015 SO 4A.021 SO 4A.027	0,05%

Handwritten signature

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke SMLouvě o dílo

10	Štětové stěny	KELLER- speciální zakládání, spol. s r.o. IČO: 49702190 Dipl.Ing. Andreas Körbler	Dálniční most na D47 přes řeku Veličku - pažení stavební jámy – dále viz příloha	SO 4A.001 SO 4A.004	0,1%
11	Vzduchotechnika	Jiří Kouřil – JK Klima IČO: 48386740 Jiří Kouřil	Sluňákov – centrum ekologických aktiv Olomouc – dále viz příloha	SO 4A.026	0,05%
12	Vzduchotechnika	PF engineering, s.r.o. IČO: 29210305 Ing. Pavel Forch	Letiště Brno- Tuřany – dále viz příloha	SO 4A.026	0,05%
13	Zámečnické kce	Pavel Nádvorník IČO: 62298780 Pavel Nádvorník	Galerie Šantovka – dále viz příloha	SO 4A.001 SO 4A.002 SO 4A.003 SO 4A.004 SO 4A.005 SO 4A.006 SO 4A.007 SO 4A.008 SO 4A.009 SO 4A.014 SO 4A.015 SO 4A.021 SO 4A.027	0,15%
14	Trubní vedení v ČOV	MEBIKAN spol. s r.o. IČO: 25441981 Ing. Dalimil Kotas Bc. Martin Hauzner	Synthesia a.s. – dále viz příloha	SO 4A.013 SO 4A.018 SO 4A.020	0,7%
15	Trubní vedení v ČOV	AVJ-STAVBY s.r.o. IČO: Bc. Andrej Peňák	Viz příloha	SO 4A.013 SO 4A.018 SO 4A.020	0,7%

Handwritten signature

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

16	Trubní vedení v ČOV	SEWER, s.r.o. IČO: 25371240 Ing. Daniel Fránek	Kanalizace Frýdland nad Ostravicí – dále viz příloha	SO 4A.013 SO 4A.018 SO 4A.020	0,7%
17	Zámečnické kce	Ing. Petr Duda IČO: 13238884 Ing. Petr Duda	ČOV Štěpánov – dále viz příloha	SO 4A.001 SO 4A.002 SO 4A.003 SO 4A.004 SO 4A.005 SO 4A.006 SO 4A.007 SO 4A.008 SO 4A.009 SO 4A.014 SO 4A.015 SO 4A.021 SO 4A.027	0,15%
18	Zkušební laboratoř	SQZ, s.r.o. IČO: 25743554 Ing. Jiří Prokop, MBA	Rychlostní komunikace R35 – dále viz příloha	SO 4A.013 SO 4A.018 SO 4A.020	0,008%
19	Zkušební laboratoř	Qualiform Slovakia s.r.o. IČO:28311060 Ing. Jan Jašek	Dálnice D47 – dále viz příloha	SO 4A.013 SO 4A.018 SO 4A.020	0,008%
20	Archeologický dozor	Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace IČO: 75008271 PhDr. Jaroslav Peška Ph.D.	Viz příloha	Všechny SO	0,02%
21	Geodetické práce	Geodézie Cindr s.r.o. IČO: 02967723 Ing. Miloslav Cindr	ČOV Česká Třebová – dále viz příloha	Všechny SO	0,1%
22	Kamerové zkoušky, zkoušky těsnosti	Medřa stavební s.r.o. IČO: 01857401 Jaroslav Medřický		SO 4A.013 SO 4A.018 SO 4A.020	0,008%

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

23	Elektroinstalace technologická v ČOV	GDF spol. s r.o. IČO: 47151901 Ing. Oldřich Filip Karel Sirotek	Česká Třebová – kanalizace a ČOV	PS 4A.015 PS 4A.016	0,8%
24	Kontaktní zateplovací systém, fasáda na budovách v ČOV	Radim Švec s.r.o. IČO: 28291352 Radim Švec	Novostavba lékárny FN Olomouc	SO 4A.003 SO 4A.004 SO 4A.008 SO 4A.014 SO 4A.015 SO 4A.021 SO 4A.027	0,15%
25	Plastové výplně otvorů v ČOV	Pramos, a.s. IČO: 63479087 Radomír Zelinka Jana Šušnová Ing. Petr Kaňa	Nemocnice Šternberk	SO 4A.003 SO 4A.004 SO 4A.008 SO 4A.014 SO 4A.015 SO 4A.021 SO 4A.027	0,05%
25	Sanace betonových kcí - tryskání	AgilaMont s.r.o. IČO: 27550567 Michal Roubíček	ČOV Velké Meziříčí	SO 4A.001 SO 4A.002 SO 4A.003 SO 4A.004 SO 4A.005 SO 4A.006 SO 4A.007 SO 4A.009 SO 4A.011 SO 4A.021	0,03%
26	Automatická vrata	Pakl družstvo IČO: 25906283 Robert Pajonk Přemysl Klaban Petr Klecker	Česká Třebová – kanalizace a ČOV	SO 4A.015	0,001%
27	Střešní konstrukce	Milan Michalčák			0,05%

Celkem za dílčí podprojekt	22,2%
Celkem za dílčí projekt	6,2%



Formulář: Předpokládané subdodávky, organizační schéma

Plánuje-li zhotovitel zadat část zakázky jako subdodávku – je povinen subdodavatele následujícím způsobem identifikovat:

dílčí podprojekt	4B MĚSTO MOHELNICE - REKONSTRUKCE A DOPLNĚNÍ KANALIZACE
------------------	---

Pořadové číslo Druhu prací, které hodlá zadavatel zadat	Práce, které zhotovitel hodlá zadat jako subdodávku jiným osobám ¹	Identifikace subdodavatele ²	Zkušenosti subdodavatele v obdobných zakázkách ³	Dílčí stavební objekt potenciální realizace subdodávky ⁴	Objem subdodávky v % z nabídkové ceny ⁵
1	Rekonstrukce kanalizace Mohelnice sever I - pokládka kanalizace, zemní práce	Porr a.s., IČO: 43005560 Lubor Nôta Ing. Antonín Daňa Mag. Alois Janusch Štefan Havlík	Kanalizace Jičín - Holínské předměstí a Markova ulice - dále viz příloha	SO 4B.001	0,5%
2	Rekonstrukce kanalizace Mohelnice sever II - vložkování rukávem	WOMBAT, s.r.o., IČO: 47912553 Ing. Petr Holeš	Kanalizace a ČOV Křelov - Břuchotín - dále viz příloha	SO 4B.002	0,6%
3	Rekonstrukce kanalizace Mohelnice sever II - vložkování rukávem	MEBIKAN spol. s r.o. IČO: 25441981 Ing. Dalimil	Synthesia a.s. - dále viz příloha	SO 4B.002	0,6%

¹ Osoba podzhotovitele uvedená v seznamu potenciálních podzhotovitelů musí odpovídat podmínkám uvedeným ve smlouvě o dílo

² Uvedení úplné identifikace předpokládaného podzhotovitele, včetně statutárních zástupců. V příloze formuláře bude k předpokládanému subdodavateli přiloženo jeho čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči státním institucím, bezúhonnosti, ekonomické způsobilosti... (viz formulář uvedený v zadávacím řízení na zhotovitele - svazek č. 1)

³ Součástí formuláře a dokumentů uvedených při identifikaci zadavatele – viz poznámka 2), bude uveden základní list referencí potenciálního subdodavatele s uvedením referencí vztahujících se k předpokládanému druhu a rozsahu prací subdodávky (je možno uvést i reference klíčových pracovníků subdodavatele z odlišných společností. Součástí předpokládaných referencí bude soupis základního vybavení předpokládaného podzhotovitele, které bude využito při realizaci předpokládané subdodávky.

⁴ Bude uvedena přiměřená identifikace stavebních objektů (podle identifikačního označení uvedeného v rozpočtu akce – přílohy uzavřené smlouvy

⁵ Bude uvedeno procento zaokrouhlené na 1 desetinné místo z celkového finančního objemu zakázky (tj. celé dílčí stavby – buď „JIH“ nebo „SEVER“ v cenách odpovídajících smluvní ceně zhotovitele (bez započítání rezerv). Pokud bude uvažováno o více potenciálních podzhotovitelích, je objem subdodávky platný pro součet všech potenciálních subdodavatelů uvedených k identifikovanému druhu prací, které hodlá zhotovitel zadat

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke SMLouvě o dílo

		Kotas Bc. Martin Hauzner			
4	Rekonstrukce kanalizace Mohelnice sever III - pokládka kanalizace, zemní práce	Porr a.s., IČO: 43005560 Ľubor Nôta Ing. Antonín Daňa Mag. Alois Janusch Štefan Havlík	Kanalizace Jičín - Holínské předměstí a Markova ulice - dále viz příloha	SO 4B.003	0,9%
5	Rekonstrukce kanalizace Mohelnice centrum	Porr a.s., IČO: 43005560 Ľubor Nôta Ing. Antonín Daňa Mag. Alois Janusch Štefan Havlík	Kanalizace Jičín - Holínské předměstí a Markova ulice - dále viz příloha	SO 4B.005	0,2%
6	Rekonstrukce kanalizace Mohelnice jih - pokládka kanalizace, zemní práce	MEBIKAN spol. s r.o. IČO: 25441981 Ing. Dalimil Kotas Bc. Martin Hauzner	Synthesia a.s. - dále viz příloha	SO 4B.006	0,5%
7	Rekonstrukce kanalizace Mohelnice jih - pokládka kanalizace, zemní práce	VK – AQUA OLOMOUC, spol. s r.o., IČO: 25371878 Ing. Roman Papica	Odkanalizování obce Dlouhomilov - - dále viz příloha	SO 4B.006	0,5%
8	Splašková kanalizace Podolí	VK – AQUA OLOMOUC, spol. s r.o., IČO: 25371878 Ing. Roman Papica	Odkanalizování obce Dlouhomilov - - dále viz příloha	SO 4B.007	0,8%
9	Splašková kanalizace Podolí	MEBIKAN spol. s r.o. IČO: 25441981 Ing. Dalimil Kotas Bc. Martin Hauzner	Synthesia a.s. - dále viz příloha	SO 4B.007	0,8%
10	Splašková kanalizace Mohelnice-západ -	SEWER, s.r.o. IČO: 25371240	Kanalizace Frýdland nad	SO 4B.008	0,6%

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

	pokládka kanalizace, zemní práce	Ing. Daniel Fránek	Ostravicí – dále viz příloha		
11	Splašková kanalizace Mohelnice-západ - pokládka kanalizace, zemní práce	MEBIKAN spol. s r.o. IČO: 25441981 Ing. Dalimil Kotas Bc. Martin Hauzner	Synthesia a.s. – dále viz příloha	SO 4B.008	0,6%
12	Splašková kanalizace Mohelnice-centrum, jih - pokládka kanalizace, zemní práce	VK – AQUA OLOMOUC, spol. s r.o., IČO: 25371878 Ing. Roman Papica	Odkanalizování obce Dlouhomilov - – dále viz příloha	SO 4B.009	0,4%
13	Splašková kanalizace Mohelnice-centrum, jih - pokládka kanalizace, zemní práce	MEBIKAN spol. s r.o. IČO: 25441981 Ing. Dalimil Kotas Bc. Martin Hauzner	Synthesia a.s. – dále viz příloha	SO 4B.009	0,4%
14	Splašková kanalizace Dolní Krčmy	Porr a.s., IČO: 43005560 Ľubor Nôta Ing. Antonín Daňa Mag. Alois Janusch Štefan Havlík	Kanalizace Jičín - Holínské předměstí a Markova ulice - dále viz příloha	SO 4B.010	0,4%
15	Splašková kanalizace Horní Krčmy	AVJ-STAVBY s.r.o. IČO: Bc. Andrej Peňák	Jaroměřice - Za Tvrzí, infrastruktura - vodovod, kanalizace, plynovod – dále viz příloha	SO 4B.011	0,4%
16	Splašková kanalizace Horní Krčmy	MEBIKAN spol. s r.o. IČO: 25441981 Ing. Dalimil Kotas Bc. Martin Hauzner	Synthesia a.s. – dále viz příloha	SO 4B.011	0,4%
17	Čerpací stanice 01 u potoka – technologická část	ZEMSKÝ Rohatec, IČO: 25729331	Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova – dále	SO 4B.012	0,1%

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

			viz příloha		
18	Čerpací stanice 01 u potoka – technologická část	VODA CZ s.r.o. IČO: 25969692 Ing. Jan Švorčík Jan Beran	Kanalizace a ČOV Žleby	SO 4B.012	0,1%
19	Čerpací stanice 02 podolí - elektromontáže	ELPREMO, spol. s r.o. IČO: 42869951 Jan Skřivan Přemysl Obdržálek	Česká Třebová – kanalizace a ČOV – dále viz příloha	SO 4B.013	0,01%
20	Čerpací stanice 02 podolí - elektromontáže	ELZACO spol. s r.o. IČO: 19013108 Jiří Vénos	ČS Mohelnice, Jesenická ulice – dále viz příloha	SO 4B.013	0,01%
21	Čerpací stanice 02 podolí - elektromontáže	ZEMSKÝ Rohatec, IČO: 25729331	Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova – dále viz příloha	SO 4B.013	0,01%
22	Elektropřípojky - elektromontáže	ELPREMO, spol. s r.o. IČO: 42869951 Jan Skřivan Přemysl Obdržálek	Česká Třebová – kanalizace a ČOV – dále viz příloha	SO 4B.014	0,01%
23	Elektropřípojky - elektromontáže	ELZACO spol. s r.o. IČO: 19013108 Jiří Vénos	ČS Mohelnice, Jesenická ulice – dále viz příloha	SO 4B.014	0,01%
24	Elektropřípojky - elektromontáže	ZEMSKÝ Rohatec, IČO: 25729331	Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova – dále viz příloha	SO 4B.014	0,01%
25	Čerpací stanice ČS01 u potoka - elektromontáže	ELPREMO, spol. s r.o. IČO: 42869951 Jan Skřivan Přemysl Obdržálek	Česká Třebová – kanalizace a ČOV – dále viz příloha	PS 4B.001	0,03%
26	Čerpací stanice ČS01 u potoka - elektromontáže	ELZACO spol. s r.o. IČO: 19013108 Jiří Vénos	ČS Mohelnice, Jesenická ulice – dále viz příloha	PS 4B.001	0,03%
27	Čerpací stanice ČS01 u potoka - elektromontáže	ZEMSKÝ Rohatec, IČO: 25729331	Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova – dále viz příloha	PS 4B.001	0,03%

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

28	Přeložky plynovodů	Kavoplyn s.r.o. IČO: 27794946 Luboš Makáň Roman Horký	Rekonstrukce NTL Mohelnice, ul. Staškova	Všechny SO	0,09%
29	Přeložky plynovodů	PLYNOMONT spol. s r.o. IČO: 45196265 Radovan Batta	SMP Net, s.r.o. - REKO MS Mohelnice – Masarykova +2 – dále viz příloha	Všechny SO	0,09%
30	Povrchy komunikací	STRABAG a.s., IČO: 60838744 Ing. Svatopluk Novák Ing. Zbyněk Planka Ing. Vítězslav Bujnoch	Výstavba místních komunikací a inženýrských sítí – obec Hevlín – dále viz příloha	Všechny SO	0,1%
31	Povrchy komunikací	KARETA s.r.o., IČO: 62360213 Ing. Zdenek Němec Ing. Marek Němec	Dolany - Průtah - I.etapa	Všechny SO	0,1%
32	Povrchy komunikací	Skanska a.s., IČO: 26271303	Jižní obchvat Olomouce	Všechny SO	0,1%
33	Povrchy komunikací	M - silnice a.s., IČO: 42196868	Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž - východ - Říkovice	Všechny SO	0,1%
34	Povrchy komunikací	EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924	Stavba dálnice D47 Bohumín– státní hranice Česko/Polsko	Všechny SO	0,1%
35	Zkušební laboratoř	SQZ, s.r.o. IČO: 25743554 Ing. Jiří Prokop, MBA	Rychlostní komunikace R35 – dále viz příloha	Všechny SO	0,03%
36	Zkušební laboratoř	Qualiform Slovakia s.r.o. IČO:28311060 Ing. Jan Jašek	Dálnice D47 – dále viz příloha	Všechny SO	0,03%
37	Archeologický dozor	Archeologické centrum Olomouc, příspěvková	Viz příloha	Všechny SO	0,06%

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke SMLouvě o dílo

		organizace IČO: 75008271 PhDr. Jaroslav Peška Ph.D.			
38	Geodetické práce	Geodézie Cindr s.r.o. IČO: 02967723 Ing. Miloslav Cindr	ČOV Česká Třebová – dále viz příloha	Všechny SO	0,09%
39	Kamerové zkoušky, zkoušky těsnosti	Medřa stavební s.r.o. IČO: 01857401 Jaroslav Medřický	Viz. příloha	Všechny SO	0,03%
40	Kamerové zkoušky, zkoušky těsnosti	BMH spol. s r.o. IČO: 42869668 Ing. Leoš Kutner Ing. Ivo Mrázek	ENERGOAQUA a.s. Rožnov p. Radhoštěm	Všechny SO	0,03%
41	Provedení štětových stěn	KELLER- speciální zakládání, spol. s r.o. IČO: 49702190 Dipl.Ing. Andreas Körbler	Dálniční most na D47 přes řeku Veličku - pažení stavební jámy – dále viz příloha	SO 4B.007 SO 4B.008 SO 4B.010 SO 4B.011 SO 4B.012 SO 4B.013	0,03%

Celkem za dílčí podprojekt	28,2%
Celkem za dílčí projekt	10,0%



Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Formulář: Předpokládané subdodávky, organizační schéma

Plánuje-li zhotovitel zadat část zakázky jako subdodávku – je povinen subdodavatele následujícím způsobem identifikovat:

dílčí podprojekt	5 MĚSTO LOŠTICE REKONSTRUKCE A DOPLNĚNÍ KANALIZACE
------------------	--

Pořadové číslo Druhu prací, které hodlá zadavatel zadat	Práce, které zhotovitel hodlá zadat jako subdodávku jiným osobám ¹	Identifikace subdodavatele ²	Zkušenosti subdodavatele v obdobných zakázkách ³	Dílčí stavební objekt potenciální realizace subdodávky ⁴	Objem subdodávky v % z nabídkové ceny ⁵
1	Lokalita - Loštice - Nábřežní sběrač - pokládka kanalizace, zemní práce	MODOS spol. s r.o., IČO: 00576832 Ing. Petr Stejskal Zdeněk Černocký Ing. Pavel Stejskal	Skrbeň - Splašková kanalizace – dále viz příloha	SO 5.001	0,6%
2	Lokalita - Loštice - Nábřežní sběrač - pokládka kanalizace, zemní práce	INSTA CZ s.r.o., IČO: 25374311 Jan Všetická	Kanalizace a ČOV Křelov - Břuchotín – dále viz příloha	SO5.001	0,6%
3	Lokalita - Loštice - pravý břeh - pokládka kanalizace,	MODOS spol. s r.o., IČO: 00576832	Skrbeň - Splašková kanalizace –	SO 5.002	1,4%

¹ Osoba podzhotovitele uvedená v seznamu potenciálních podzhotovitelů musí odpovídat podmínkám uvedeným ve smlouvě o dílo

² Uvedení úplné identifikace předpokládaného podzhotovitele, včetně statutárních zástupců. V příloze formuláře bude k předpokládanému subdodavateli přiloženo jeho čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči státním institucím, bezúhonnosti, ekonomické způsobilosti... (viz formulář uvedený v zadávacím řízení na zhotovitele - svazek č. 1)

³ Součástí formuláře a dokumentů uvedených při identifikaci zadavatele – viz poznámka 2), bude uveden základní list referencí potenciálního subdodavatele s uvedením referencí vztahujících se k předpokládanému druhu a rozsahu prací subdodávky (je možno uvést i reference klíčových pracovníků subdodavatele z odlišných společností. Součástí předpokládaných referencí bude soupis základního vybavení předpokládaného podzhotovitele, které bude využito při realizaci předpokládané subdodávky.

⁴ Bude uvedena přiměřená identifikace stavebních objektů (podle identifikačního označení uvedeného v rozpočtu akce – přílohy uzavřené smlouvy)

⁵ Bude uvedeno procento zaokrouhlené na 1 desetinné místo z celkového finančního objemu zakázky (tj. celé dílčí stavby – buď „JIH“ nebo „SEVER“ v cenách odpovídajících smluvní ceně zhotovitele (bez započítání rezerv). Pokud bude uvažováno o více potenciálních podzhotovitelích, je objem subdodávky platný pro součet všech potenciálních subdodavatelů uvedených k identifikovanému druhu prací, které hodlá zhotovitel zadat

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

	zemní práce	Ing. Petr Stejskal Zdeněk Černocký Ing. Pavel Stejskal	dále viz příloha		
4	Lokalita - Loštice - pravý břeh - pokládka kanalizace, zemní práce	INSTA CZ s.r.o., IČO: 25374311 Jan Všetická	Kanalizace a ČOV Křelov - Břuchotín— dále viz příloha	SO5.002	1,4%
5	Lokalita - ul. U rybníku, ul. U valchy - pokládka kanalizace, zemní práce	AVJ-STAVBY s.r.o. IČO: Bc. Andrej Peňák	Jaroměřice - Za Tvrzí, Infrastruktura - vodovod, kanalizace, plynovod — dále viz příloha	SO 5.003	0,3%
6	Lokalita - ul. U rybníku, ul. U valchy - pokládka kanalizace, zemní práce	INSTA CZ s.r.o., IČO: 25374311 Jan Všetická	Kanalizace a ČOV Křelov - Břuchotín— dále viz příloha	SO5.003	0,3%
7	Lokalita - ul. Kašparová, Ztracená	AVJ-STAVBY s.r.o. IČO: Bc. Andrej Peňák	Jaroměřice - Za Tvrzí, infrastruktura - vodovod, kanalizace, plynovod — dále viz příloha	SO 5.004	0,1%
8	Lokalita - ul. Kašparová, Ztracená	INSTA CZ s.r.o., IČO: 25374311 Jan Všetická	Kanalizace a ČOV Křelov - Břuchotín— dále viz příloha	SO5.004	0,1%
9	Lokalita - ul. Palackého - pokládka kanalizace, zemní práce	WOMBAT, s.r.o., IČO: 47912553 Ing. Petr Holeš	Kanalizace a ČOV Křelov - Břuchotín— dále viz příloha	SO 5.005	0,05%
10	Lokalita - ul. Palackého - pokládka kanalizace, zemní práce	INSTA CZ s.r.o., IČO: 25374311 Jan Všetická	Kanalizace a ČOV Křelov - Břuchotín— dále viz příloha	SO 5.005	0,05%
11	Lokalita - Žadlovice - pokládka kanalizace, zemní práce	MODOS spol. s r.o., IČO: 00576832 Ing. Petr Stejskal Zdeněk	Skrbeň - Splašková kanalizace — dále viz příloha	SO 5.006	0,5%

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

		Černocký Ing. Pavel Stejskal			
12	Lokalita - Žadlovice - pokládka kanalizace, zemní práce	INSTA CZ s.r.o., IČO: 25374311 Jan Všeticka	Kanalizace a ČOV Křelov - Břuchotín – dále viz příloha	SO 5.006	0,5%
13	Loštice – kanalizace - technologie ČS vč. elektra	ZEMSKÝ Rohatec, IČO: 25729331	Kanallzace a ČOV Brodek u Přerova – dále viz příloha	SO 5.007	0,3%
14	Loštice – kanalizace - technologie ČS vč. elektra	VODA CZ s.r.o. IČO: 25969692 Ing. Jan Švorčík Jan Beran	Kanalizace a ČOV Žleby	SO 5.007	0,3%
15	Čerpací stanice ČS02, ČS04, ČS05, ČS06 - elektrotechnologická část	ZEMSKÝ Rohatec, IČO: 25729331 Mojmír Dobeš	Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova – dále viz příloha	SO 5.008	0,2%
16	Čerpací stanice ČS02, ČS04, ČS05, ČS06 - elektrotechnologická část	VODA CZ s.r.o. IČO: 25969692 Ing. Jan Švorčík Jan Beran	Kanalizace a ČOV Žleby	SO 5.008	0,2%
17	Přípojka vody pro ČS 05 - kompletní provedení	MODOS spol. s r.o., IČO: 00576832 Ing. Petr Stejskal Zdeněk Černocký Ing. Pavel Stejskal	Skrbeň - Splašková kanalizace – dále viz příloha	SO 5.008	0,04%
18	Přípojka vody pro ČS 05 - kompletní provedení	INSTA CZ s.r.o., IČO: 25374311 Jan Všeticka	Kanalizace a ČOV Křelov - Břuchotín – dále viz příloha	SO 5.008	0,04%
19	Přípojky NN pro ČS - elektromontáže	ELPREMO, spol. s r.o. IČO: 42869951 Jan Skřivan Přemysl Obdržálek	Česká Třebová – kanalizace a ČOV – dále viz příloha	SO 5.009	0,008%
20	Přípojky NN pro ČS - elektromontáže	ELZACO spol. s r.o. IČO: 19013108	ČS Mohelnice, Jesenická ulice – dále viz	SO 5.009	0,02%

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke SMLouvě o dílo

		Jiří Vénos	příloha		
21	Příjezdové komunikace a zpevněné plochy pro ČS02-ČS06 - živičné povrchy	STRABAG a.s., IČO: 60838744 Ing. Svatopluk Novák Ing. Zbyněk Planka Ing. Vítězslav Bujnoch	Výstavba místních komunikací a inženýrských sítí – obec Hevlín – dále viz příloha	SO 5.010	0,01%
22	Příjezdové komunikace a zpevněné plochy pro ČS02-ČS06 - živičné povrchy	KARETA s.r.o., IČO: 62360213 Ing. Zdenek Němec Ing. Marek Němec	Dolany - Průtah - I.etapa	SO 5.010	0,01%
23	Příjezdové komunikace a zpevněné plochy pro ČS02-ČS06 - živičné povrchy	Skanska a.s., IČO: 26271303	Jižní obchvat Olomouce	SO 5.010	0,01%
24	Příjezdové komunikace a zpevněné plochy pro ČS02-ČS06 - živičné povrchy	M - silnice a.s., IČO: 42196868	Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž - východ - Říkovice	SO 5.010	0,01%
25	Příjezdové komunikace a zpevněné plochy pro ČS02-ČS06 - živičné povrchy	EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924	Stavba dálnice D47 Bohumín – státní hranice Česko/Polsko	SO 5.010	0,01%
26	Výtlaky odpadních vod - pokládka kanalizace, zemní práce	AVJ-STAVBY s.r.o. IČO: Bc. Andrej Peňák	Jaroměřice - Za Tvrzí, infrastruktura - vodovod, kanalizace, plynovod – dále viz příloha	SO 5.011	0,1%
27	Výtlaky odpadních vod - pokládka kanalizace, zemní práce	VK – AQUA OLOMOUC, spol. s r.o., IČO: 25371878 Ing. Roman Papica	Odkanalizování obce Dlouhomilov – dále viz příloha	SO 5.011	0,1%
28	Čerpací stanice - strojně-technologická část	ZEMSKÝ Rohatec, IČO: 25729331 Mojmír Dobeš	Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova – dále viz příloha	PS 5.101	0,1%

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke SMLouvě o dílo

29	Čerpací stanice - strojně- technologická část	ELPREMO, spol. s r.o. IČO: 42869951 Jan Skřivan Přemysl Obdržálek	Česká Třebová – kanalizace a ČOV – dále viz příloha	PS 5.101	0,1%
30	Čerpací stanice - strojně- technologická část	VODA CZ s.r.o. IČO: 25969692 Ing. Jan Švorčík Jan Beran	Kanalizace a ČOV Žleby	PS 5.101	0,1%
31	Čerpací stanice – elektrotechnologická část	ZEMSKÝ Rohatec, IČO: 25729331 Mojmír Dobeš	Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova – dále viz příloha	PS 5.102	0,02%
32	Čerpací stanice – elektrotechnologická část	ELPREMO, spol. s r.o. IČO: 42869951 Jan Skřivan Přemysl Obdržálek	Česká Třebová – kanalizace a ČOV – dále viz příloha	PS 5.102	0,02%
33	Čerpací stanice – dispečink a rádiový přenos dat	ZEMSKÝ Rohatec, IČO: 25729331 Mojmír Dobeš	Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova – dále viz příloha	PS 5.103	0,04%
34	Čerpací stanice – dispečink a rádiový přenos dat	ELPREMO, spol. s r.o. IČO: 42869951 Jan Skřivan Přemysl Obdržálek	Česká Třebová – kanalizace a ČOV – dále viz příloha	PS 5.103	0,04%
35	Přeložky plynovodů	Kavoplyn s.r.o. IČO: 27794946 Luboš Makáň Roman Horký	Rekonstrukce NTL Mohelnice, ul. Staškova	Všechny SO	0,09%
36	Přeložky plynovodů	PLYNOMONT spol. s r.o. IČO: 45196265 Radovan Batta	SMP Net, s.r.o. - REKO MS Mohelnice – Masarykova +2 – dále viz příloha	Všechny SO	0,09%
37	Povrchy komunikací	STRABAG a.s., IČO: 60838744 Ing. Svatopluk Novák Ing. Zbyněk Planka Ing. Vítězslav	Výstavba místních komunikací a inženýrských sítí – obec Hevlín – dále viz příloha	Všechny SO	0,1%


Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

		Bujnoch			
38	Povrchy komunikací	KARETA s.r.o., IČO: 62360213 Ing. Zdenek Němec Ing. Marek Němec	Dolany - Průtah - I.etapa	Všechny SO	0,1%
39	Povrchy komunikací	Skanska a.s., IČO: 26271303	Jižní obchvat Olomouce	Všechny SO	0,1%
40	Povrchy komunikací	M - silnice a.s., IČO: 42196868	Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž - východ - Říkovice	Všechny SO	0,1%
41	Povrchy komunikací	EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924	Stavba dálnice D47 Bohumín- státní hranice Česko/Polsko	Všechny SO	0,1%
42	Zkušební laboratoř	SQZ, s.r.o. IČO: 25743554 Ing. Jiří Prokop, MBA	Rychlostní komunikace R35 – dále viz příloha	Všechny SO	0,03%
43	Zkušební laboratoř	Qualiform Slovakia s.r.o. IČO:28311060 Ing. Jan Jašek	Dálnice D47 – dále viz příloha	Všechny SO	0,03%
44	Archeologický dozor	Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace IČO: 75008271 PhDr. Jaroslav Peška Ph.D.	Viz příloha	Všechny SO	0,06%
45	Geodetické práce	Geodézie Cindr s.r.o. IČO: 02967723 Ing. Miloslav Cindr	ČOV Česká Třebová – dále viz příloha	Všechny SO	0,09%
46	Kamerové zkoušky, zkoušky těsnosti	Medřa stavební s.r.o. IČO: 01857401 Jaroslav Medřický	Viz. příloha	Všechny SO	0,03%
47	Kamerové zkoušky, zkoušky těsnosti	BMH spol. s r.o. IČO: 42869668	ENERGOAQUA a.s. Rožnov p. Radhoštěm	Všechny SO	0,03%

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke SMLouvě o dílo


		Ing. Leoš Kutner Ing. Ivo Mrázek			
48	Provedení štětových stěn	KELLER- speciální zakládání, spol. s r.o. IČO: 49702190 Dipl.Ing. Andreas Körbler	Dálniční most na D47 přes řeku Veličku - pažení stavební jámy – dále viz příloha	SO 5.007 SO 5.008	0,01%

Celkem za dílčí podprojekt	29,2%
Celkem za dílčí projekt	9,3%




Investor: Vodohospodářské zařízení Šumperk a.s.

Localización del Proyecto

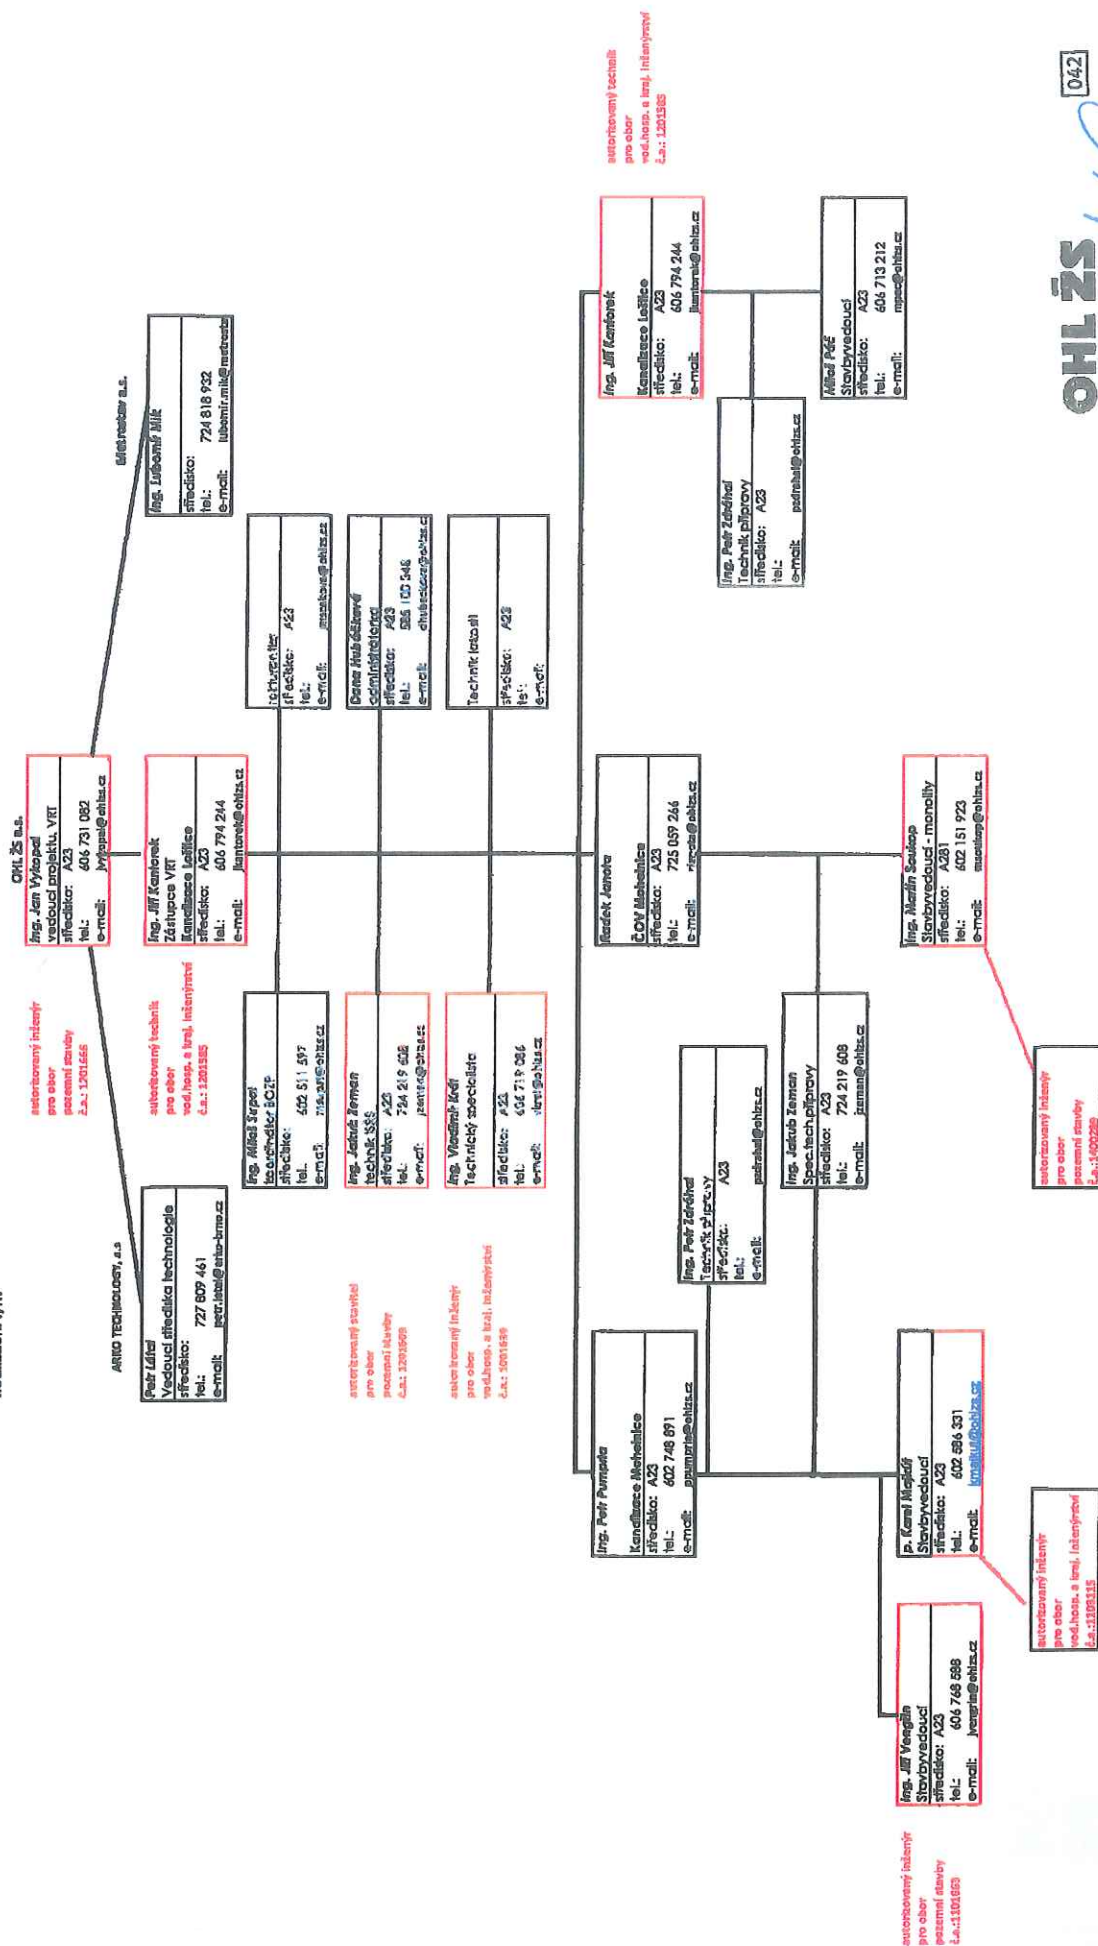

THE WIN!

OHLŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverř
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

042

PŘÍLOHA č. 4

PROFESNÍ KVALIFIKACE UCHAZEČE

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Navrhovaná pozice ve smlouvě:

1. Příjmení: Kantorek
2. Jméno: Jiří
3. Datum a místo narození: 7.5.1978, Valašské Meziříčí, ČR
4. Státní příslušnost: ČR
5. Rodinný stav: Ženatý
Adresa (tel/fax/e-mail): Burešova 938/17, Brno 602 00, ČR
Tel.: +420 541 100 345, e-mail: jkantorek@ohlzs.cz

6. Dosažené vzdělání:

Instituce:	VŠB - TU Ostrava, fakulta stavební Obor: Průmyslové a pozemní stavby
Datum:	
Od (měsíc/rok)	09/1999
Do (měsíc/rok)	06/2005
Stupeň (titul):	Ing. Autorizovaný technik od 04/2007 Autorizace ve Slovinsku – více paní Řehůrková

7. Jazyková znalost (na stupnici od 1 do 5, kde 5 je nejvyšší):

Jazyk	Úroveň	Pasivně	Slovem	Písmem
Český	Mateřský jazyk	5	5	5
Anglický		2	0	2
Německý		3	1	3

8. Členství v odborných organizacích: ČKAIT

9. Jiné dovednosti (počítačová gramotnost atd.): MS Office, Windows, Internet, ArchiCad, MicroStation,

10. Současná pozice: Stavbyvedoucí

11. Počet let profesních zkušeností: 13 let (pozn, VŠB TUO – forma studia kombinovaná - při zaměstnání)

12. Klíčové kvalifikace: Vodohospodářské stavby

13. Specifické zkušenosti v zahraničí: nejsou

Země	Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok)	Název a stručný popis projektu
------	--------------------------------------	--------------------------------

14. Profesní zkušenosti:

Datum: (od měsíc/rok do měsíc/rok)	8/1999 – 3/2003
Místo:	Šumperk, Jilová 2, ČR
Společnost / organizace:	Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Pozice:	Technický pracovník provozní divize - operátor GISu
Popis pracovního místa: (včetně staveb)	pořizování, zpracování dat v Geografickém informačním systému, provozní evidence, archiv provozní divize

Datum: (od měsíc/rok do měsíc/rok)	5/2003
Místo:	Olomouc, Litovelská 12, ČR
Společnost / organizace:	LB 2000, s.r.o.,
Pozice:	Přípravář staveb
Popis pracovního místa: (včetně staveb)	sestavování rozpočtů podle PD, oceňování výkazu výměr

Datum: (od měsíc/rok do měsíc/rok)	7/2003 – 3/2006
Místo:	Olomouc, Tovární 41, ČR
Společnost / organizace:	Středomoravská vodárenská, a.s.
Pozice:	Specialista oddělení technicko provozní činnosti
Popis pracovního místa: (včetně staveb)	dozorování staveb ze strany provozovatele, vyjadřování k PD k ÚŘ a SR, účast při kolaudačních řízeních, určení možnosti napojení na vodovod a kanalizaci, informace o existenci zařízení v provozování společnosti

Datum: (od měsíc/rok do měsíc/rok)	4/2006 – 9/2007
Místo:	Brno, ČR
Společnost / organizace:	OHL ŽS, a.s. (dříve ŽS Brno, a.s.)
Pozice:	Stavbyvedoucí

Popis pracovního místa: (včetně staveb) <i>Profesní zkušenost uvedena ve formátu: název stavby (celková doba realizace, náklady stavby) - popř. vymezení konkrétního časového období a úseku/objektu, na kterém se pracovník v rámci stavby podílel.</i>	vedení pracovníku společnosti, koordinace stavební činnosti subdodavatelů, kontrola provedených stavebních prací dle položkových rozpočtů, zpracování rozpočtu v průběhu realizace, příprava staveb, porovnávání a vyhodnocování cenových nabídek dodavatelů <i>Tlaková kanalizace, vodovod a ČOV Štěpánov (04/2006-12/2006, 95 mil. Kč)</i> <i>Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy (01/2007-12/2008, 450 mil. Kč). Do 09/2007</i>
--	---

Datum: (od měsíc/rok do měsíc/rok)	10/2007 – 12/2008
Místo:	Olomouc, Tovární 41, ČR
Společnost / organizace:	Moravská vodárenská, a.s
Pozice:	Specialista provozního útvaru
	dozorování staveb financovaných s fondu soudržnosti ze strany budoucího provozovatele, účast při komplexních zkouškách a kontrolních dnech, kontrola vypouštění odpadních vod z nemovitostí – uzavírání přihlášek

Datum: (od měsíc/rok do měsíc/rok)	1/2009 – do současnosti
Místo:	Brno, ČR
Společnost / organizace:	OHL ŽS, a.s. (dříve ŽS Brno, a.s.)
Pozice:	Stavbyvedoucí

Popis pracovního místa: (včetně staveb) <i>Profesní zkušenost uvedena ve formátu: název stavby (celková doba realizace, náklady stavby) - popř. vymezení konkrétního časového období a úseku/objektu, na kterém se pracovník v rámci stavby podílel.</i>	spolupráce s objednateli stavebních zakázek, finanční plánování, kontrola výnosů a nákladů akce, provedení soupisů provedených prací, sledování a vyhodnocování postupů prací dle harmonogramu prací dle, řízení kolektivu společnosti, výběr a koordinace subdodavatelů, kontrola dodržování bezpečnostních opatření, zpracování rozpočtů pro změnové řízení staveb <i>Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně (01/2009-08/2009, 21 mil. Kč)</i> <i>Olomouc – Ulice Přichystalova – rekonstrukce komunikace (09/2009-08/2010, 75 mil. Kč)</i> <i>Silnice III/44311 Dolany – průtah 1. Etapa (09/2010-08/2011, 33 mil. Kč)</i> <i>Olomouc – Přeložka sběrače C – ul. Velkomoravská (06/2011-04/2012, 71 mil. Kč)</i> <i>Silnice III/44311 Dolany – průtah 2. Etapa (09/2011-05/2012, 21 mil. Kč)</i> <i>Bedihošť - Průtah 1. Etapa (07/2012-11/2012, 24 mil. Kč)</i> <i>Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova místní část Luková (03/2012-06/2013, 112,8 mil. Kč)</i>
--	---

15. Jiné:

Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, č. certifikátu ČKAIT – 1201585, udělen 04/2007

Podpis:



OHL ŽS, a.s.

(osoba nebo osoby oprávněné podepsat jménem uchazeče)

Datum: 22.3.2013

DIPLOM

Jiří Kantorek

narozen 7. května 1978, Valašské Meziříčí

získal(a) vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru

Průmyslové a pozemní stavitelství

studium v magisterském studijním programu

Pozemní stavby a architektura

na Fakultě stavební

Podle § 46 odst. 4a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů se mu(ji) uděluje

akademický titul „inženýr“ ve zkratce „Ing.“ uváděné před jménem.



prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
rektor




doc. Ing. Alois Materna, CSc. MBA
děkan

V Ostravě dne 31. 5. 2005

Číslo diplomu: FAST109T/2005



PŘÍLOHA č. 6

A 000275

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 29112

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě,
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jiří Kantorek

jméno a příjmení

780507/5883

rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

**stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
specializace stavby zdravotnětechnické**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1201585

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 13.4.2007



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT
