

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2016/1015/0512

o dodávce stavebních prací uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník
na realizaci zakázky „**FC Nasavrky – rekonstrukce fotbalového hřiště**“

Smluvní strany

Objednatel:

název: **FC Nasavrky, z.s.**
sídlo: Nasavrky 297, 538 25 Nasavrky
IČ: 150 54 535
statutární orgán: Ing. Tomáš Michek, předseda spolku
bankovní spojení: ČS, a.s., číslo účtu 1143064399/0800
gsm: +420 777 192 110
e-mail: fcnasavrky@gmail.com; michek.tomas@gmail.com

Zhotovitel:

název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
IČ: 252 53 361
zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
statutární orgán: Ing. Martin Kvirenc – předseda představenstva
tel., fax: 466 791 111
mobil: 724 615 588
e-mail: info@cht-pce.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen "smlouva"), kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy.

I. Předmět plnění

Článek I základní smlouvy se na základě dohody smluvních stran doplňuje a upřesňuje následovně s tím, že provedené plnění dle tohoto dodatku se stane plně funkční součástí celého díla.

Specifikace předmětu se nově doplňuje:

Dle Změnového listu č. 1:

- součástí předmětu díla je výměna stávajících brankových konstrukcí za nové;
- dodávka a montáž záchytných konstrukcí za brankami;
- doplnění brány a branky do záchytné konstrukce tréninkového hřiště;

Dle Změnového listu č. 2:

- výměna nevyhovujícího zábradlí kolem travnatého hřiště za nové hliníkové;
- navržená závlaha je nahrazena automatickou závlahou;
- úprava rozsahu dodávky a montáže oplocení, které bylo již podél silnice I. třídy vyměněno;

Dle Změnového listu č.3:

- navýšení rozsahu drenážního systému a drenážní vrstvy v objektu SO 02 – Travnaté hřiště;

Dle Změnového listu č.4:

- doplnění sádrokartonových podhledů v koupelnách a chodbě SO 01 – Rekonstrukce tribuny.

II. Cena díla

Vzhledem ke změně předmětu smlouvy dle článku I tohoto dodatku se zvýší cena díla o 1 521 096 Kč bez DPH

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	15 534 537,- Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	1 521 096,- Kč
Cena celkem bez DPH	17 055 633,- Kč
DPH v zákonné výši 21%	3 581 683,- Kč
Cena včetně DPH	20 637 316,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a zbývající dva zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Přílohy:

- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2
- Změnový list č. 3
- Změnový list č. 4

V Nasavrkách, dne 14.12.2018

v Pardubicích, dne 14.12.2018

za objednatele:

za zhotovitele:



FC Nasavrky, z.s.
Nasavrky 297, 538 25 Nasavrky
IČO: 15054535

FC Nasavrky, z.s.
Ing. Tomáš Michek, předseda spolku


Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice DIČ: CZ15253361
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 351
IČ: 25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Závní Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002


Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: č. 1

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Investor: **FC Nasavrky, z.s.** Datum: 10.10.2018Název akce: **FC Nasavrky – rekonstrukce fotbalového hřiště**Způsob odeslání / předání datum: poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: **ZL č. 1 - rozpočet**
na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

ZL č. 1 – Doplnkové konstrukce fotbalových hřišť

Popis a zdůvodnění změny:



Dle pokynu objednatele dojde k výměně stávajících brankových konstrukcí za nové. Dále dojde k doplnění záchytných konstrukcí za brankami přírodního hřiště. Do oplocení tréninkového hřiště bude vložena obslužná brána a branka.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:

zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby:
souhlasí s výše uvedeným**Stanovisko projektanta stavby:**
souhlasí s výše uvedeným

Příloha: 1) ZL č.1 – rozpočet
2) Technický popis fotbalové branky
2) Technický popis záchytné konstrukce za brankami

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 1
Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	10.10.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla a veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Předmět změny: ZL č. 1 – Doplnkové konstrukce fotbalových hřišť Popis a zdůvodnění změny: Dle pokynu objednatele dojde k výměně stávajících brankových konstrukcí za nové. Dále dojde k doplnění záchytných konstrukcí za brankami přírodního hřiště. Do oplocení tréninkového hřiště bude vložena obslužná brána a branka.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	339 830 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Podpis technického dozoru investora:	
339 830 Kč	Ing. Lukáš Bezdíček Datum: 10.10.2018 	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
  FC Nasavrky, z.s. Nasavrky 297, 538 25 Nasavrky IČO: 15054535	 Chládek & Tintěra PARDUBICE tel.: +420 466 311 111 fax: +420 466 311 361 IČ: 25253361 DIČ: CZ25253361 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pardubice, Zámek Ptákovský, K Václavské 2077, PSČ 530 02	
Ing. Tomáš Michek Datum: 10.10.2018	Ing. Jaroslav Barton Datum: 10.10.2018	

Příloha č.1 - Doplnkové konstrukce fotbalových hřišť

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Ród:

Stavba: Rekonstrukce fotbalového hřiště

JKSO:

Místo: Nasavrky

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Fotbalový klub FC Nasavrky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

339 830,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

339 830,00

DPH základní
snižena

21,00%
15,00%

Ze
ze

339 830,00
#ODKAZ!

71 364,30

Cena s DPH

v

CZK

411 194,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

0

Stavba:

Rekonstrukce fotbalového hřiště

Místo:

Nasavrky

Datum:

Objednatel:

Fotbalový klub FC Nasavrky

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Vícepráce		339 830,00	411 194,30
1	Branky	83 567,00	101 116,07
2	Záchytný systém za brankami	212 422,00	257 030,62
3	Brána, branka v oplocení tréninkového hřiště	43 841,00	53 047,61

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce fotbalového hřiště

Objekt: Brána, branka v oplocení tréninkového hřiště

Místo:

Datum:

Objednatel: Fotbalový klub FC Nasavrky

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 841,00

HSV - Práce a dodávky HSV

43 841,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce


43 841,00

K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	4,000	255,00	1 020,00
M	553423291	sloupek pro branku a bránu	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
K	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
M	553000005	brana ocelová otočná 2,40/2,40m	kus	1,000	21 255,00	21 255,00
K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,000	846,00	846,00
M	553000001	branka ocelová otočná 1,0/1,80m	kus	1,000	6 720,000	6 720,00

1. FOTBALOVÉ BRANKY V ZEMNÍCH POUZDRECH S VOLNÝM ZAVĚŠENÍM SÍTĚ (TYP 1)



- dle EN 748, [GS certifikace](#), dle předpisu FIFA a FAČR
- rám branky v rozích svařen
- oválný Al profil 105 x 100 mm
- velmi tuhá konstrukce skrze několikanásobné vnitřní žebrování
- včetně tyčí volného zavěšení sítě
- možnost uchycení sítě systémem SimplyFix jako doplňková výbava
- zemní rám, hloubka 2 m – jako doplňková výbava



Profil 105 x 100 mm



SimplyFix

Varianta č. 2

Č. výr.: 0124 - fotbalová branka v rozích svařená, bíle lakovaná, se systémem uchycení sítě SimplyFix, bez tyčí volného zavěšení sítě


1. ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

Sloupy pro záchytný systém:

- mimořádně stabilní hliníkové profily
- barva přírodní hliník
- dodávka se zemními pouzdry, hloubka 500 mm
- sloupy oválného profilu 120x100 mm

Příčnky:

- zvyšují stabilitu konstrukce
- jednoduchá montáž, s drážkou pro háčky sítě
- zlepšují tuhost a vzhled celé konstrukce

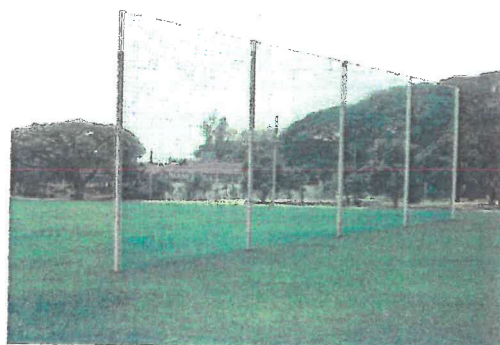

Celková délka záchytného systému: 2 x 27 m

1 záchytný systém: délka 27 m, rozestup sloupů: 4,5 m, 7 ks sloupů, 6 ks příčníků, 1 ks záchytné síť
vč. upínacího systému (vysokopevnostní polypropylen, síla 4 mm, zelená barva, oko 120 x 120 mm)

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 2	
Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.		
Investor:	FC Nasavrky, z.s.	Datum: 12.10.2018	
Název akce: FC Nasavrky – rekonstrukce fotbalového hřiště			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 2 - rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL č. 2 – Změna zábradlí, závlahy, oplocení Popis a zdůvodnění změny: V době mezi vznikem dokumentace, vydáním stavebního povolení a přidělením dotace, vzniklo několik skutečností, které ovlivnili předmět a cenu díla vázanou na smlouvu o dílo. <u>Stávající stav:</u> 1) Stávající zábradlí kolem travnatého hřiště bylo ve výše uvedeném období z důvodu přístupu techniky při údržbě travnaté plochy odstraněno – za brankami ze 100 procent. Ve zbylé části zábradlí byla zastižena silná koroze a bylo doporučeno provést výměnu zábradlí za nové. 2) Rozvod vody pro navrženou závlahu hřiště byl veden uvnitř stávajícího zábradlí. Z důvodu výměny zábradlí za jiný systém, nelze závlahu dle stávajícího návrhu provést. 3) V období uvedeném výše bylo nutno řešit havarijní stav oplocení v délce 102 metrů podél silnice I. třídy výměnou oplocení za nové. Z toho důvodu bude rozsah oplocení dle smlouvy o dílo ponížen o tento úsek. <u>Navrhovaný stav:</u> 1) Dle předpisů FAČR pro pořádání fotbalových utkání, musí být zamezen přístup diváků na fotbalové hřiště. Toto bude zajištěno novým hliníkovým zábradlím v rozsahu dle přiloženého rozpočtu. 2) Navržená závlaha byla nahrazena automatickou závlahou, která je v dnešní době a při tomto způsobu rekonstrukce standartní.			

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:


zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby:


souhlasí s výše uvedeným

Stanovisko projektanta stavby:

souhlasí s výše uvedeným



Příloha: 1) ZL č.2 – rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č. 2

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Změnový list vystavil: Zhotovitel

Datum: 12.10.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla a veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Předmět změny:

ZL č. 2 – Změna zábradlí, závlahy, oplocení

Popis a zdůvodnění změny:

V době mezi vznikem dokumentace, vydáním stavebního povolení a přidělením dotace, vzniklo několik skutečností, které ovlivňují předmět a cenu díla vázanou na smlouvu o dílo.

Stávající stav:

- 1) Stávající zábradlí kolem travnatého hřiště bylo ve výše uvedeném období z důvodu přístupu techniky při údržbě travnaté plochy odstraněno – za brankami ze 100 procent. Ve zbylé části zábradlí byla zastižena silná koroze a bylo doporučeno provést výměnu zábradlí za nové.
- 2) Rozvod vody pro navrženou závlahu hřiště byl veden uvnitř stávajícího zábradlí. Z důvodu výměny zábradlí za jiný systém, nelze závlahu dle stávajícího návrhu provést.
- 3) V období uvedeném výše bylo nutno řešit havarijní stav oplocení v délce 102 metrů podél silnice I. třídy výměnou oplocení za nové. Z toho důvodu bude rozsah oplocení dle smlouvy o dílo ponížen o tento úsek.

Navrhovaný stav:

- 1) Dle předpisů FAČR pro pořádání fotbalových utkání, musí být zamezen přístup diváků na fotbalové hřiště. Toto bude zajištěno novým hliníkovým zábradlím v rozsahu dle přiloženého rozpočtu.
- 2) Navržená závlaha byla nahrazena automatickou závlahou, která je v dnešní době a při tomto způsobu rekonstrukce standardní.

Cena méněprací bez DPH:

308 107,30 Kč

Cena víceprací bez DPH:

513 874,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

205 766,70 Kč

Podpis technického dozoru investora:

Ing. Lukáš Bezdíček

Datum: 12.10.2018

Podpis zmocněnce objednatele:



FC Nasavrky, z.s.
Nasavrky 297, 538 25 Nasavrky
IČO: 15054535

Ing. Tomáš Michek

Datum: 12.10.2018

Podpis zmocněnce zhotovitele:



(259) **Chládek a Tintěra**
PARDUBICE
tel.: +420 466 781 111
fax: +420 466 310 351
e: 26263351
223253351

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, ul. 17. listopadu 2077, Pobožice

Ing. Jaroslav Barton

Datum: 12.10.2018

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

DÍČ:

Cena s DPH	v	CZK	248 977,71
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

0

Stavba: Rekonstrukce fotbalového hřiště

Místo:

Nasavrky

Datum:

Objednatel:

Fotbalový klub FC Nasavrky

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Vícepráce		513 874,00	621 787,54
1	Automatická závlaha travnatého hřiště	353 209,00	427 382,89
2	Zábradlí kolem travnatého hřiště	160 665,00	194 404,65
Méněpráce		-308 107,30	-372 809,83
3	SO 02 Zábradlí pro travnaté hřiště - Repase	-114 264,00	-138 259,44
4	SO 05 Závlaha	-168 773,77	-204 216,26
5	SO 04 Oplocení	-25 069,53	-30 334,13
Celkové náklady za Změnový list č. 2		205 766,70	248 977,71

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce fotbalového hřiště

Objekt: SO 04 Zábradlí pro travnaté hřiště - odpočet

Místo: Datum: 12.10.2018

Objednatel: Fotbalový klub FC Nasavrky

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-114 264,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **-114 264,00**

767 - Konstrukce zámečnické **-114 264,00**

0	K	767161116R	Repase stávajícího zábradlí	kg	-2 229,000	46,00	-102 534,00
0	K	767995106	Nový nátěry OK	m2	-115,000	102,00	-11 730,00

Zavlažování hřiště SO 05

800-1	Zemní práce	-	30 535,92 Kč
827-1	Podkladní konstrukce	-	62 314,08 Kč
827-1	Montáž potrubí	-	16 036,57 Kč
	Specifikace hmot	-	59 887,20 Kč

GZS

Celkově bez DPH

-168 773,77 Kč

Celkově s DPH

15 _ SO05_Zavlaž systém

P. Č.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M. J.	Množ	Cena	celkem	Hmot	Hmot. Cel
Zemní práce								
1	119 00-1401	Dočasné zajištění potrubí ocelového DN do 200	m	-2	176,00 Kč	- 352,00 Kč	0,008	-0,016
2	119 00-1422	Dočasné zajištění kabelů přes 3 do 6. kabelů	m	-3	192,80 Kč	- 578,40 Kč	0,060	-0,180
3	132 20-1201	Hloubení rýh do 2 m v horninách 3 do 100 m	m ³	-54	200,00 Kč	- 10 800,00 Kč	0,000	0,000
4	132 20-1209	Příplatek za lepidlo	m ³	-54	9,60 Kč	- 518,40 Kč	0,000	0,000
5	133 20-1101	Hloubení šachet v horninách 3 do 100 m	m ³	-1	520,00 Kč	- 520,00 Kč	0,000	0,000
6	151 10-1101	Zřízení pažení rýh pro podzemní vedení příložené do 2 m	m ²	-120	16,00 Kč	- 1 920,00 Kč	0,001	-0,120
7	151 10-1111	Odstranění pažení stěn rýh příložené do 2 m	m ²	-120	8,00 Kč	- 960,00 Kč	0,000	0,000
8	161 10-1101	Svislé přemístění výkopu z horniny 1-4 do 2,5 m	m ³	-54	32,00 Kč	- 1 728,00 Kč	0,000	0,000
9	162 30-1102	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1-4 do 1000 m	m ³	-23	144,00 Kč	- 3 312,00 Kč	0,000	0,000
10	167 10-1101	Nakládání výkopku množství do 100 m hornin 1-4	m ³	-23	40,00 Kč	- 920,00 Kč	0,000	0,000
11	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	-23	12,00 Kč	- 276,00 Kč	0,000	0,000
12	174 10-1101	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam a šachet	m ³	-77	60,00 Kč	- 4 620,00 Kč	0,000	0,000
13	Př.cena	Poplatek za skládku zeminy	t	-32	120,00 Kč	- 3 840,00 Kč	0,000	0,000
14	998 27 -6101	Přesun hmot	t	-0,316	604,80 Kč	- 191,12 Kč	0,000	0,000
SOUČET						- 30 535,92 Kč		-0,316
Podkladní konstrukce								
1	451 57-3111	Lože pod potrubí z písku a štěrkopísku a obsyp	m ³	-23	552,00 Kč	- 12 696,00 Kč	1,890	-43,470
2	892 24-1111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	-483	16,00 Kč	- 7 728,00 Kč	0,000	0,000
4	892 37-2111	Zabezpečení konců při tlak. Zkoušce do DN 300	kus	-9	2 800,00 Kč	- 25 200,00 Kč	0,052	-0,468
5	892 23-3111	Proplach a dezinfekce vodovodu do DN 80	m	-483	20,00 Kč	- 9 660,00 Kč	0,000	0,000
6	998 27 -6101	Přesun hmot	t	-43,938	160,00 Kč	- 7 030,08 Kč	0,000	0,000
SOUČET						- 62 314,08 Kč		-44,374
Montáž potrubí								
1	871 15-1121	Montáž potrubí z polyetylenu φ 20 mm	m	-20	15,20 Kč	- 304,00 Kč	0,000	0,000
2	871 16-1121	Montáž potrubí z polyetylenu φ 32 mm	m	-145	17,60 Kč	- 2 552,00 Kč	0,000	0,000
3	871 17-1121	Montáž potrubí z polyetylenu φ 40 mm	m	-320	20,80 Kč	- 6 656,00 Kč	0,000	0,000
4	891 15-3111	Montáž ventilů pro přípojky DN 20	kus	-15	228,00 Kč	- 3 420,00 Kč	0,001	-0,015
5	891 18-3111	Montáž ventilů pro přípojky DN 40	kus	-3	368,00 Kč	- 1 104,00 Kč	0,001	-0,003
6	893 81-2112	Montáž šachet z plastu do hloubky 1,4 m	kus	-1	1 056,00 Kč	- 1 056,00 Kč	0,362	-0,362
7	př.cena	Montáž domovní vodárny	kus	-1	520,00 Kč	- 520,00 Kč	0,322	-0,322

15 SO05 Zavlaž systém

8	998 27 -6101	Přesun hmot	t	-0,702	604,80 Kč	-	424,57 Kč	0,000	0,000
SOUCET							16 036,57 Kč		-89,330
Materiál									
1	př. Cena	Drenážní potrubí DN 40	m	-6	20,00 Kč	-	120,00 Kč	0,001	-0,006
2	722 13-0232	Potrubí z trub závitových pozinkovaných DN 20	m	-2	158,40 Kč	-	316,80 Kč	0,001	-0,002
3	722 13-0234	Potrubí z trub závitových pozinkovaných DN 32	m	-2	196,00 Kč	-	392,00 Kč	0,001	-0,002
4	722 13-0235	Potrubí z trub závitových pozinkovaných DN 40	m	-7	260,00 Kč	-	1 820,00 Kč	0,001	-0,007
5	př. Cena	Potrubí Pe D25x2,3(DN20)	kus	-20	20,00 Kč	-	400,00 Kč	0,008	-0,160
6	př. Cena	Potrubí Pe D40x3,7(DN32)	kus	-145	29,60 Kč	-	4 292,00 Kč	0,020	-2,900
7	př. Cena	Potrubí Pe D50x4,6(DN40)	kus	-320	52,00 Kč	-	16 640,00 Kč	0,006	-1,920
8	př. Cena	Dg přechod DN 20	kus	-6	228,00 Kč	-	1 368,00 Kč	0,004	-0,024
9	př. Cena	Dg přechod DN 40	kus	-12	368,00 Kč	-	4 416,00 Kč	0,004	-0,048
10	899 62-3131	Betonové sächty 30x30x30 cm-množství betonu	m3	-0,5	2 880,00 Kč	-	1 440,00 Kč	0,004	-0,002
11	př. Cena	Plastová jímka DN 1000, 80 cm hloubka s poklopem k pojezd	kus	-1	7 680,00 Kč	-	7 680,00 Kč	0,000	0,000
12	př. Cena	Domovní vodárna Q=2,5-3 l/s H=35-40 m	kus	-1	5 200,00 Kč	-	5 200,00 Kč	0,002	-0,002
13	př. Cena	Poklop 30/30 plech 5mm	kus	-6	388,00 Kč	-	2 328,00 Kč	0,002	-0,012
14	722 22-4111	Závitové kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	-6	116,00 Kč	-	696,00 Kč	0,002	-0,012
15	722 22-4112	Závitové kohouty plnicí a vypouštěcí G 3/4	kus	-3	134,40 Kč	-	403,20 Kč	0,002	-0,006
16	722 23-2043	kulový ventil G 20 s připojením na hadici	kus	-6	151,20 Kč	-	907,20 Kč	0,002	-0,012
17	722 23-2043	kulový ventil G 40	kus	-3	368,00 Kč	-	1 104,00 Kč	0,003	-0,009
18	př. Cena	Trojcestný ventil DN 40 s připojením na plasty se servomotore	kus	-1	3 880,00 Kč	-	3 880,00 Kč	0,003	-0,003
19	př. Cena	Filtr závitový DN 40	kus	-1	328,00 Kč	-	328,00 Kč	0,003	-0,003
20	998 27 -6101	Přesun hmot	t	-5,13	1 200,00 Kč	-	6 156,00 Kč	0,000	0,000
SOUCET							59 887,20 Kč		-5,113

ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt: SO 04 Oplocení varianta - odpočet

Místo: Nasavrky Datum: 12.10.2018

Objednavatel: FC Nasavrky

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-25 069,53

HSV - Práce a dodávky HSV

-25 069,53

1 - Zemní práce

-2 937,26

1	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 33*0,3*0,3*0,7	m3	-2,079	588,00	-1 222,45
2	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	-2,079	69,00	-143,45
3	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,079	108,00	-224,53
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-2,079	51,00	-106,03
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 2,079*1,8	t	-3,760	330,00	-1 240,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-20 958,00

6	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	-33,000	126,00	-4 158,00
7	M	553422550	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm	kus	-30,000	138,000	-4 140,00
8	M	553422630	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm	kus	-1,000	153,600	-153,60
9	M	553422740	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm	kus	-2,000	133,200	-266,40
14	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	-102,000	70,80	-7 221,60
15	M	313247740	pletivo čtyřhranné pozinkované pletené 55 x 55 / 2,15 výška 180 cm	m	-102,000	45,600	-4 651,20
16	M	156153000	drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m 102*1,8	m	-306,000	1,200	-367,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-1 174,27

99 - Přesuny hmot a sutí

-1 174,27

17	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	-6,116	192,00	-1 174,27
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt: Automatická závlaha hřiště 12+3

Místo: Nasavrky

Datum: 12.10.2018

Objednavatel: FC Nasavrky

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

353 209,00

HSV - Práce a dodávky HSV

353 209,00

1 - Zemní práce - bez sejmutí ornice

53 910,00

1	Vytýčení tras potrubí a postřikovačů	kpl	1,000	300,00	300,00
2	Hloubení rýhy hl 0,40,š.0,15 m	bm	430,000	55,00	23 650,00
3	Zasyp potrubí a kabelu neosouhranými materiálem	bm	430,000	17,00	7 310,00
4	Zához a hutnění výkopů	bm	430,000	25,00	10 750,00
5	Úvoz a vyrovnání přebytečného vykopku na stavěništi	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
6	Ruční hloubení jam pro postřikovače	ks	12,000	250,00	3 000,00
7	Drenáž pro postřikovače	ks	12,000	200,00	2 400,00
8	Dodávka písku pro pískování (do 10km)	m3	12,000	250,00	3 000,00

2 - Potrubí, armatury

35 460,00

9	Rozváděcí potrubí 63 PN 10/PE-HD	bm	450,000	42,00	18 900,00
10	Fitinky	kpl	1,000	7 560,00	7 560,00
11	Montáž	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00

3 - Postřikovače, ventilové šachty

152 110,00

12	Výšečový postřikovač LVZR WVAC	ks	12,000	8 250,00	99 000,00
13	Celokruhový postřikovač LVZR SVAC	ks	3,000	8 850,00	26 550,00
14	Ventilová šachta VBS 250 x 390	ks	1,000	670,00	670,00
15	Kloubová spojka (Swing Joint) 6/4"	ks	15,000	800,00	12 000,00
16	Instalace postřikovače	ks	15,000	890,00	13 350,00
17	Instalace šachet	ks	1,000	540,00	540,00

4 - Akumulace, ovládací systém

35 710,00

18	Řídící jednotka WaterControl	ks	1,000	8 050,00	8 050,00
19	Rozšiřovací modul 4	ks	3,000	1 420,00	4 260,00
20	Čidlo srážek Mini Click I	ks	1,000	1 050,00	1 050,00
21	Ovládací kabel 5 x 1.5 mm ²	m	800,000	20,00	16 000,00
22	Kabelová spojka DBY	ks	30,000	45,00	1 350,00
23	Instalace ovládání, ventilů, ovládacích kabelů	h	20,000	250,00	5 000,00

5 - Čerpací stanice - bez elektrické přípojky a zdroje vody

76 019,00

24	Čerpadlo Q= 14m3/h H=75m	ks	1,000	31 780,00	31 780,00
25	35l stojatá tlaková nádoba 10bar	ks	1,000	2 470,00	2 470,00
26	Rozvaděč elektro, hlídání suchoběhu	ks	1,000	21 900,00	21 900,00
27	Kabely k čerpadlu a sondám	kpl	1,000	4 389,00	4 389,00
28	Armatury vystrojení	ks	1,000	5 900,00	5 900,00
29	Filtrace	ks	1,000	4 580,00	4 580,00
30	Montáž, oživení	h	20,000	250,00	5 000,00

ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt: Zábradlí kolem travnatého hřiště

Místo: Nasavrky

Datum: 12.10.2018

Objednavatel: FC Nasavrky

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady z rozpočtu

160 665,00

HSV - Práce a dodávky HSV

160 665,00

1 - Zemní práce

15 250,00

1	Hloubení děr pro sloupky 0,3 x 0,7 m	ks	61,000	250,00	15 250,00
---	--------------------------------------	----	--------	--------	-----------

2 - Materiál

112 780,00

2	Beton CP20	m3	4,500	2 700,00	12 150,00
---	------------	----	-------	----------	-----------



3	Zábradlí "Standard" - hliník přírodní	bm	173,500	580,00	100 630,00
---	---------------------------------------	----	---------	--------	------------


3 - Postřikovače, ventilové šachty

32 635,00

4	Montáž sloupků	ks	61,000	350,00	21 350,00
---	----------------	----	--------	--------	-----------

5	Montáž tvarovek a madel	ks	61,000	185,00	11 285,00
---	-------------------------	----	--------	--------	-----------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 3	
Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.		
Investor:	FC Nasavrky, z.s.	Datum: 14.11.2018	
Název akce: FC Nasavrky – rekonstrukce fotbalového hřiště			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 3 - rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: ZL č.3 – Doplnění drenážního systému a drenážní vrstvy v SO 02 Popis a zdůvodnění změny: Po sejmutí ornice v prostoru původního travnatého hřiště byly zastiženy nepředvídatelné geotechnické poměry, které po provedení doplňkového geotechnického průzkumu vedou k následujícím změnám v provádění díla. 1) Původní systém příčných drénu bude změněn za podélný a bude proveden v celé ploše hřiště. Podélné drény budou vedeny svodnému drénu za jednou z branek. Napříč hřiště bude zhotoven doplňkový svodný drén, který z důvodu velké délky podélných drénů těmto drénům odlehčí. 2) Bude provedeno navýšení drenážní štěrkopískové vrstvy na 130 mm.			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává:			
		zhotovitel	
Stanovisko technického dozoru stavby:		 souhlasí s výše uvedeným	
Stanovisko projektanta stavby:		 souhlasí s výše uvedeným	
Příloha: 1) ZL č.3 – rozpočet 2) geotechnický průzkum			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: č. 3	
Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	14.11.2018		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla a veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Předmět změny: ZL č.3 – Doplnění drenážního systému a drenážní vrstvy v SO 02 Popis a zdůvodnění změny: Po sejmutí ornice v prostoru původního travnatého hřiště byly zastiženy nepředvídatelné geotechnické poměry, které po provedení doplňkového geotechnického průzkumu vedou k následujícím změnám v provádění díla. 1) Původní systém příčných drénů bude změněn za podélný a bude proveden v celé ploše hřiště. Podélné drény budou vedeny svodnému drénu za jednou z branek. Napříč hřiště bude zhotoven doplňkový svodný drén, který z důvodu velké délky podélných drénů těmto drénům odlehčí. 2) Bude provedeno navýšení drenážní štěrpkové vrstvy na 130 mm.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč		921 598,37 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Podpis technického dozoru investora:	
921 598,37 Kč		Ing. Lukáš Bezdíček Datum: 14.11.2018 	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
  FC Nasavrky, z.s. Nasavrky 297, 538 25 Nasavrky IČO: 15054535		 Chládek a Tintěra PARDUBICE tel.: +420 466 791 111 fax: +420 466 319 361 IČ: 25253361 DIČ: CZ25253361 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Průmyslová, K Vápenice 2077, PSČ 53002	
Ing. Tomáš Michek Datum: 14.11.2018		Ing. Jaroslav Barton Datum: 14.11.2018	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:Rekonstrukce fotbalového hřiště

Objekt:SO 02 Travnaté hřiště včetně drenáže-sběrných drénů - **doplnění drenážního systému a drenážní vrstvy**

JKSO:CC-CZ:

Místo:Datum:

Objednatel:IC:

Fotbalový klub FC NasavrkyDIČ:

Zhotovitel:IC:

DIČ:

Projektant:IC:

DIČ:

Zpracovatel:IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu921 598,37

Cena bez DPH921 598,37

DPH základní21,00%ze921 598,37193 535,66

Cena s DPHv CZK1 115 134,03

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce fotbalového hřiště

Objekt: SO 02 Travnaté hřiště včetně drenáže-sběrných drénů - doplnění drenážního systému a drenážní vrstvy

Místo:

Datum:

Objednatel: Fotbalový klub FC Nasavrky

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu **921 598,37**

HSV - Práce a dodávky HSV 921 598,37

1 - Zemní práce 709 070,37

2 - Zakládání 198 528,00

8 - Trubní vedení 14 000,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce fotbalového hřiště

Objekt: SO 02 Travnaté hřiště včetně drenáže-sběrných drénů - doplnění drenážního systému a drenážní vrstvy

Místo:

Datum:

Objednatel: Fotbalový klub FC Nasavrky

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

921 598,37

HSV - Práce a dodávky HSV

921 598,37

1 - Zemní práce

709 070,37

3	K	132101102	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 100 m3 "Hloubení svodného drénu od šachty Š2 k revizní šachtě" (23,00*0,6*1,5) "Hloubení svodného drénuě" (172,00*0,6*1,5) "Hloubení podélných sběrných drénů 12 ks" 12*(106,00*0,4*0,60) "V původním rozsahu díla" Součet	m3	244,200	95,00	23 199,00
6	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	244,200	154,00	37 606,80
4	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "Hloubení revizní šachty" (3,14*1,2*1,2)*1,2*2ks "V původním rozsahu díla" Součet	m3	7,234	280,00	2 025,52
5	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	7,234	113,00	817,44
7	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 244,2+7,234 Součet	m3	251,434	65,00	16 343,21
120	K	180404112R	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu včetně filtrační drenážní vrstvy 150 mm, vegetační vrstvy "Filtrační drenážní vrstva - písek 0/4 pro filtrační vrstvu, hrubé rozhrnutí, rovnání, ruční dorovnání - navýšení mocnosti vrstvy z 50 mm na 130 mm vykazován pouze rozdíl"	m2	7 776,000	80,90	629 078,40

2 - Zakládání

198 528,00

8	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop "Sběrný dreny podélné 11 ks"	m	590,000	282,00	166 380,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			12*106		1 272,000		
			"V původním rozsahu díla"				
					-682,000		
			Součet		590,000		
9	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	114,000	282,00	32 148,00
			"Svodný dren z hřiště do Revizní šachty"				
			172		172,000		
			"V původním rozsahu díla"				
					-58,000		
			Součet		114,000		
			8 - Trubní vedení				14 000,00
13	K	894215111	Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s litinovým poklopem	m3	1,000	14 000,00	14 000,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: č. 4

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Investor: **FC Nasavrky, z.s.**

Datum: 27.11.2018

Název akce: **FC Nasavrky – rekonstrukce fotbalového hřiště**Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

ZL č. 4 - rozpočet

Předmět změny:

ZL č. 4 – Doplnění SDK podhledu v koupelnách a chodbě

Popis a zdůvodnění změny:

Dle pokynu objednatele dojde doplnění SDK podhledu včetně tepelné izolace v koupelnách (m.č. 1.12, 1.15, 1.18, sprcha rozhodčí) a k doplnění SDK podhledu na chodbě (m.č. 1.03, 1.04). V místech uzavíracích armatur budou do SDK podhledu osazena revizní dvířka.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:

zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasí s výše uvedeným

Stanovisko projektanta stavby:

souhlasí s výše uvedeným

Příloha: 1) ZL č.4 - rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 4
Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	27.11.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla a veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. ZL č. 4 – Doplnění SDK podhledu v koupelnách a chodbě Popis a zdůvodnění změny: Dle pokynu objednatele dojde doplnění SDK podhledu včetně tepelné izolace v koupelnách (m.č. 1.12, 1.15, 1.18, sprcha rozhodčí) a k doplnění SDK podhledu na chodbě (m.č. 1.03, 1.04). V místech uzavíracích armatur budou do SDK podhledu osazena revizní dvířka.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
17 199 Kč	71 099,64 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Podpis technického dozoru investora:	
53 900,64 Kč	 Ing. Lukáš Bezdíček Datum: 27.11.2018	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
  FC Nasavrky, z.s. Nasavrky 297, 538 25 Nasavrky IČO: 15054535	 tel.: +420 466 791 111 fax: +420 466 310 361 IČ: 13953391 DIČ: CZ2223244 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pardubice, Zámek Pardubice, K Václavce 2677; PSČ 53002	
Ing. Tomáš Michek Datum: 27.11.2018	Ing. Jaroslav Barton Datum: 27.11.2018	

Příloha č.1 - Doplnění SDK pohledů

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce fotbalového hřiště

Objekt: SO 01 Rekonstrukce tribuny - SDK pohled

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

Fotbalový klub FC Nasavrky

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

53 900,64

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

53 900,64

DPH základní

21,00%

ze

53 900,64

11 319,13

snižena

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

65 219,77

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce fotbalového hřiště

Objekt: SO 01 Rekonstrukce tribuny - SDK podhled

Místo:

Datum:

Objednatel: Fotbalový klub FC Nasavrky

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 900,64

HSV - Práce a dodávky HSV

-17 199,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-17 199,00

64	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-66,150	50,00	-3 307,50
65	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-66,150	145,00	-9 591,75
66	K	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-66,150	65,00	-4 299,75

PSV - Práce a dodávky PSV

71 099,64

763 - Konstrukce suché výstavby

71 099,64

			SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	28,450	608,00	17 297,60
			SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	37,700	652,00	24 580,40
			Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	37,700	34,60	1 304,42
			<i>plst' skelná pro izolaci mezi krokve $\lambda=0,036$ tl 200mm</i>	m2	<i>45,240</i>	<i>188,00</i>	<i>8 505,12</i>
			D+M parotěsné zábrany Nicobar	m2	79,380	45,00	3 572,10
			D+M revizních dvířek SDK kci vel. 400x400 mm	kus	8,000	1 550,00	12 400,00
			D+M revizních dvířek SDK kci vel. 400x600 mm	kus	2,000	1 720,00	3 440,00

8

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/1015/0512

o dodávce stavebních prací uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník
na realizaci zakázky „**FC Nasavrky – rekonstrukce fotbalového hřiště**“

Smluvní strany

Objednatel:

název: **FC Nasavrky, z.s.**
sídlo: Nasavrky 297, 538 25 Nasavrky
IČ: 150 54 535
statutární orgán: Ing. Tomáš Michek, předseda spolku
bankovní spojení: ČS, a.s., číslo účtu 1143064399/0800
gsm: +420 777 192 110
e-mail: fcnasavrky@gmail.com; michek.tomas@gmail.com

Zhotovitel:

název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
IČ: 252 53 361
zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
statutární orgán: Ing. Martin Kvirenc – předseda představenstva
tel., fax: 466 791 111
mobil: 724 615 588
e-mail: info@cht-pce.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen "smlouva"), kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy.

I. Termín plnění

Po dohodě obou smluvních stran se článek II. Termín plnění základní smlouvy zcela vypouští a nahrazuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Předpoklad zahájení doby plnění: 20.08.2018

Předpoklad ukončení doby plnění: 17.12.2018

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

8)

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a zbývající dva zhotovitel.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Nasavrkách, dne 20. 7. 2018


v Pardubicích, dne 13. 7. 2018

za objednatele:

za zhotovitele:



FC Nasavrky, z.s.
Ing. Tomáš Michek, předseda spolku



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/1015/0512

o dodávce stavebních prací uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník
na realizaci zakázky „**FC Nasavrky – rekonstrukce fotbalového hřiště**“

Smluvní strany

Objednatel:

název: **FC Nasavrky, z.s.**
sídlo: Nasavrky 297, 538 25 Nasavrky
IČ: 150 54 535
statutární orgán: Ing. Tomáš Michek, předseda spolku
bankovní spojení: ČS, a.s., číslo účtu 1143064399/0800
gsm: +420 777 192 110
e-mail: fcnasavrky@gmail.com; michek.tomas@gmail.com

Zhotovitel:

název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
IČ: 252 53 361
zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
statutární orgán: Ing. Martin Kvirenc – předseda představenstva
Ing. Pavel Šťastný – člen představenstva
tel., fax: 466 791 111
mobil: 724 615 588
e-mail: info@cht-pce.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy.

II. Termín plnění

Po dohodě obou smluvních stran se článek II. Termín plnění základní smlouvy zcela vypouští a nahrazuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Předpoklad zahájení doby plnění: květen 2018

Předpoklad ukončení doby plnění: srpen 2018

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.

XIII. Ostatní ujednání

Po dohodě obou smluvních stran se článek XIII. Ostatní ujednání základní smlouvy rozšiřuje o tento odstavec:

„Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.“

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a zbývající dva zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Nasavrkách, dne 7.8.2017

V Pardubicích, dne 7.8.2017

za objednatele:

za zhotovitele:


FC Nasavrky, z.s.
Nasavrky 297, 538 25 Nasavrky
IČO: 15054535 ①

.....

FC Nasavrky, z.s.
Ing. Tomáš Michek, předseda spolku


Chládek a Tintěra
PARDUBICE
tel.: +420 466 791 11*
fax: +420 466 310 36*
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

.....

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
