


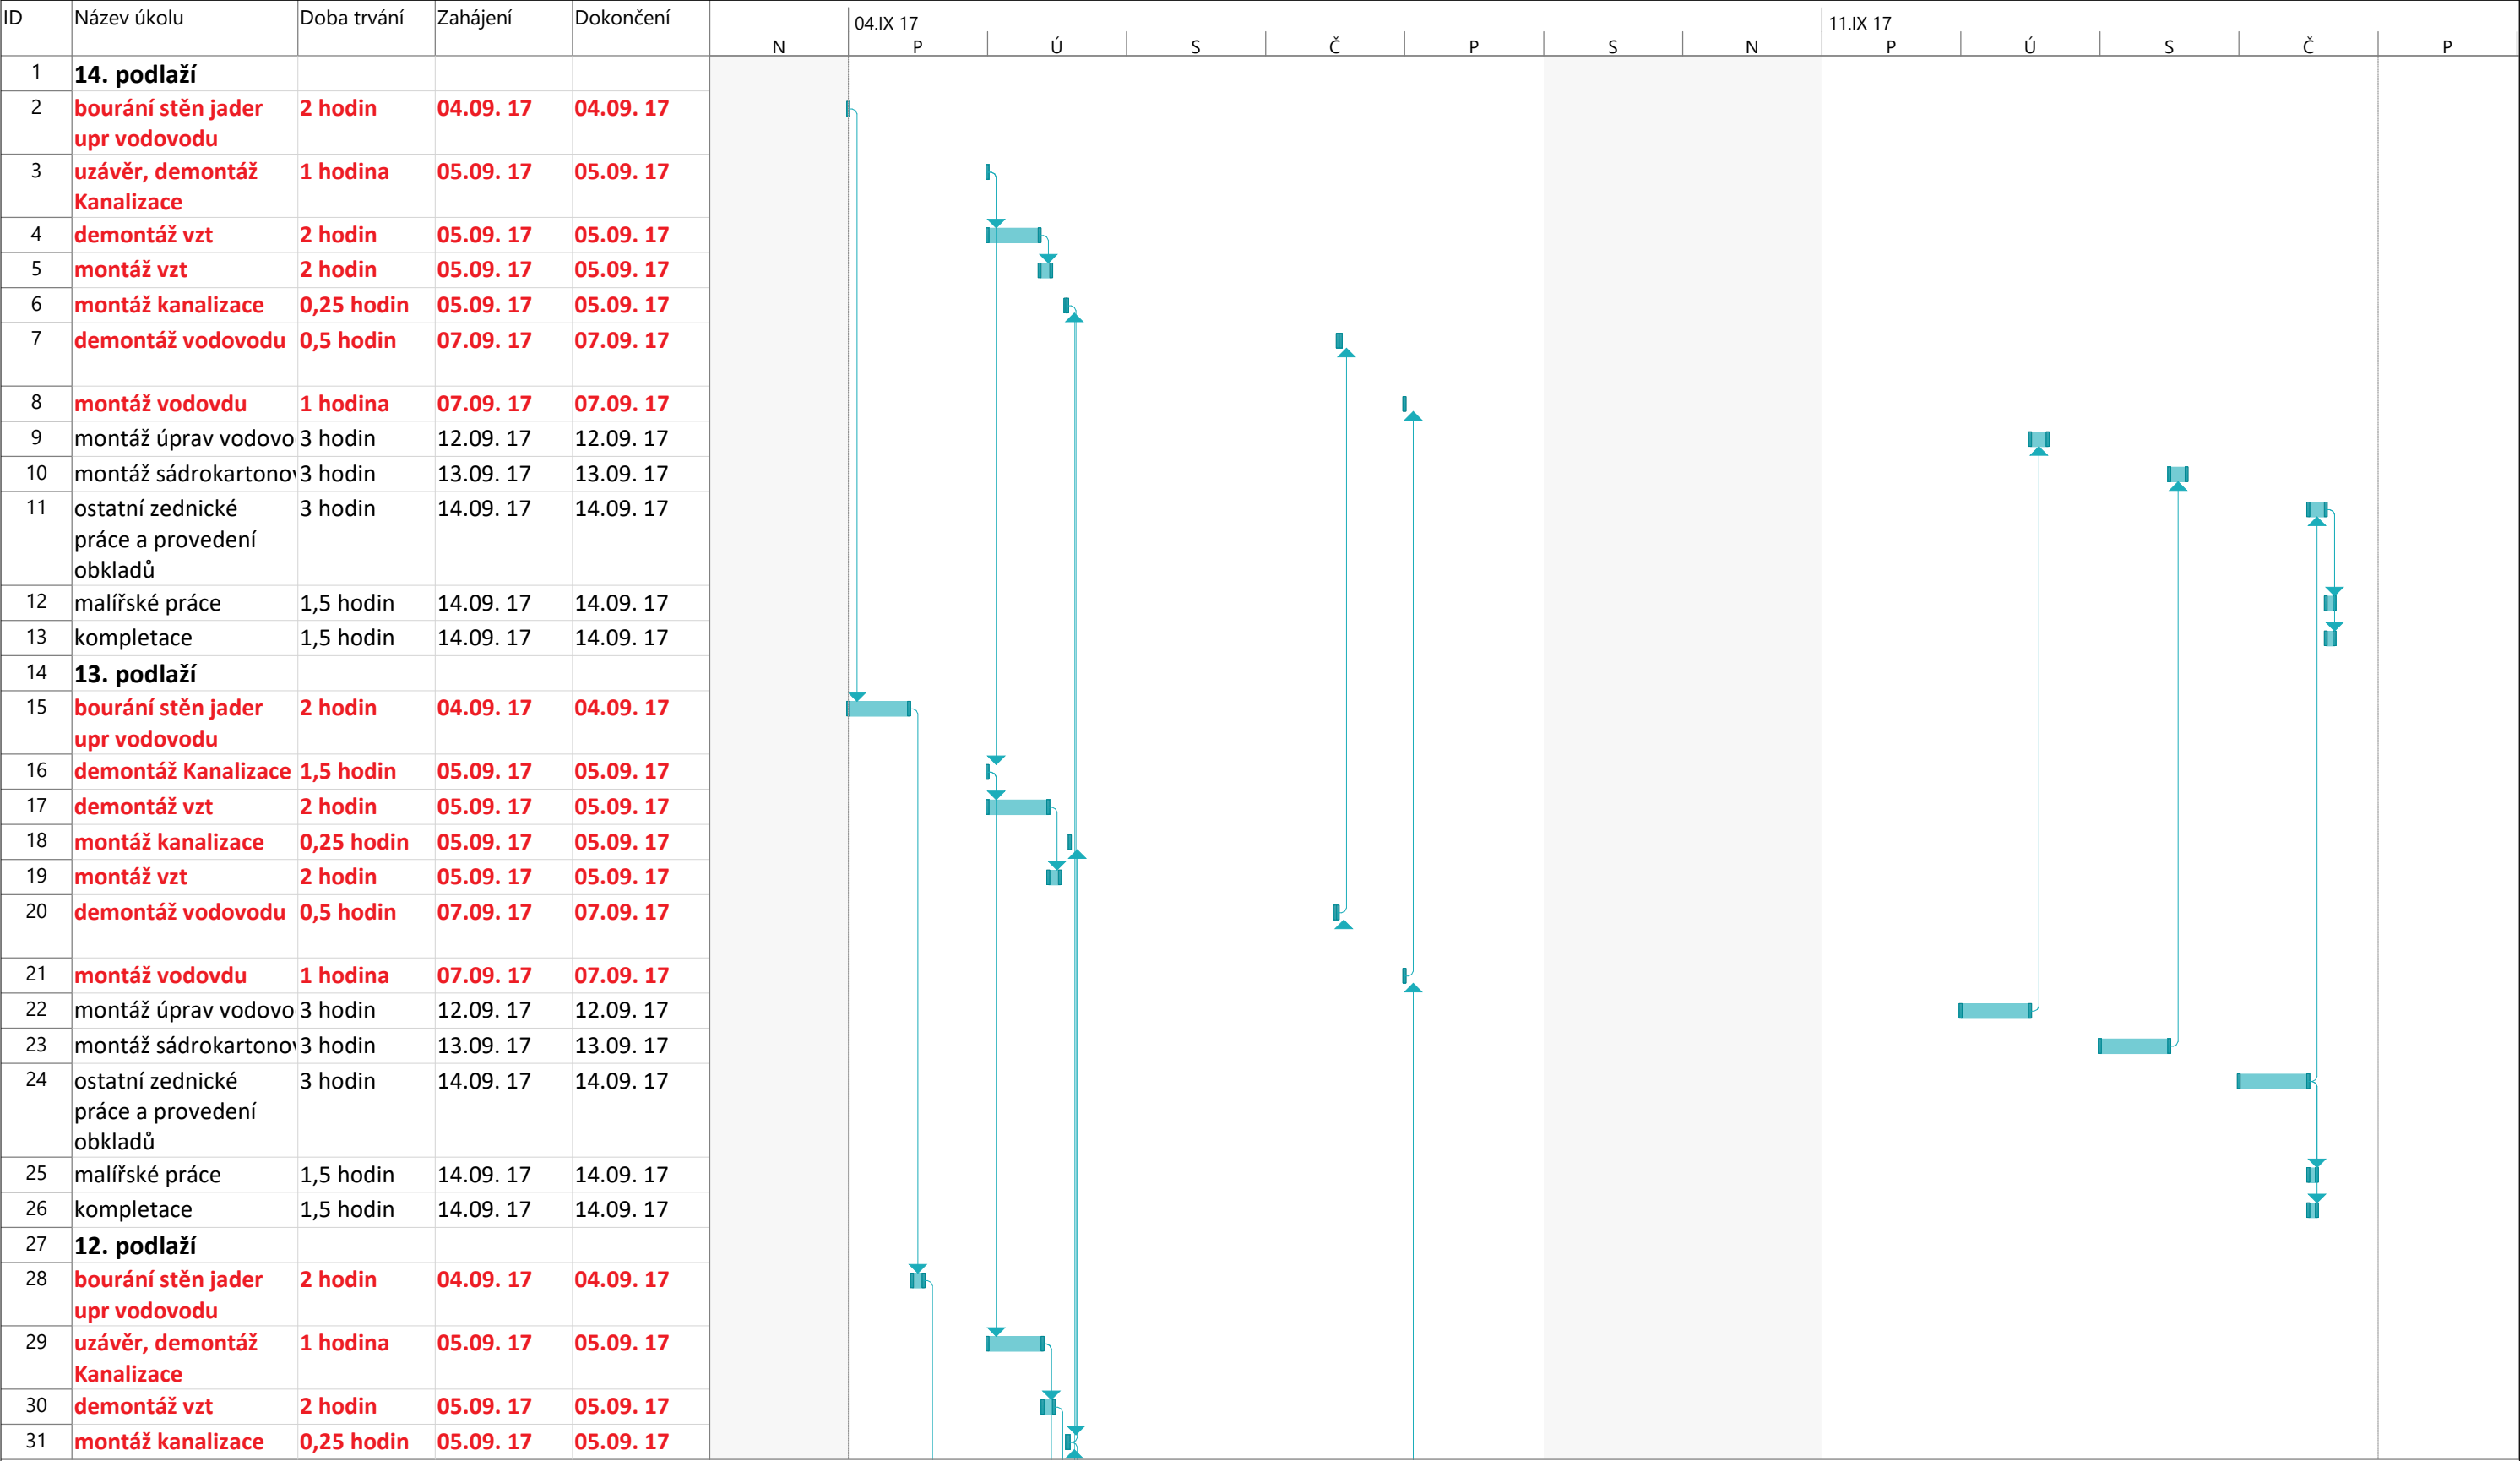

Projekt: Rýmařovská 475-5
Datum: 22.05. 17

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení


Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

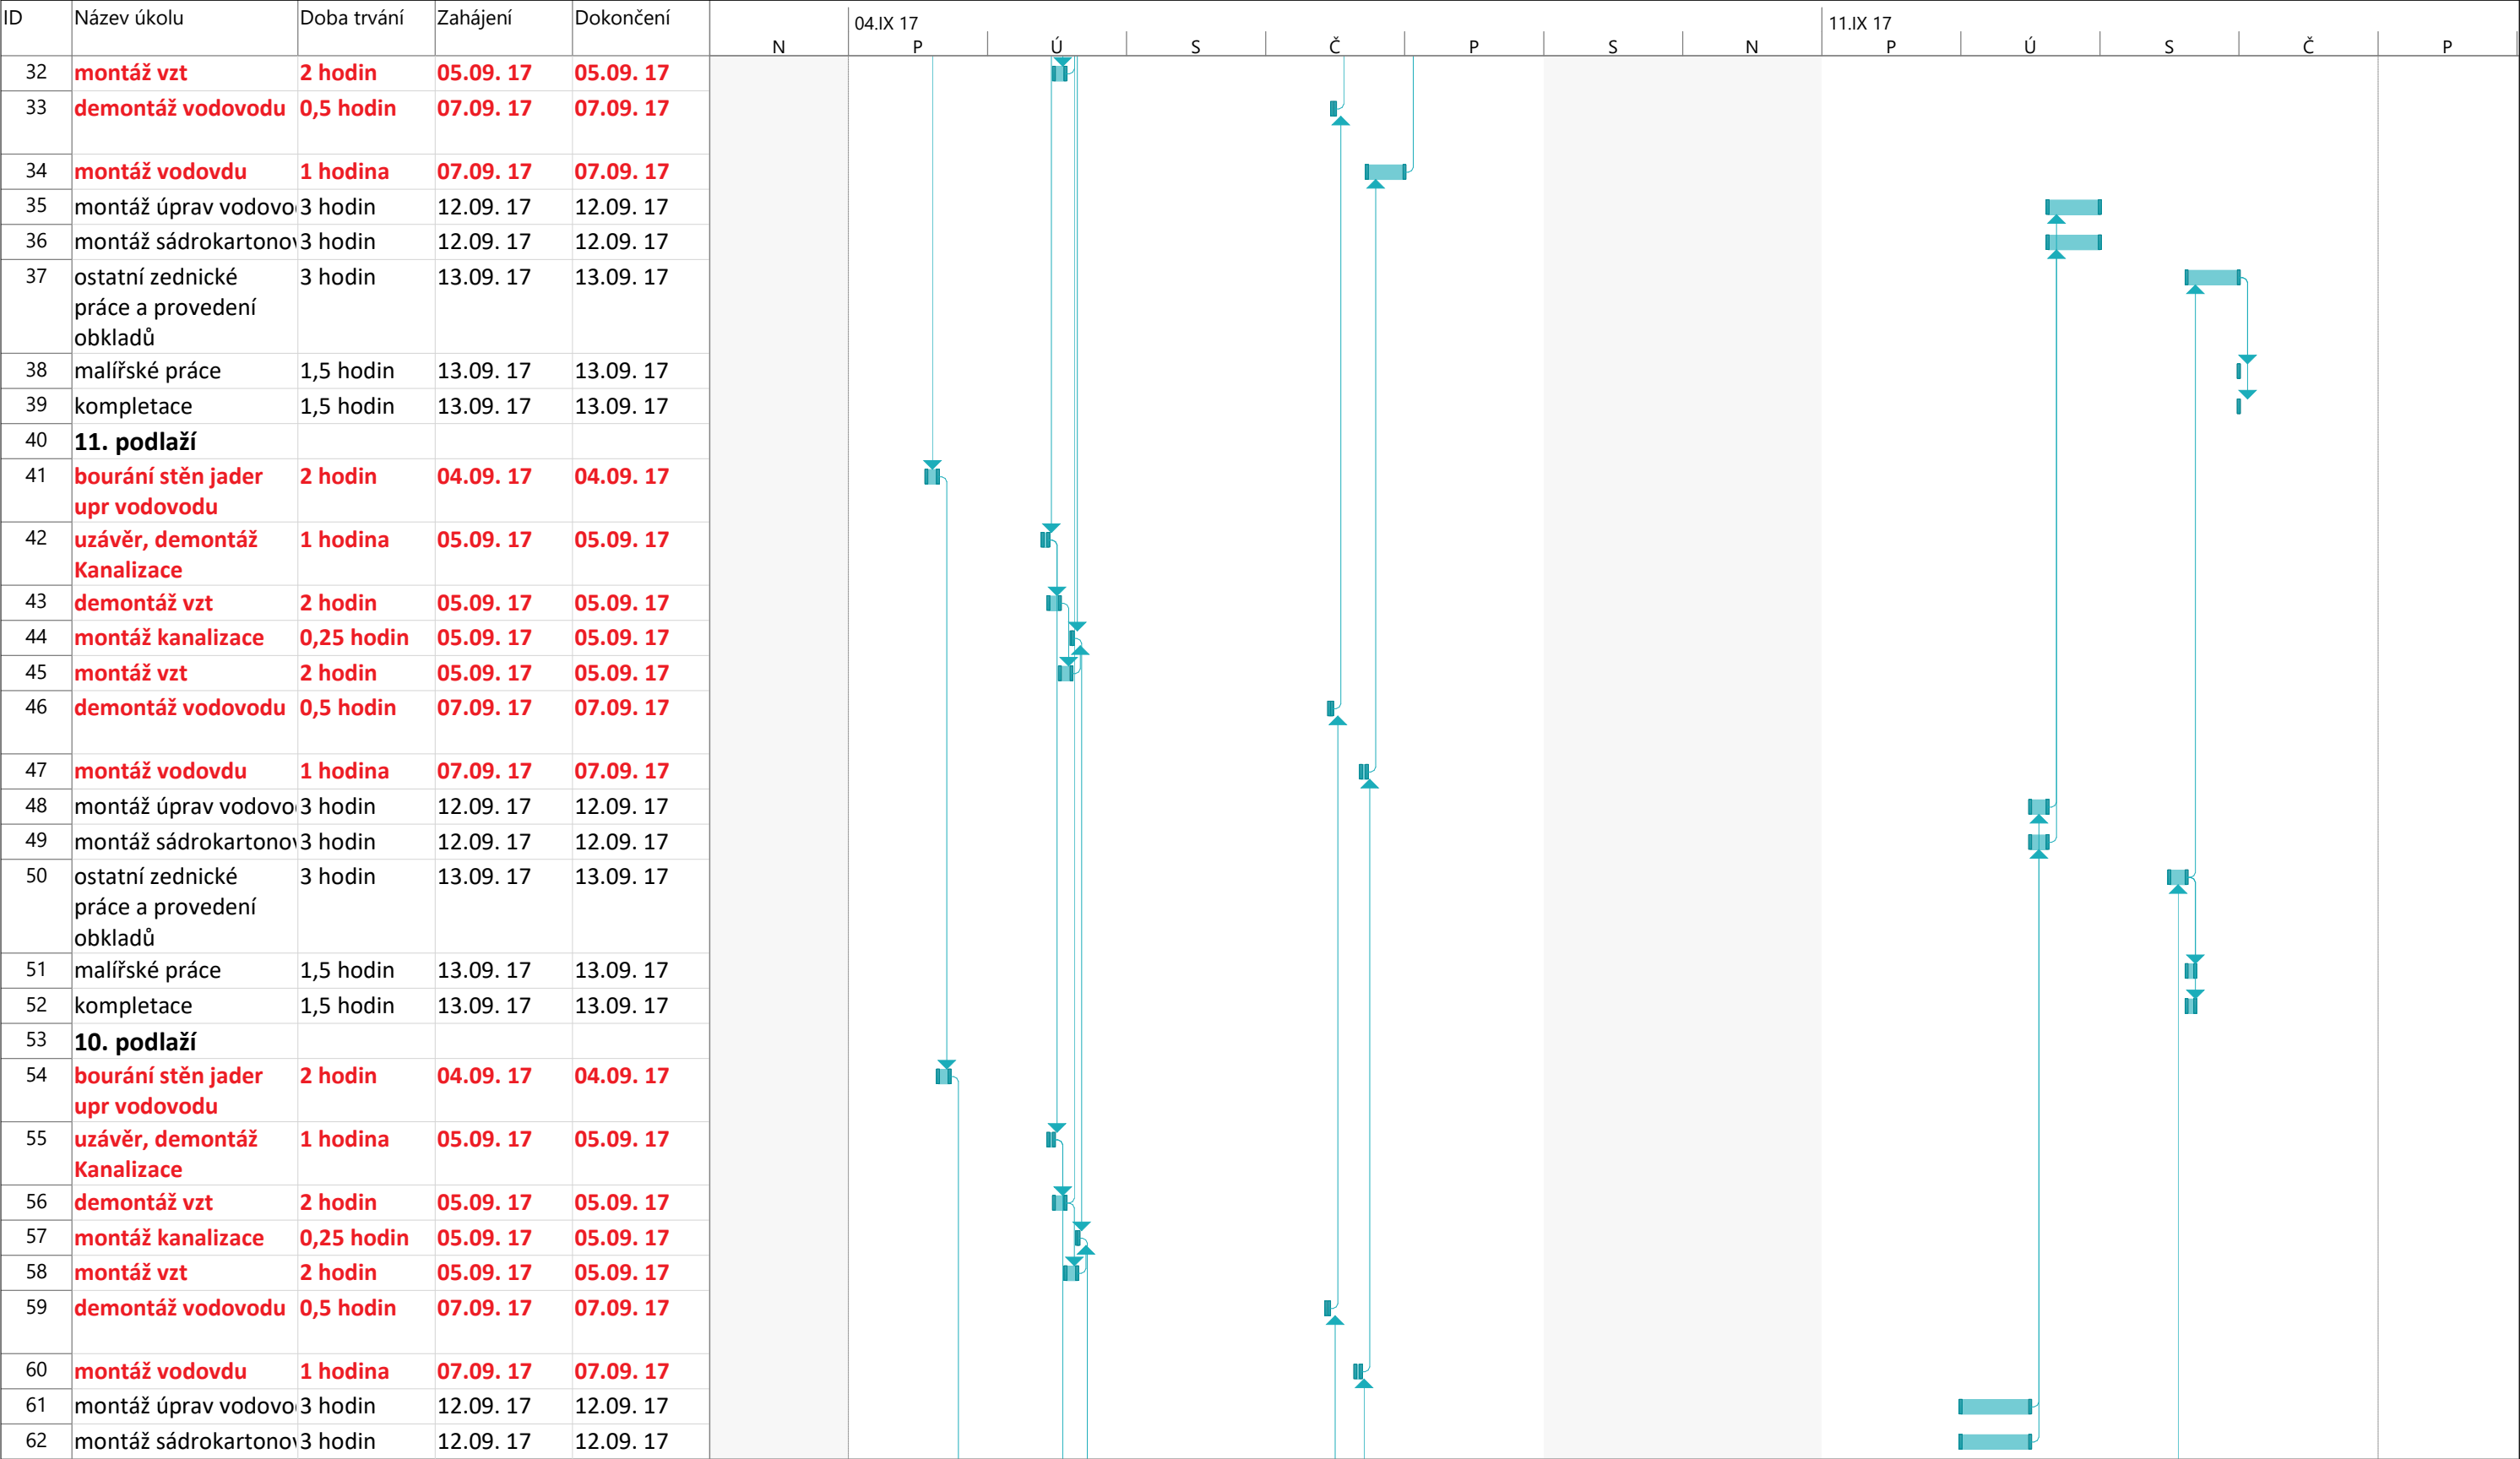

Projekt: Rýmařovská 475-5
Datum: 22.05. 17

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení


Vnější úkoly

Vnější milník


Konečný termín


Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

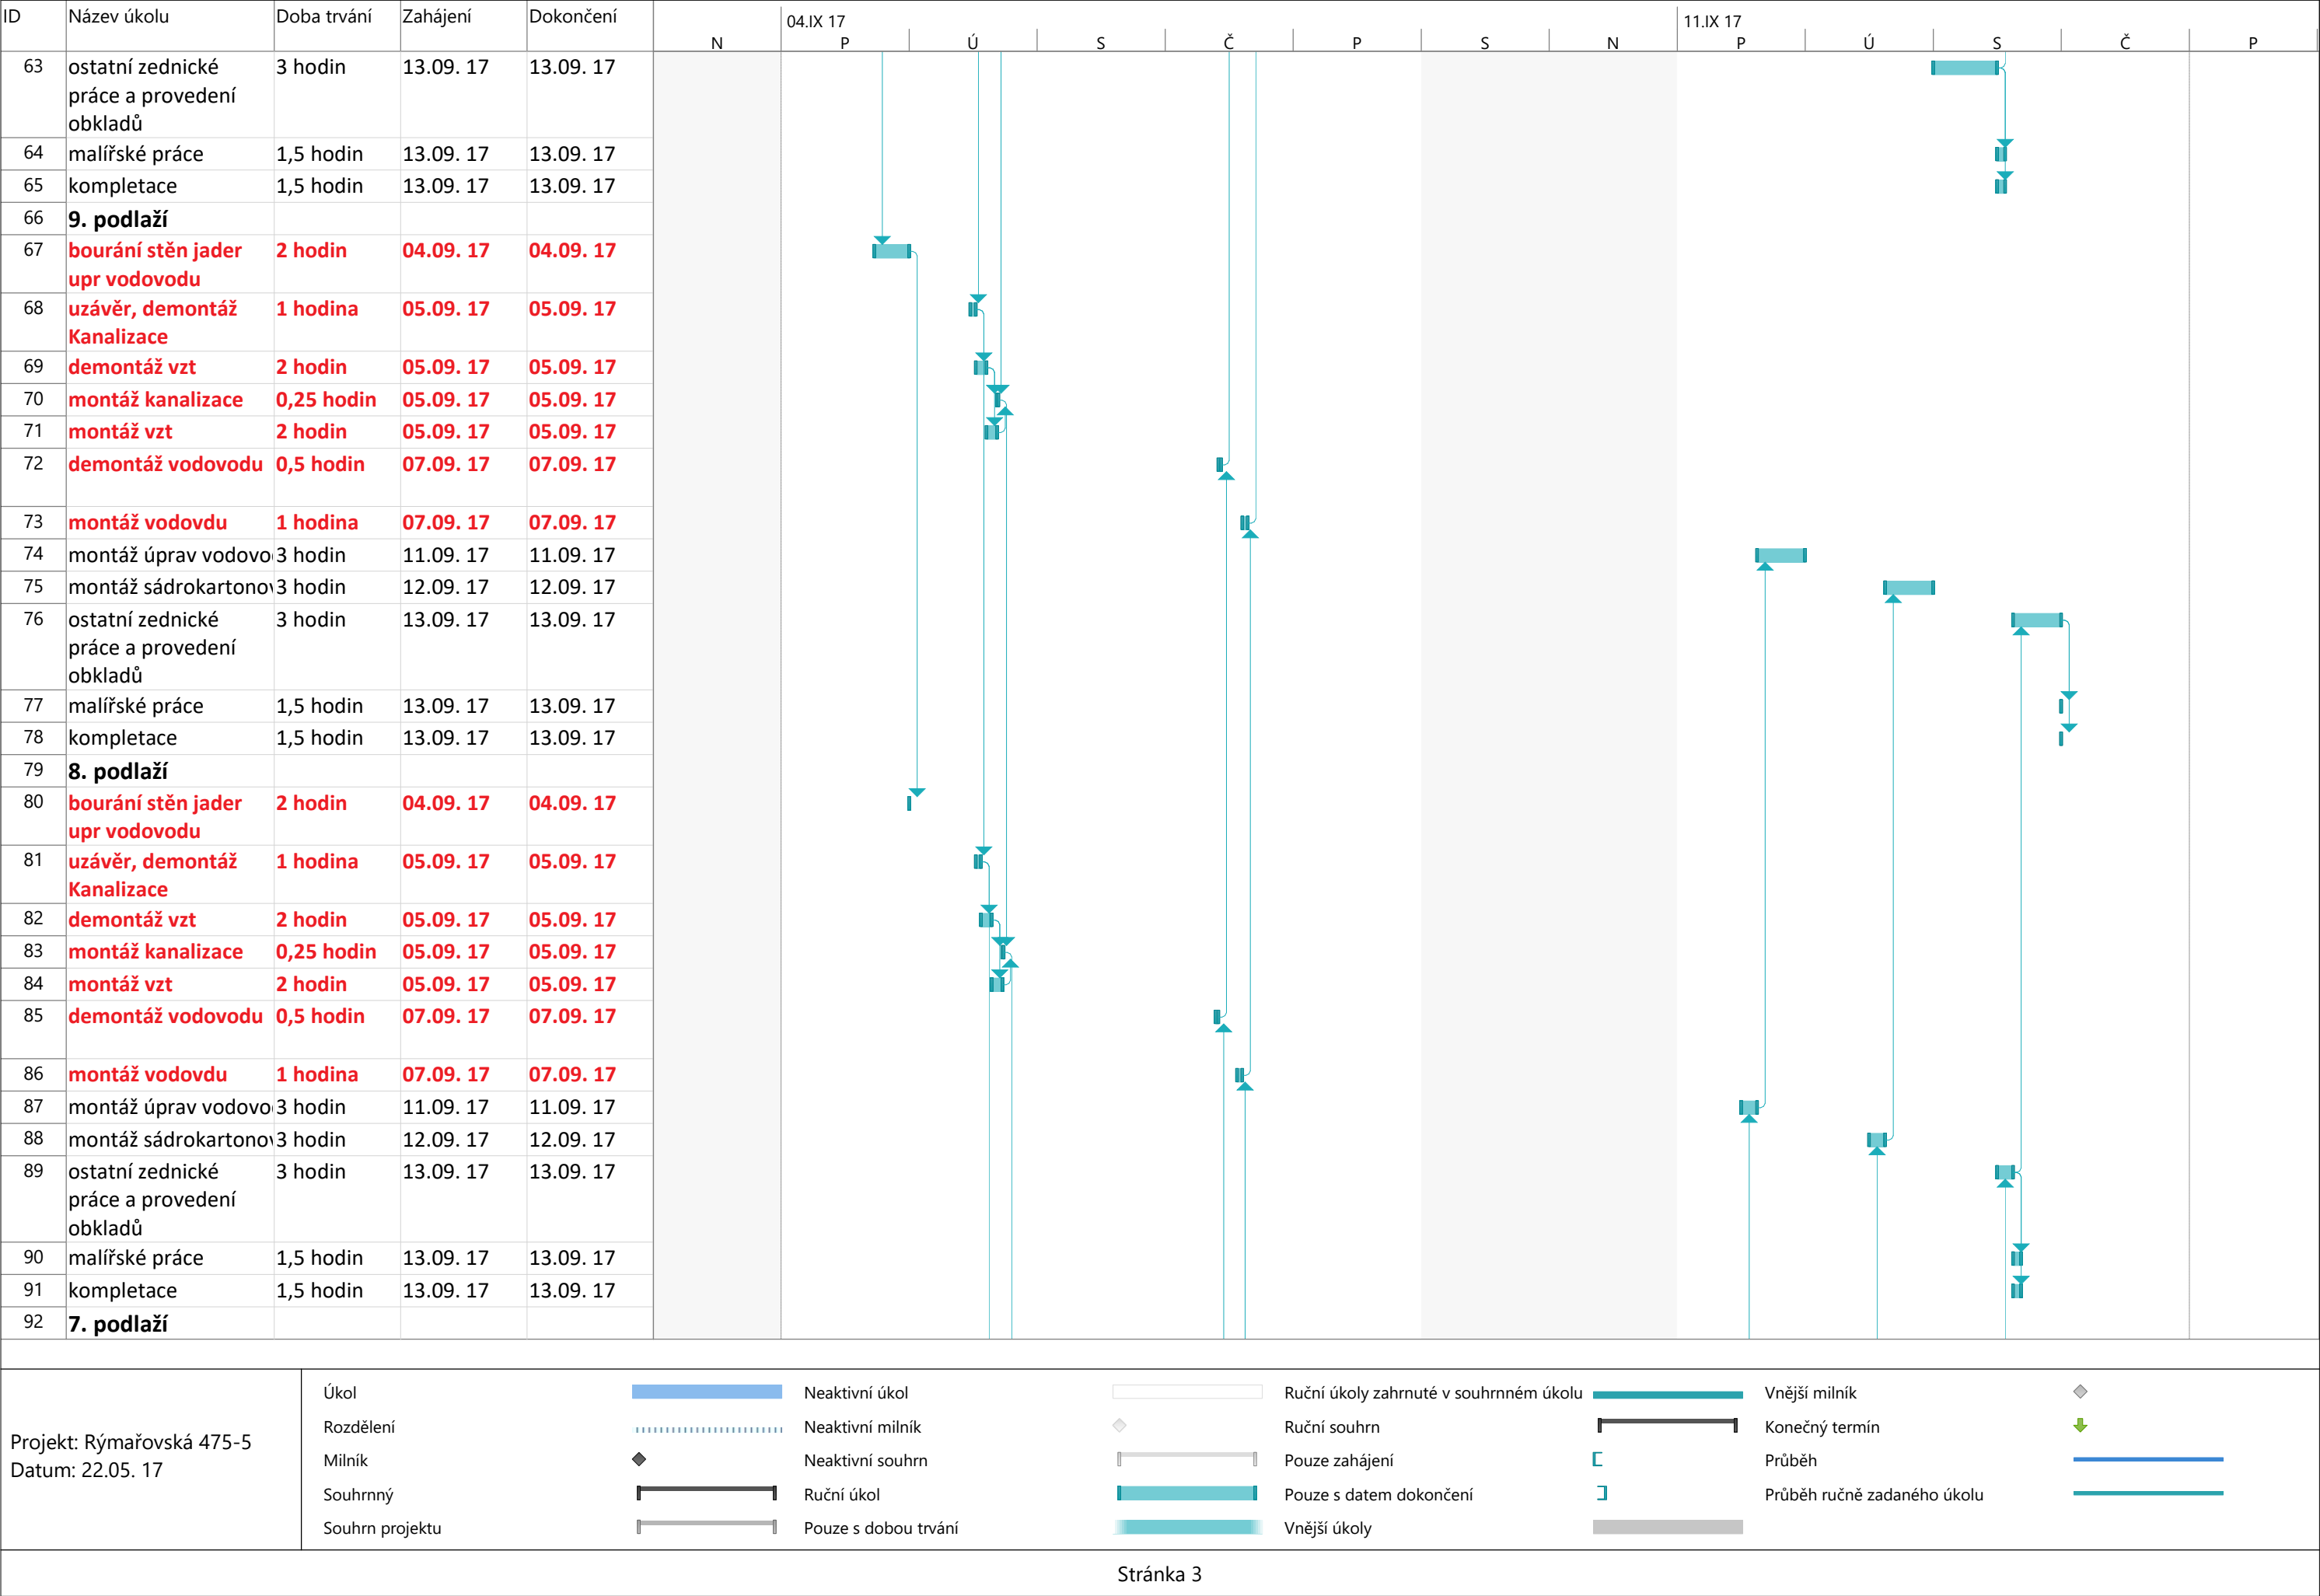

Stránka 3

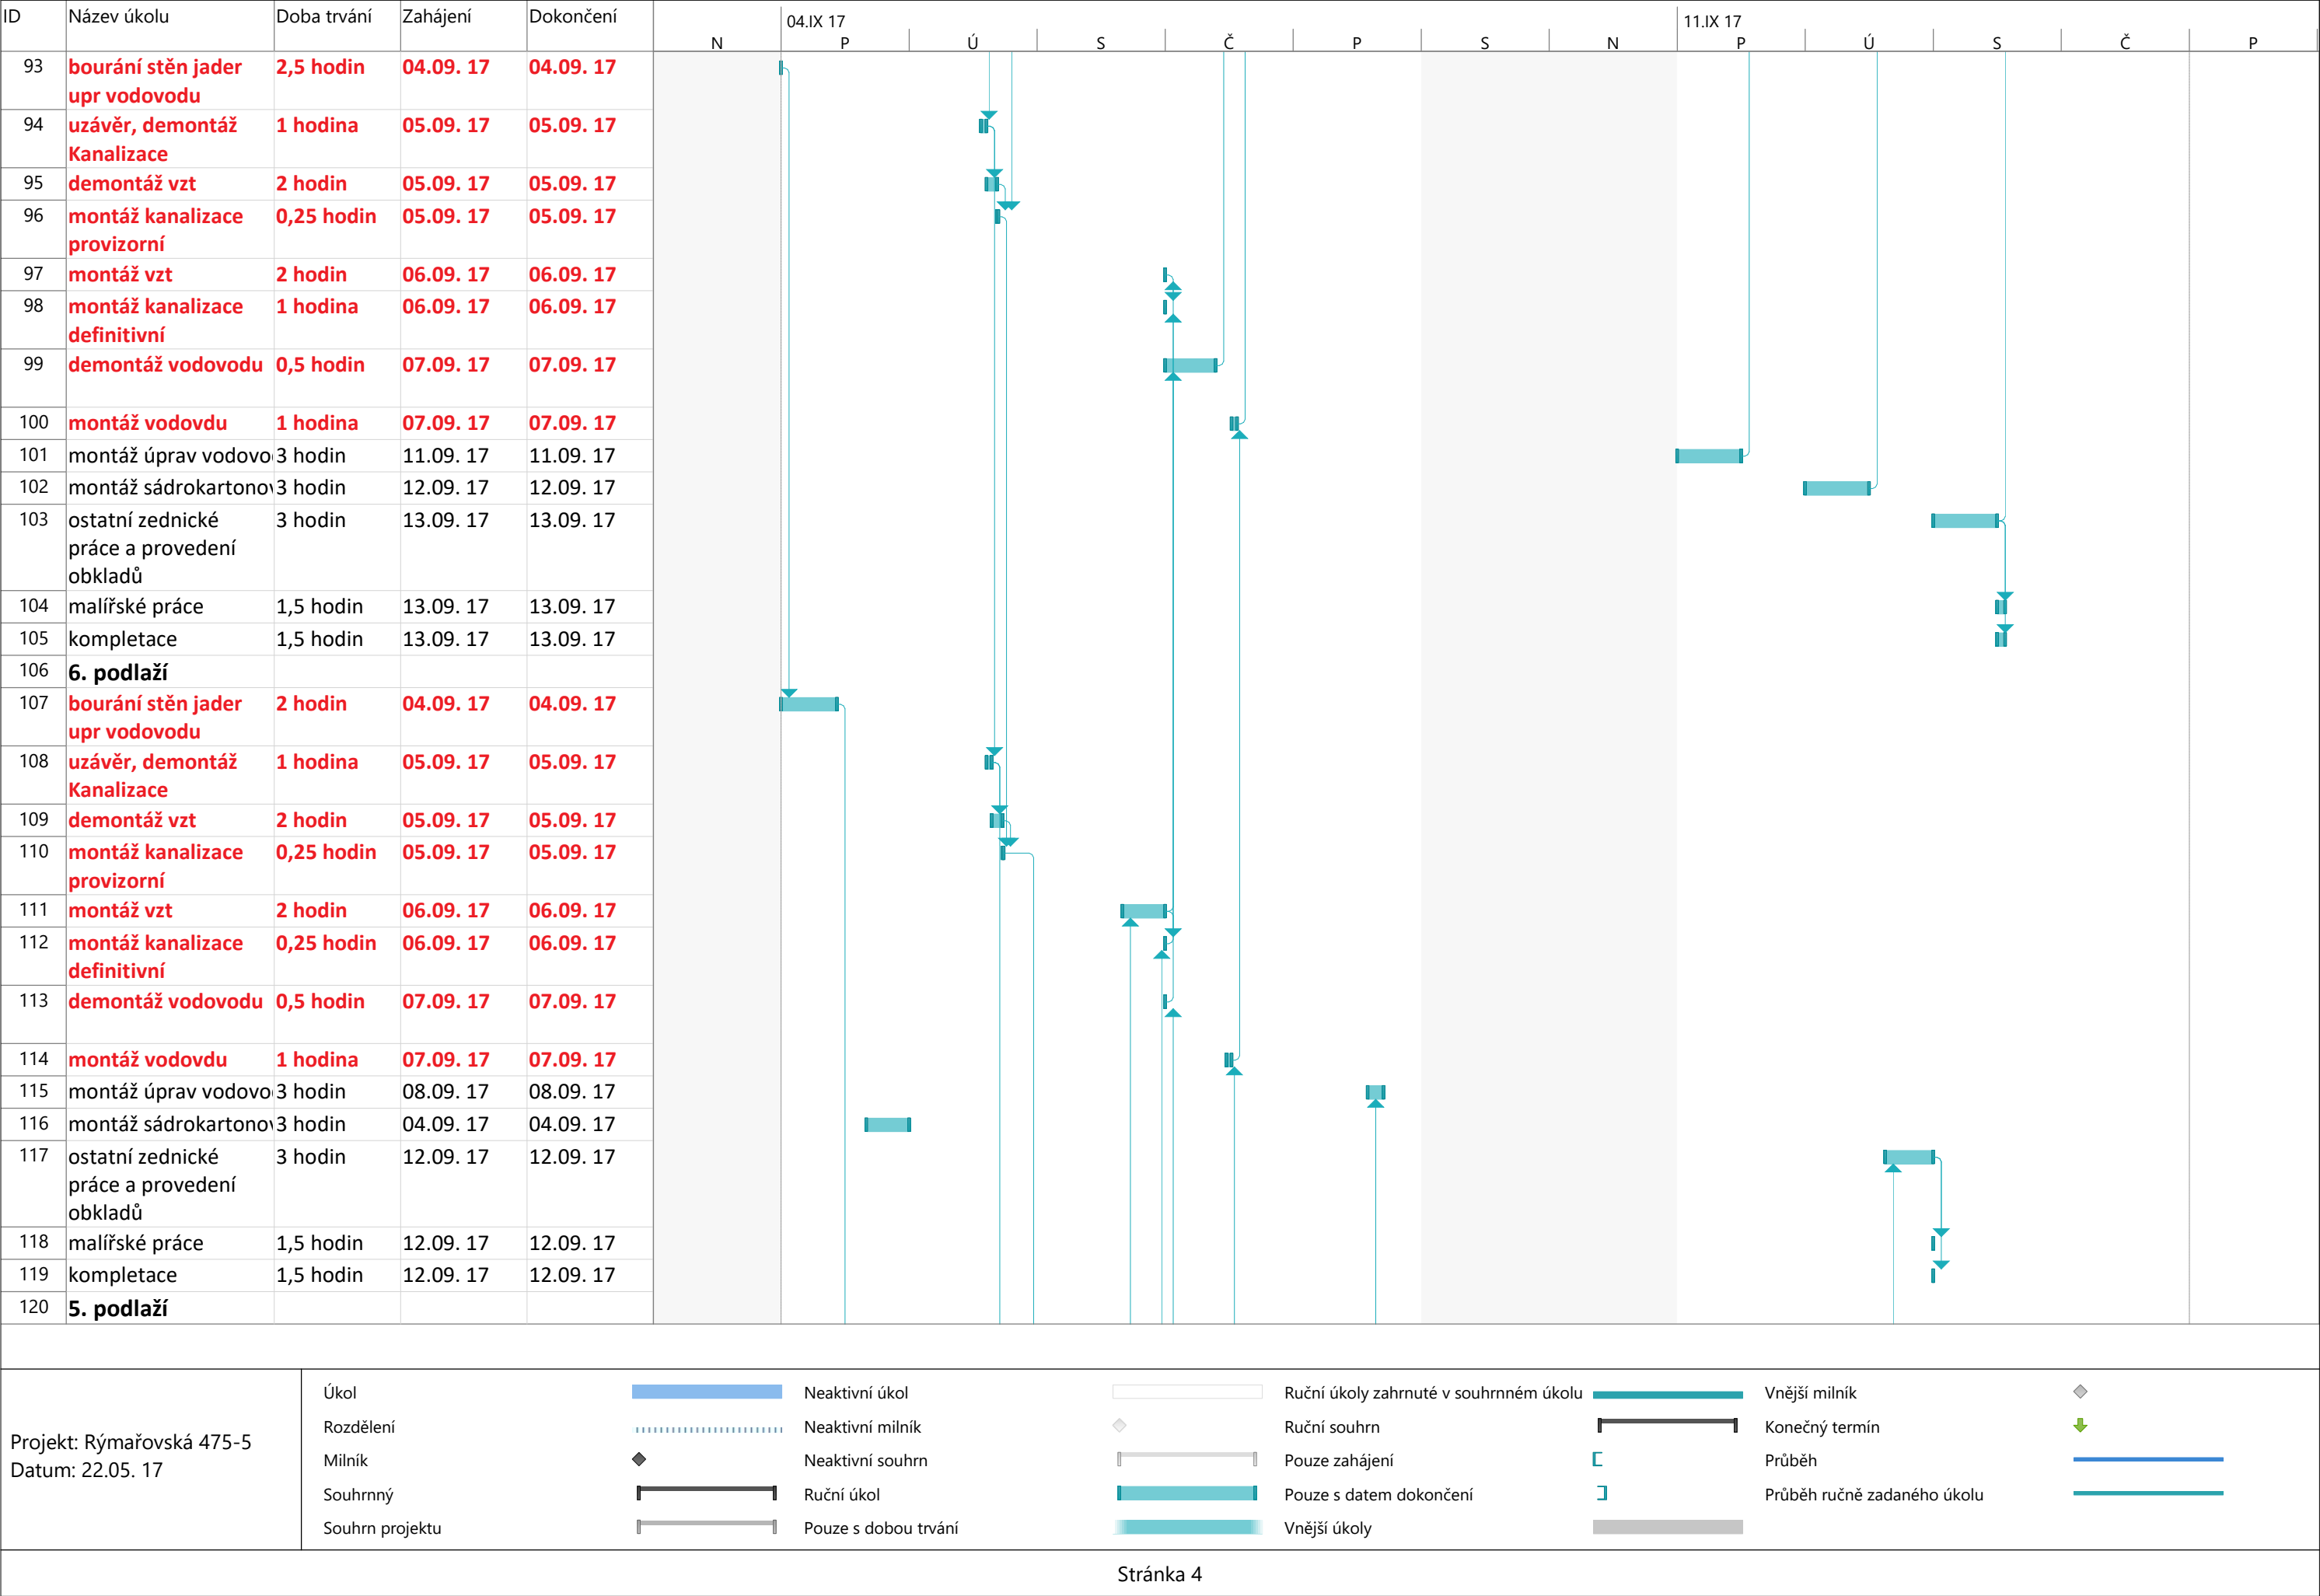

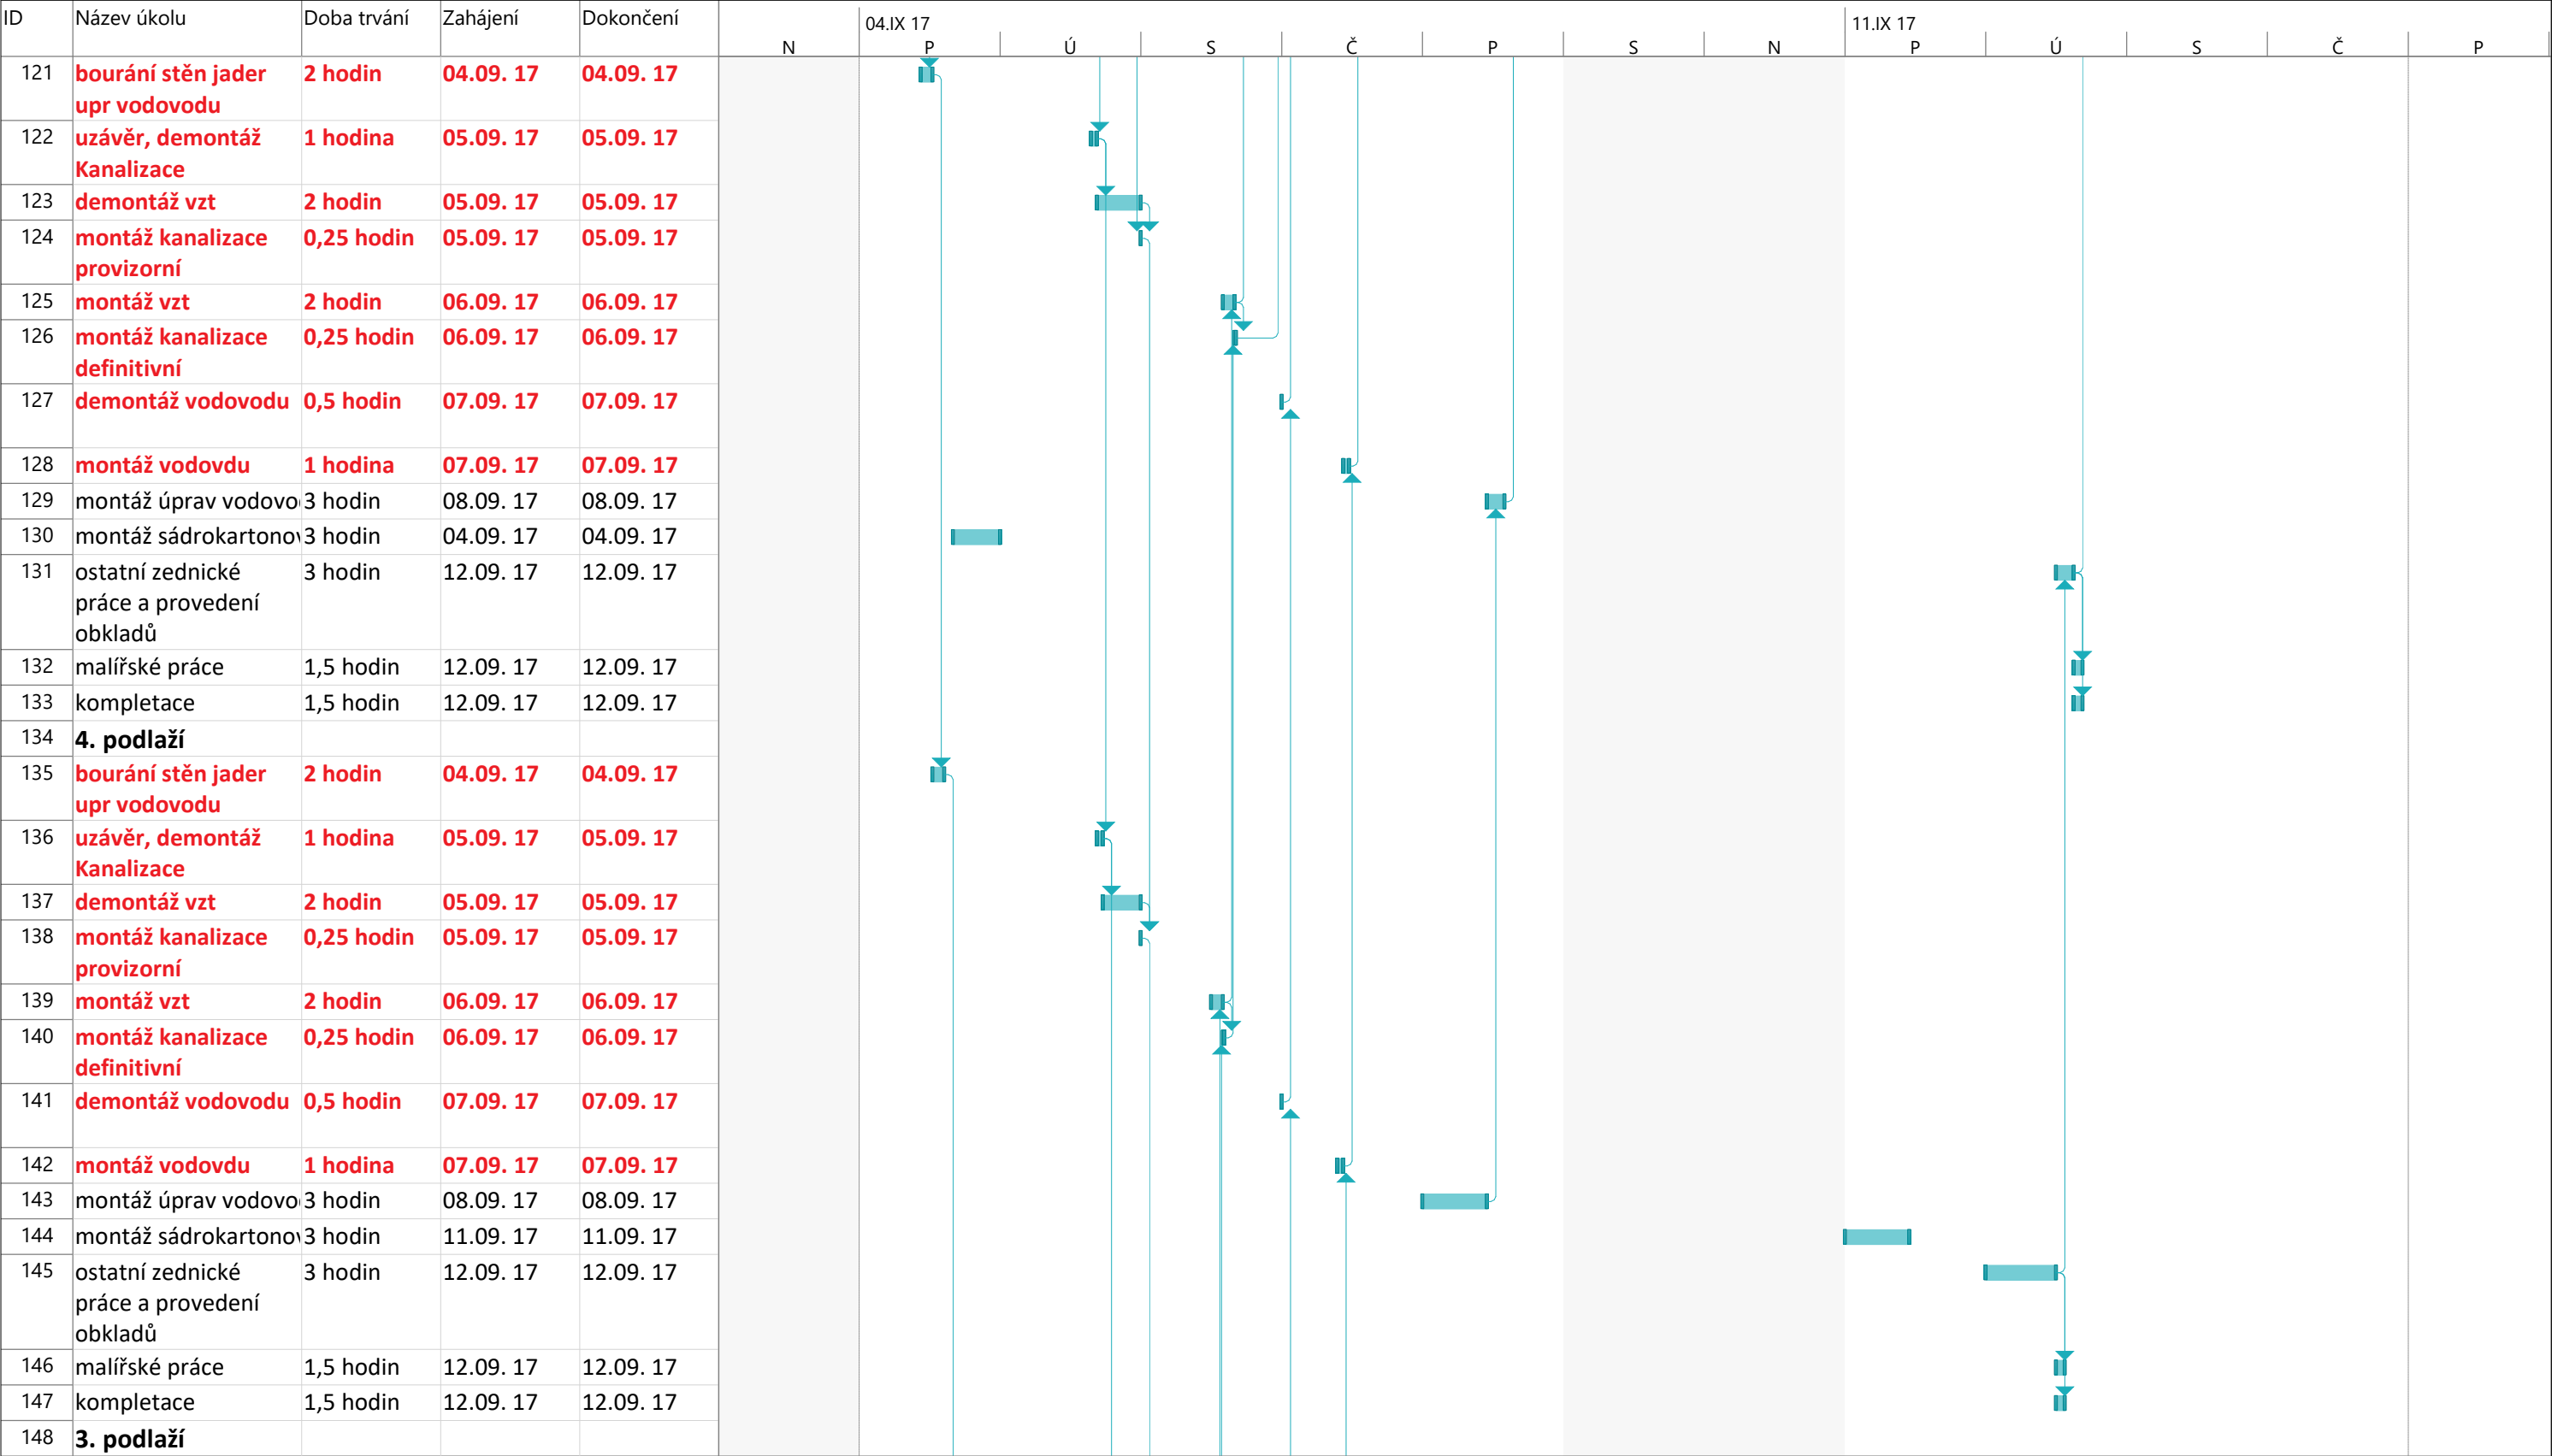

Projekt: Rýmařovská 475-5
Datum: 22.05. 17

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly


Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 5

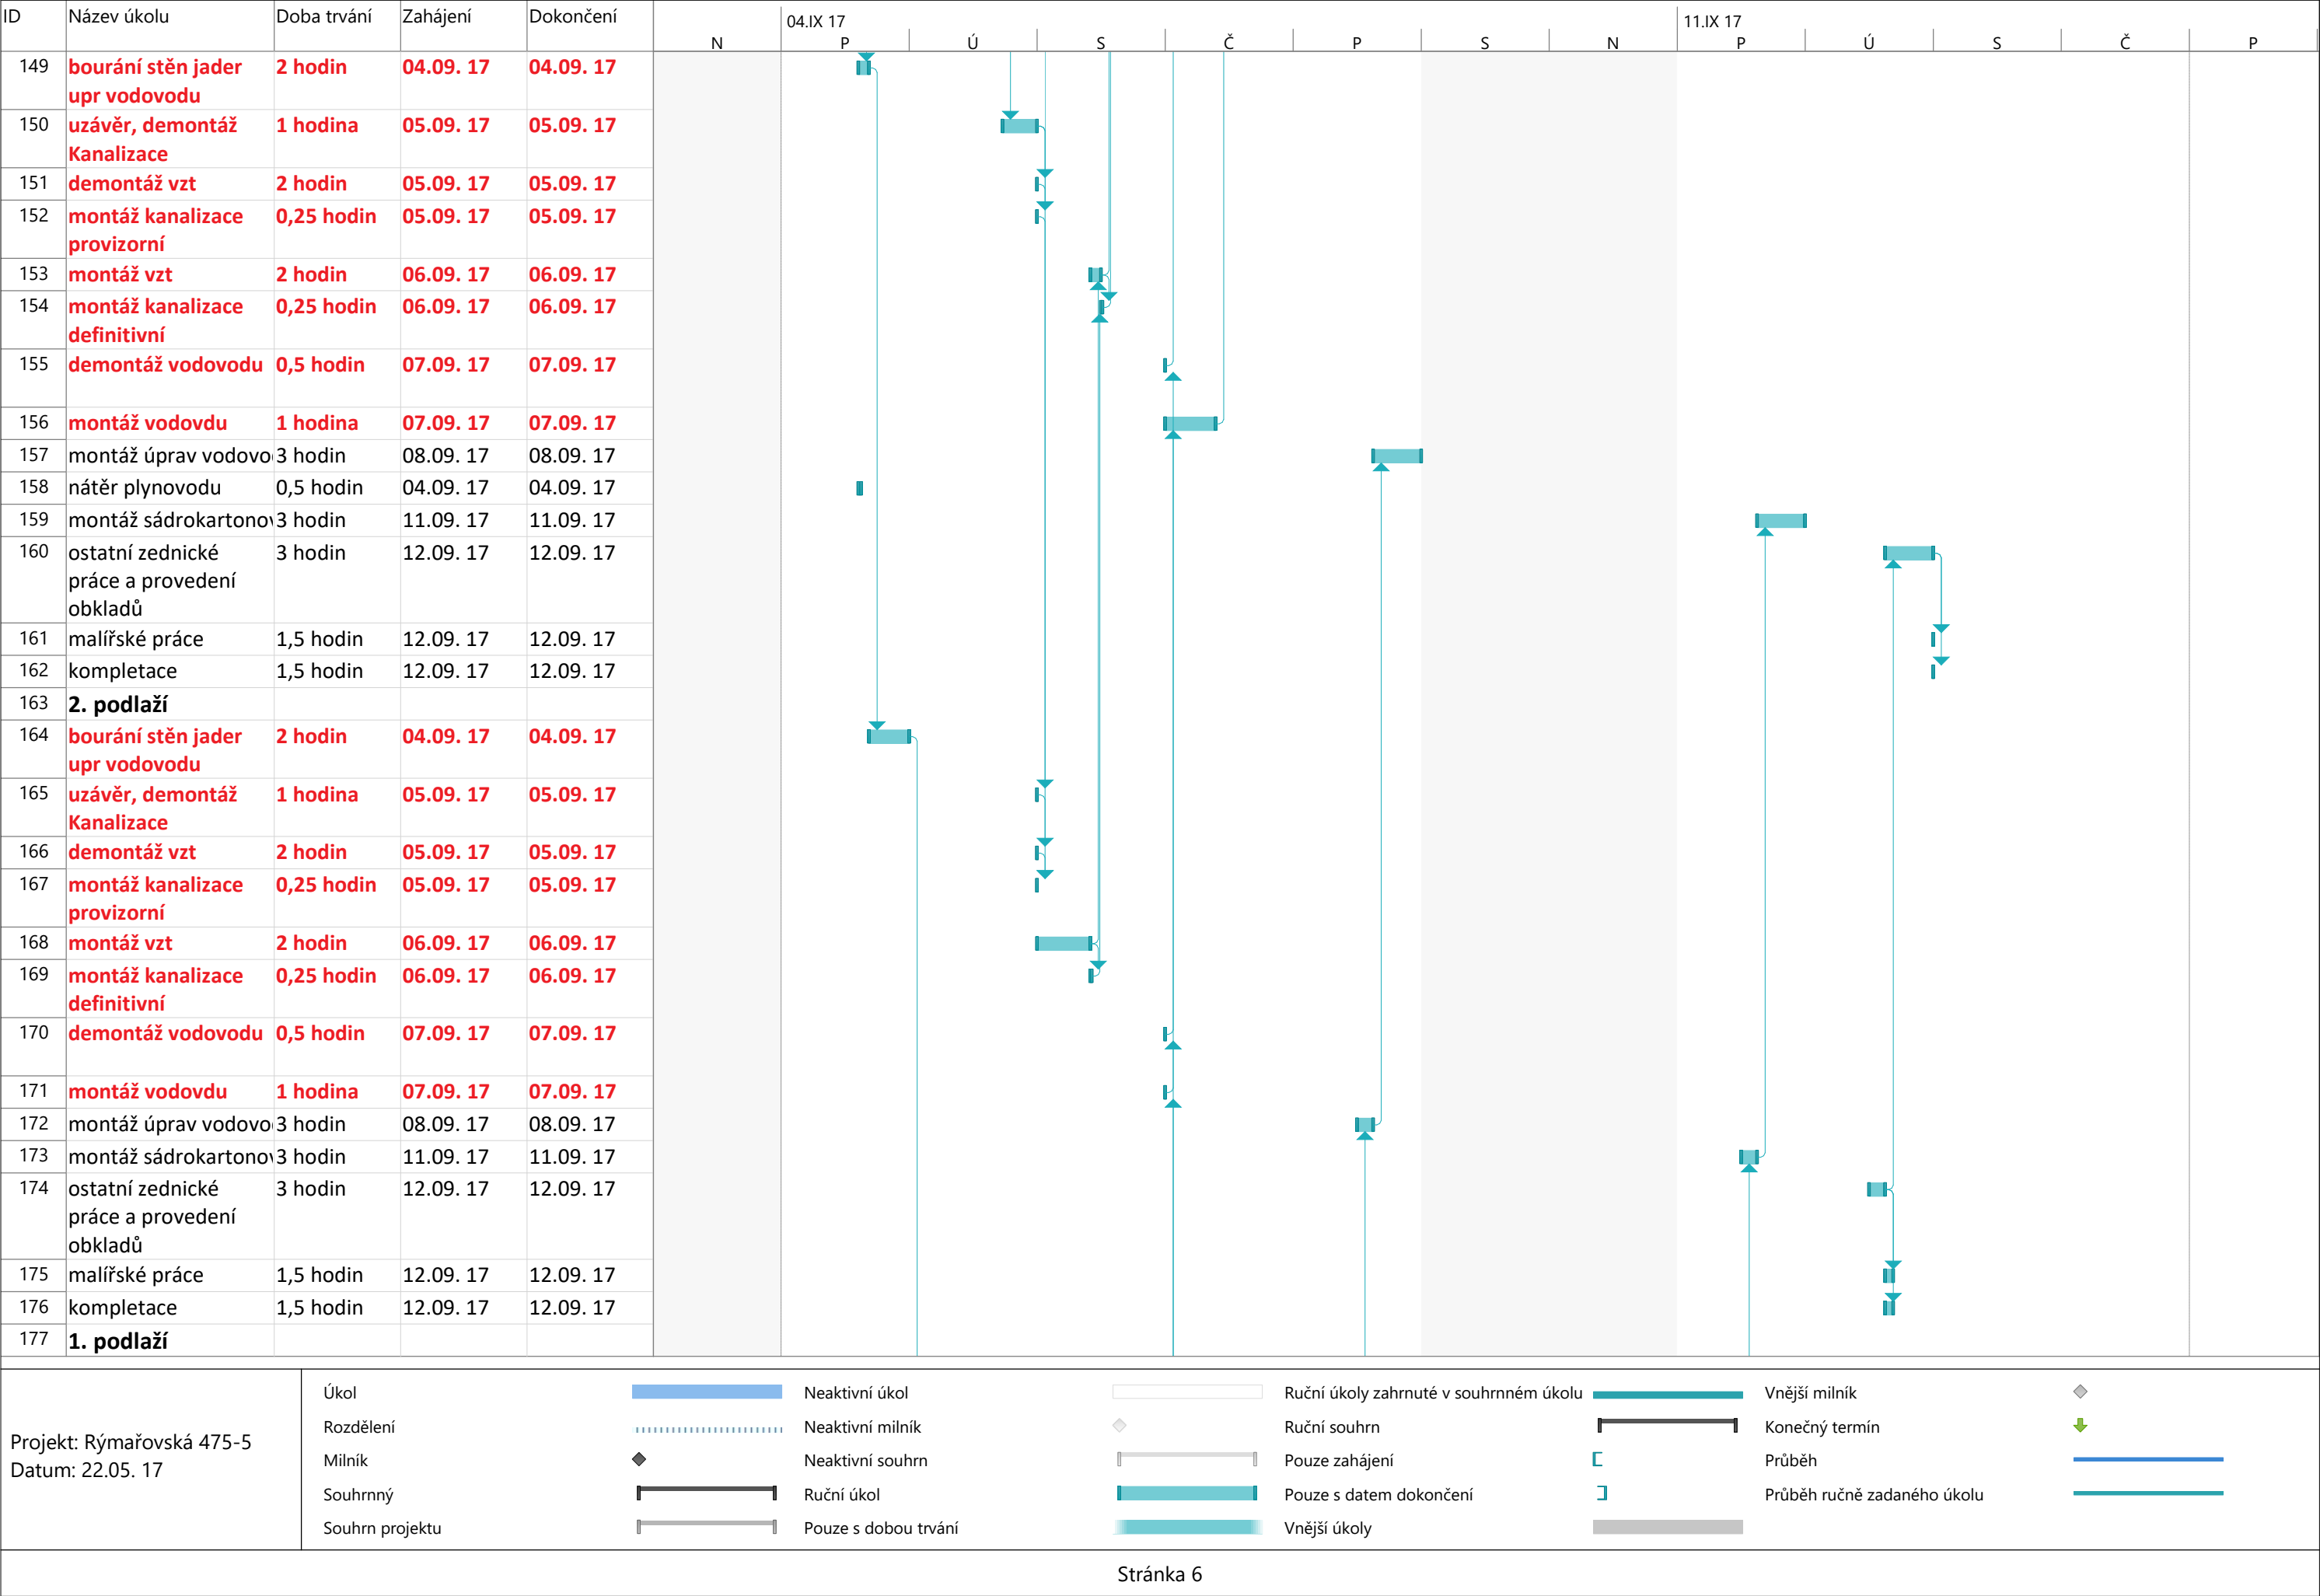

Stránka 6

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení		N	04.IX 17	P	Ú	S	Č	P	S	N	11.IX 17	P	Ú	S	Č	P
178	bourání stěn jader upr vodovodu	2 hodin	04.09. 17	04.09. 17																
179	demontáž vodovodu	0,5 hodin	07.09. 17	07.09. 17																
180	montáž vodovdu	1 hodina	07.09. 17	07.09. 17																
181	montáž úprav vodovo	3 hodin	08.09. 17	08.09. 17																
182	montáž sádrokartono	3 hodin	11.09. 17	11.09. 17																
183	malířské práce	1,5 hodin	11.09. 17	11.09. 17																
184	kompletace	1,5 hodin	11.09. 17	11.09. 17																

Projekt: Rýmařovská 475-5
Datum: 22.05. 17

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 7
