

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616053298.02

(ORG 2873)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 103/2016

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva
k podpisu této smlouvy je oprávněn dle zmocnění ze dne 14. 6. 2017
Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková,
tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Ing. Michaela Běloševičová,
tel. 725 663 793, e-mail: mbelosevicova@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka 2144
IČO: 253 17 628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: KB Brno – město, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. ú. 250048-621/0100, 2102043465/2700

oprávnění zaměstnanci:
stavbyvedoucí Ing. Miloš Raab, tel. 543 532 231, e-mail: raab@firesta.cz

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Brno, Jugoslávská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, ve znění dodatku č. 1 uzavřeným dne 8. 12. 2016.
- 2) Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu stavebních prací na objektech:
 - SO 01.1 Kanalizace – trubní část (změna č. 1)
 - SO 01.2 Kanalizace – štolování, protlaky (změna č. 1)
 - SO 02.1 Kanalizační přípojky – trubní část (změna č. 2)
 - SO 05.1 Komunikace – vozovky (změna č. 3)
 - SO 05.2 Komunikace – chodníky (změna č. 3).

a s tím spojené navýšení ceny díla.

- 3) Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3 ze dne 9. 8. 2017, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel bere na vědomí, že navrhované dílo je třeba koordinovat se stavbami všech dalších investorů.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek IV., odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Celková cena bez DPH 29 790 182,68 Kč

Sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)“

se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena bez DPH 32 591 453,03 Kč

Sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy o dílo je:
 - Příloha č. 1 – Finanční harmonogram prací nahrazující finanční harmonogram prací uvedený v čl. XIV smlouvy o dílo
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 1, č. 2 a č. 3 ze dne 9. 8. 2017

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/130 dne 29. 8. 2017.

V Brně dne 15. 09. 2017

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel


V Brně dne 07. 09. 2017

Za zhotovitele:


FIRESTA-Fiřer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628



.....
FIRESTA-Fiřer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek, člen představenstva



Finanční harmonogram

Brno, Jugoslávská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

měsíc	období	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
IX/X.2016	15.9.16-15.10.16	0	0	0
	1. dílčí faktura - 15.10.16	0	0	0
X/XI.2016	16.10.16-15.11.16	0	0	0
	2. dílčí faktura - 15.11.16	0	0	0
XI/XII.2016	16.11.16-15.12.16			
	3. dílčí faktura - 15.12.16	3 044 674	639 382	3 684 056
XII.2016/I.2017	16.12.16-15.1.17			
	4. dílčí faktura - 15.1.17	3 285 957	690 051	3 976 008
I/II.2017	16.1.17-15.2.17	0	0	0
	5. dílčí faktura - 15.2.17	4 392 031	922 327	5 314 358
II/III.2017	16.2.17-15.3.17	0	0	0
	6. dílčí faktura - 15.3.17	5 053 191	1 061 170	6 114 361
III/IV.2017	16.3.17-15.4.17	0	0	0
	7. dílčí faktura - 15.4.17	4 152 691	872 065	5 024 756
IV/V.2017	16.4.17-15.5.17	0	0	0
	8. dílčí faktura - 15.5.17	2 190 303	459 964	2 650 267
V/VI.2017	16.5.17-15.6.17	0	0	0
	9. dílčí faktura - 15.6.17	629 575	132 211	761 786
VI/VII.2017	16.6.17-15.7.17	0	0	0
	10. dílčí faktura - 15.7.17	612 741	128 676	741 417
VIII.2017		0	0	0
IX.2017	16.7.17-15.09.17	6 285 330	1 319 919	7 605 249
	11. dílčí faktura - 15.09.17		0	0
X/XI.2017	16.09.17-15.10.17	2 944 960	618 442	3 563 402
	konečná faktura		0	0
celkem		32 591 453	6 844 206	39 435 659

Cena celkem bez DPH

32 591 453 Kč

DPH 21%

6 844 206 Kč

Cena celkem vč. DPH

39 435 659 Kč

V Brně, dne 15 -09- 2017

07. 09. 2017

za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

za zhotovitele:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Rekapitulace změnových listů

Název díla: Brno, Jugoslávská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnové listy:

- Změnový list č. 1 – Zkrácení "Stoky B"
- Změnový list č. 2 – Provádění kanalizačních přípojek štolou
- Změnový list č. 3 – Zapravení povrchů

Stavební objekty dotčené změnou č. 1, 2, 3:

SO 01.1 Kanalizace – trubní část (změna č. 1)
 SO 01.2 Kanalizace – štolování, protlaky (změna č. 1)
 SO 02.1 Kanalizační přípojky – trubní část (změna č. 2)
 SO 05.1 Komunikace – vozovky (změna č. 3)
 SO 05.2 Komunikace – chodníky (změna č. 3)

Datum oznámení změny:

Datum předložení změny: 9. 8.2017

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

- změna předmětu díla na základě změnových listů č. 1, 2, 3 a s tím spojené navýšení ceny díla o 2 801 270,35 Kč bez DPH na celkovou cenu díla ve výši 32 591 453,03 Kč bez DPH.

Termín dokončení stavby: 30. 11.2017

V Brně dne: 15 -09- 2017
 Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
 1.



za statutární město Brno
 na základě plné moci
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 za které jedná
 Ing. Jakub Kožnárek
 generální ředitel

V Brně dne: 07. 09. 2017
 Za zhotovitele:

 
 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
 IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628 ⑬

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 Ing. Pavel Borek
 člen představenstva

Změnový list č. 1

Název díla: Brno, Jugoslávská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Stavební objekty dotčené změnou č. 1 :

SO 01.1 Kanalizace – trubicí část
SO 01.2 Kanalizace – štolování, protlaky

Vyjmají se původní objekty:

- zkrácení "Stoky B" o 10,69 m – tj. snížení ceny o 811 432,04 Kč (bez DPH)

Nově se vkládají objekty:

Datum oznámení změny:

Datum předložení změny: 9. 8.2017

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 1

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

- změna technického řešení: snížení ceny o 811 432,04 Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 30. 11.2017

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 – Popis změny č. 1
- Příloha č. 4 – Položkový rozpočet

V Brně dne: 15 -09- 2017

Za objednatele:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.



za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
za které jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

V Brně dne: 07. 09. 2017

Za zhotovitele:





FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628 ⑮

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Příloha č. 1 – Popis změny č. 1**Změnač.1 – Zkrácení "stoky B"**

Z důvodu koordinace objízdných tras akcí „Brno, Jugoslávská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Brno, Francouzská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ musí zůstat ulice Přadlácká nepřetržitě průjezdná v době realizace obou staveb.

Šachty RŠ3a, RŠ3b a RŠ3c umístěné v ul. Přadlácká není možné provést za plného dopravního provozu. Z tohoto důvodu byla upravena trasa a délka "stoky B" KT DN400 v ul. Přadlácká. Protlak z šachty RŠ3 byl napojen do stávající šachty v ul. Přadlácké. Uvedenou změnou došlo ke zkrácení "stoky B" z původních 22,39 m na 11,7 m - tj. **zkrácení o 10,69 m**. Původně vyprojektované revizní šachty RŠ3a, RŠ3b a RŠ3c; uliční vpust UV4-150 a dešťový svod KP3a-150 se nerealizovaly. Stávající revizní šachta v ul. Přadlácká byla stavebně opravena včetně nových stupadel.

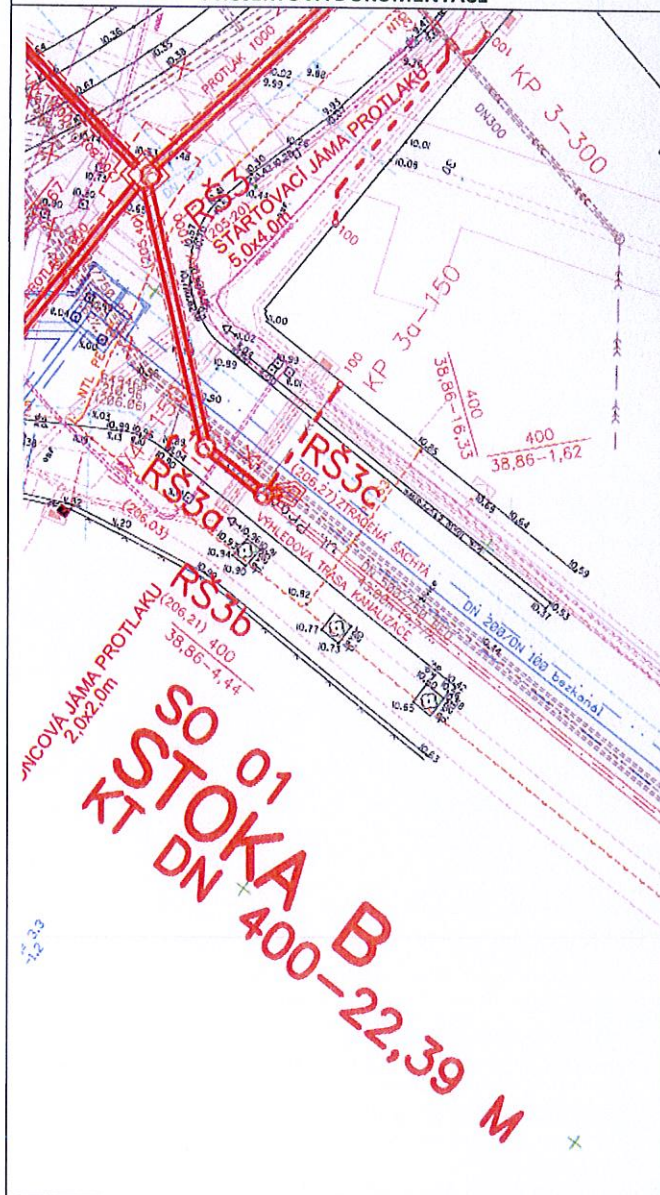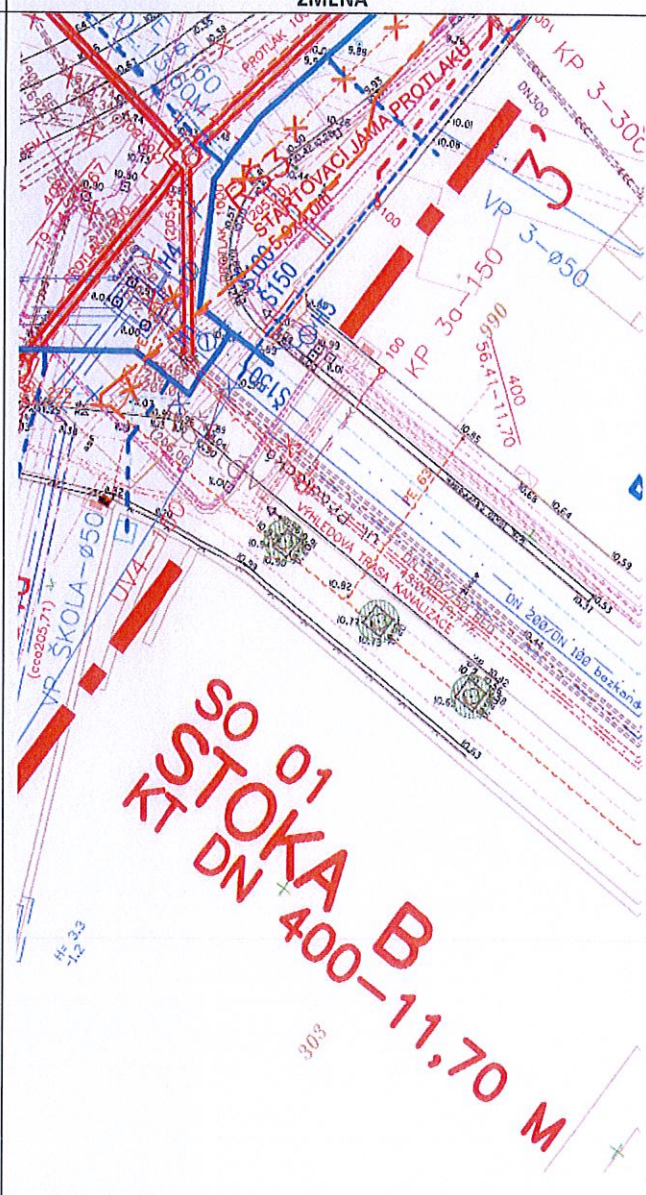PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE**ZMĚNA**

Změnový list č. 2

Název díla: Brno, Jugoslávská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Stavební objekty dotčené změnou č. 2 :

SO 02.1 Kanalizační přípojky – trubicí část

Vyjmají se původní objekty:

Nově se vkládají objekty:

- kanalizační přípojky provedené štolou – tj. navýšení ceny o 4 463 133,52 Kč (bez DPH)

Datum oznámení změny:

Datum předložení změny: 9. 8.2017

Popis změny:

viz. Příloha č. 2 – Popis změny č. 2

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

- změna technického řešení: navýšení ceny o 4 463 133,52 Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 30. 11.2017

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 2 – Popis změny č. 2
- Příloha č. 4 – Položkový rozpočet

V Brně dne: 15 -09- 2017

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno



1.

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
za které jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

V Brně dne: 07. 09. 2017

Za zhotovitele:



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 678 • DIČ: CZ25317628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Příloha č. 2 – Popis změny č. 2**Změna č. 2 – Provádění kanalizačních přípojek štolou**

V rámci projektové dokumentace měly být všechny kanalizační přípojky (kromě KP4-300 a KP6-200) provedeny otevřeným výkopem.


Křížení kanalizačních přípojek s velkým množstvím inženýrských sítí (vodovod, plynovod, kabely O2, kabely VN 2x, kabely NN) v celé délce přípojky a velké hloubky výkopu (až 6,4 m) neumožňuje provést bezpečné zapažení otevřeného výkopu pro provádění prací.

Z těchto důvodů byly kanalizační přípojky provedeny štolou 1200/1700 popř. protlakem DN800.

Jedná se o přípojky: KP3-300, KP7-300, KP9a-200, KP9b-200, KP9C-300, KP11-250, KP13a-200, KP13b-150, KP15-200, KP17-200, KPM46-150/200, DPMB1-150, DPMB2-150, DPMB3-150, KPT-150, UV3-150, KP13-dešť.


Přípojka KP3a-150 v ul. Přadlácká se neprováděla.

Přípojka KP1-200 byla provedena otevřeným výkopem bez změny.

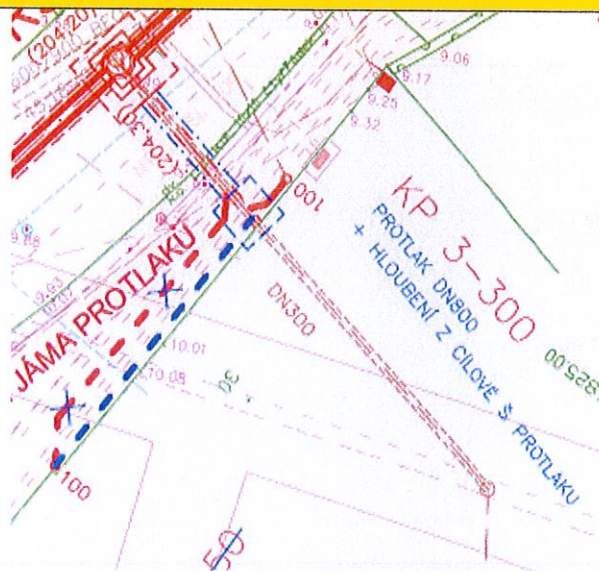KP3 - 300


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ZMĚNA
Otevřený výkop	Protlak DN800, délka 5,5 m
KP3 – dl. 8,25 m	
KP3 _{dešťová} – dl. 13,16 m	Bez změny
KP3 _{dešťová} – dl. 2,13 m	Bez změny
	Š KP3 – rozměr (2*1,5*4,5); 209,55-205,05=4,5m

KP3a – 150 – neprováděla se

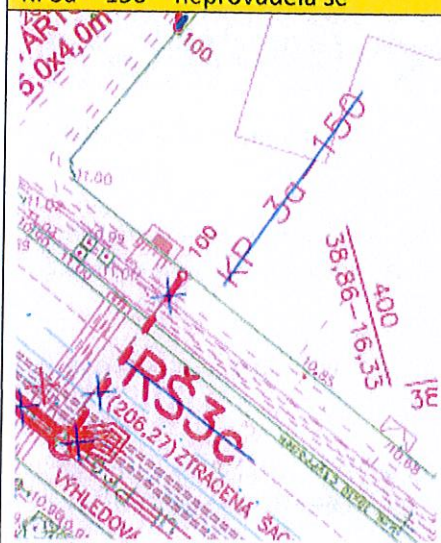


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ZMĚNA
Otevřený výkop	Přípojka se neprováděla. Viz. změna stoky B.
KP3a – dl. 7,96 m	

KP7 - 300

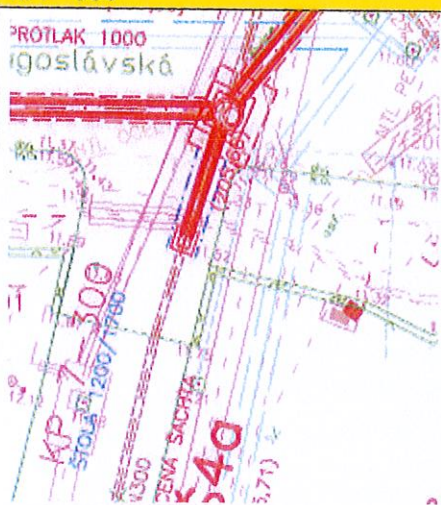


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ZMĚNA
Otevřený výkop	Štola 1200/1700; délka 4,8 m
KP7 – dl. 5,7 m	
RŠ4 – rozměry (1,95*1,95) TŠ4 – rozměry (3,25*3,25)	

KP9a - 200

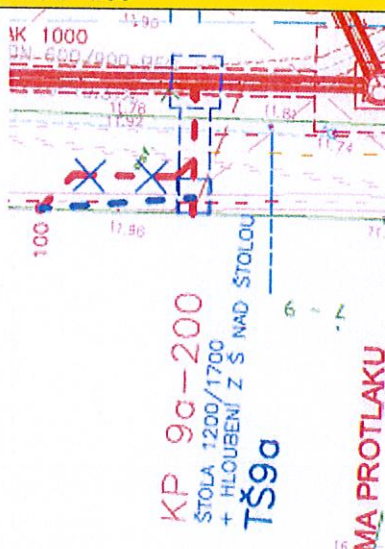

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ZMĚNA
Otevřený výkop	- štola 1200/1700; délka 5,0 m - hloubení z šachty nad štolou
KP9a – dl. 5,04 m	
KP9a _{dešťová} – dl. 6,88 m	Bez změny
	TŠ 9a – rozměr (2*2*5,7); 211,67-206,04=5,7m

KP9b - 200

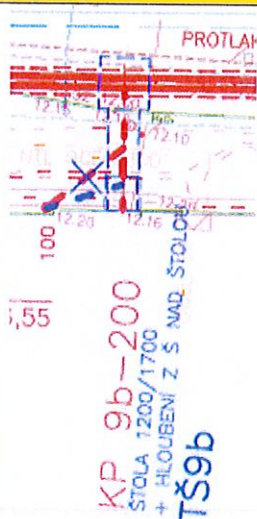


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ZMĚNA
Otevřený výkop	- štola 1200/1700; délka 5,0 m - hloubení z šachty nad štolou
KP9b – dl. 4,9 m	
KP9b _{dešťová} – dl. 2,54 m	Bez změny
	TŠ 9b – rozměr (2*2*5,7); 211,95-206,27=5,7m

KP9c - 300




PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ZMĚNA
Otevřený výkop	Štola 1200/1700, délka 5,9 m
KP9c – DN300, dl. 7,0 m	

KP11 - 250

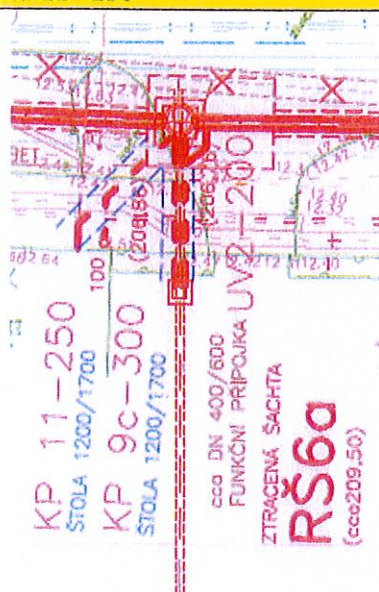


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ZMĚNA
Otevřený výkop	Štola 1200/1700, délka 4,9 m
KP11 – DN250, dl. 6,6 m	
KP11 _{dešťová} – dl. 2,0 m	Bez změny

KP13a - 200

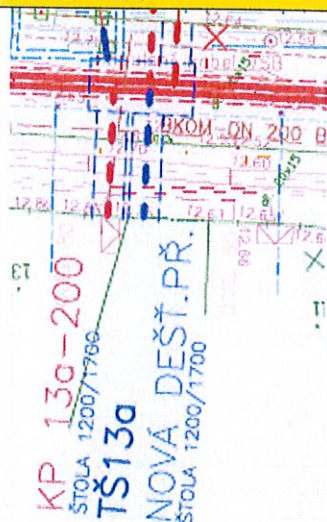


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ZMĚNA
Otevřený výkop	Štola 1200/1700, délka 5,0 m
KP13a – DN200, dl. 5,02 m	
	TŠ 13a – rozměr (4,0*2,0*6,0)

KP13b - 150

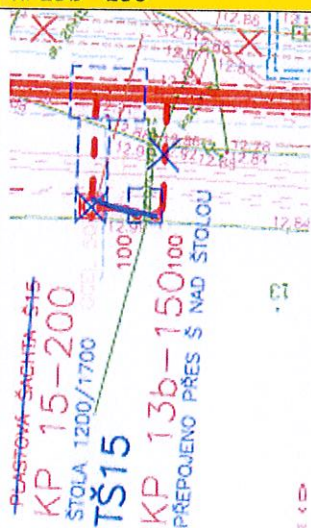


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ZMĚNA
Otevřený výkop	Přepojeno přes šachtu nad štolou
KP13b – DN200, dl. 4,73 m	Změna délky na 2,83 m (o 40 % kratší)

KP15 - 200

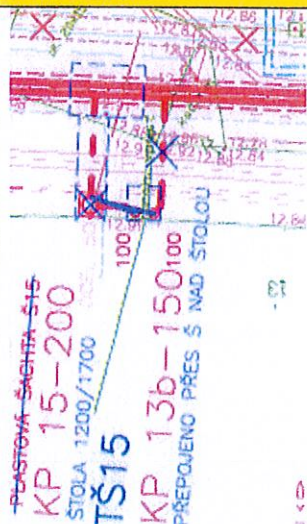


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ZMĚNA
Otevřený výkop	Štola 1200/1700; délka 4,5 m
KP15 – DN200, dl. 4,9 m	
KP15 _{dešťová} – dl. 2,34 m	Bez změny
Plastová šachta Š15	Šachta se neprováděla
	TŠ 15 – rozměr (3,0*2,0*6,0)

KP17 - 200

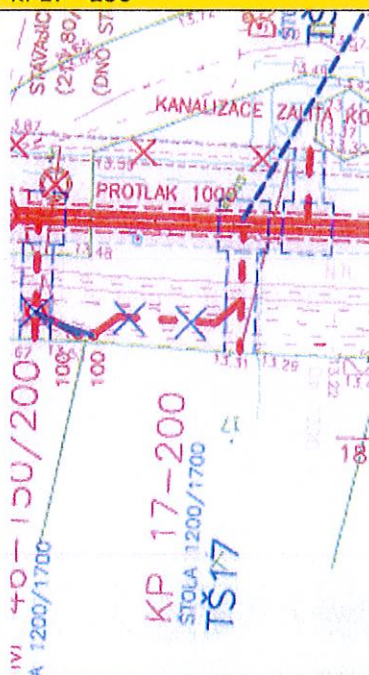


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ZMĚNA
Otevřený výkop	Štola 1200/1700; délka 5,0 m
KP17 – DN200, dl. 4,91 m	
KP17 _{dešťová} – dl. 6,45 m	Změna délky na 2,26 m (o 65 % kratší)
Plastová šachta Š46	Šachta se neprováděla
	TŠ 17 – rozměr (2,0*2,0*6,0)

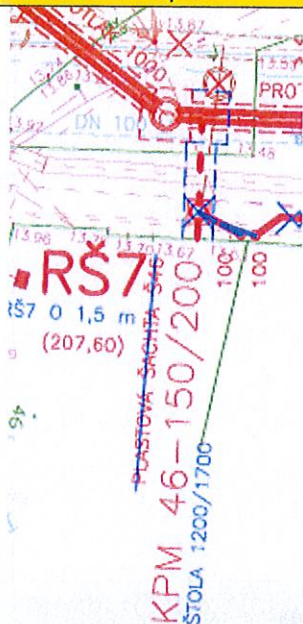

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ZMĚNA
Otevřený výkop	Štola 1200/1700; délka 4,9 m
KPM 46 – DN150/200, dl. 4,68 m	
KPM 46 _{dešťová} – dl. 1,9 m	Bez změny
	Rozšíření šachty RŠ7 – rozměr (2,0*1,5*6,4)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ZMĚNA
Otevřený výkop	Štola 1200/1700; délka 2,0 m
DPMB1 – DN150, dl. 3,0 m	
	TŠ DPMB1 – rozměr (2,0*2,0*6,0)

DPMB2 - 150

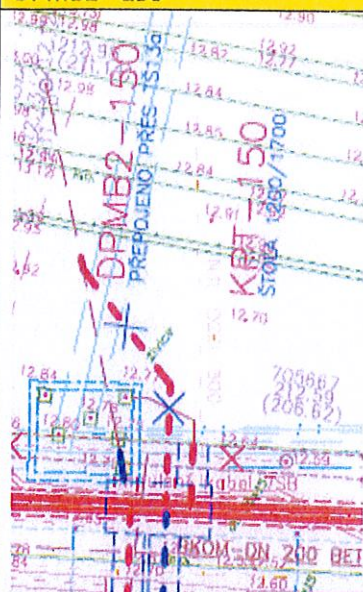


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ZMĚNA
Otevřený výkop	Přepojeno přes TŠ 13a
DPMB2 – DN150, dl. 10,80 m	

DPMB3 - 150



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ZMĚNA
Otevřený výkop	Štola 1200/1700; délka 2,0 m
DPMB3 – DN150, dl. 4,5 m	

KPT - 150

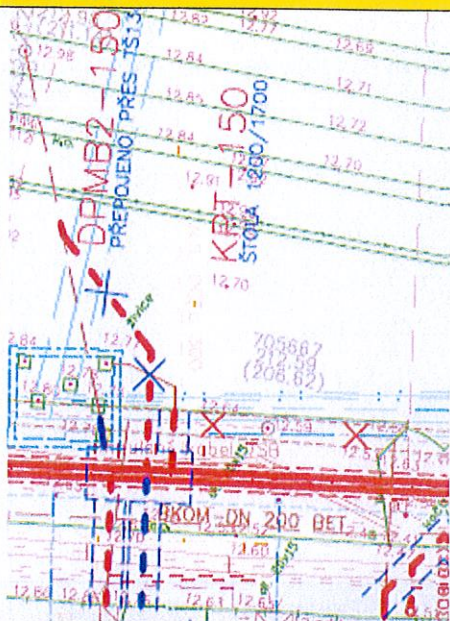

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ZMĚNA
Otevřený výkop	Štola 1200/1700; délka 2,0 m
KPT – DN150, dl. 2,5 m	

UV3 - 150



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ZMĚNA
Otevřený výkop	Štola 1200/1700
UV3 – DN150, dl. 3,3 m	Z důvodu omezeného prostoru musela být UV1 vybudovaná za "kioskem". - nová délka 10,0 m

KP13-dešť.



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ZMĚNA
Nebyla součástí PD	Štola 1200/1700, délka 5,0 m

Změnový list č. 3

Název díla: Brno, Jugoslávská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Stavební objekty dotčené změnou č. 3 :

SO 05.1 Komunikace – vozovky
SO 05.2 Komunikace - chodníky

Vyíjmají se původní objekty:

- odpočet části celoplošné obnovy vozovky – tj. 818 303,82 Kč (bez DPH)
- odpočet obnovy části chodníků – tj. 32 127,31 Kč

Nově se vkládají objekty:

Datum oznámení změny:

Datum předložení změny: 9. 8.2017

Popis změny:

viz. Příloha č. 3 – Popis změny č. 3

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

- změna technického řešení: snížení ceny o 850 431,13 Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 30. 11.2017

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 3 – Popis změny č. 3
- Příloha č. 4 – Položkový rozpočet

V Brně dne: 15 -09- 2017
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno



za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
za které jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

V Brně dne: 07. 09. 2017
Za zhotovitele:



FIRESTA
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Příloha č. 3 – Popis změny č. 3


Změna č. 3 – Zapravení povrchů

Z důvodu složité dopravní situace na ulicích Jugoslávská, Merhautova a v blízkém okolí, v době realizace akcí „Brno, Francouzská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Brno, Jugoslávská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, bude akce DPMB, a.s. - rekonstrukce kolejového tělesa „RKT Vranovská/Jugoslávská“ vč. rekonstrukce zastávek v úseku mezi ul. Merhautova/Vranovská zahájena až v roce 2018.

S ohledem na výše uvedené se zástupci BVK, a.s., DPMB, a.s., BKOM, a.s. dohodli, že v rámci akce „Brno, Jugoslávská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ **nebude provedena celoplošná obnova vozovky a chodníků v celém rozsahu dle PD**. Zapraveny budou pouze rýhy po rekonstrukci vodovodu, výkopy a těžní jámy po rekonstrukci kanalizace lokálně do původního stavu včetně odskoků jednotlivých vrstev komunikace. Chodník v ul. Merhautova (cca 3 roky starý) bude zapraven finálně.

Následně v roce 2018 provedou Brněnské komunikace, a.s. v koordinaci s DPMB, a.s. celoplošnou obnovu komunikace (chodníky, obruby, vozovku).

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

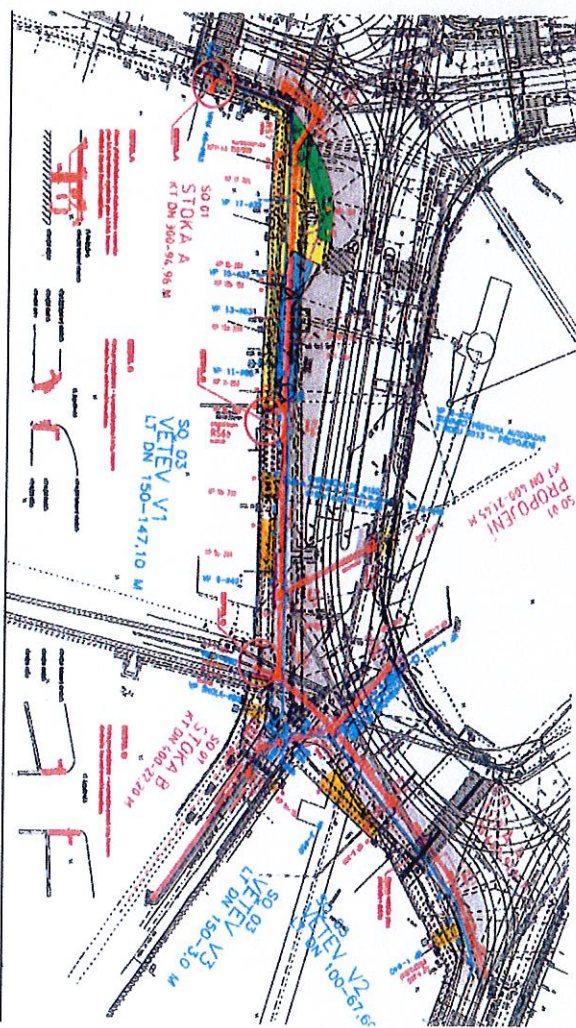

ZMĚNA

