

Smluvní strany

Obec Blažovice

Nádražní 165, 664 08 Blažovice

IČ: 00281603

zastoupená panem Petrem Plevou, starostou obce
(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Firma/Jméno *VS-build, s.r.o.*

se sídlem: Družstevní 369, 664 43 Želešice

zastoupený: Ing.Jaroslav Vraňan, jednatel

IČO: 28312015

DIČ: CZ28312015

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 253798874/0300

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o dílo.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně (doplnění) následujících bodů smlouvy ze dne 4.6.2021. Ostatní body smlouvy a dodatku č.1 zůstávají beze změn.

V souvislosti s prováděním díla, tj. stavby „Blažovice, Za křížkem – prodloužení inženýrských sítí a komunikace“ – mimo stavební objekty SO 301 Kanalizace splašková, SO 302 Kanalizace dešťová a SO 303 Vodovod, vznikla potřeba posunu termínu dokončení díla. Posun termínu dokončení díla je zapříčiněn:

- a) Výskyt skalního podloží pod objekty SO 301 Kanalizace splašková, SO 302 Kanalizace dešťová a SO 303 Vodovod, které nejsou předmětem této smlouvy, ale mají přímý dopad na realizaci objektů této smlouvy.
- b) Objekt SO 402 - vedení NN (investice společnosti EG.D.) není projekčně dořešen. Objekty SO 101 Místní komunikace a SO 102 Chodník pro pěší jsou objektem SO 402 přímo dotčené a nelze je realizovat a dokončit před dokončením objektu SO 402

Článek 3
Doba a místo plnění


1. V článku č. 3 se odstavec č.1 mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 30.4.2022.

OSTATNÍ BODY SMLOUVY ZŮSTAVAJÍ BEZE ZMĚN

v Želešicích dne 8.12.2021

V Blažovicích dne 11.12.2021

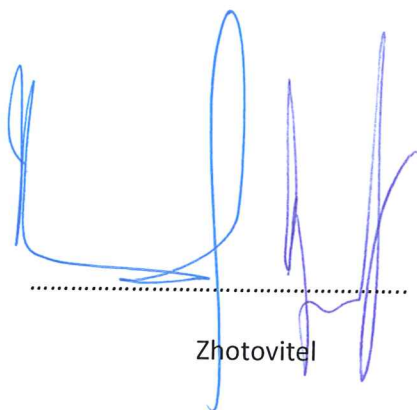

.....
Zhotovitel

Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel
VS-build, s.r.o.

Ing. Michal Garláthy, jednatel
VS-build, s.r.o.

VS-build, s.r.o.

Družstevní 369, 664 43 Želešice

IČ: 28 31 20 15

[4]



.....
Petr Pleva, objednatel
