



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	21. 09. 2015
Ev.č.	ZL-048-S-Z-SO 3.002	Datum schválení	29. 09. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS **)		Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh / SO 3.002 - LOKALITA UL. U DRAHY / ul. Zelená		
<u>Specifikace změny:</u> Při provádění stoky 02.2.2 v úseku mezi Š02.2.21 až 02.2.2-2 bylo při výkopu rýhy zastiženo kabelové vedení O2. Kabelová trasa je uložena těsně na stávajícím potrubí DN600. Nově rekonstruovaná stoka má být provedena potrubím DN800 ŽB, které bude v kolizi se stávajícími kabely. Zhotovitel navrhuje přeložení kabelů O2, aby bylo možné realizovat stoku 02.2.2.			
<u>Předmětem změnového listu je:</u> - Přeložení telekomunikačního vedení			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	13 207,35 Kč		
<u>Stanovisko správce stavby:</u> <i>Uniklun kolizi kabelů O2 s novou stávkou může být přeložen kabel? dopř. Spíše je lepší s novým řízením souhlasit a dýmkou přiznatel. tak schválit. Bez přeložení kabelů O2 nelze provést u výkopu u úseku 02.2.2.</i>			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iničiační dopis + situace 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Faktura O2 Czech Republic a.s. 5) Fotodokumentace 6) Stavební deník 7) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.		





OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit xx)  SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu	 AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ46984971 Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu
Datum: 21. 09. 2015	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění xx) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno závod Brno - VHS a.s. 4 Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji xx)  Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilová 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel.: 583 317 111 fax: 583 214 845 Jiří Vykydal - manažer projektu 29. 09. 2015

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

xx) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Aquaprocon

Ing. Vlastislav Kolečkář

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Holotík Vladimír	holotikv@imosbrno.eu / 602 713 982	14.10.2014

Iniciační dopis č. ID-048-S-Z-SO 3.002 - Kolize stoky 02.2.2 s vedením O2

Aktuální stav:

Při provádění stoky 02.2.2 v úseku mezi Š02.2.21 až 02.2.2-2 bylo při výkopu rýhy zastiženo kabelové vedení O2. Kabelová trasa je uložena těsně na stávajícím potrubí DN600. Nově rekonstruovaná stoka má být provedena potrubím DN800 ŽB, které bude v kolizi se stávajícími kabely.

Návrh řešení:


Přeložení kabelů O2.

Žádáme zodpovědného projektanta o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a návrh řešení.

S pozdravem

Ing. Holotík Vladimír

Dne 14.10.2014

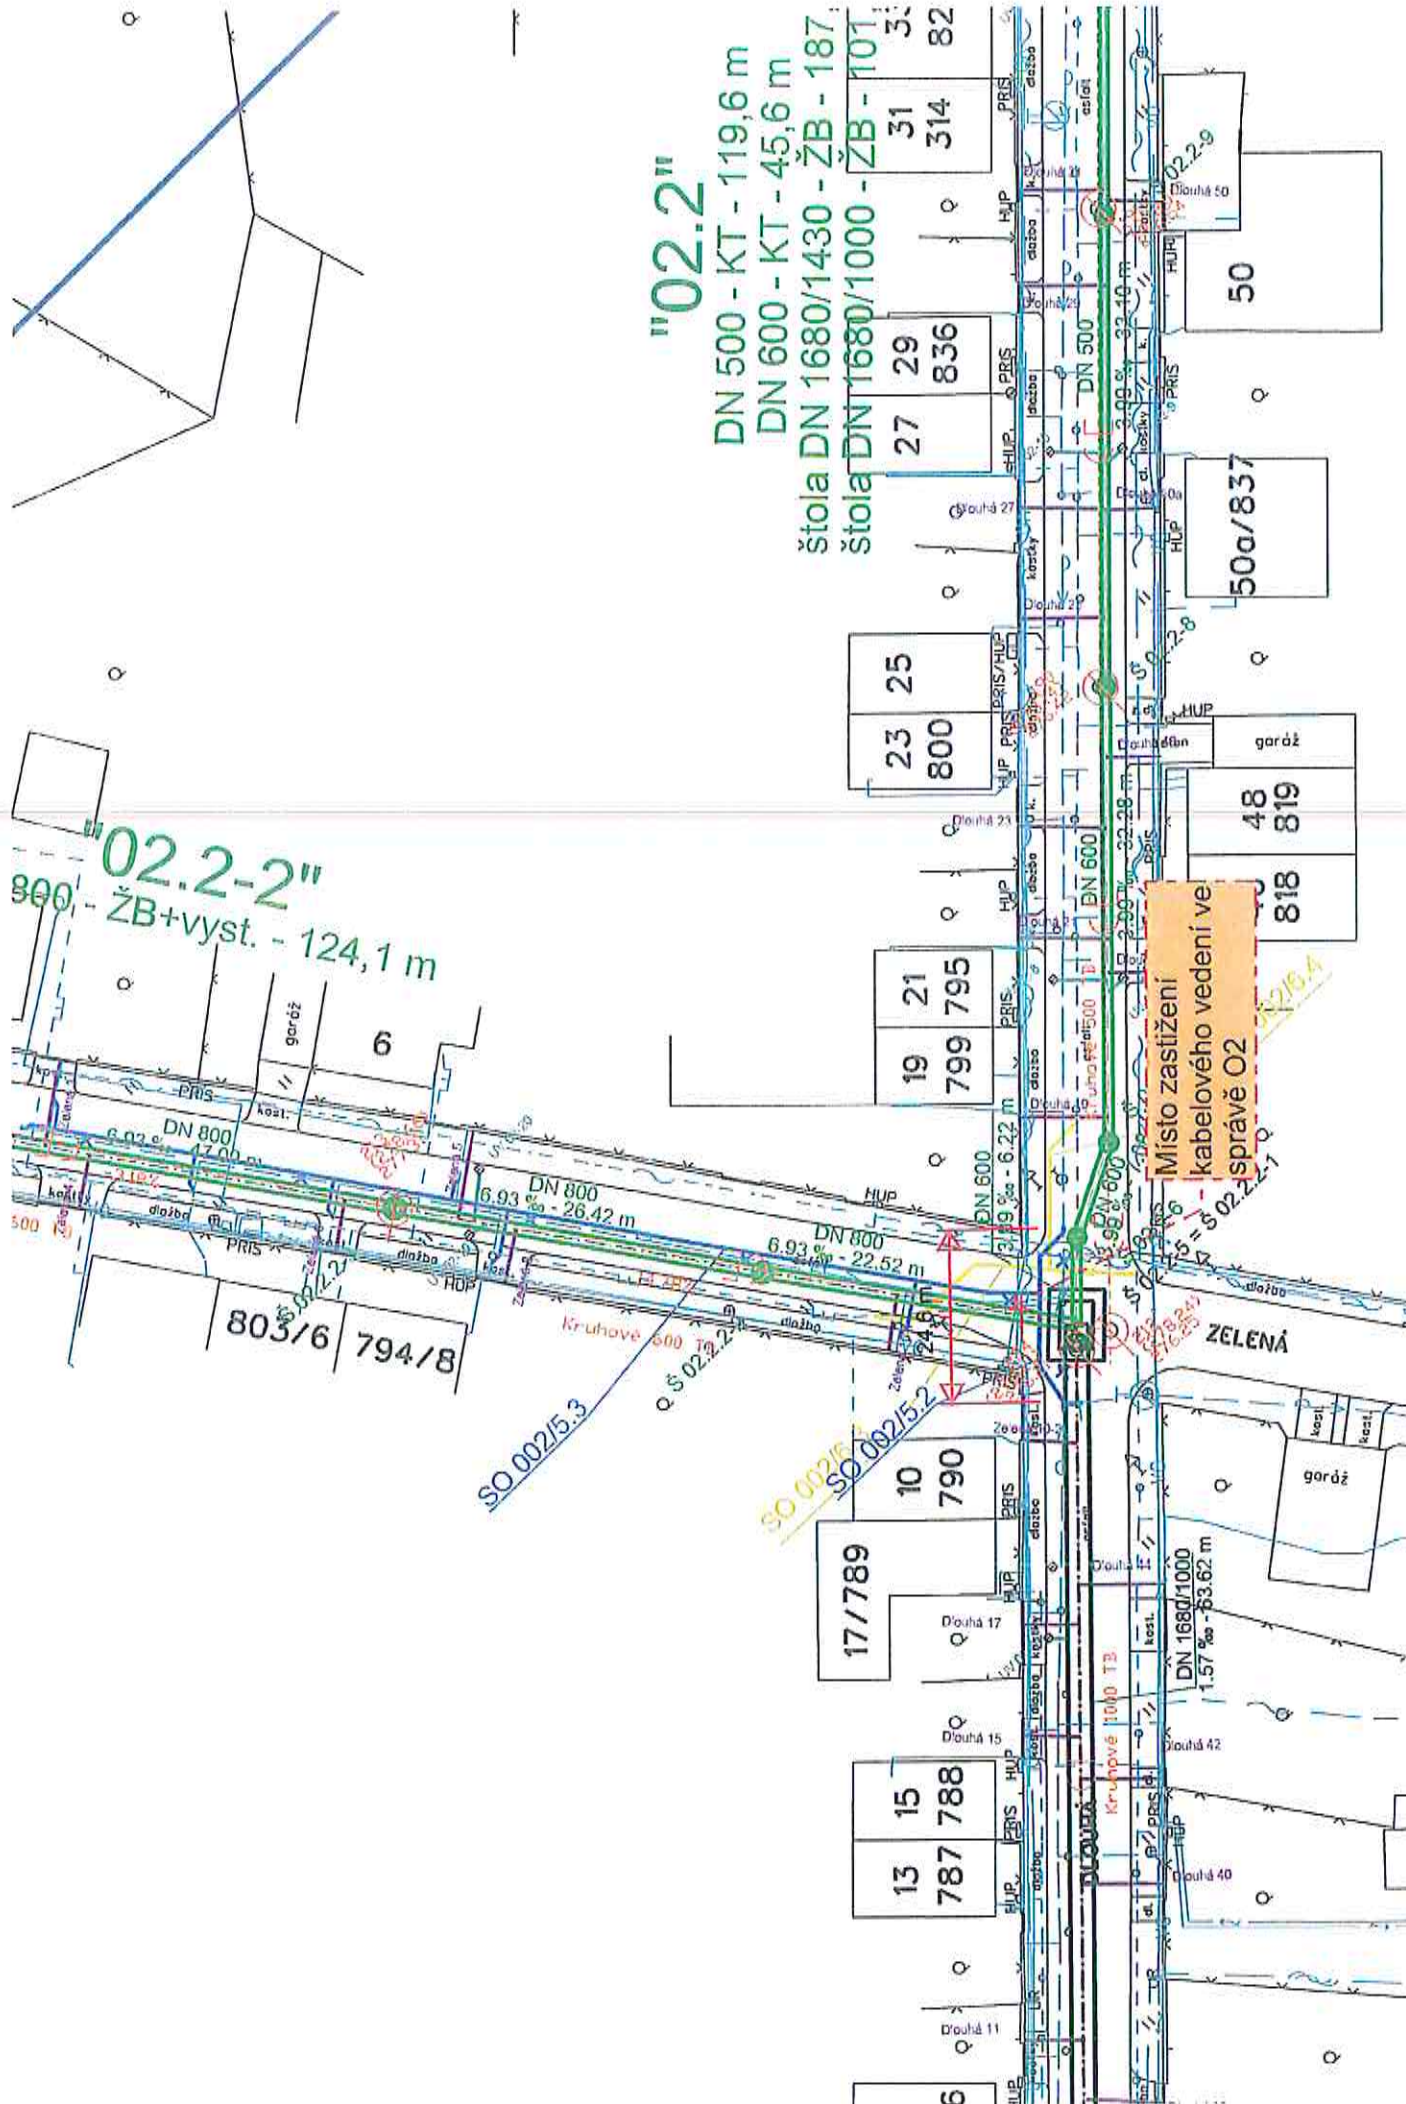

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvémú listu č. ZL-048-S-Z-SO 3.002

3. Město Zábřeh /SO 3.002

Kolize stoky 02.2.2 s vedením O2, přeložení kabelů O2

Poř.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-048-S-Z-SO 3.002	
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
SO 3.002 - LOKALITA UL. U DŘÁHY												
Přeložení kabelů O2												
n1	Překládka telekomunikačního vedení	kpl	0,00	13 207,35	0,00	1,00	13 207,35	13 207,35	1,00	13 207,35	13 207,35	0,00
	<i>doloženo fakturou O2 Czech Republic a.s.</i>											
ZL-048-S-Z-SO 3.002 CELKEM :						0,00		13 207,35		13 207,35	13 207,35	0,00



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 439/15/K
Datum: 14. 10. 2014
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iničiační dopis č.: ID-048-S-Z-SO 3.010

Vyřádění projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při provádění stoky 02.2.2 v úseku mezi šachtami Š 02.2.2-2 bylo při výkopu zastiženo kabelové vedení O2. Kabelová trasa je uložena bezprostředně nad stávajícím potrubím DN 600 (v přímém kontaktu). Nově rekonstruovaná stoka má být větší a má mít dimenzi DN 800. Za stávajících poměrů nelze potrubí DN 800 položit, neboť jej nelze podvléknout pod kabelové vedení.

Zhotovitel navrhuje provedení přeložky kabelu.

Projektant s návrhem zhotovitele souhlasí, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. O přesném výškovém a směrovém průběhu stávajícího kabelového vedení potrubí nebyly k dispozici žádné podklady. Bez realizace přeložky kabelu O2 nebude možné dokončit stoku 02.2.2.

Za projektanta:

Datum:

Ing. Vlastislav Kolečkář

Podpis:





IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 93-7/15/K
Datum: 14. 10. 2014
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-048-S-Z-SO 3.010

Vyjádření generálního projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při provádění stoky 02.2.2 v úseku mezi šachtami Š 02.2.2-2 bylo při výkopu zastiženo kabelové vedení O2. Kabelová trasa je uložena bezprostředně nad stávajícím potrubím DN 600 (v přímém kontaktu). Nově rekonstruovaná stoka má být větší a má mít dimenzi DN 800. Za stávajících poměrů nelze potrubí DN 800 položit, neboť jej nelze podvléknout pod kabelové vedení,

Zhotovitel navrhuje provedení přeložky kabelu.


Z pozice generálního projektanta s navrženým řešením souhlasíme. Vzniklou situaci nebylo možno předvídat. Bez provedení přeložky kabelu O2 nebude možné stoku 02.2.2 dokončit.

Za generálního projektanta:

Datum:

Ing. Jan Polášek

Podpis:





IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 439/15/K
Datum: 14. 10. 2014
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jol

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iničiační dopis č.: ID-048-S-Z-SO 3.010

Vyjádření projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při provádění stoky 02.2.2 v úseku mezi šachtami Š 02.2.2-2 bylo při výkopu zastiženo kabelové vedení O2. Kabelová trasa je uložena bezprostředně nad stávajícím potrubím DN 600 (v přímém kontaktu). Nově rekonstruovaná stoka má být větší a má mít dimenzi DN 800. Za stávajících poměrů nelze potrubí DN 800 položit, neboť jej nelze podvléknout pod kabelové vedení.

Zhotovitel navrhuje provedení přeložky kabelu.

Projektant s návrhem zhotovitele souhlasí, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. O přesném výškovém a směrovém průběhu stávajícího kabelového vedení potrubí nebyly k dispozici žádné podklady. Bez realizace přeložky kabelu O2 nebude možné dokončit stoku 02.2.2.

Za projektanta:

Datum:

Ing. Vlastislav Kolečkář

Podpis:



31091

DF 14/26.06.0

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vložka 2322		IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336	Variabilní symbol: 2014600979 Naše číslo: 200000167319 Strana: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Došlo: - 5 -01- 2015 S. jedn.: Vyzváno:
Bankovní data: Konstantní symbol: 0308 Číslo účtu: 0000274908440207/0100 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Adresa: Na Příkopě 33 (PO Box 839), 114 07 Praha 1		Odběratel: IČ: 25322257 DIČ: CZ25322257 IMOS Brno, a.s. - Olomoucká 704/174 627 00 Brno Referenční číslo: 4000101422	
Datum splatnosti: 22.01.2015		Datum vystavení dokladu: 23.12.2014 Datum uskutečnění plnění: 19.12.2014	

Fakturuje Vám za překládku telekomunikačního vedení

Cena bez DPH

13.207,35 CZK

Rekapitulace DPH v CZK:

Sazba	Základ daně	Daň	Částka vč.daně
Výstupní DPH 0,00%	13.207,35	0,00	13.207,35
Celkem	13.207,35	0,00	13.207,35

Celkem k úhradě

13.207,35 CZK

Položky s nulovou DPH jsou stavebními činnostmi dle § 92e zákona o DPH. Zákazník je u těchto položek povinen přiznat a zaplatit DPH v zákonné výši. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Lenka Kobzová
 Tel.: +420596682597 Fax:
 Email: lenka.kobzova@o2.cz

7/10



OZNÁMENÍ O UKONČENÍ REALIZACE PŘEKLÁDKY

Společnost O2 Czech Republic a.s. na základě objednávky na realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPU/MM/2014/0060, uzavřenou dne 4.12.2014 oznamuje, že ukončila Překládku sítě elektronických komunikací vyvolanou Stavebníkem:

Název Překládky a její číslo: **TVH 841912/14 Zábřeh, přeložení telef. kabelu**

Stavebník požadující Překládku: **IMOS Brno, a.s.**

Vlastník překládané sítě elektronických komunikací: **O2 Czech Republic a.s.**

Náklady na Překládku: **13.207,35 Kč bez DPH**

Rozsah Překládky: **dle objednávky**

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovskou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193335

794

Jaromír Bedáň
Specialista ochrany sítě Morava Sever

V Šumperku dne 19.12.2014



(OP 1278 VY 375/3356)

