



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	3. 11. 2015
Ev.č.	ZL-115-S-Z-SO 3.007	Datum schválení	6. 11. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS **)		Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh / SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK / STOKA 07.1-2.ČÁST		
<u>Specifikace změny:</u> Při realizaci stoky 07.1 - 2 část byla v trase zjištěna stávající vodoteč – zatrubněný potok, který prochází souběžně s trasou nově budované kanalizace. Pravděpodobně zajišťuje odvodnění lokality Oborník do stávajícího rybníka Oborník. Tato vodoteč byla pravděpodobně vybudována již na počátku 20. století, a proto nebyla ani v podkladech provozovatele kanalizace (ŠPVS), ani v podkladech města Zábřeh. Z důvodu velmi stísněných prostorových podmínek navrhuje zhotovitel lokální změnu dimenze navrhované stoky z DN 1 000 na DN 600. Tuto změnu je možno provést i díky tomu, že v místě záměny dimenze je možno lokálně zvýšit podélný sklon a tím zachovat kapacitní parametry navrhované stoky. Snížením dimenze potrubí dojde ke snížení šířky rýhy z původních 2,55 m na 1,85 m, což už bude umožňovat realizaci tohoto úseku stoky 07.1-2. část.			
Předmětem změnového listu je: - Snížení profilu z ŽB DN 1000 na KT DN 600 na stoce 07.1 - 2. část			
Finanční dopad změny:	Snížení		
Změna ceny po schválení:	-343 290,17 Kč		
Stanovisko správce stavby: <i>S konkrétním návrhem snižování stoky souhlasím, doplněním pro op. důstojnost schválit tento návrh stoky, bez nutnosti zbytečného prodloužení v této věci stř.</i>			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis + situace 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Fotodokumentace 5) Stavební deník 6) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.		



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu


Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji-schválit **) SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu	 AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ46964971 Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu
Datum: 3. 11. 2015	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 IMOS Brno, a.s. Olešnická 174, 627 00 Brno závod Brno - VHS a DS Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **) Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilová 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel.: 583 317 1111 fax: 583 244 046 Jiří Vykydal - manažer projektu 6. 11. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Tým Správce stavby

Horní Pomoraví II - sever

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Martin Spáčil	spacilm@imosbrno.eu / 739 391 653	24.8.2015

Iniciační dopis ID-115-S-Z-SO 3.007 - KOLIZE NA STOCE 07.1 - 2 část se stávající dešťovou kanalizací

Aktuální stav:

Při realizaci stoky 07.1 - 2 část zjištěna stávající vodoteč - potok, která prochází souběžně s trasou nově budované kanalizace. Pravděpodobně zajišťuje odvodnění zatrubněného potoka z lokality Oborník do stávajícího rybníka Oborník.

Tato vodoteč nebyla v podkladech u provozovatele kanalizace (ŠPVS Šumperk, ani v podkladech Města Zábřeh. Tato vodoteč byla pravděpodobně vybudovaná v minulém století.


Návrh řešení:

Z důvodu stísněných prostorových podmínek bylo nutné změnit profil navrhované stoky z DN 1 000 na DN 600. Mezi revizní šachtou RŠ 07.1-5 a RŠ 07.1-7 na základě výpočtu projektanta dojde ke změně profilu a spádu, navržený profil je KT DN 600 a spád 1,2%. Tím dojde ke zmenšení šířky nutné pažené rýhy pro pokládku kameninového potrubí. Pro pokládku ŽB DN 1 000 je potřebná rýha šířky 2 550 mm a pro KT DN 600 je 1 850 mm.

Žádáme tým správce stavby o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Martin Spáčil

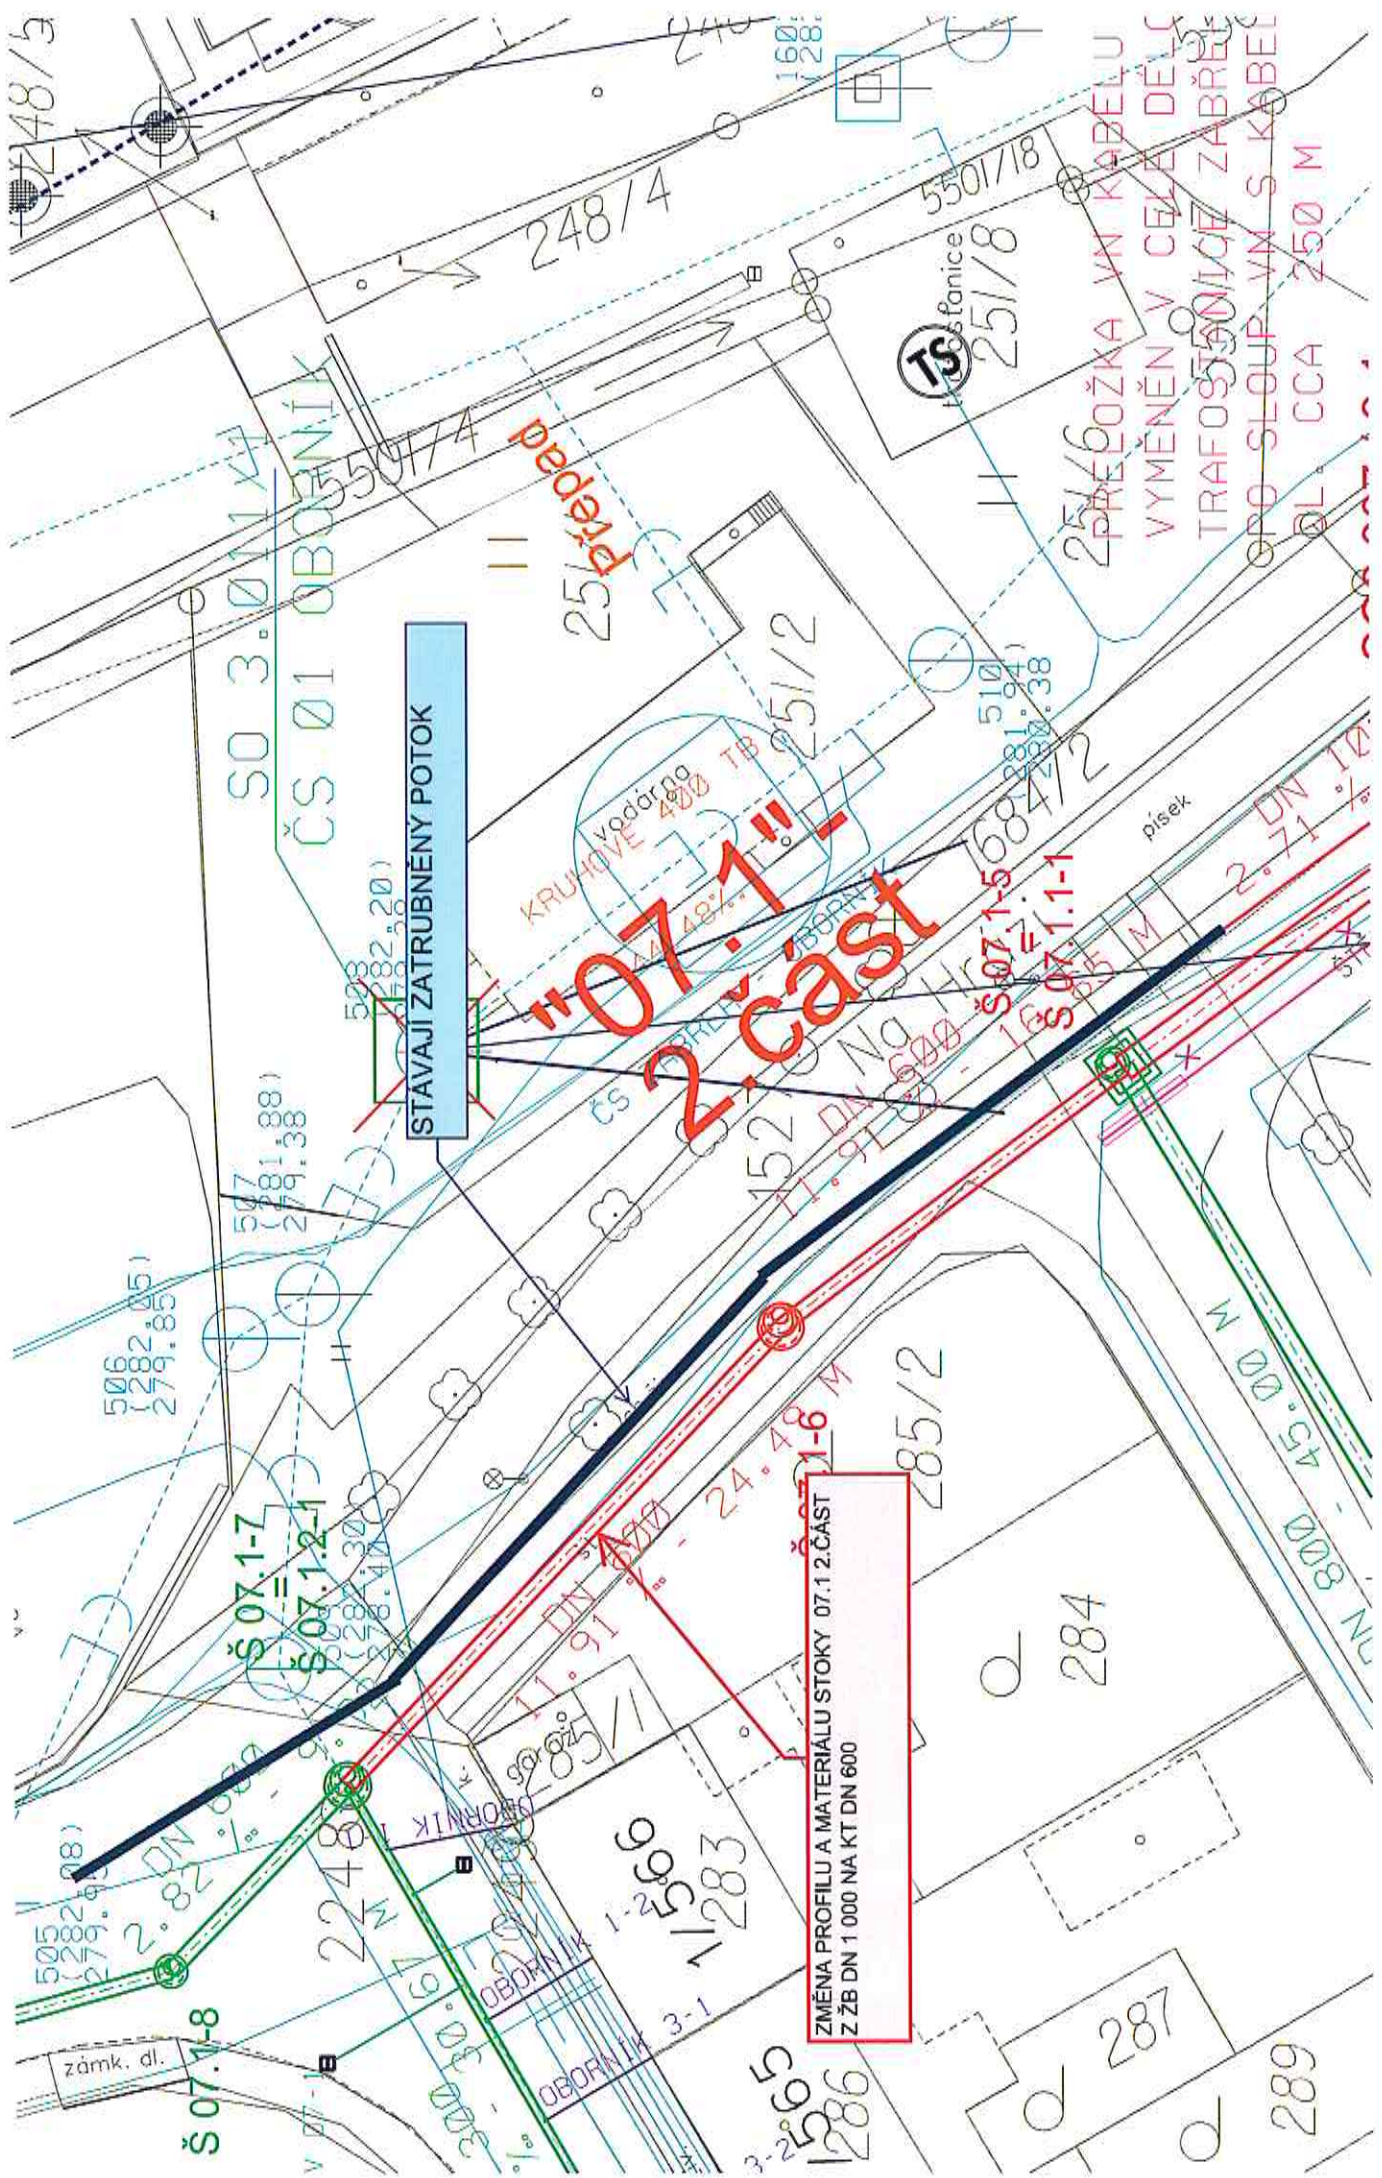

STAVAJÍ ZATRUBNĚNÝ POTOK

ČS 01 OBORNÍK

07.1-2 část

ZMĚNA PROFILU A MATERIÁLU STOKY 07.1.2 ČÁST
Z ŽB DN 1 000 NA KT DN 600

251/6
PŘELOŽKA VN KABELU
VYMĚNĚN V CELE DĚL
TRAFOSTANICE ZABŘE
OPRO SLOUP VN S KABEL
DL CCA 250 M

Staniční
251/8

písek

zámk. dl.

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-115-S-Z-SO 3.007

3. Město Zábřeh / SO 3.007

Stoka 07.1 - 2. část - snížení profilu z ŽB DN 1000 na KT DN 600

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD				Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-115-S-Z-SO 3.007	
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč		Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK - Změna profilu na stoce 07.1-2.část z ŽB DN1000 na KT DN600													
STOKA 07.1-2.ČÁST - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
143	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,65	154,90	875,19	4,95	154,90	766,76	-0,70	-108,43	0,00	-108,43	
144	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	116,26	270,10	31 401,83	107,58	270,10	29 057,36	-8,68	-2 344,47	0,00	-2 344,47	
146	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 041,78	214,80	223 773,64	958,88	214,80	205 967,85	-82,89	-17 805,79	0,00	-17 805,79	
147	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	78,41	964,30	75 613,95	72,17	964,30	69 597,29	-6,24	-6 016,66	0,00	-6 016,66	
149	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 424,25	26,70	38 027,48	1 424,25	26,70	38 027,53	0,00	0,05	0,05	0,00	
150	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	572,97	37,50	21 486,51	527,39	37,50	19 776,94	-45,59	-1 709,57	0,00	-1 709,57	
151	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	53,53	40,70	2 178,49	50,10	40,70	2 038,89	-3,43	-139,60	0,00	-139,60	
152	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	677,16	280,70	190 078,81	623,27	280,70	174 952,82	-53,89	-15 125,99	0,00	-15 125,99	
154	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	78,41	294,90	23 123,11	72,17	294,90	21 284,08	-6,24	-1 839,03	0,00	-1 839,03	
155	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	572,38	86,00	49 224,62	570,69	86,00	49 079,76	-1,68	-144,86	0,00	-144,86	
156	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	216,76	296,80	64 335,53	173,40	296,80	51 465,80	-43,36	-12 869,73	0,00	-12 869,73	
158	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	677,16	109,10	73 878,16	623,27	109,10	67 999,12	-53,89	-5 879,04	0,00	-5 879,04	
159	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	78,41	109,10	8 554,53	72,17	109,10	7 874,17	-6,24	-680,36	0,00	-680,36	
160	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	230,82	536,00	123 720,27	261,18	536,00	139 992,91	30,36	16 272,64	16 272,64	0,00	
161	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	402,17	276,10	111 039,14	321,73	276,10	88 828,38	-80,44	-22 210,76	0,00	-22 210,76	

Zemní práce celkem :																			1 037 311,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Příloha č.2 ke změnóvémú listu č. ZL-115-S-Z-SO 3.007

257	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavěbrováním	m2	119,26	22,90	2 731,05	89,27	22,90	2 044,31	-29,99	-686,74	0,00	-686,74
	Komunikace celkem :				27 465,57			20 559,12		-6 906,45	0,00	-6 906,45
	ZL-115-S-Z-SO 3.007 CELKEM:				3 091 180,86			2 747 890,69		-343 290,17	342 456,05	-685 746,22



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 487/15/K
Datum: 26. 8. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iniciační dopis č.: ID-115-S-Z-SO 3.007 Kolize na stoce 07.1-2.část se stávající dešťovou kanalizací

Vyjádření projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky 07.1 - 2 část byla v trase zjištěna stávající vodoteč – zatrubněný potok, který prochází souběžně s trasou nově budované kanalizace. Pravděpodobně zajišťuje odvodnění lokality Oborník do stávajícího rybníka Oborník.

Tato vodoteč byla pravděpodobně vybudována již na počátku 20. století, a proto nebyla ani v podkladech provozovatele kanalizace (ŠPVŠ), ani v podkladech města Zábřeh.


Z důvodu velmi stísněných prostorových podmínek navrhuje zhotovitel lokální změnu dimenze navrhované stoky z DN 1 000 na DN 600. Tuto změnu je možno provést i díky tomu, že v místě záměny dimenze je možno lokálně zvýšit podélný sklon a tím zachovat kapacitní parametry navrhované stoky. Snížením dimenze potrubí dojde ke snížení šířky rýhy z původních 2.55 m na 1.85 m, což už bude umožňovat realizaci tohoto úseku stoky 07.1-2. část.

Projektant s návrhem souhlasí, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. V době zpracování zadávací i realizační dokumentace nebyly k dispozici údaje o existenci a poloze zatrubněného potoka. Teprve po provedení zemních prací na předmětném úseku stoky 07.1-2. část bylo zjištěno výše uvedené skutečnosti. Bez provedení úpravy navržené zhotovitelem není možno dokončit stoku 07.1-2. část.

Za projektanta:

Datum:

Ing. Vlastislav Kolečkář





IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 487-1/15/K
Datum: 26. 8. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-115-S-Z-SO 3.007 Kolize na stoce 07.1-2.část se stávající dešťovou kanalizací

Vyjádření generálního projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky 07.1 - 2 část byla v trase zjištěna stávající vodoteč – zatrubněný potok, který prochází souběžně s trasou nově budované kanalizace. Pravděpodobně zajišťuje odvodnění lokality Oborník do stávajícího rybníka Oborník.

Tato vodoteč byla pravděpodobně vybudována již na počátku 20. století, a proto nebyla ani v podkladech provozovatele kanalizace (ŠPVS), ani v podkladech města Zábřeh.

Z důvodu velmi stísněných prostorových podmínek navrhuje zhotovitel lokální změnu dimenze navrhované stoky z DN 1 000 na DN 600. Tuto změnu je možno provést i díky tomu, že v místě záměny dimenze je možno lokálně zvýšit podélný sklon a tím zachovat kapacitní parametry navrhované stoky. Snížením dimenze potrubí dojde ke snížení šířky rýhy z původních 2,55 m na 1,85 m, což už bude umožňovat realizaci tohoto úseku stoky 07.1-2. část.

Z pozice generálního projektanta s návrhem souhlasíme, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. V době zpracování zadávací i realizační dokumentace nebyly k dispozici údaje o existenci a poloze zatrubněného potoka. Teprve pro provedení zemních prací na předmětném úseku stoky 07.1-2. část bylo zjištěno výše uvedené skutečnosti. Bez provedení úpravy navržené zhotovitelem není možno dokončit stoku 07.1-2. část.

Za generálního projektanta:


Datum:

Ing. Jan Polásek



AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
KB Brno-venkov č. ú.: 24301641/0100
Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

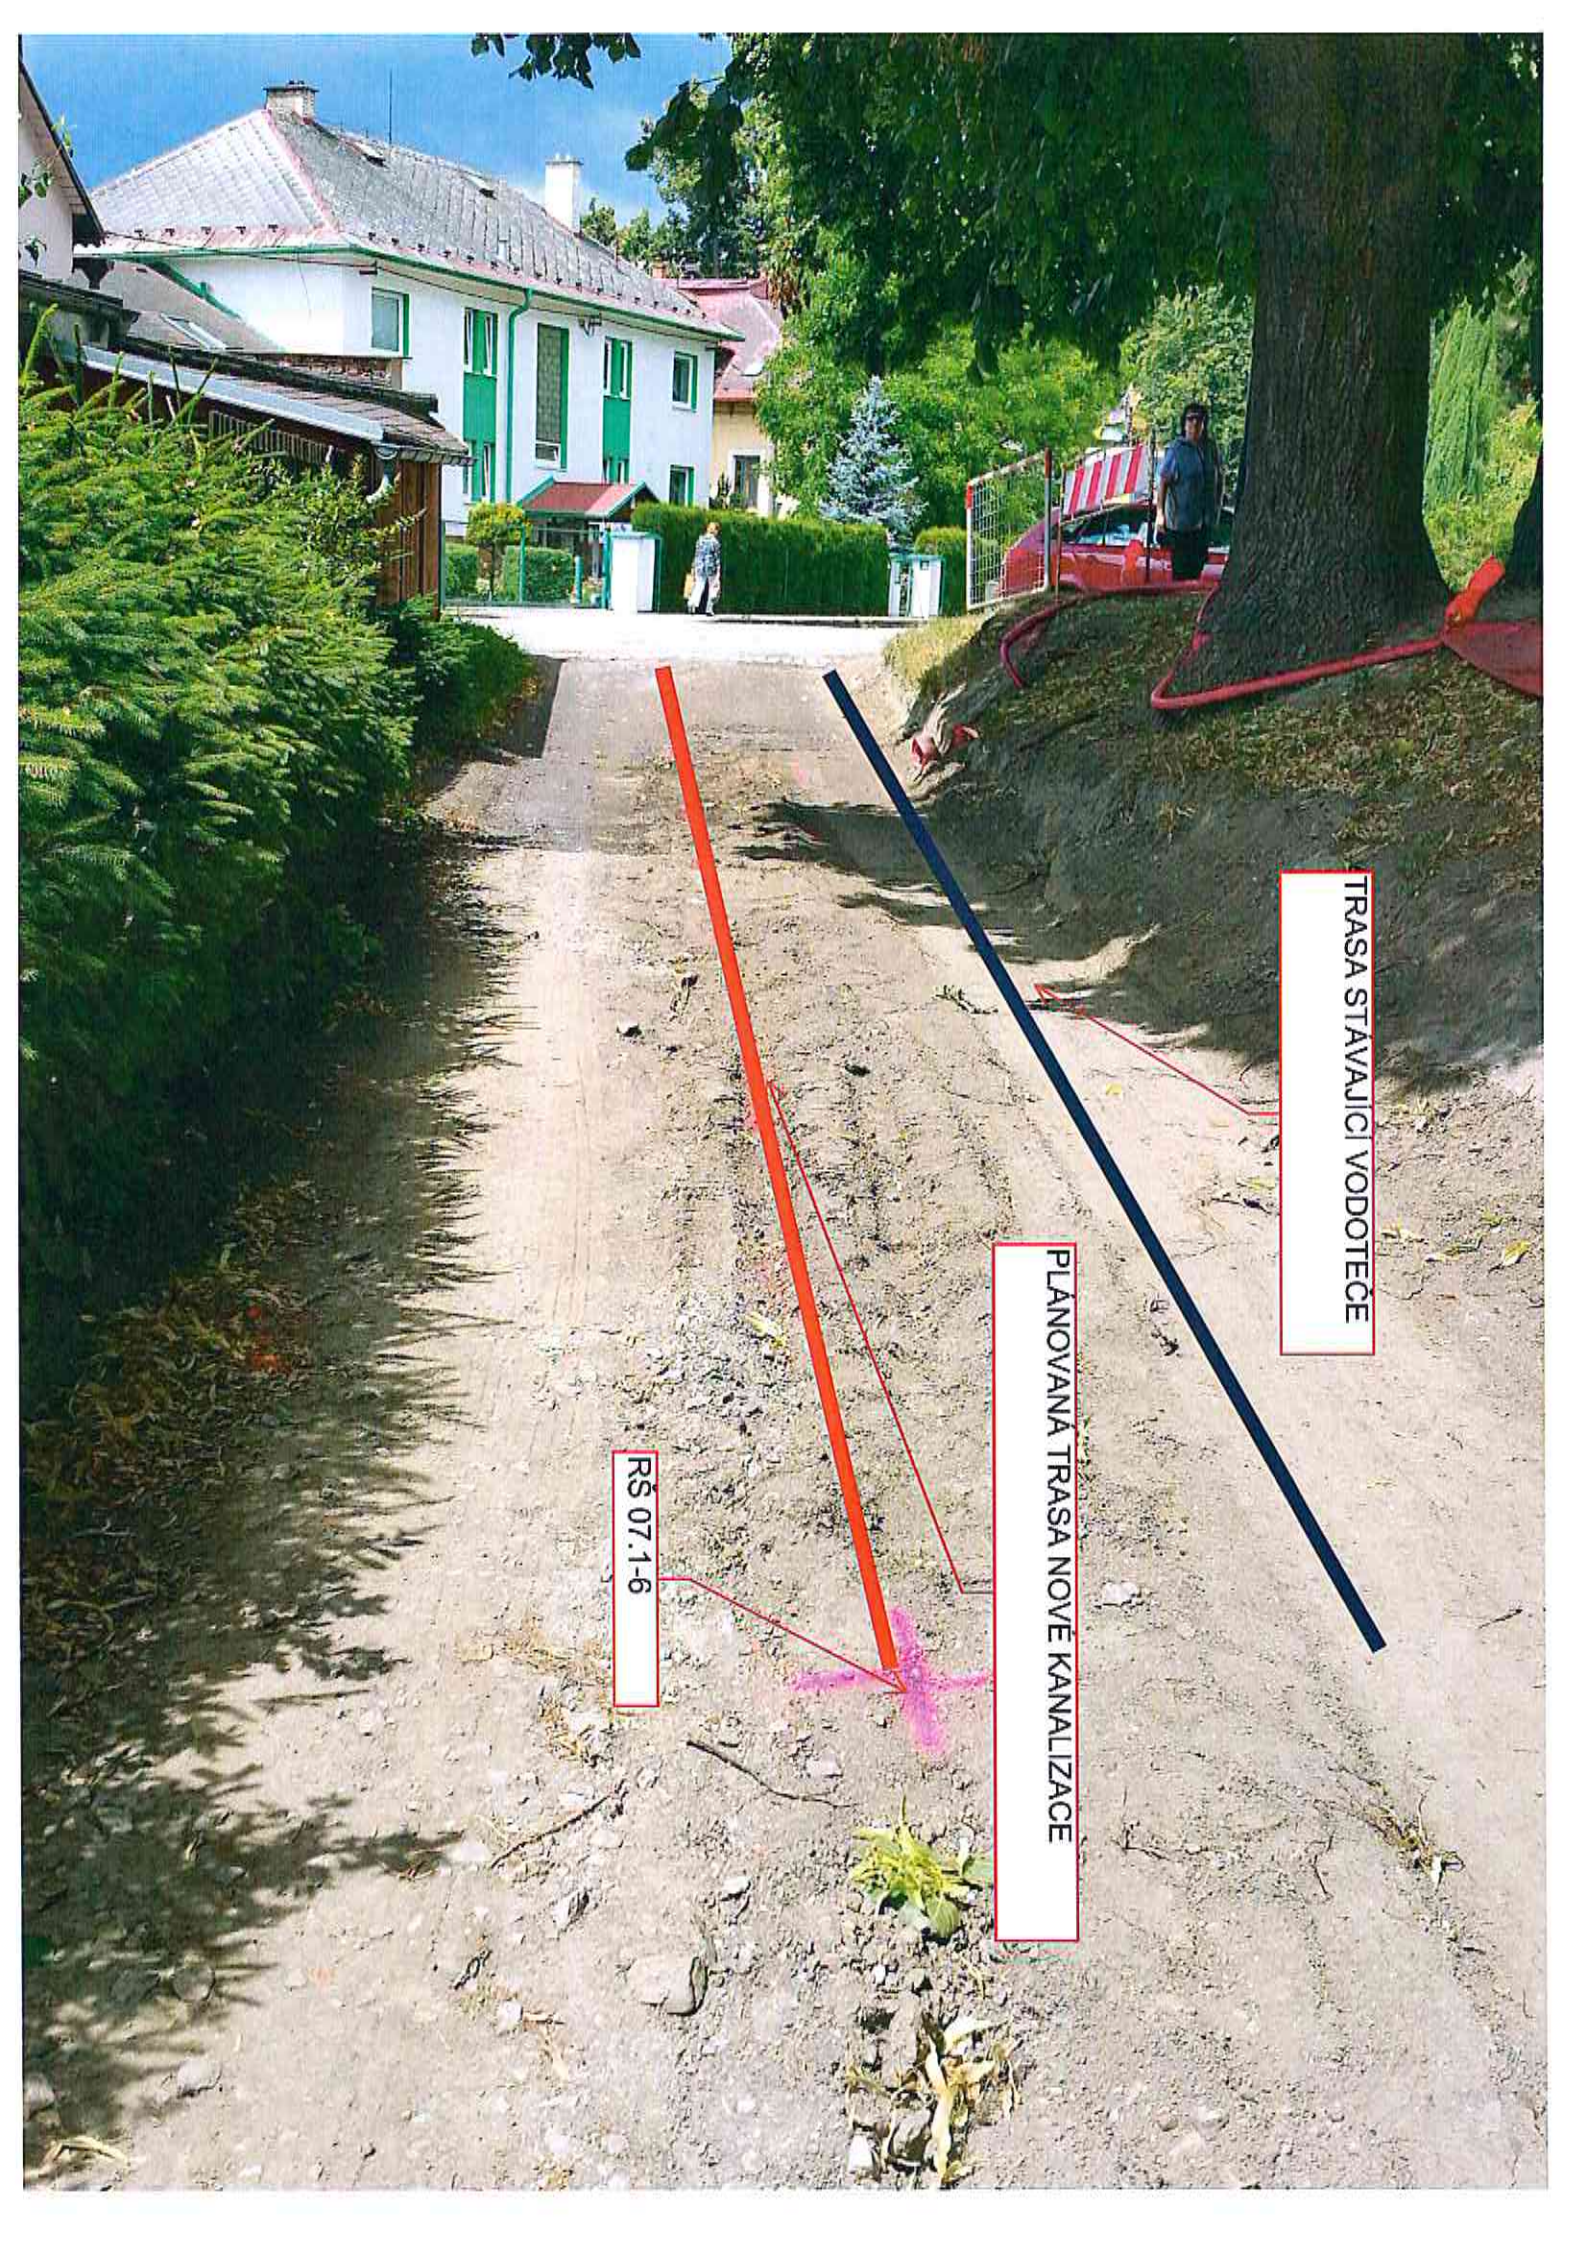

TRASA STAVAJICI VODOTEČE

PLANOVANÁ TRASA NOVE KANALIZACE


RS 07.1-6

TRASA
KANALIZACE

ZATRUBNĚNÁ VODOTEČ



39

Datum	Denní záznamy stavby
24.8.2015	
ZÁPIS:	Z důvodu stísněných prostorových podmínek mezi inženýrskými sítěmi a požadovanou výstavbou státní kanalizace bylo nutné změnit profil (02-3) stoky z ŽB 1000 na KT DN 500 a to mezi RS 02.3-2 a Ř 02.3-2 
24.8.2015	03.1 - REALIZACE KANALIZAČNÍ PŘEPRAVY 03.1-1 výkop pažení žby v úseku Š11-Š12 pokládka potrubí KT DN 300 do RČ. stoka OBČST + ZÁST + HUTNIN
	03.2 - výkop pažení žby v úseku Š13-Š14 pokládka KT DN 300 do RČ. stoka OBČST + ZÁST + HUTNIN
	03.2 - REALIZACE MONOLITICKÉ ČÁSTI - Š17
	03.3 - REALIZACE POKRYTÍ
	04.1 - výkop pažení žby v úseku Š5-Š6 pokládka ŽB DN 800 do RČ. stoka OBČST + ZÁST + HUTNIN
	007/Š.1, Š.2 - REALIZACE VODOVODNÍ PŘELOŽKY
	07.1.1 výkop pažení žby v úseku Š21-Š22 pokládka KT DN 400 do RČ. stoka OBČST + ZÁST + HUTNIN
	07.1.1.1 část - výkop pažení žby v úseku Š8-Š9 pokládka KT DN 400 do RČ. stoka OBČST + ZÁST + HUTNIN
ZÁPIS	PŘI REALIZACI STOKY 7.1-2 část byla zjištěna slabší vodorovná část, která vyžaduje dodatečné státní kování pokládání kanalizace ŽB DN 1000. Z důvodu stísněných prostorových podmínek kurzů proskladit závit profilu na KT DN 600. 



Šumerská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

☎ 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603-841/0100

AQUA Procon s.r.o.
Ing. Kolečkář
Palackého tř. 12,
612 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

e-mail

Vyřizuje/

Šumperk

1229

50000/2015

heitmar@spvs.cz

Heitmar Petr

5.11.2015

Věc: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“

Týká se: „Horní Pomoraví II sever, Město Zábřeh „

Šumerská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk jako provozovatel obdržela od zhotovitele stavby fa: IMOS BRNO, a.s. žádost o vyjádření k předloženému stanovisku (Iniciační dopis ID-115-S-Z-SO 3.007 – Kolize na stoce 07.1 – 2 část se stávající dešťovou kanalizací).

Šumerská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk k předloženému návrhu konstatuje následující:

- S navrženým řešením souhlasíme.

S pozdravem

Šumerská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911
-6-

Ing. Pavel Paloncý
technický ředitel
