

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.02.2026

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Třebotov**
Se sídlem: Klidná 69, 252 26 Třebotov
IČO: 00241741
DIČ: CZ00241741
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 126584339/0800
Zastoupená: Ing. Matějem Králem, starostou obce

(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **Společnost „ESB/EUROGAS – ČOV Třebotov“**
se sídlem: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 – Motol

Správce společnosti: Energie – stavební a báňská a.s.
Se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802
Zastoupený: Ing. Oldřichem Vytiskou, předsedou představenstva
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1000141/0100

Společník 2: EUROGAS a.s.
Se sídlem: Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 61859974
DIČ: CZ61859974
Zastoupený: Ing. Janem Kdýrem, předsedou představenstva
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2593

(dále jen "**zhotovitel**")

uzavírají v souladu s článkem XIX. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27.02.2026 dodatek č. 1 takto:

PREAMBULE

Důvodem k uzavření dodatku č. 1 je změna rozsahu prací zhotovitele, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl při uzavření smlouvy ani při zahájení realizace díla při vynaložení odborné péče předvídat, a tyto práce jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.

Objednatel a zhotovitel proto projednali a odsouhlasili změnový list ZL č. 01, jehož předmětem je navýšení rozsahu zemních prací na objektu SO 02. V důsledku uvedených změn dochází k navýšení ceny díla o 1 038 564,44 Kč bez DPH. Provedení změn dohodnutých tímto změnovým listem nemá vliv na termín dokončení díla.

Smluvní strany shodně prohlašují, že změna sjednaná tímto dodatkem nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Uzavření tohoto dodatku je proto v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I.

Změna článku II. smlouvy (Předmět smlouvy)

1.1 Čl. II., odst. 1. smlouvy – na konec textu odstavce se připojuje další úprava takto:

„ Součástí předmětu plnění jsou také práce a dodávky spojené se změnami v předmětu díla zhotovitele, na kterých se objednatel se zhotovitelem v průběhu realizace prací dohodl, spočívající v **navýšení objemu zemních prací SO 02**, a jejichž rozsah je uveden ve změnovém listě ZL č. 01, který tvoří přílohu k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. “

II.

Změna článku III. smlouvy (Cena díla)

2.1 Čl. III., odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„ 1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši

33 285 568,79 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny :

Cena dle základní smlouvy o dílo	32 247 004,35 Kč
Cena dle dodatku č. 1	1 038 564,44 Kč
Cena dle základní smlouvy a dodatku č. 1 celkem	33 285 568,79 Kč

Pro účely této smlouvy se cenou díla rozumí vždy cena díla bez DPH. “

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek byl schválen na 8. zasedání zastupitelstva Obce Třebotov konaném dne 02.09.2026 usnesením č. 4/8/26.

- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 3.5 Příloha: Změnový list ZL č. 01

V Třebotově dne: 11.9.2026

V Praze dne 10-09-2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Třebotov
Ing. Matěj Král
starosta obce



Společnost „ESB/EUROGAS – ČOV Třebotov“
Ing. Oldřich Vytiska
předseda představenstva
Energie – stavební a báňská a.s.
Správce Společnosti
na základě plné moci

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 8081
272 04 Kladno
(21)

"Intenzifikace čistírny odpadních vod Třebotov"

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Smlouva o dílo:	č. 160900/26 ze dne 27.02.2026		
Navrhovatel změny:	Energie - stavební a báňská a.s.		
Název změnového listu:	Zemní práce SO 02		
Objekt:	02 - SO 02.1 - Nová budova ČOV - stavební část		
Důvod a popis změny:	Změnový list doplňuje zadávací projektovou dokumentaci a výkazy výměr o změnu, která byla stanovena na prvním KD - tj. stavební jáma bude u stávající ČOV vyhloubena na úroveň základové spáry stávající ČOV (jejích nádrží) a následně dohloubena na úroveň projektované základové spáry nové ČOV (bod č.4 z 1.KD). Při provádění zemních prací byly zjištěny skutečné objemy hornin třídy těžitelnosti 3, 4, 5 a 6, které byly geodeticky zaměřeny.		
Technické řešení - příloha ZL:	Příloha č. 2 - Geodetické zaměření Příloha č. 3 - Kalkulace geodetických prací		
Dokumentace - příloha ZL:			
Cenová kalkulace - příloha ZL:	Příloha č. 1 - Rozpočet ZL č.01		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):			1 038 564,44 Kč
Dopad do smluvní ceny (DPH 21%):	21%		218 098,53 Kč
Dopad do smluvní ceny (včetně DPH):			1 256 662,97 Kč
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ANO / NE	
	Dopad do konečného termínu:	ANO / NE	
Vyjádření zhotovitele:	☒ souhlasí / ☐ nesouhlasí dne: 15.7.26 Svatopluk Dvořák podpis:		
Vyjádření projektanta:	☒ souhlasí / ☐ nesouhlasí dne: 15.7.26 Ing. Veronika Pittnerová podpis:		
Vyjádření technického dozoru:	☒ souhlasí / ☐ nesouhlasí dne: 15.7.26 Ing. Tomáš Melichar podpis:		
Vyjádření uživatele:	☐ souhlasí / ☐ nesouhlasí dne: podpis:		
Vyjádření objednatele:	☒ schvaluje / ☐ neschvaluje dne: 15.7.26 Ing. Matěj Král podpis:		

Intenzifikace čistírny odpadních vod Třebotov.....Zemní práce SO02										Č. ZL	1
Odpočet										Připočet	
č. pol. dle SO0	Kód	Specifikace	m.j.	j. cena	Celkem	č. pol. dle SO0	Kód	Specifikace	m.j.	j. cena	Celkem
Práce a dořadyk HSV										Zemní práce	
1	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů stropné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	-553,523	-110 446,59	1	4	131251105	dle SoD	199,57	48 295,94
2	131351105	Hloubení nezapažených jam a zářezů stropné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	-237,224	-46 260,39	2	5	131351105	dle SoD	279,40	205 359,00
3	131451104	Hloubení nezapažených jam a zářezů stropné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	-145,477	-105 730,98	3	6	131451104	dle SoD	726,85	382 323,10
4	131551104	Hloubení nezapažených jam a zářezů stropné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	-250,954	-263 738,16	4	7	131551104	dle SoD	906,46	418 794,52
5	138511101	Dolamování hloubených výkopů jam ve vrstvě II do 1000 mm v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6	m3	-48,492	-168 062,97	5	8	138511101	dle SoD	3 466,20	266 897,40
6	162451105	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	-713,414	-83 176,94	6	10	162451105	dle SoD	116,59	36 364,42
7	162451125	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	-382,701	-51 865,99	7	11	162451125	dle SoD	135,50	170 865,50
8	162451145	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	-339,447	-52 410,62	8	12	162451145	dle SoD	154,40	83 221,60
9	997	Přesun sušé	m3	-722,148	-207 971,40	9	61	99706005R	dle SoD	287,99	518 382,00
		Drcení výkopu kamenného a smíšeného s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičového zařízení	m3			10	212755214	CS URS 2026.01	m	73,50	3 675,00
						11		R položka	kpl	1,000	14 118,96
Celkem					-1 109 723,00	Celkem					2 148 287,44
										1 038 564,44	

Priloha č. 2 k ZL 01

energie
STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ

Odbor geodetických služeb
Energie – stavební a báňská a.s., Vašickova 3081, 272 04 Kladno 4
Tel.: +420 312 612 111, www.energie-as.cz, energie@enas.cz

Ing. Pavel Vraspír
Tel.: +420 312 612 367, mobil +420 724 381 904
E-mail: vraspir@enas.cz

Předávací protokol č. 4

Zakázka: G – 6767/26 – ČOV Třebotov – navýšení kapacity

Datum měření: 29.04.2026

Katastrální území: Třebotov (7703966)

Měřil: Martin Mikovec

Spolupracoval: Tomáš Jirgl

Přístroje: Trimble S5 - v.č. 37021535

Software: Kokeš verze 16.83, Atlas DMT 6

Vytyčeno podle: -

Název dokumentace:

Dodání dokumentace:

Geodetický systém: S-JTSK, Bpv

Pozn.:

Přílohy: 1. výkres situace bodů pro výpočet objemu, 2. seznamy souřadnic zaměřených bodů, 3. protokoly výpočtu objemu, 4. schema vrstev
5. 3D model terénu

Bylo provedeno geodetické zaměření výkopu jámy pro ČOV Třebotov – navýšení kapacity a vypočítány dílčí objemy jednotlivých vrstev a výměra spodní plochy.

Objemy jednotlivých vrstev:

původní terén – upravená hrana	242 m³
upravená hrana – podorníční vrstva	735 m³
podorníční vrstva - kamenité nadloží	526 m³
kamenité nadloží - tvrdá skála	462 m³

Výměra spodní plochy: **210 m²**

Náležitostmi a přesností odpovídá
právním předpisům.

Počet MJ:

Počet předaných kopií protokolu: 2

Vypracoval: Vyhotovil dne:	Ing. Pavel Vraspír 04.05.2026	Odběratel: Převzal dne:	Číslo ověření: Ověřil dne:
Podpis		Podpis	Podpis

X=1054700m Y=754600m

+

X=1054700m Y=754560m

+

areál ČOV Třebotov

Třebotov



Název výkresu	SITUACE BODŮ PRO VÝPOČET OBJEMU Zaměření hran terénu a vrstev hornin				
Zakázka	6767/26 – ČOV Třebotov – navýšení kapacity				
Číslo výkresu	6767/26/04/01	Souř. systém	S – JTSK	Měřítko	1 : 200
Datum	04.05.2026	Výšk. systém	Bpv	Formát	2 x A4

Třebotov ČOV - navýšení kapacity
 Výpočet objemu
 Souřadnice původního terénu

ČB	Y	X	Z
260407-003	754596.43	1054727.71	334.22
260407-013	754604.78	1054731.07	334.01
260407-015	754601.16	1054717.92	335.78
260407-016	754596.00	1054717.64	335.61
260407-017	754590.92	1054720.47	335.65
260407-018	754585.45	1054721.87	335.97
260407-019	754576.69	1054721.79	335.97
260407-020	754569.21	1054719.44	335.97
260407-021	754557.12	1054713.22	335.79
260407-022	754559.39	1054713.22	336.01
260407-023	754565.93	1054713.92	336.14
260407-024	754568.82	1054717.13	336.06
260407-025	754585.75	1054718.90	336.09
260407-026	754589.70	1054724.72	334.67
260407-027	754581.89	1054728.05	334.61
260407-028	754576.44	1054728.44	334.28
260407-029	754567.81	1054723.32	334.28
260407-030	754561.64	1054718.96	334.43
260407-031	754556.30	1054715.45	334.60
260407-032	754554.97	1054718.19	333.47
260407-033	754562.64	1054723.93	333.25
260407-034	754571.81	1054731.28	332.47
260407-035	754579.19	1054737.46	332.32
260407-036	754584.75	1054742.70	332.06
260407-037	754583.56	1054744.68	331.85
260407-038	754581.86	1054746.25	331.84
260407-039	754568.92	1054732.39	332.67
260407-040	754567.17	1054733.87	332.68
260407-041	754552.26	1054719.49	333.55
260407-042	754550.83	1054721.42	333.44
260407-050	754587.70	1054700.28	336.08

Třebotov ČOV - navýšení kapacity

Výpočet objemu

Souřadnice upraveného terénu po vybagrování

ČB	Y	X	Z
260318-114	754575.11	1054716.61	335.98
260318-115	754573.57	1054716.33	336.05
260318-116	754572.26	1054717.62	335.94
260318-117	754571.67	1054720.80	335.79
260318-118	754572.19	1054725.04	334.49
260318-119	754573.61	1054729.57	333.27
260318-120	754574.02	1054730.12	333.02
260318-121	754577.58	1054730.72	332.78
260318-122	754585.97	1054736.29	332.42
260318-123	754591.74	1054731.79	333.43
260318-124	754595.20	1054730.73	333.75
260318-125	754598.34	1054731.05	333.83
260318-126	754600.27	1054727.95	334.27
260318-127	754601.51	1054720.05	335.47
260318-128	754601.08	1054717.26	335.76
260318-129	754599.98	1054715.38	335.94
260318-130	754595.35	1054714.14	336.07
260318-131	754586.04	1054713.44	336.02
260318-132	754583.97	1054714.79	335.99
260318-133	754573.91	1054726.55	333.12
260318-134	754577.52	1054728.22	333.01
260318-135	754581.17	1054728.85	332.31
260318-136	754587.06	1054729.46	332.06
260318-137	754590.89	1054729.65	331.60
260318-138	754589.22	1054732.97	332.12
260318-139	754577.36	1054717.75	329.35
260318-140	754576.41	1054722.00	329.37
260318-141	754576.22	1054726.30	329.44
260318-142	754582.11	1054727.67	329.38
260318-143	754583.02	1054722.54	329.35
260318-144	754583.74	1054718.22	329.37
260318-145	754590.77	1054718.47	329.35
260318-146	754590.63	1054723.21	329.31
260318-147	754590.94	1054728.58	329.36
260318-148	754597.10	1054729.08	329.25
260318-149	754598.28	1054723.31	329.31
260318-150	754599.17	1054718.88	329.35
260318-151	754578.95	1054717.21	332.30
260318-152	754585.98	1054717.29	331.40
260318-153	754588.73	1054717.47	330.94
260318-154	754591.48	1054717.93	330.23
260318-155	754594.14	1054717.85	329.83
260318-156	754596.49	1054716.85	333.33
260318-157	754599.60	1054717.94	332.27
260318-158	754598.59	1054723.90	331.22
260318-159	754597.29	1054729.11	330.25
260318-160	754594.06	1054729.12	330.69
260318-161	754591.37	1054728.81	330.78
260318-162	754590.59	1054728.67	329.37
260318-163	754587.19	1054728.47	330.27
260318-164	754582.90	1054728.16	330.69
260318-165	754577.69	1054726.87	331.02
260318-166	754575.12	1054726.09	331.85
260318-167	754575.83	1054722.14	330.81
260318-168	754576.57	1054719.12	330.33
260318-169	754577.26	1054717.35	330.63
260318-170	754578.21	1054717.43	330.81
260318-171	754578.44	1054716.89	333.35
260318-172	754585.76	1054715.44	333.69
260318-173	754592.28	1054715.66	333.86
260318-174	754598.56	1054717.00	333.61
260318-176	754600.12	1054718.33	333.70
260318-177	754599.51	1054723.48	333.03
260318-178	754598.87	1054728.04	332.90
260318-179	754597.73	1054729.68	332.42
260318-180	754590.91	1054729.29	332.03
260318-181	754583.33	1054728.31	331.94
260318-182	754575.80	1054726.61	332.43
260318-183	754573.97	1054725.68	332.53
260318-184	754574.62	1054720.17	332.88
260318-185	754575.81	1054717.03	332.99

příloha č. 3

Protokol o výpočtu objemu:

***** WOBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru *****

30-04-2026 13:11

Hraniční body :

N~~14 >> N~~13 >> N~~12 >> N~~11 >> N~~10 >>
N~~9 >> N~~8 >> N~~7 >> N~~6 >> N~~5 >>
N~~4 >> N~~3 >> N~~2 >> N~~1 >> N~~19 >>
N~~18 >> N~~17 >> N~~16 >> N~~15 >> N~~14

Hlavní model : "Z:\67...ET\ATLAS\HORN_HRANA"

Srovnávací model : "Z:\67...ET\ATLAS\VYKOP_ATLAS"

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] = 1722.30

V[-] = 0.00

V[+] + V[-] = 1722.30

abs(V[+]) + abs(V[-]) = 1722.30

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] = 489.46

A[-] = 0.00

A[0] = 1.18

490.64

POVRCH MODELU :

Hlavní m. S[celk] = 498.76

Srovnávací m. S[celk] = 751.61

***** WOBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru *****

30-04-2026 12:48

Hraniční body :

N~~10 >> N~~9 >> N~~8 >> N~~7 >> N~~6 >>
N~~5 >> N~~4 >> N~~3 >> N~~2 >> N~~1 >>
N~~14 >> N~~13 >> N~~12 >> N~~11 >> N~~10

Hlavní model : "Z:\67...LAS\KAMENITE_NADLOZI"

Srovnávací model : "Z:\67...ET\ATLAS\VYKOP_ATLAS"

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] = 987.72

V[-] = 0.00

V[+] + V[-] = 987.72

abs(V[+]) + abs(V[-]) = 987.72

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] = 304.69

A[-] = 0.02

A[0] = 0.00

304.70

POVRCH MODELU :

Hlavní m. S[celk] = 307.25

Srovnávací m. S[celk] = 493.90

***** WOBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru *****

30-04-2026 12:35

Hraniční body :

N~~14 >> N~~13 >> N~~12 >> N~~11 >> N~~10 >>

N~~9 >> N~~8 >> N~~7 >> N~~6 >> N~~5 >>
N~~4 >> N~~3 >> N~~2 >> N~~1 >> N~~19 >>
N~~18 >> N~~17 >> N~~16 >> N~~15 >> N~~14

Hlavní model : "Z:\67...\ET\ATLAS\TVRDA_SKALA"
Srovnávací model : "Z:\67...\ET\ATLAS\VYKOP_ATLAS"

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] = 461.95
V[-] = -0.00
V[+] + V[-] = 461.94
abs(V[+]) + abs(V[-]) = 461.95

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] = 244.90
A[-] = 0.21
A[0] = 0.00

245.10

POVRCH MODELU :

Hlavní m. S[celk] = 264.58
Srovnávací m. S[celk] = 347.82

***** WOBJEM - výpočet objemu prostorového útvaru *****

30-04-2026 11:00

Hraniční body :

N~~21 >> N~~22 >> N~~25 >> N~~7 >> N~~15 >>
N~~20 >> N~~28 >> N~~29 >> N~~30 >> N~~31 >>
N~~26 >> N~~16 >> N~~8 >> N~~1 >> N~~21

Hlavní model : "Z:\67...\ATLAS\TEREN_PUVODNI"
Srovnávací model : "Z:\67...\ET\ATLAS\VYKOP_ATLAS"

VÝSLEDNÝ OBJEM :

V[+] = 1960.69
V[-] = -0.28
V[+] + V[-] = 1960.41
abs(V[+]) + abs(V[-]) = 1960.98

CELKOVÁ PLOCHA :

A[+] = 486.88
A[-] = 2.40
A[0] = 0.00


489.28

POVRCH MODELU :

Hlavní m. S[celk] = 497.23
Srovnávací m. S[celk] = 749.49


schema složení vrstev

výsledné kubatury

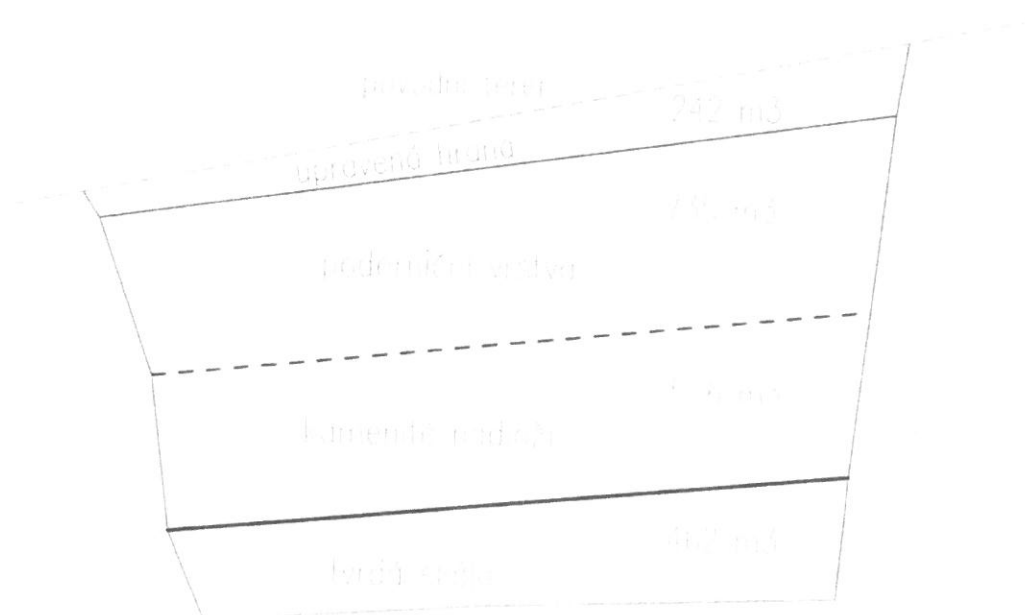


příloha č. 5


3D model terénu:

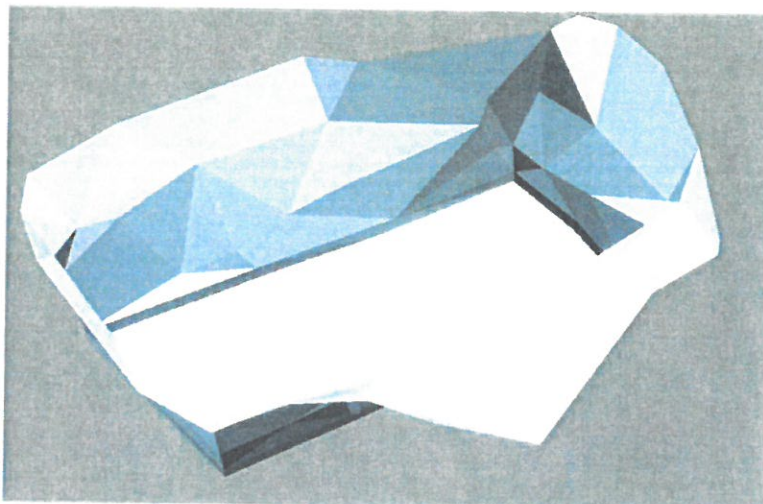

celkový výkop

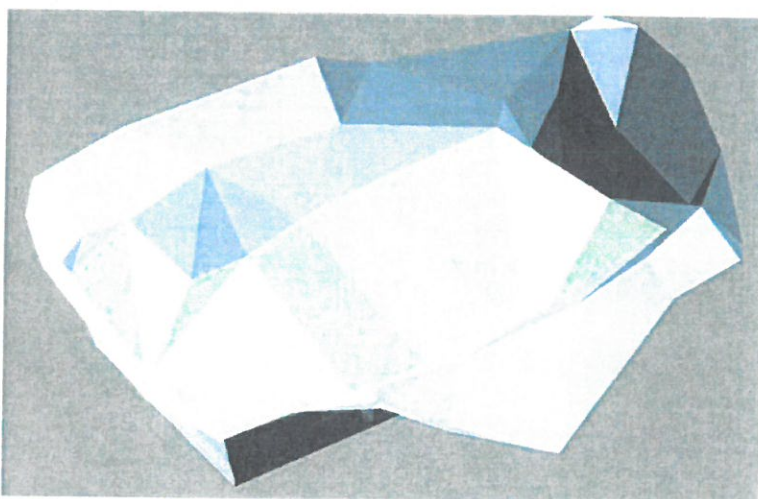

tvrdá skála

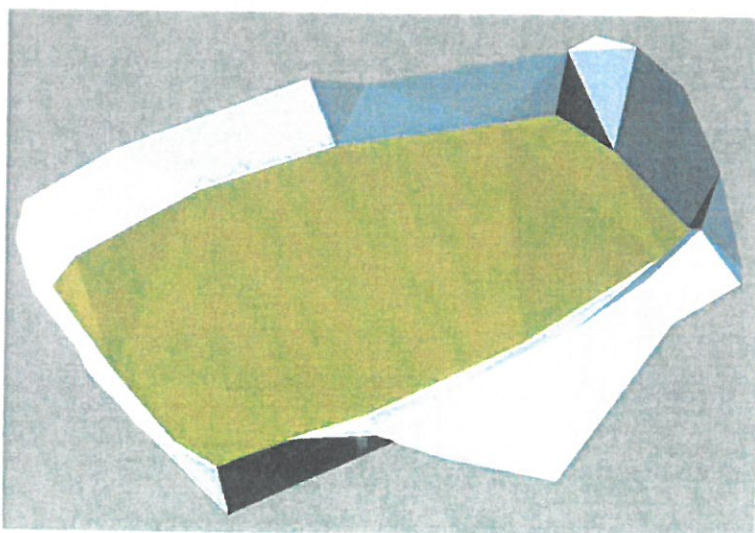

kamenité nadloží

Kalkulace geodetických prací - pol. č. 11.:

Kód	Cenová soustava	Název položky	m.j.	množství	j.cena	Celkem
HZS4221	CS ÚRS 2026 01	Hodinová zúčtovací sazba geodet	HR	13,640	714,000	9 738,96
HZS4222	CS ÚRS 2026 01	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	HR	5,000	876,000	4 380,00
						14 118,96



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.
Křížová 472/47, 150 00 Praha 5

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994 pod zn. Firm. 40 990/93

Věc: **Rozšíření kapacity ČOV Třebotov**

Registrační číslo projektu: 1240700011

Změnový list č. 01 - Zemní práce SO 02

Objekt: 02 – SO 02.1 – Nová budova ČOV – stavební část

Stanovisko projektanta:

1. Zemní práce SO 02

Na základě domluvy proběhlé mezi investorem, zhotovitelem, TDI a AD na prvním kontrolním dni (KD) došlo v rámci zemních prací na stavební jámě u stávajícího objektu ČOV ke změně provedení jámy – stavební jáma byla dle domluvy vyhloubena na úroveň základové spáry stávajícího objektu ČOV (nádrží) a následně dohloubena na úroveň projektované základové spáry nového objektu ČOV. Při provádění zemních prací byly zjištěny skutečné objemy zeminy třídy těžitelnosti 3, 4, 5 a 6. Objemy byly geodeticky zaměřeny (součástí přílohy č. 2 tohoto ZL 01).

Projektant souhlasí se změnovým listem č. 01 – změny jsou následkem nepředvídatelných situací vzniklých v rámci stavebních prací a vzájemné domluvy mezi investorem, zhotovitelem, TDI a AD.

V Praze dne 18. 6. 2026

Vypracovala: Ing. Veronika Pittnerová

Vodohospodářské inženýrské služby,
akciová společnost
Křížová 472/47, p. schránka 36

