

DODATEK č. 2

smlouvy dílo uzavřený podle občanského zákoníku v platném znění na provedení stavby
„Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052389 (ORG 2930, ORG 2931, ORG 3023, ORG 3024, ORG 4500)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 20/2015

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc

č.ú. 7510006666/5400

(dále jen Město)

a

Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 151, 656 46 Brno

Zastoupená: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva

IČ: 25508881

DIČ: CZ25508881

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno - město

č.ú. 27 – 7491250267/0100

(dále jen DPMB)

K podpisu této smlouvy je za objednatele oprávněna: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna na základě smlouvy o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním a následnou realizací veřejné zakázky „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“ uzavřené mezi Městem a DPMB dne 31.1.2014 a na základě usnesení R7/ 013. schůze Rady města Brna ze dne 10.3.2015.

V pozici technického zástupce objednatele a hlavního technického dozoru stavby jsou na základě mandátní smlouvy oprávněny jednat:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno

společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: Richardem Mrázkem, předsedou představenstva

Ing. Radkem Sovičkou, místopředsedou představenstva

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb, tel: 603442336

Ing. Ctibor Pechart, technický dozor. tel: 724026911

(dále jen BKOM)

V pozici technického dozoru stavby pro vodohospodářské objekty jsou na základě mandátní smlouvy oprávněny jednat:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 783

Zastoupená: Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva

Pověření zaměstnanci: Ing. Miroslav Martínek, vedoucí útvaru inženýrských
služeb, tel. 543433276

Ing. Jitka Fraňková, vedoucí oddělení oprav a
rekonstrukcí, tel. 606715411

Pavel Zelený, technický dozor stavby,
tel. 543433280, 724532671

(dále jen BVK)

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: účastníci společnosti s názvem

„Společnost Firesta + DS Brno - Horova, Bráfova“ na základě smlouvy o společnosti ze dne
26.3.2014

Vedoucí společník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČ: 25317628

DIČ: CZ 25317628

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú. 2111629345/2700

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Společník: Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vlastimilem Chládkem, jednatelem

IČ: 45474281

DIČ: CZ45474281

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno, č.ú. 7252970267/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062

Vedoucí společník FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno je zmocněn společníkem Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno dle smlouvy o společnosti ze dne 26.3.2014 k jednání s objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace díla včetně realizace platebního styku s objednatelem prostřednictvím bankovního účtu vedoucího společníka. Plná moc se nevztahuje na uzavření (podpis) smlouvy o dílo s objednatelem na provedení stavby a jejích dodatků. Smlouvu o dílo a její dodatky podepisuje oprávněný zástupce každého ze společníků.

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo (č. objednatele 5615052389 (ORG 2930, ORG 2931, ORG 3023, ORG 3024, ORG 4500) č. zhotovitele (20/15) uzavřené dne 4.5.2015 (dále jen „smlouva o dílo“) na provedení stavby „Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“, a to v čl. III z důvodu nepředvídatelné opravy 11 ks kanalizačních přípojek v havarijním stavu na ulici Horova a s tím souvisejícím přerušením prací u stavebních objektů SO 50 Komunikace, SO 60 Tramvajová trať, SO 70 Trolejové vedení, SO 06.1 Tramvajová trať, SO 06.2 Trolejové vedení. Provedení prací na výše uvedených stavebních objektech spolu vzájemně souvisí, předávají se jako jeden celek do předčasného užívání, zkušebního provozu a průjezdu tramvaje.

Čl. III. Doba plnění, bod 1. – nahrazuje se novým textem, který zní:

- a) Doba plnění včetně předání objednateli u stavebních objektů SO 50 Komunikace, SO 60 Tramvajová trať, SO 70 Trolejové vedení, SO 06.1 Tramvajová trať, SO 06.2 Trolejové vedení činí 379 dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.
- b) Doba plnění u ostatních stavebních objektů včetně předání objednateli činí 365 dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

Tímto dodatkem o dílo se mění příloha č. 1 – časový a finanční harmonogram. Aktualizovaný časový a finanční harmonogram je nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/046 dne 15.12.2015.

V Brně dne 7.1.2016

Za objednatele:

za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 29.12.2015

Za zhotovitele:

za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva


za Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Ing. Vlastimil Chládek
jednatel

Brno
- rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace
v ulicích Minská, Horova a Brávo

Časový harmonogram postupu stavebních prací

firesta

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Termín dle SOD	365 dny	2.7.15	30.6.16
2	Termín dle dodatku č.2	379 dny	2.7.15	14.7.16
3	Brno, Brávo I – rekonstrukce kanalizace	198 dny	1.12.15	15.6.16
4	SO 10.1 - KANALIZACE - stoka (§§7533 - §4)	63 dny	1.12.15	1.2.16
5	SO 10.2 - KANALIZACE - přepojení odvodnění parkoviště	18 dny	1.2.16	18.2.16
6	SO 20 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	31 dny	6.2.16	7.3.16
7	SO 30.1 - OBNOVA VOZOVKY - povrchy - pravá část	40 dny	8.3.16	16.4.16
8	SO 30.1 - OBNOVA VOZOVKY - povrchy - levá část	40 dny	17.4.16	26.5.16
9	SO 30.2 - OBNOVA VOZOVKY - odvodnění	32 dny	5.2.16	7.3.16
10	Stavby koordinujících investorů:	45 dny	2.5.16	15.6.16
11	Brávo - rekonstrukce chodníků, zřízení parkovacích stání a parkové úpravy (BKOM a.s.)	45 dny	2.5.16	15.6.16
12				
13	Brno, Minská – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace	379 dny	2.7.15	14.7.16
14	SO 01 - KANALIZAČNÍ STOKY	205 dny	2.7.15	22.1.16
15	SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	218 dny	13.7.15	15.2.16
16	SO 03 - VODOVODNÍ ŘADY	208 dny	6.7.15	29.1.16
17	SO 04 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	197 dny	3.8.15	15.2.16
18	SO 05 - KOMUNIKACE	239 dny	2.11.15	27.6.16
19	komunikace, odvodnění	239 dny	2.11.15	27.6.16
20	chodníky	96 dny	24.3.16	27.6.16
21	sadové úpravy	26 dny	2.6.16	27.6.16
22	SO 06.1 - TRAMVAJOVÁ TRATĚ	379 dny	2.7.15	14.7.16
23	úvrat - montáž	3 dny	2.7.15	4.7.15
24	demontáž tratí	126 dny	2.7.15	4.11.15
25	zřízení tratí, odvodnění	256 dny	2.11.15	14.7.16
26	úvrat - demontáž	1 den	14.7.16	14.7.16
27	SO 06.2 - TROLEJOVÉ VEDENÍ	328 dny	2.7.15	24.5.16
28	demontáž	9 dny	2.7.15	10.7.15
29	montáž patek a sloupů	43 dny	14.3.16	25.4.16
30	nové TV - převěsy	30 dny	25.4.16	24.5.16
31	SO 07.1 - PŘELOŽKA VO	60 dny	4.4.16	2.6.16
32	SO 07.2 - PŘELOŽKA NAPÁJECÍCH A ZPĚTNÝCH KABELŮ DPMB	250 dny	17.8.15	22.4.16
33	SO 07.3 - PŘELOŽKA PLYNU	165 dny	6.7.15	17.12.15
34	SO 07.4 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ TELEFONICA O2	60 dny	7.3.16	5.5.16
35	SO 07.5 - PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ UPC	60 dny	7.3.16	5.5.16
36	SO 07.6 - MECHANICKÁ OCHRANA KABELŮ VN, NN	20 dny	7.3.16	26.3.16
37	Minská, Horova – rekonstrukce plynovodních přípojek (RWE Energie, s. r.o.)	200 dny	3.8.15	18.2.16
38	Minská - obnova NN vedení a rekonstrukce VN (E.ON Česká republika)	35 dny	7.3.16	10.4.16
39				
40	Brno, Horova – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace	379 dny	2.7.15	14.7.16
41	SO 10 - KANALIZACE	237 dny	6.7.15	27.2.16
42	SO 10.1 - stoka §7093-§1632366, §20-§25, §24-§26	162 dny	6.7.15	14.12.15
43	SO 10.2 - stoka §4-§12, §15-§14, §9-§16, §9-§17	133 dny	6.7.15	15.11.15
44	SO 10.3 - stoka §5-§13	180 dny	3.8.15	29.1.16
45	SO 10.4 - přepojení odvodnění parkoviště	30 dny	29.1.16	27.2.16
46	SO 20 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	136 dny	10.8.15	23.12.15
47	SO 20.1 - kanalizační přípojky §7093-§25	103 dny	12.9.15	23.12.15
48	SO 20.2 - kanalizační přípojky §4-§12	126 dny	10.8.15	13.12.15
49	SO 30 - VODOVOD	168 dny	7.7.15	21.12.15
50	SO 40 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	166 dny	18.8.15	30.1.16
51	SO 60 - KOMUNIKACE	291 dny	28.9.15	14.7.16
52	SO 60.1 - komunikace	249 dny	9.11.15	14.7.16
53	SO 60.2 - odvodnění komunikace	187 dny	28.9.15	1.4.16
54	SO 60.1 - tramvajová trať	371 dny	10.7.15	14.7.16
55	demontáž, nový tramvajový pás, kolejnice	371 dny	10.7.15	14.7.16
56	odvodnění	155 dny	5.10.15	7.3.16
57	SO 60.2 - přeložka jízdenkového automatu	21 dny	7.3.16	27.3.16
58	SO 70 - TROLEJOVÉ VEDENÍ	379 dny	2.7.15	14.7.16
59	odstranění a zřízení	379 dny	2.7.15	14.7.16
60	SO 80 - NAPÁJECÍ A ZPĚTNÉ KABELY DPMB	119 dny	20.7.15	15.11.15
61	SO 90 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	269 dny	1.8.15	25.4.16
62	nové VO	269 dny	1.8.15	25.4.16
63	SO 100 - PLYNOVOD NTL	146 dny	2.9.15	25.1.16
64	SO 110 - STRANOVÉ POSUNUTÍ KABELŮ	28 dny	1.3.16	28.3.16
65	SO 110.1 - kabely UPC Česká republika a.s.	28 dny	1.3.16	28.3.16
66	SO 110.2 - kabely Telefonica Czech Republic a.s.	28 dny	1.3.16	28.3.16
67	SO 120 - SADOVÉ ÚPRAVY	356 dny	2.7.15	21.6.16
68	kácení	7 dny	2.7.15	8.7.15
69	výsadba	16 dny	6.6.16	21.6.16
70	Stavby koordinujících investorů:	49 dny	18.9.15	5.11.15
71	Minská, Horova – rekonstrukce plynovodních přípojek (RWE Energie, s. r.o.)	123 dny	30.9.15	30.1.16
72				
73	Výuka tramvajové trati	379 dny	2.7.15	14.7.16
74	dopravní omezení	379 dny	2.7.15	14.7.16
75	Dokončovací práce	6 dny	9.7.16	14.7.16
76	Termín dokončení a předání stavby	6 dny	25.6.16	30.6.16

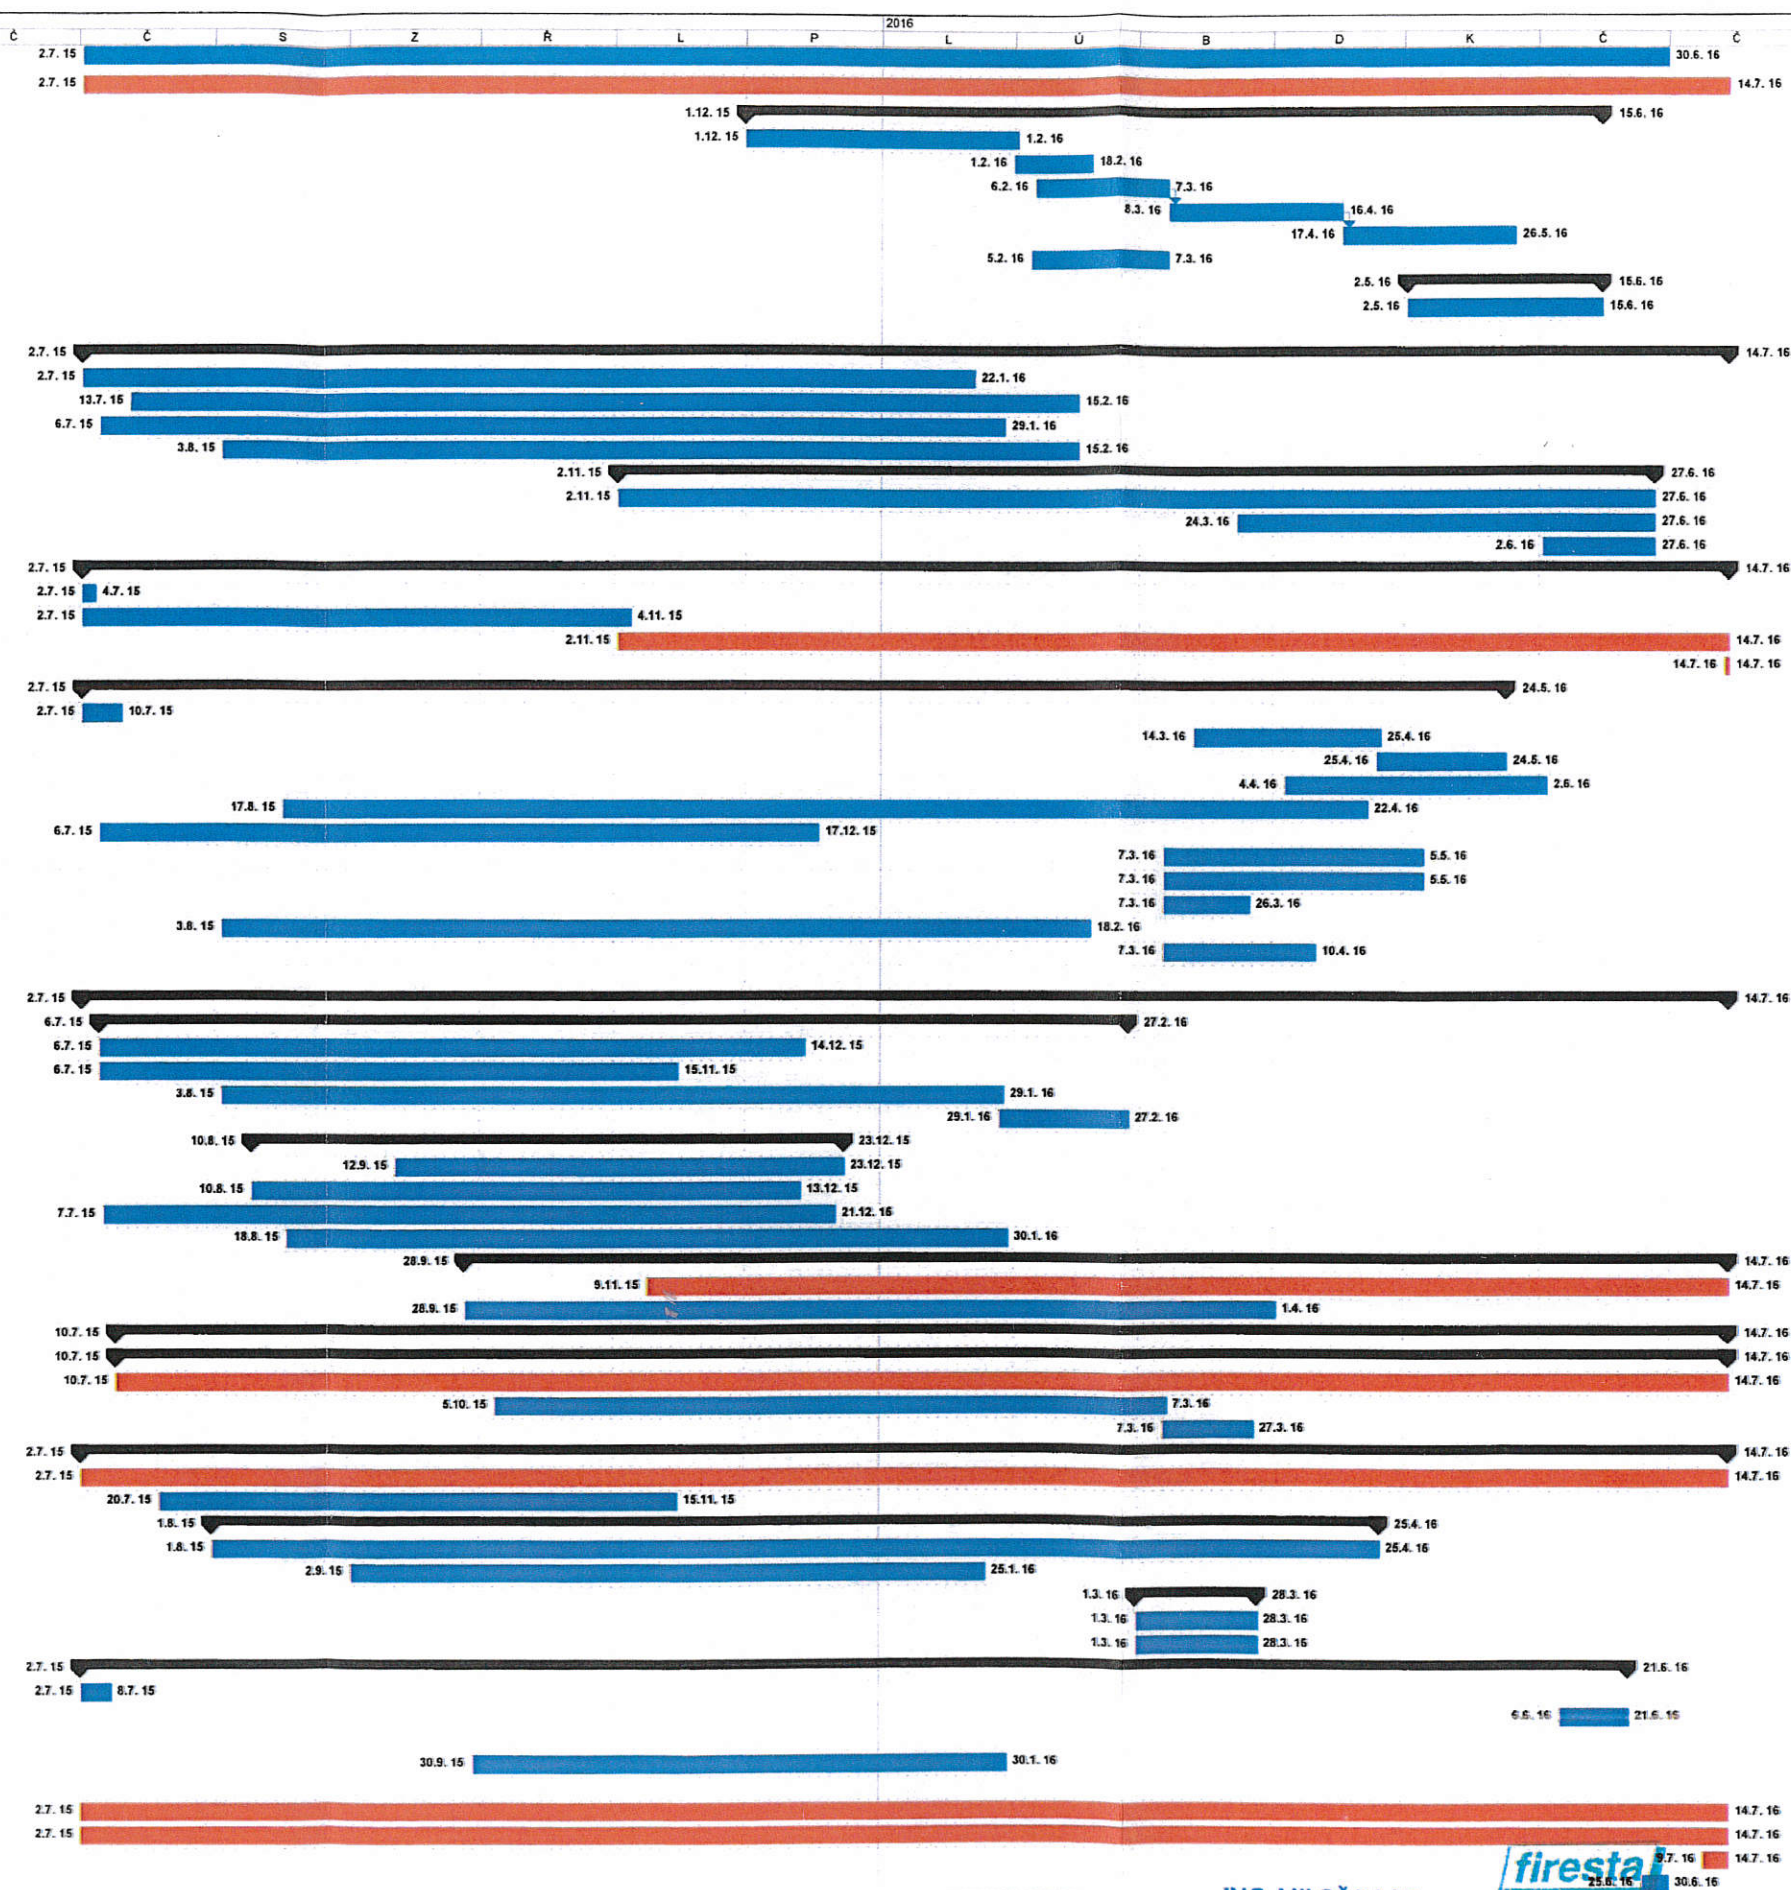



Finanční harmonogram

Brno

– rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace
v ulicích Minská, Horova a Bráfova

měsíc	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
5.2015	8 313 806	1 745 899	10 059 705
6.2015	13 072 324	2 745 188	15 817 512
7.2015	16 684 288	3 503 701	20 187 989
8.2015	15 316 116	3 216 384	18 532 500
9.2015	16 096 405	3 380 245	19 476 651
10.2015	17 260 500	3 624 705	20 885 206
11.2015	15 727 229	3 302 718	19 029 947
12.2015	11 762 381	2 470 100	14 232 482
1.2016	12 026 705	2 525 608	14 552 313
2.2016	15 198 583	3 191 702	18 390 285
3.2016	19 364 158	4 066 473	23 430 631
4.2016	22 357 623	4 695 101	27 052 724
celkem	183 180 118	38 467 825	221 647 943

Cena celkem bez DPH

183 180 118 Kč

DPH 21%

38 467 825 Kč

Cena celkem vč. DPH

221 647 943 Kč

Boh



FIRESTÁ-Fíšer, rekonstrukce, stavby a.s.

MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO

IČO: 253 12 679 • DIČ: CZ25317628

13

Finanční harmonogram



Stavební objekt	2015						2016						Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
	VII.2015	VIII.2015	IX.2015	X.2015	XI.2015	XII.2015	I.2016	II.2016	III.2016	IV.2016	V.2016	VI.2016		
Bráfova														
SO 10 - KANALIZACE	0	0	0	0	2 503 383	2 503 383	2 503 383	834 461	0	0	0	0	8 344 610	10 096 978
SO 20 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	0	0	0	0	62 149	124 299	124 299	310 747	0	0	0	0	621 494	752 008
SO 30.1 - OBNOVA VOZOVKY - povrchy	0	0	0	0	0	0	0	0	818 691	818 691	818 691	818 691	3 274 763	3 962 464
SO 30.2 - OBNOVA VOZOVKY - odvodnění	0	0	0	0	0	0	0	0	198 574	198 574	0	0	397 148	480 550
Minská														
SO 01 - KANALIZAČNÍ STOKY	1 895 434	1 444 141	2 256 470	2 256 470	1 173 364	0	0	0	0	0	0	0	9 025 879	10 921 313
SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	0	0	1 530 902	2 296 353	2 296 353	1 530 902	0	0	0	0	0	0	7 654 512	9 261 959
SO 03 - VODOVODNÍ ŘADY	0	486 134	1 325 821	1 325 821	1 281 627	0	0	0	0	0	0	0	4 419 403	5 347 478
SO 04 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	0	0	542 566	542 566	868 106	217 027	0	0	0	0	0	0	2 170 265	2 626 021
SO 05 - KOMUNIKACE	0	0	0	0	1 895 265	947 633	0	0	2 369 081	2 369 081	1 895 265	0	9 476 325	11 466 354
SO 06.1 - TRAMVAJOVÁ TRAŤ	303 436	0	505 727	2 528 633	5 057 265	1 264 316	1 264 316	1 264 316	2 528 633	5 057 265	5 057 265	455 154	25 286 325	30 596 453
SO 06.2 - TROLEJOVÉ VEDENÍ	0	374 536	668 814	668 814	0	0	0	0	0	535 051	428 041	0	2 675 256	3 237 060
SO 07.1 - PŘELOŽKA VO	0	0	249 463	187 097	124 731	0	0	0	249 463	311 828	124 731	0	1 247 313	1 509 248
SO 07.2 - PŘELOŽKA NAPÁJECÍCH A ZPĚTNÝCH	0	361 278	361 278	361 278	240 852	0	0	0	722 556	0	361 278	0	2 408 519	2 914 309
SO 07.3 - PŘELOŽKA PLYNU	0	0	870 565	870 565	870 565	290 188	0	0	0	0	0	0	2 901 883	3 511 278
SO 07.4 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ	0	0	0	964 465	964 465	214 326	0	0	0	0	0	0	2 143 255	2 593 339
SO 07.5 - PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ	0	0	0	85 122	85 122	0	0	0	0	0	0	0	170 244	205 995
SO 07.6 - MECHANICKÁ OCHRANA KABELŮ	0	0	0	382 612	127 537	0	0	0	0	0	0	0	510 149	617 281
Horova														
SO 10 - KANALIZACE	2 757 050	3 446 313	3 446 313	5 169 469	2 412 419	0	0	0	0	0	0	0	17 231 563	20 850 191
SO 20 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	0	0	893 712	1 340 568	1 340 568	893 712	0	0	0	0	0	0	4 468 561	5 406 958
SO 30 - VODOVOD	432 023	672 035	576 030	1 440 075	1 200 063	480 025	0	0	0	0	0	0	4 800 251	5 808 304
SO 40 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	473 838	263 243	315 892	658 109	658 109	263 243	0	0	0	0	0	0	2 632 435	3 185 246
SO 50 - KOMUNIKACE	0	0	0	1 257 758	1 886 637	1 257 758	0	0	2 515 516	2 515 516	2 515 516	628 879	12 577 580	15 218 872
SO 60 - TRAMVAJOVÁ TRAŤ	0	0	1 064 085	3 325 267	6 650 534	1 662 634	1 662 634	1 662 634	3 325 267	6 650 534	6 650 534	598 548	33 252 671	40 235 732
SO 70 - TROLEJOVÉ VEDENÍ	428 526	545 397	973 923	545 397	0	0	0	0	0	779 138	623 311	0	3 895 692	4 713 787
SO 80 - NAPÁJECÍ A ZPĚTNÉ KABELY DPMB	755 868	2 223 140	0	0	0	0	0	0	444 628	578 016	444 628	0	4 446 280	5 379 999
SO 90 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	168 290	84 145	252 434	252 434	168 290	0	0	0	504 869	0	252 434	0	1 682 896	2 036 304
SO 100 - PLYNOVOD NTL	0	0	803 415	803 415	803 415	267 805	0	0	0	0	0	0	2 678 049	3 240 440
SO 110 - STRANOVÉ POSUNUTÍ KABELŮ	0	0	234 456	234 456	0	0	0	0	0	0	0	0	468 912	567 383
SO 120 - SADOVÉ ÚPRAVY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 132	565 132	683 810
SO 900 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY	2 350 551	1 057 748	705 165	705 165	705 165	705 165	705 165	705 165	705 165	705 165	705 165	1 997 968	11 752 754	14 220 832
CELKEM za měsíc bez DPH	9 565 015	10 958 109	17 577 031	28 201 908	33 375 985	12 622 416	6 259 797	4 777 323	14 382 442	20 518 861	19 876 859	5 064 372	rok 2015:	rok 2016:
Sumarizace po měsících bez DPH	9 565 015	20 523 125	38 100 155	66 302 064	99 678 048	112 300 464	118 560 261	123 337 584	137 720 026	158 238 887	178 115 747	183 180 118	123 337 584	59 842 534

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ																			
Kód:										13054b									
Stavba:										BRNO, BRÁFOVÁ I - REKONSTRUKCE KANALIZACE									
Kód	Objekt, Soupis prací																		
											kontrola					cena sdružení			cena sdružení +
Náklady stavby celkem											16 604 431,30		13 386 271,49		12 638 016,08				
101	SO 10.1 - KANALIZACE - stoka (557533 - 54)										10 314 678,13		8 409 273,67		7 988 793,80				1,28
102	SO 10.2 - KANALIZACE - přepojení odvodnění parkoviště										461 353,62		374 544,22		355 816,41				1,28
200	SO 20 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY										859 169,78		654 202,21		621 494,17				1,28
301	SO 30.1 - OBNOVA VOZOVKY - povrchy										4 377 024,12		3 521 212,11		3 274 763,34				1,28
302	SO 30.2 - OBNOVA VOZOVKY - odvodnění										592 205,65		427 039,28		397 148,36				1,28
Stavba:										BRNO, HOROVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE,									
Kód	Objekt, Soupis prací																		
Náklady stavby celkem											120 871 893,71		94 195 147,15		88 700 020,23				
010	SO 10 - KANALIZACE																		
	SO 10.1 - stoka 57093-51632366, 520-525, 524-526										5 895 172,28		4 470 505,73		4 246 968,67				1,28
	SO 10.2 - stoka 54-512, 515-514, 59-516, 59-517										12 114 216,88		10 091 647,50		9 587 042,72				1,28
	SO 10.3 - stoka 55-513										4 109 018,21		3 098 990,73		2 944 039,98				1,28
	SO 10.4 - přepojení odvodnění parkoviště										622 114,35		477 380,16		453 511,21				1,28
020	SO 20 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY																		
	SO 20.1 - kanalizační přípojky 57093-525										3 098 196,27		2 139 173,45		2 032 210,58				1,28
	SO 20.2 - kanalizační přípojky 54-512										3 603 398,17		2 564 582,38		2 436 350,03				1,28
030	SO 30 - VODOVOD										7 542 662,56		5 052 876,41		4 800 250,96				1,28
040	SO 40 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY										3 392 659,35		2 769 472,65		2 632 434,57				1,28
050	SO 50 - KOMUNIKACE																		
	SO 50.1 - komunikace										17 951 867,04		11 680 582,56		10 862 929,48				1,28
	SO 50.2 - odvodnění komunikace										2 498 578,81		1 843 705,18		1 714 650,43				1,28
	SO 50.3 - napojení komunikace Minská (neprovádí se)														0,00				1,28
060	SO 60 - TRAMVAJOVÁ TRATĚ																		
	SO 60.1 - tramvajová trať										44 066 458,78		34 413 000,00		33 222 936,99				1,28
	SO 60.2 - přeložka jízdenkového automatu										49 776,76		30 653,08		29 733,68				1,28
	SO 60.3 - napojení tramvajové trati Minská (neprovádí se)														0,00				
070	SO 70 - TROLEJOVÉ VEDENÍ										3 804 218,00		4 869 615,00		3 895 692,00				1,28
080	SO 80 - NAPÁJECÍ A ZPĚTNÉ KABELY Dpmb										4 805 624,54		4 940 337,77		4 446 280,37				1,28
090	SO 90 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ										1 881 991,63		1 869 884,00		1 682 895,61				1,28
100	SO 100 - PLYNOVOD NTL										4 133 205,63		2 818 958,41		2 678 049,49				1,28
110	SO 110 - STRANOVÉ POSUNUTÍ KABELŮ																		
	SO 110.1 - kabely UPC Česká republika a.s.										284 194,60		266 801,77		266 801,77				1,28
	SO 110.2 - kabely Telefonica Czech Republic a.s.										241 866,10		202 109,82		202 109,82				1,28
120	SO 120 - SADOVÉ ÚPRAVY										776 673,75		594 870,55		565 131,87				1,28
Stavba:										BRNO, MINSKÁ - REKONSTRUKCE KANALIZACE,									
Kód	Objekt, Soupis prací																		
Náklady stavby celkem											101 257 421,28		74 552 643,99		70 089 328,27				
01	SO 01 - KANALIZAČNÍ STOKY										15 348 570,27		9 500 956,66		9 025 878,54				1,28
02	SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY										11 835 147,97		8 057 396,64		7 654 511,50				1,28
03	SO 03 - VODOVODNÍ RADY										7 470 455,68		4 651 999,24		4 419 403,12				1,28
04	SO 04 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY										2 851 219,08		2 282 581,33		2 170 265,42				1,28
05	SO 05 - KOMUNIKACE										14 228 064,87		10 189 600,42		9 476 325,35				1,28
061	SO 06.1 - TRAMVAJOVÁ TRATĚ										34 372 921,25		26 559 000,00		25 286 325,02				1,28
062	SO 06.2 - TROLEJOVÉ VEDENÍ										3 258 179,41		3 344 069,90		2 675 255,91				1,28
071	SO 07.1 - PŘELOŽKA VO										1 710 060,13		1 385 885,78		1 247 312,80				1,28
072	SO 07.2 - PŘELOŽKA NAPÁJECÍCH A ZPĚTNÝCH KABELŮ DPMB										2 534 181,27		2 676 135,06		2 408 519,46				1,28
073	SO 07.3 - PŘELOŽKA PLYNU										4 341 347,95		3 054 518,52		2 901 882,67				1,28
074	SO 07.4 - PŘELOŽKA SDELOVACÍHO VEDENÍ TELEFONICA OZ										2 556 586,73		2 143 255,27		2 143 255,27				1,28
075	SO 07.5 - PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ UPC										226 097,61		170 243,80		170 243,80				1,28
076	SO 07.6 - MECHANICKÁ OCHRANA KABELŮ VN, NN										524 589,06		537 001,37		510 149,41				1,28
Stavba:										SO 900 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVEB									
Kód	Objekt, Soupis prací																		
01	SO 900 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVEB MINSKÁ, HOROVA,										25 266 216,00		12 056 375,04		11 752 753,71				1,28
CELKEM											263 999 962,29		194 190 437,67		183 180 118,29				
