HARMONOGRAM - MŠ - Na Ryšavce 241,Písek - pavilon A,D

Vakustav

Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11.MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek

Dnes je: 16.7.2019

Zahájení 16.7.2019 Přepočítáno

Týdenní kalendář

Projekt: Důležité pracovní úkoly

ID	Jméno úkolu	Začátek	Konec	Dnů
1	Převzetí stavby - **pavilon A,B,C,D**	16.7.2019	16.7.2019	1
2	Bourací práce - **pavilon - A,D**	24.8.2019	6.9.2019	14
6	Svislé konstrukce - **pavilon - A,D**	7.9.2019	21.9.2019	15
7	Vzduchotechnika - **pavilon A,D**	25.8.2019	15.10.2019	52
8	Instalace - **pavilon - A,D**	6.9.2019	15.10.2019	40
9	Ústřední topení - **pavilon A,D**	7.9.2019	13.10.2019	37
10	Elektromontáže - **pavilon - A,D**	7.9.2019	14.10.2019	38
11	Ostatní konstrukce a práce - **pavilon A,D**	9.9.2019	23.9.2019	15
12	Úpravy povrchů vnitřních - **pavilon - A,D**	23.9.2019	11.10.2019	19
13	Konstukce truhlářské - **pavilon - A,D**	3.10.2019	13.10.2019	11
14	Izolace proti vodě - **pavilon - A,D**	8.9.2019	12.9.2019	5
15	Podlahy - **pavilon - A,D**	12.9.2019	20.9.2019	9
16	Obkaldy keramické - **pavilon - A,D**	24.9.2019	10.10.2019	17
17	Podlahy z dlaždic - **pavilon - A,D**	24.9.2019	10.10.2019	17
18	Podlahy povlakové - **pavilon - A,D**	10.10.2019	13.10.2019	4
20	SDK - sádrokarton - **pavilon - A,D**	18.9.2019	7.10.2019	20
21	Nátěry - **pavilon - A,D**	9.10.2019	13.10.2019	5
22	Malby - **pavilon - A,D**	9.10.2019	13.10.2019	5
23	Zkušební provoz - **pavilon - A,D**	15.10.2019	15.10.2019	1
24	Předání díla - **pavilon - A,D**	31.10.2019	31.10.2019	1

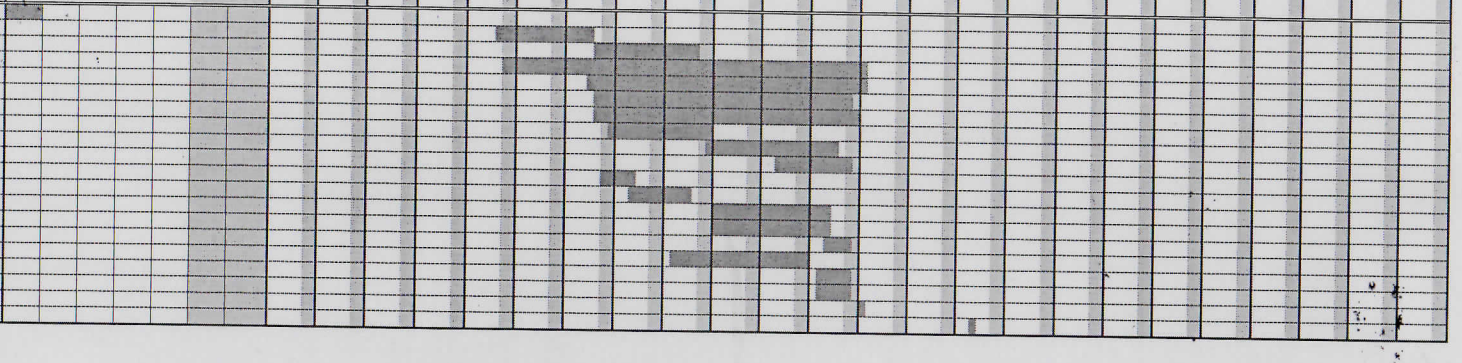

Vasyl Kuzevych

Digitálně podepsal Vasyl Kuzevych
Datum: 2019.07.16 18:39:29 +02'00'

Mgr. Pavel Koc

Digitálně podepsal Mgr. Pavel Koc
Datum: 2019.07.16 18:52:45 +02'00'
