HARMONOGRAM
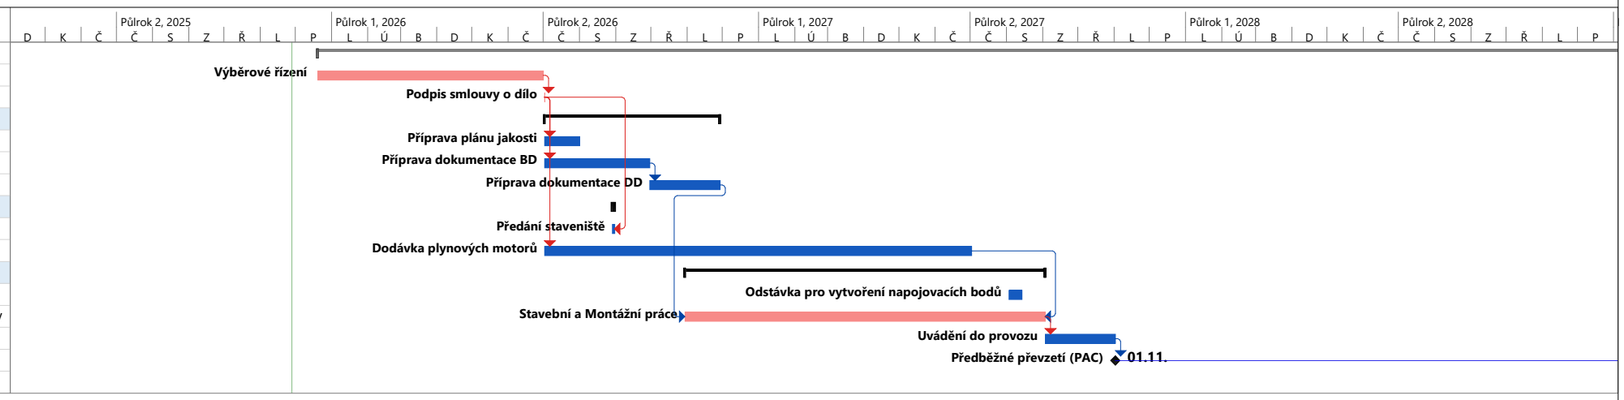
ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
0		**Plynové motory**	**982 dny**	**19.12. 25**	**01.11. 29**	
1		**1 Výběrové řízení**	**131 dny**	**19.12. 25**	**30.06. 26**	
2		**2 Podpis smlouvy o dílo**	**1 den**	**01.07. 26**	**01.07. 26**	**1**
3		**3 Dokumentace**	**106 dny**	**01.07. 26**	**28.11. 26**	
4		3.1 Příprava plánu jakosti	30 upl.dny	01.07. 26	31.07. 26	2
5		3.2 Příprava dokumentace BD	90 upl.dny	01.07. 26	29.09. 26	2
6		3.3 Příprava dokumentace DD	60 upl.dny	29.09. 26	28.11. 26	5
7		**4 Staveniště**	**1 den**	**28.08. 26**	**30.08. 26**	
8		4.1 Předání staveniště	1 den	28.08. 26	30.08. 26	2FF+60 upl.dny
9		5 Dodávka plynových motorů	365 upl.dny	01.07. 26	01.07. 27	2
10		**6 Realizace**	**217 dny**	**29.10. 26**	**02.09. 27**	
11		6.1 Odstávka pro vytvoření napojovacích bodů	10 dny	02.08. 27	13.08. 27	
12		6.2 Stavební a Montážní práce	217 dny	29.10. 26	02.09. 27	9FF+45 dny;6FS-30 dny
13		**7 Uvádění do provozu**	**60 upl.dny**	**02.09. 27**	**01.11. 27**	**12**
14		***8 Předběžné převzetí (PAC)***	***0 dny***	***01.11. 27***	***01.11. 27***	***13***
15		***9 Konečné převzetí (FAC)***	***0 dny***	***01.11. 29***	***01.11. 29***	***14FS+508 dny***
