

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052582

(ORG 2927)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: SOD00105708

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
 č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
 zastoupené:
 Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
 K podpisu smlouvy je oprávněn :
 Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
 na základě zmocnění ze dne 19.9.2014
 společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
 IČ : 449 92 785
 DIČ : CZ44992785
 Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
 č.ú. 7510006666/5400
 Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
 faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
 Pověření zaměstnanci:
 vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková,
 tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz
 technický dozor stavby, Pavel Zelený, tel. 724 532 671,
 e-mail: pzeleny@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
 sídlo společnosti Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno
 Zastoupený: Ing. Zdeňkou Kvasničkovou, Ph.D., ředitelkou Divize 1
 IČ: 463 42 796
 DIČ: CZ46342796
 Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
 Pověření zaměstnanci:
 stavbyvedoucí, Ing. Vladimír Král, tel. 606 719 086
 Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
 číslo účtu : 7507-621/0100
 (dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní zhotovení díla tj. stavby

„Brno, Staňkova I, Skřivanova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.

Součástí předmětu smlouvy je i zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytýčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikačních ploch bude dokladován v digitální podobě pomocí programu EZA (dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a na dvou CD).

2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy a podle projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vypracované společností Pöyry Environment a.s. v listopadu 2013, zakázkové číslo 3A13065.41.
3. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.
4. Zhotovitel provede dílo v souladu s nabídkou na zhotovení díla ze dne 21. 4. 2015.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje:

zahájit práce na díle v termínu 15.6.2015

dokončit práce na díle a předat dílo v termínu 5.12.2016
2. Lhůta provádění prací na rekonstrukci kanalizace a vodovodu činí 463 kalendářních dní.
3. Lhůta provádění prací na obnově vozovky činí 90 kalendářních dní.
4. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena bez DPH 56 106 571,95 Kč

sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II a dále obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
 - pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci na základě požadavku objednatele,
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
4. Veškeré vícepráce, změny, rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele. Pro ocenění víceprací budou použity položky nabídkového rozpočtu z nabídky zhotovitele ze dne 21.4.2015, u případných nových položek budou použity jednotkové ceny v cenové úrovni odpovídající nabídce. Teprve po písemném souhlasu objednatele může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění budou promítnuty do dodatku smlouvy o dílo, který bude předložen ihned, nejpozději 5 týdnů před termínem ukončení díla.
5. Předmětné stavební a montážní práce jsou zařazeny podle klasifikace produkce CZ – CPA pod kódem 42.2 a uplatňuje se na ně režim přenesené daňové povinnosti.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě osmi dílčích faktur a konečné faktury.
2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Faktury budou doloženy soupisem provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

2 580 000,- Kč bez DPH

20. 8. 2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury:

SO 03 – Odstavení vodovodních řadů - dokončení

SO 01g TŠ0 – Hloubení pažení - dokončení

výše 2. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

5 053 000,- Kč bez DPH

19.10.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury:

SO 01b TŠ1 – Hloubení, pažení - dokončení

výše 3. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

6 242 000,- Kč bez DPH

18.12.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury :

SO 01c TŠ2 – Hloubení, pažení - dokončení

SO 01d TŠ3 – Hloubení, pažení - dokončení

SO 01e TŠ4 – Hloubení, pažení - dokončení

SO 01f TŠ5 – Hloubení, pažení - dokončení

výše 4. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

6 350 000,- Kč bez DPH

18.2.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 4. dílčí faktury :

SO 01a – Dokončení v rozsahu 50%

SO 01 – Dokončení v rozsahu 35%

výše 5. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

6 940 000,- Kč bez DPH

18.4.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 5. dílčí faktury :

SO 01a – Dokončení v rozsahu 65%

SO 02 – Dokončení v rozsahu 55%

výše 6. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

8 522 000,- Kč bez DPH

20.6.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 6. dílčí faktury :

SO 01a – Dokončení v rozsahu 80%

SO 02 – Dokončení v rozsahu 70%

SO 03 – Dokončení v rozsahu 50%

výše 7. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

8 212 000,- Kč bez DPH

18.8.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 7. dílčí faktury :

SO 01b TŠ1 – dokončení

SO 01c TŠ2 – dokončení

SO 01g TŠ0 - dokončení

výše 8. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

6 584 000,- Kč bez DPH

18.10.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 8. dílčí faktury :

SO 01 – dokončení

SO 02 – dokončení

SO 03 – dokončení

SO 04 – dokončení

3. Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury,
- den uskutečnění zdanitelného plnění,
- označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
- označení díla,
- číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
- fakturovanou částku a sazbu DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- na faktuře musí být uvedena věta „daň odvede zákazník“,
- nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.

4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

5. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejich osobního doručení zástupci objednatele, tj. útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (oddělení plánu a zakázky), Pisárecká 277/1, 657 33 Brno.

6. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel ručí za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.

7. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději ke dni vystavení konečné faktury doklad o poskytnutí bankovní záruky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na dobu 24 měsíců od předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude kryt nároky objednatele na náhradu škody vzniklé z důvodu porušení povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dílo nebo ze zákona, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.

8. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladu o poskytnutí bankovní záruky je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději v den zahájení prací (čl. III odst. 1 této smlouvy) spolu s projektem stavby ve dvou vyhotoveních. O předání staveniště bude pořízen zápis.

2. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště.

3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku jsou stanoveny vyhláškou č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je povinen uvést do stavebního deníku všechny předepsané identifikační údaje a zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Dále je zhotovitel povinen vést pravidelné denní záznamy ve stavebním deníku a další záznamy dokumentující provádění stavby.
3. Zhotovitel je povinen průběžně zpracovávat tabulky vodovodních přípojek, které bude potvrzovat provozní technik objednatele nad výkopem. Tabulky musí být kontrolovány provozem objednatele a uloženy společně se stavebním deníkem.
4. Záznamy o postupu prací a souvisejících činnostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze technický zástupce objednatele, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (působí-li na staveništi), případně další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru.
5. Zhotovitel bude dále po konzultaci s technickým dozorem stavby do stavebního deníku průběžně zaznamenávat základní technické údaje, zejména skladbu původní vozovky a chodníků, rozměry rýhy, charakter vytěžené zeminy a další informace, které dokumentují rozsah prováděné stavby. Tyto údaje nechá písemně potvrdit technickým zástupcem objednatele.
6. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

VIII. Požadavky na způsob provádění díla

1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré dostupné podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámil.
2. Zhotovitel zajistí projednání veškerých potřebných rozhodnutí nezbytných k realizaci díla, např. zvláštní užívání komunikace (ZUK), uzavírku komunikace, povolení vstupů na zelené plochy (zábory veřejného prostranství), kácení dřevin, atd. a předá kopie těchto rozhodnutí technickému dozoru stavby ihned po jejich vydání.
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými účinnými normami a předpisy.

4. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí být v souladu s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
5. Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním nakládat v souladu s platnou legislativou, tzn. zhotovitel zajistí předání vzniklého odpadu k dalšímu nakládání či k likvidaci oprávněnému subjektu.
6. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků, nad rámec předaného staveniště, je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Současně se zápisem výzvy do stavebního deníku zhotovitel informuje technický dozor stavby zasláním e-mailu. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.
9. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem (zápisem do stavebního deníku a e-mailem) termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Náklady na provedené zkoušky jsou součástí ceny díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích.
12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu díla a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy BOZP každého pracovníka staveniště. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele (působí-li na staveništi) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

13. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP). Při provádění prací zabezpečí dodržování bezpečnostních předpisů a rovněž učiní veškeré kroky k ochraně životního prostředí.
14. V případě nedodržení bezpečnostních předpisů nebo pokynů stanovených k ochraně životního prostředí na straně zhotovitele, má objednatel právo odmítnout pokračování v provádění prací.
15. Technický dozor stavby je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavby je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor stavby není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
16. Zhotovitel zajistí vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
17. Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup.
18. Zhotovitel nesmí manipulovat s armaturami na stávající vodovodní síti. Případnou manipulaci provede na objednávku útvar správy a údržby Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
19. V případě, že z důvodu zásahu do vodovodní sítě bude nutno přerušit dodávku pitné vody odběratelům, je zhotovitel povinen vzniklou skutečnost písemně oznámit provozovateli vodovodní sítě (úsek správy a provozu vodovodní sítě Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.), technickému zástupci objednatele (útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a všem dotčeným odběratelům vody. Rozsah uzavřeného úseku (počátek a konec přerušování) oznámí zhotovitel minimálně 15 dnů před zahájením odstávky, v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
20. Zhotovitel uhradí prokázané náklady na uniklou vodu, vzniklé poškozením (činností zhotovitele) provozovaných vodovodních přípojek a řadů, správně vytyčených objednatelem při předání staveniště. Zhotovitel také hradí zajištění odstávky vody a náhradní zásobování při provádění propojů vodovodních řadů.
21. Zhotovitel předem projedná s vlastníky přilehlých nemovitostí nebo pozemků přesné umístění orientačních tabulek, vyznačujících polohu vodovodní přípojky nebo armatur na vodovodu. Umístění orientačních tabulek je prováděno v souladu s §7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Tabulky budou umístěny na nemovitostech

v souladu s požadavky normy ČSN 755025, podle místních podmínek a s přihlédnutím k požadavkům vlastníka nemovitosti.

22. Objednatel požaduje a zhotovitel se zavazuje, že pracovníci zhotovitele při montáži vodovodu budou mít zdravotní průkazy a budou prokazatelně proškoleni o zásadách provozní hygieny v rozsahu Hygienického minima. Kontrola tohoto požadavku bude prováděna technickými zástupci objednatele v průběhu stavby. Školení pracovníků zhotovitele lze zajistit prostřednictvím provozovatele vodovodní sítě (Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., vodárenská sekce), jehož vybraní zaměstnanci jsou oprávněni ke školení dalších osob.
23. Zhotovitel zajistí příjezd a vjezd do jednotlivých objektů dotčených stavbou.
24. Zhotovitel před zahájením prací projedná se zástupcem objednatele postup prací.
25. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle této smlouvy pojišť stavbu proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu díla.
26. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu škodnou událost nejméně ve výši 75 mil. Kč.
27. Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu všech osob pohybujících se po staveništi proti úrazu.
28. Zhotovitel je povinen zajistit smluvní závazek subdodavatelů, že budou pojištěni za škodu způsobenou jejich činností při realizaci subdodávky s pojistným plněním alespoň ve sjednané ceně subdodávky.
29. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
30. Zhotovitel bude v předstihu informovat místně příslušný ÚMČ o zahájení a plánovaném průběhu prací (uzavírkách).
31. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu ve své nabídce, je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním subdodavatelem.
32. Zhotovitel bude stavbu koordinovat se stavbami koordinujícími investorů. Jedná se o stavby:
 - Staňkova – rekonstrukce plynovodu (RWE GasNet, s.r.o.),
 - Staňkova – oprava chodníků (Brněnské komunikace a.s.).

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

1. Vlastníkem objektů, které jsou předmětem rekonstrukce, zůstává objednatel. Vlastnické právo nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla na zhotovitele. Zhotovitel je však vlastníkem všech věcí, které opatřil ke zhotovení díla, až do doby jejich převzetí objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.
2. Nebezpečí škody na díle nebo nebezpečí zničení díla nese zhotovitel do termínu předání díla objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla.

X. Předání díla

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram převímky. Následně svolá objednatel předávací a převímací řízení.
2. Zhotovitel je povinen doložit u převímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (4 x kompletní vytištěné paré),
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - stavební deník,
 - tabulky vodovodních přípojek (3x v tištěné podobě),
 - geodetické zaměření dokončeného díla (4x v tištěné podobě a 4x na CD),
 - zaměření realizované obnovy komunikačních ploch v digitální podobě pomocí programu EZA (2x na CD),
 - doklad o nakládání s odpady (doklady budou obsahovat údaje o druhu a množství odpadu a identifikační údaje subjektu, kterému byl odpad předán).
3. Nedoložení kteréhokoliv z výše uvedených nezbytných dokladů je důvodem pro nepřevzetí díla.
4. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 30 dnů po předání díla.
5. Dílo bude prosto vad a nedodělků, pokud se smluvní strany při předání dokončeného díla z objektivních důvodů nedohodnou jinak.

XI. Vady díla a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.
2. Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl.
3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí díla, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

4. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 60 měsíců. Běh záruční doby začíná dnem následujícím po dni, kdy došlo k předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dokončené a předané dílo má, a po celou dobu záruky bude mít, vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je řádné užívání díla a provádění běžné údržby díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

XII. Platnost smlouvy, odstoupení, sankce

1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků dle čl. X odst. 5 této smlouvy, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí zápisu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění byl smluven písemně při předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý případ a den prodlení do jejich úplného odstranění.
3. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě, že koordinátor BOZP při své návštěvě staveniště prokáže, že více pracovníků zhotovitele nebo pracovníků subdodavatele či subdodavatelů porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII. této smlouvy. Na základě takového zápisu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o porušení předpisů BOZP či plánu BOZP, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli a objednateli. Takto udělená smluvní pokuta bude započtena vůči celkové ceně díla při vystavení konečné faktury.
5. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady majetkové či nemajetkové újmy. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti majetková či nemajetková újma, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.
7. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud objektivně prokáže podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
8. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delším než 30 dnů z viny na straně zhotovitele,
 - prodlení objednatele s uhrazením faktury delším než 30 dnů.

9. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací nabídkovým rozpočtem stavebních objektů (nabídka zhotovitele ze dne 21.4.2015) proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

XIII. Dodatky a změny smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí.
2. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla (veřejné zakázky), nejpozději do 60 dnů ode dne předání díla objednateli. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, předloží zhotovitel objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10 % z celkové ceny díla (veřejné zakázky) do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě plnění díla (veřejné zakázky) bez subdodavatelů, je zhotovitel povinen předložit objednateli o této skutečnosti čestné prohlášení, a to k termínu podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.
4. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

7. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací

V Brně dne 11-06-2015
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno




.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne 10. 6. 2015
Za zhotovitele:

.....
za společnost OHL ŽS, a.s.
Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D.
ředitelka Divize 1
na základě plné moci ze dne 1. 6. 2015

 155
OHL ŽS, a.s.
Jurešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Časový harmonogram postupu prací Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

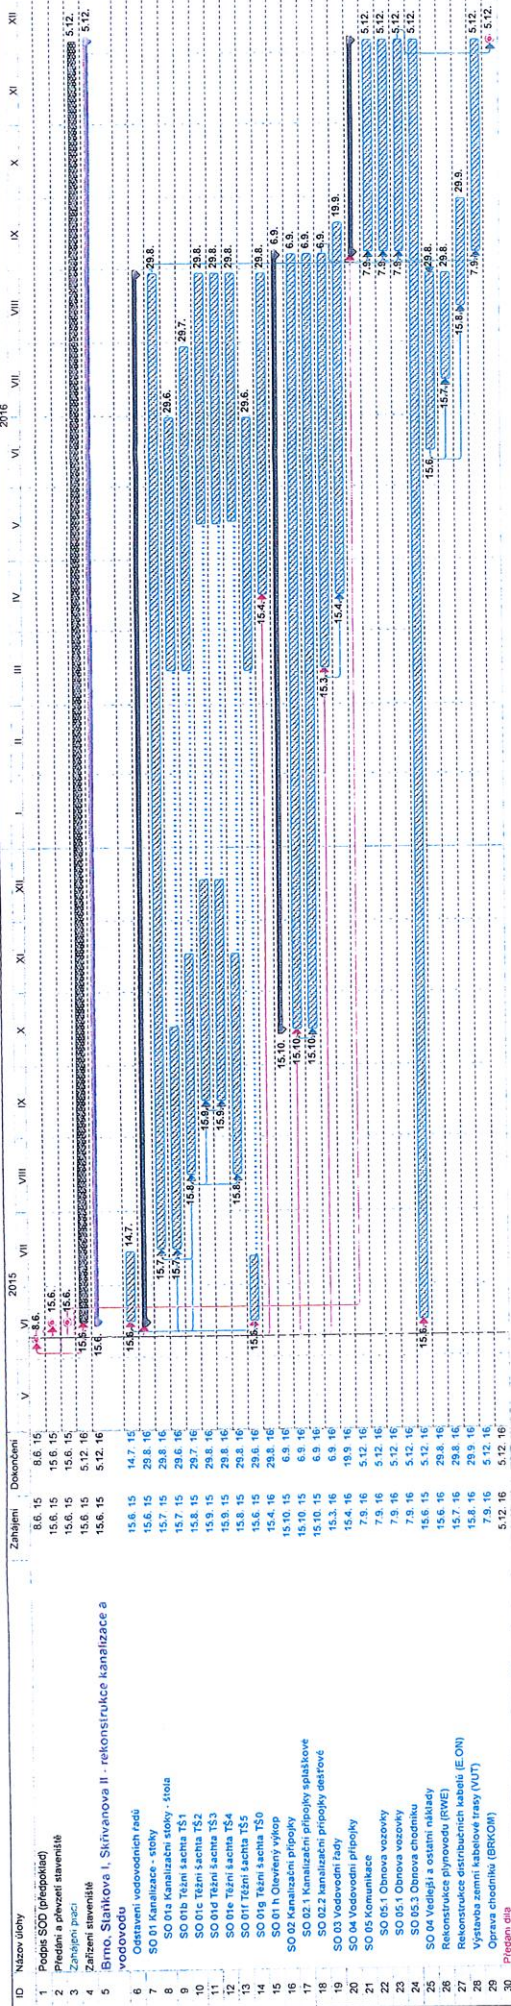

1 1 -06- 2015

V Brně dne
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hydrošova 254/116, 602 00 Brno

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne 10.6.2015
Za zhotovitele:

za společnost OHL ŽS a.s.
Ing. Zdeněk Kvasnička, Ph.D.
ředitelka Divize 1
na základě plné moci ze dne 1.6.2015

OHL ŽS
OHL ŽS a.s.
Gerešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 795, DIČ: CZ46342796

Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky

Celkem:

Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

V Brně dne 10.6.2015

Za zhotovitele:

V Brně dne

Za obiednatele:

91-06-2015

2107 00 11

oměnská vodárny a kanalizace, a.s.

Ulica Božova 254/16. 657 33 Brno

za statutární město Brno

na základě plné moci

Brněnské vodárny a k:

Ing. I. Adislaw Haška

generální ředitel

...

za společnost OHL ZS, a.s.

Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D.

ředitelka Divize 1

na základě plné moci ze dne 1.6.2015

MINI JO

OHL ŽS. a.s.

Blatná 17, CZ-602 00 Brno, Veverí
Č. 22 2 175, JIC: 222 2 175

Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Příloha č. 1 SOD Finanční harmonogram prací (s uvedením součtů finančního plnění za kalendářní čtvrtletí a roky realizace)

Měsíc	Měsíční postavěnost	Postavěnost od zahájení stavby	Čtvrtletní postavěnost	Dílčí fakturace	
Červen	293	293	293		
Červenec	2 287	2 580			
Srpen	2 491	5 071		20.8.2015	2 580
Září	2 562	7 633	7 340		
Říjen	3 169	10 802		19.10.2015	5 053
Listopad	3 073	13 875			
Prosinec	3 175	17 050	9 417	18.12.2015	6 242
Celkem rok 2015			17 050		
Leden	3 175	20 225			
Únor	2 970	23 195		18.2.2016	6 350
Březen	3 970	27 165	10 115		
Duben	4 189	31 354		18.4.2016	6 940
Květen	4 333	35 687			
Červen	4 111	39 798	12 633	20.6.2016	8 522
Červenec	4 101	43 899			
Srpen	3 258	47 157		18.8.2016	8 212
Září	3 326	50 483	10 685		
Říjen	3 394	53 877		18.10.2016	6 584
Listopad	2 230	56 107			
Prosinec		56 107	5 624 (kf)		5 624
Celkem rok 2016			39 057		
Celkem stavba			56 107		

Poznámka:

Ceny v tis. Kč bez DPH

Fakturace bude realizována dle odsouhlasené postavěnosti, v souladu s SOD, čl. V. Platební podmínky.

V Brně dne 11-06-2015
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne 10.6.2015
Za zhotovitele:

za společnost OHL ŽS, a.s.
Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D.
ředitelka Divize 1
na základě plné moci ze dne 1.6.2015

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ 602 00 Brno - Vaučín
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

155

PLNÁ MOC

ev. číslo: RA603971/15

obchodní společnost
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,
IČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,
zastoupená Ing. Michalem Šteflem - předsedou představenstva
a Ing. Tomášem Nossekem - členem představenstva

z m o c ň u j e
tímto

ředitelku Divize 1
paní Ing. Zdeňku Kvasničkovou, Ph.D.

datum narození 18.07.1978, bytem Ruská 487/172, Dubí 1, PSČ 417 01

k zastupování společnosti OHL ŽS, a.s., včetně podepisování, ve věci:

- jednání a uzavření smlouvy o dílo, včetně jejích dodatků, s objednatelem (zadavatelem) - Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno, PSČ 601 67, IČ: 449 92 785, jejímž předmětem je realizace stavby „Brno, Staňkova I, Skřivanova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, jakož i ke všem právním jednáním vůči objednateli (zadavateli) souvisejícím s realizací předmětu smlouvy, včetně změn smlouvy o dílo a úkonů OHL ŽS, a.s., jako dodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, týkajících se změn smlouvy o dílo,
- uzavření smlouvy o dílo, včetně jejích dodatků, se subdodavatelem na výše uvedenou stavbu, nebo smlouvy kupní či jiné obdobné smlouvy s dodavatelem materiálu nebo služeb v souvislosti s realizací výše uvedené stavby.

Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jmenovaný zaměstnanec svůj podpis s označením funkce a jména: ředitelka Divize 1 Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D.

Toto zmocnění má platnost do 1. 6. 2017

V Brně, dne 1. 6. 2015

Ing. Michal Štefl,
předseda představenstva
společnosti OHL ŽS, a.s.

Ing. Tomáš Nossek
člen představenstva
společnosti OHL ŽS, a.s.

Toto zmocnění přijímám:

podpis:

datum: 1. 6. 2015
