



Městský úřad Rudná	čj.
Došlo 5.4.2012	02564
Přílohy	Č.dor.zásilky
Zpracovatel JMA	

37

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 841/DDCS/14/12

uzavřená podle ust. § 536 obch. zák.
mezi následujícími smluvními stranami :

Objednatel :**Město Rudná**

se sídlem: Masarykova 94, 252 19 Rudná
zastoupený: Lubomírem Kocmanem, starostou města
IČO: 233773
DIČ: CZ 00233773
telefon: +420 311 652 311
fax: +420 311 652 381
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0388165329/0800
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Lubomír Kocman, starosta města
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Karel Procházka

Zhotovitel :**STRABAG a.s.**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 7634

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
závod pověřený
realizací: STRABAG a.s. odštěpný závod Praha
Beroun, Lidická 802, PSČ 266 01
zástupce: Ing. František Císař, v zast. dle plné moci ze dne 29.2.2012
Ing. Vladimír Král, v zast. dle plné moci ze dne 29.2.2012
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
telefon: +420 311 626 632
fax: +420 222 621 054
bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice
číslo účtu: 112071233/0300
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. František Císař - zmocněnec
Ing. Vladimír Král - zmocněnec
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. František Císař, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
Tel. 606 732 098
Ing. Radek Lhotka – stavbyvedoucí
Tel. 724 275 435

1. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy je provedení stavby „Částečná oprava mostu D5-009 přes dálnici D5 v km 6,382860“ dle zadávací dokumentace, kterou vypracoval Pontex, s.r.o., Praha 4, Bezová 1658 a oceněného soupisu prací -nabídkového rozpočtu.

Nabídkový rozpočet tvoří přílohu smlouvy a jako takový obnáší nejen cenu, ale i rozsah prací ceně odpovídající.

Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a podkladů dle čl.2 této smlouvy. Řešení které se bude odchylovat od vzorových listů staveb pozemních komunikací (VL-4 MOSTY Ministerstvo dopravy a spojů ČR,Praha 2010) musí být předem odsouhlaseno objednatelem.

Místem plnění předmětu smlouvy je : most D5-009 přes dálnici D5 v km 6,382 860 u Města Rudná

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky
- Tato smlouva
- Příloha č.1 smlouvy o dílo – nabídkový rozpočet
- Platné technické a právní normy,
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP, ŘSD ČR ve znění platném k 29.8.2005)
- TP 86 Mostní závěry (Ministerstvo dopravy a spojů ČR,Praha 2009)
- TP 88 Oprava trhlin betonových konstrukcí (Ministerstvo dopravy a spojů ČR,Praha 1997)
- Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL-4 MOSTY (Ministerstvo dopravy a spojů ČR,Praha 2010)
- stavební povolení

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

3. Cena díla

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní a činí:

Celkem bez DPH	1 149 066,46 Kč
DPH 20%	229 813,29 Kč
Celkem včetně DPH	1 378 879,75 Kč

Zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla za práce popsané v zadávací dokumentaci.

Vícepráce nad rámec zadávací dokumentace budou zapsány do stavebního deníku spolu cenou odsouhlasenou objednatelem.

1. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy je provedení stavby „Částečná oprava mostu D5-009 přes dálnici D5 v km 6,382860“ dle zadávací dokumentace, kterou vypracoval Pontex, s.r.o., Praha 4, Bezová 1658 a oceněného soupisu prací -nabídkového rozpočtu.

Nabídkový rozpočet tvoří přílohu smlouvy a jako takový obnáší nejen cenu, ale i rozsah prací ceně odpovídající.

Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a podkladů dle čl.2 této smlouvy. Řešení které se bude odchylovat od vzorových listů staveb pozemních komunikací (VL-4 MOSTY Ministerstvo dopravy a spojů ČR,Praha 2010) musí být předem odsouhlaseno objednatelem.

Místem plnění předmětu smlouvy je : most D5-009 přes dálnici D5 v km 6,382 860 u Města Rudná

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky
- Tato smlouva
- Příloha č.1 smlouvy o dílo – nabídkový rozpočet
- Platné technické a právní normy,
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP, ŘSD ČR ve znění platném k 29.8.2005)
- TP 86 Mostní závěry (Ministerstvo dopravy a spojů ČR,Praha 2009)
- TP 88 Oprava trhlin betonových konstrukcí (Ministerstvo dopravy a spojů ČR,Praha 1997)
- Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL-4 MOSTY (Ministerstvo dopravy a spojů ČR,Praha 2010)
- stavební povolení

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

3. Cena díla

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní a činí:

Celkem bez DPH	1 149 066,46 Kč
DPH 20%	229 813,29 Kč
Celkem včetně DPH	1 378 879,75 Kč

Zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla za práce popsané v zadávací dokumentaci.

Vícepráce nad rámec zadávací dokumentace budou zapsány do stavebního deníku spolu cenou odsouhlasenou objednatelem.

4. Termín plnění

Termín zahájení prací : 29.3..2012
Termín dokončení prací : 30.8. 2012

V případě, že objednatel předá zhotoviteli staveniště později než k 15.4.2012 bude posunut o stejný časový úsek i termín ukončení díla.

5. Provádění prací.

Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost k omezení případných prací třetích subjektů na mostě a v jeho okolí, tak aby neomezily průběh prací na mostě a řádné plnění termínů dle harmonogramu. V opačném případě bude termín díla posunut o dobu vynucených prostojů, případně bude řešen vliv na cenu díla.

Zhotovitel má právo uzavřít pouze jeden jízdní pruh, s tím, že vždy zůstane průjezdný jeden jízdní pruh v minimální šíři 3 metrů, zhotovitel uzavře na nezbytně dlouhou dobu (pro osazení mostních závěrů a provedení vozovky) provoz na mostě a dobu uzavření projedná s objednatelem, minimálně 7 dní předem.

✓ Zhotovitel nesmí svou činností ohrozit bezpečnost silničního provozu a chodců v okolí stavby.

Zhotovitel je povinen před zahájením stavby pojistit se na svůj náklad proti všem rizikům a možným škodám na prováděném díle, majetku objednavatele a třetích osob v souvislosti s prováděním díla na částku nejméně 10 mil. Kč. Doklad o pojištění dodavatele bude předložen na vyžádání do 14 dnů po podpisu smlouvy.

Práce, které vykáží již v průběhu provádění nedostatky, musí dodavatel nahradit pracemi bezvadnými ve vzájemně dohodnuté lhůtě. Pokud dodavatel v této lhůtě vady neodstraní, má zadavatel právo od smlouvy odstoupit.

Kvalita prací a způsob její kontroly jsou dány projektem, dokumenty vyjmenovanými v kapitole „2. Podklady“ v této smlouvě .

Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu díla dále zejména:

- zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, spolupráce ze správci inženýrských sítí, zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, veškeré náklady plně hradí zhotovitel
- odvoz a uložení vzniklého odpadu na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a staveb) včetně poplatku za uskladnění,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- ✓ zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- ✓ v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti,
- zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTSK, B.p.v.), CD ve formátu DGN a DWG
- zajištění výroby nových dilatačních závěrů kvalifikovaným výrobcem, kterého musí odsouhlasit objednatel
- repase vyjmutých ložisek podle projektové dokumentace, případné nutné práce nad rámec zadávací dokumentace budou odsouhlaseny včetně změny ceny
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) jako např. nedestruktivní zkoušení svarů,

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla či zkušebního provozu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména:
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti
 - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování

6. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve písemně 2 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla .

Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté bez vad a nedodělků nebo v případě souhlasu objednatele může být převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

Podklady vyžadované při převzetí prací :

- prováděcí dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby včetně doplnění názvů a výrobců použitých materiálů
- prohlášení o shodě nebo atesty dodaných a použitých materiálů a výrobků na stavbu
- návody na údržbu nových dilatačních závěrů a opravených ložisek
- protokoly o předepsaných zkouškách
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- stavební deníky
- další doklady dle požadavku technického dozoru nebo budoucího správce díla.
- Zhotovitel předloží výše uvedené doklady objednateli v trojím vyhotovení.

7. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí 36 měsíců a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V případě předávání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné ucelené části díla. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, materiály rozrušujícími silniční konstrukci, se záruka nevztahuje.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.

Za zjevnou ani skrytou vadu díla nelze považovat případné kolísání barevných odstínů a vznik vápenných výkvětů na betonových výrobcích. Tomuto projevu vlastností přírodních surovin nelze technologicky zcela zabránit. Tyto přirozené jevy nemají vliv na technické vlastnosti výrobků, stanovené příslušnými normami jakosti.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdávání objednateli.

Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení § 427-428 obch. z. o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

8. Platební podmínky

Úhrada ceny díla bude prováděna dílčími měsíčními fakturami na základě soupisu skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami z nabídky. Soupis prací bude odsouhlasen TDI.

Konečná faktura bude vystavena po řádném předání a převzetí díla na základě protokolu o předání a převzetí díla a oceněného soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem.

K faktuře bude připočteno DPH, ve výši dle platných právních předpisů.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů po doručení objednateli. V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena 3. den po odeslání.

Objednatel má právo pozastavit k zajištění svých práv a nároku na odstranění vad a nedodělků zjištěných při odevzdání a převzetí díla částku rovnající se 5 % z každé fakturované částky. Objednatel je povinen uvolnit tuto částku v celé výši po odstranění vad a nedodělků.

9. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- a) Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,05% z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.
- b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo za každý den prodlení. Objednatel má právo odečíst pokutu za nesplnění termínu dokončení stavby z částky na poslední faktuře.

Při prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dní může objednatel odstoupit od smlouvy.

10. Ostatní ujednání

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami. Staveniště nebude prosté práv třetích osob.

Objednatel odpovídá za řádné veřejnoprávní projednání díla, eventuálně ohlášení úprav příslušnému orgánu státní správy.

Objednatel předá min. 1 fixní výškový bod na staveništi.

Objednatel vyčlení pro zhotovitele na staveništi prostor pro umístění zařízení staveniště, náradí, strojů.

Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Za poškození inženýrských sítí nevyznačených v dokumentu nebo nevytýčených při předání staveniště nese odpovědnost objednatel.

11. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Nedílnou součástí této smlouvy je čestné prohlášení objednatele, že oprava mostu nespadá do ekonomické činnosti, ale do veřejné správy.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli i třetím osobám v důsledku své stavební činnosti nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny dohodou obou stran a případně soudem, místně příslušným objednateli.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

Přílohy smlouvy:

- Nabídkový rozpočet
- Časový harmonogram stavby
- Výpis z obchodního rejstříku (prostá kopie)
- Čestné prohlášení objednatele ve vztahu k novele zákona o DPH

ing. Tomáš Ptáček

Eva Klouček

Smlouvu prověřil:

V Rudné dne 29.3.2012

V Berouně dne

Za objednatele:

Kocman

Město Rudná
Masarykova 94
252 19 Rudná ①

Lubomír Kocman
starosta města

Za zhotovitele:

Král

Ing. Vladimír Král
v zastoupení dle plné moci ze dne 29.2.2012

Ing. František Císař
v zastoupení dle plné moci ze dne 29.2.2012

STABAG a.s.
ODSTUPNÝ ZÁVOD PRAHA
LIDICKÁ 802
CZ - 256 01 BEROUN
(43)



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:	D5-009	Oprava mostu u Krahulova v km 6,382 860 dálnice D5
Objekt:	D5-009	Most přes dálnici D5 v km 6,382 860
Rozpočet:	D5-009	Most přes dálnici D5 v km 6,382 860 - DZS 06/2011

Objednatel:**Zhotovitel/dokumentace:****Zhotovitel:**

STRABAG a.s.

Základní cena:

1 149 066 Kč

Cena - celkem: 1 149 066 Kč**DPH:** 229 813 Kč**Cena s daní:** 1 378 879 Kč**Z toho rozhod. hmoty:****Měrné jednotky:**

M2

Počet měrných jednotek:

735

Naklad na měrnou jedn.:

1 563 Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová**Datum zadání:** 15.06.2011**Vypracoval nabídku:****Datum vypracování nabídky:** . . . :



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D5-009

Oprava mostu u Krahulova v km 6,382 860 dálnice D5

Objekt: D5-009

Most přes dálnici D5 v km 6,382 860

Rozpočet: D5-009

Most přes dálnici D5 v km 6,382 860 - DZS 06/2011

HSV- 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
1	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1.00	41 870.00	41 870.00
			RDS				
2	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KČ	1.00	2 948.59	2 948.59
	HSV - 0	-	Všeobecné konstrukce a práce				44 818.59

HSV- 1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	10.00	55.91	559.10
			Vč.spálení - odhad				
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	0.36	662.08	238.35
			Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení				
			t1.30 mm - chodníky				
			'0.8*1.0*2*0.03*4+0.8*3.5*0.03*2'=0.36				
5	11332		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL	M3	14.00	321.33	4 498.62
			vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení				
			předpolí op.4 - ŠD t1.200 mm				
			'7.0*10.0*0.2'=14				
6	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	4.90	439.82	2 155.12
			Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení				
			na mostě KAZ t1.30-120 mm				
			'7.0*(0.03+0.120)*0.5*2.0*2'=2.1				
			předpolí - t1.100 mm				
			'7.0*2.0*0.1*2'=2.8				
7	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM	M3	6.58	457.67	3 011.47
			Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení				
			předpolí - KSC t1.235 mm				
			'7.0*2.0*0.235*2'=6.58				
8	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ	M	8.00	69.35	554.80
			Vč.odvozu - majetek investora				
			na mostě '2.0*4'=8				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D5-009

Oprava mostu u Krahulova v km 6,382 860 dálnice D5

Objekt: D5-009

Most přes dálnici D5 v km 6,382 860

Rozpočet: D5-009

Most přes dálnici D5 v km 6,382 860 - DZS 06/2011

9	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	13.00	104.02	1 352.26
		Vč.odvozu - majetek investora				
		na předpolí '2.0*2+4.5*2'=13				
10	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	22.40	1 460.92	32 724.61
		vč.odvozu k recyklaci				
		tl.110 mm - most a předpolí op.1				
		'7.0*2.0*0.11*3'=4.62				
		tl.210 mm - předpolí op.4				
		'7.0*10.0*0.21'=14.7				
		tl.40 mm - předpolí op.4				
		'7.0*10.0*0.04'=2.8				
		tl. 80 mm - napojení předpolí op.1				
		'7.0*0.5*0.08'=0.28				
11	113767	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	4.50	342.90	1 543.05
		Šířky 500 mm a tl.10-15 mm				
		op.1 '4.5'				
HSV - 1	-	Zemní práce				46 637.38

HSV- 2 - Základy

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
12	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0.02	99 560.40	1 991.21
			Příčné žebro z dren.plastbetonu				
			mezi novými odvod.trubičkami				
			'7.0*0.1*0.035'=0.02				
13	261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	M	40.56	139.76	5 668.67
			Pro kotvení vyrovnávacího betonu, vč.vlepení výztuže				
			'(7.0*4.0+1.45*2*2.0)*2*4*0.15'=40.56				
14	261516		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM	M	0.70	4 422.89	3 096.02
			Pro odvod.trubičky izolace				
			'0.35*2'=0.7				
HSV - 2	-	Základy					10 755.90

HSV- 3 - Svislé konstrukce

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
---------	---------	-----	------	----	----------	-------------	-------------



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D5-009

Oprava mostu u Krahulova v km 6,382 860 dálnice D5

Objekt: D5-009

Most přes dálnici D5 v km 6,382 860

Rozpočet: D5-009

Most přes dálnici D5 v km 6,382 860 - DZS 06/2011

15	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KUS	12.00	684.07	8 208.84
		Kompletní vč.vrtání a vlepení - po 1 m				
		' (2+4) *2 '=12				
16	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	8.09	8 810.99	71 280.91
		C30/37-XC4, XF4 vč.výplně a těsnění prac.a dilat.spar, vč.úpravy povrchu stíráží, vč.separační vrstvy u stávající římsy				
		' (0.65*0.25+0.26*1.45) * (2.0*2+5.5*2) '=8.09				
17	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	1.21	23 588.73	28 542.36
		Odhad 150 kg/m3				
		' 8.09*0.150 '=1.21				
HSV -	3	- Svislé konstrukce				108 032.11

— HSV- 4 - Vodorovné konstrukce

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
18	42511		PODEPŘENÍ KONSTRUKCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	KUS	2.00	20 640.14	41 280.28
			Pro výměnu ložisek vč.lisů				
			op.1 '1'				
			op.4 '1'				
19	42850		MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ	KUS	8.00	2 005.04	16 040.32
			Vyjmutí, repase a zpětné osazení				
			op.1 '4'				
			op.4 '4'				
20	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	0.90	3 771.38	3 394.24
			C8/10 X0 - podkladní beton				
			nové římsy '1.0*(0.5*2+4.0*2)*0.1'=0.9				
21	457325		VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	2.49	4 361.86	10 861.03
			C30/37-XF2				
			' (0.06+0.12)*0.5*((7.0*2.0+1.45*1.0*2)*2-(1.173*2*2+0.725*1*2)) '=2.49				
22	45734		VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	0.28	99 560.40	27 876.91
			Vyrovňovací vrstva z plastbetonu tl.30-60 mm				
			' (0.03+0.06)*0.5*(1.173*2*2+0.725*1*2) '=0.28				
23	457365		VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505	T	0.04	22 563.50	902.54
			Spřahující trny R8				
			' (7.0*4.0+1.45*2*2.0)*2*4*0.4*0.395*0.001 '=0.04				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D5-009

Oprava mostu u Krahulova v km 6,382 860 dálnice D5

Objekt: D5-009

Most přes dálnici D5 v km 6,382 860

Rozpočet: D5-009

Most přes dálnici D5 v km 6,382 860 - DZS 06/2011

24	457366	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z KARI-SITÍ ' (7.0*4.0+1.45*2.0*2) *2*0.007*1.2'=0.57	T	0.57	23 588.73	13 445.58
25	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU Výplň dutin mezerovitým betonem řimsy na křídlech op.1 '1.0*4.0*0.2*2'=1.6	M3	1.60	2 329.99	3 727.98
26	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba z lomového kamene tl.200 mm do betonu tl.150 mm - vč.obrubníků ukončení řimsy op.1 '3.0*2.0*0.35'=2.1 op.4 '3.0*(1.7+2.1)*0.35'=3.99 podél křidel op.1 '0.5*(7.0+5.0)*0.35'=2.1 op.4 '0.5*5.0*2*0.35'=1.75 celkem =9.94	M3	9.94	4 429.35	44 027.74
HSV - 4 - Vodorovné konstrukce						161 556.62

— HSV- 5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
27	56144		KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TL DO 200MM Tl.200 mm předpolí op.4 '7.0*10.0'=70	M2	70.00	302.43	21 170.10
28	56145		KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TL DO 250MM Tl.235 mm předpolí op.1 '7.0*2.0'=14	M2	14.00	344.43	4 822.02
29	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM ŠD 0-32 tl.235 mm předpolí op.4 '7.0*10.0'=70	M2	70.00	172.23	12 056.10
30	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS, EK 0.5 kg/m2 '227.5+84.0'=311.5	M2	311.50	10.70	3 333.05
31	572411		JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR UZAVÍRACÍ Na ohrubné vrstvě '0.5*(5.0+10.0)*2'=15	M2	15.00	17.65	264.75



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D5-009

Oprava mostu u Krahulova v km 6,382 860 dálnice D5

Objekt: D5-009

Most přes dálnici D5 v km 6,382 860

Rozpočet: D5-009

Most přes dálnici D5 v km 6,382 860 - DZS 06/2011

32	574134	ASFALTOVÝ BETON TŘ I MODIFIK TL 40MM ACO 11+ ACL 11+ ACO - na mostě a předpolí '7.0*(2.5*3+10.0+10.0) '=192.5 ACL - na mostě '7.0*2.5*2 '=35	M2	227.50	267.58	60 874.45
33	574161	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 75MM ACL 22+ předpolí '7.0*(2.0+10.0) '=84	M2	84.00	436.37	36 655.08
34	57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 22+ tl.100 mm předpolí '7.0*(2.0+10.0) '=84	M2	84.00	583.81	49 040.04
35	575174	LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 35MM TŘ IV MA 8 - ochrana izolace '7.0*2.0*2 '=28	M2	28.00	566.13	15 851.64
HSV - 5 - Komunikace						204 067.23

— HSV- 6 - Úpravy povrch , podlahy, výplň otvor

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
36	626111		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM [S5] - odhad opěra 1 - 30% plochy '(9.92*(0.7+1.0)+(4.0*2.0*0.5+1.1*0.7)*2)*0.3 '=7.92	M2	7.92	405.56	3 212.04
37	626111a		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM [S10] - odhad opěra 1 - 20% plochy '(9.92*(0.7+1.0)+(4.0*2.0*0.5+1.1*0.7)*2)*0.2 '=5.28	M2	5.28	511.80	2 702.30
38	626113		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM [S30] - odhad opěra 1 - 10% plochy '(9.92*(0.7+1.0)+(4.0*2.0*0.5+1.1*0.7)*2)*0.1 '=2.64 římasy - 3% vnějších ploch '(0.15+0.15+0.5+0.2+0.11)*77.5*2*0.03 '=5.16 celkem =7.8	M2	7.80	1 085.53	8 467.13



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D5-009

Oprava mostu u Krahulova v km 6,382 860 dálnice D5

Objekt: D5-009

Most přes dálnici D5 v km 6,382 860

Rozpočet: D5-009

Most přes dálnici D5 v km 6,382 860 - DZS 06/2011

39	626122	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM	M2	1.85	1 611.37	2 981.03
		[S50] - odhad				
		opěra 1 - 7% plochy				
		' $9.92 * (0.7 + 1.0) + (4.0 * 2.0 * 0.5 + 1.1 * 0.7) * 2$ ' * 0.07' = 1.85				
40	626211	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM	M2	2.28	334.37	762.36
		[S5] - odhad				
		opěra 1 - 30% plochy				
		' $1.1 * (9.92 - 3.0) * 0.3$ ' = 2.28				
41	626211a	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM	M2	1.52	440.52	669.59
		[S10] - odhad				
		opěra 1 - 20% plochy				
		' $1.1 * (9.92 - 3.0) * 0.2$ ' = 1.52				
42	626213	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM	M2	0.76	985.36	748.87
		[S30] - odhad				
		opěra 1 - 10% plochy				
		' $1.1 * (9.92 - 3.0) * 0.1$ ' = 0.76				
43	626222	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM	M2	0.53	1 486.15	787.66
		[S50] - odhad				
		opěra 1 - 7% plochy				
		' $1.1 * (9.92 - 3.0) * 0.07$ ' = 0.53				
44	626241	DOBETONOVÁNÍ VODOR PLOCH SHORA TL DO 100MM	M2	2.30	382.16	878.97
		[D100] - odhad				
		opěra 1 - úl.práh '1.3'				
		ložisk.bločky '1.0'				
45	626242	DOBETONOVÁNÍ VODOR PLOCH SHORA TL DO 200MM	M2	1.30	712.90	926.77
		[D200] - odhad				
		opěra 1 - úl.práh '1.3'				
46	626243	DOBETONOVÁNÍ VODOR PLOCH SHORA TL DO 300MM	M2	1.30	992.22	1 289.89
		[D200] - odhad				
		opěra 1 - úl.práh '1.3'				
HSV - 6		- Úpravy povrch , podlahy, výpln otvor				23 426.61

— PSV. 7 - P idružená stavební výroba

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
---------	---------	-----	------	----	----------	-------------	-------------



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D5-009

Oprava mostu u Krahulova v km 6,382 860 dálnice D5

Objekt: D5-009

Most přes dálnici D5 v km 6,382 860

Rozpočet: D5-009

Most přes dálnici D5 v km 6,382 860 - DZS 06/2011

47	71141	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ STĚRKOVÁ na NK ' (7.0*2.0+1.45*1.0*2) *2 '=33.8	M2	33.80	648.69	21 925.72
48	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY S výztužnou kovovou vložkou '1.65*1.0*2*2 '=6.6	M2	6.60	176.92	1 167.67
49	783221	PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAH Zn OK v místech nad ložisky	M2	1.50	685.20	1 027.80
50	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B [N] opěra 1 '9.92*1.1+9.92*(0.7+1.0)+(4.0*2.0*0.5+1.1*0.7) *2 '=37.32	M2	37.32	180.04	6 719.09
51	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C [NO] kraje říms '(0.15+0.15)*(2.0*2+4.5*2) '=3.9	M2	3.90	213.36	832.10
PSV - 7 - P idružená stavební výroba						31 672.38

HSV- 8 - Potrubí

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
52	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 100MM DN 100 mm ' (2.0+5.5+2.5*2) *2 '=25	M	25.00	122.48	3 062.00

HSV - 8 - Potrubí

3 062.00

HSV- 9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
53	911211		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ Nové zábradlí vč.montáže, dodání a PKO ' (2.0+5.0) *2 '=14	M	14.00	4 210.59	58 948.26
54	915111		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA vodící pruh '0.25*(10.0+30.0) *2 '=20	M2	20.00	188.71	3 774.20



POLOŽKY ROZPOČTU

		Stavba: D5-009	Oprava mostu u Krahulova v km 6,382 860 dálnice D5			
		Objekt: D5-009	Most přes dálnici D5 v km 6,382 860			
		Rozpočet: D5-009	Most přes dálnici D5 v km 6,382 860 - DZS 06/2011			
55	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Napojení '7.0*2'=14	M	14.00	28.26	395.64
56	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Napojení '7.0*2'=14	M	14.00	67.96	951.44
57	931322	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 PROVIZORNÍ POLOŽKA Kompletní zálivka vč.pročištění spár Vč.nátěru pro zvýšení přilnavosti v chodníku na 50% délky '82.6*0.5*4'=165.2	M	165.20	78.03	12 890.56
58	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 PROVIZORNÍ POLOŽKA Kompletní zálivka vč.pročištění spár a předtěsnění Vč.nátěru pro zvýšení přilnavosti spáry mezi prefabrikáty říms '0.615*56*2'=68.88	M	68.88	118.10	8 134.73
59	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 PROVIZORNÍ POLOŽKA Kompletní zálivka vč.pročištění spár do hl.50 mm a předtěsnění Vč.nátěru pro zvýšení přilnavosti mezi římsou a vozovkou - horní vrstva - 100% délky '88.6*2'=177.2	M	177.20	142.36	25 226.19
60	931325a	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Bez předtěsnění Vč.nátěru pro zvýšení přilnavosti mezi římsou a vozovkou - spodní vrstva '(4.0+7.5)*2'=23	M	23.00	101.44	2 333.12
61	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM Kompletní s dovol.posunem +-40 mm vč.zálivek Púdorysná délka !! nad opěrou 4 '10.24'	M	10.24	19 947.81	204 265.57
62	93165	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,044M2 nad opěrou 1 '10.24'	M	10.24	8 752.27	89 623.24
63	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁŘ ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM Skluz kompletní podél křídla op.1 '2.9'	M	2.90	672.89	1 951.38



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D5-009

Oprava mostu u Krahulova v km 6,382 860 dálnice D5

Objekt: D5-009

Most přes dálnici D5 v km 6,382 860

Rozpočet: D5-009


Most přes dálnici D5 v km 6,382 860 - DZS 06/2011

64	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Kompletní vč.vsakovací vrstvy z dren.plastbetonu a zavěšení	KUS	2.00	1 694.85	3 389.70
65	93850	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR MECHANICKY římasy - 5% vnějších ploch ' (0.15+0.15+0.5+0.2+0.11) *77.5*2*0.05'=8.6	M2	8.60	331.80	2 853.48
66	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ opěra 1 '9.92*1.1+9.92*(0.7+1.0)+(4.0*2.0*0.5+1.1*0.7)*2'=37.32	M2	37.32	129.74	4 841.90
67	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM OK v místech nad ložisky - na Sa 2.5	M2	1.50	430.49	645.74
68	94591	MOBILNÍ PRACOVNÍ PLOŠINA - PRONÁJEM Vč.montáže, přemístění po úsecích a odvozu po ukončení	KUS	1.00	10 025.21	10 025.21
69	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ Vč.uříznutí a odvozu na skládku a poplatku za uložení římsové prefabrikáty ' (0.5*0.35+0.1*0.3) * (2.0+5.5) *2'=3.08	M3	3.08	4 107.73	12 651.81
70	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení římasy vč.chrániček '0.8*0.2*(2.0+5.5)*2'=2.4	M3	2.40	1 844.29	4 426.30
71	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ Vč.odvozu	M	14.00	127.21	1 780.94
72	96716	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení kapsa dilatace na opěrách '0.2*0.4*9.92*2'=1.59	M3	1.59	4 257.34	6 769.17
73	96785	VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ Vč.zachování stávající výztuže Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení nad opěrami '10.24*2'=20.48	M	20.48	2 356.18	48 254.57
74	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROV BETONU NA MOSTECH Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení na mostě pod chodníky ' (1.1*0.06+0.2*0.1*0.5) *1.0*4'=0.3	M3	0.30	4 100.90	1 230.27



POLOŽKY ROZPOČTU

		Stavba: D5-009	Oprava mostu u Krahulova v km 6,382 860 dálnice D5			
		Objekt: D5-009	Most přes dálnici D5 v km 6,382 860			
		Rozpočet: D5-009	Most přes dálnici D5 v km 6,382 860 - DZS 06/2011			
75	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	28.88	334.98	9 674.22
		Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení				
		na mostě				
		' (7.0*1.8+ (9.3-7.0) *0.8) *2 '=28.88				
HSV -	9	- Ostatní konstrukce a práce				515 037.64
Celkem za rozpočet				[Kč]		1 149 066.46

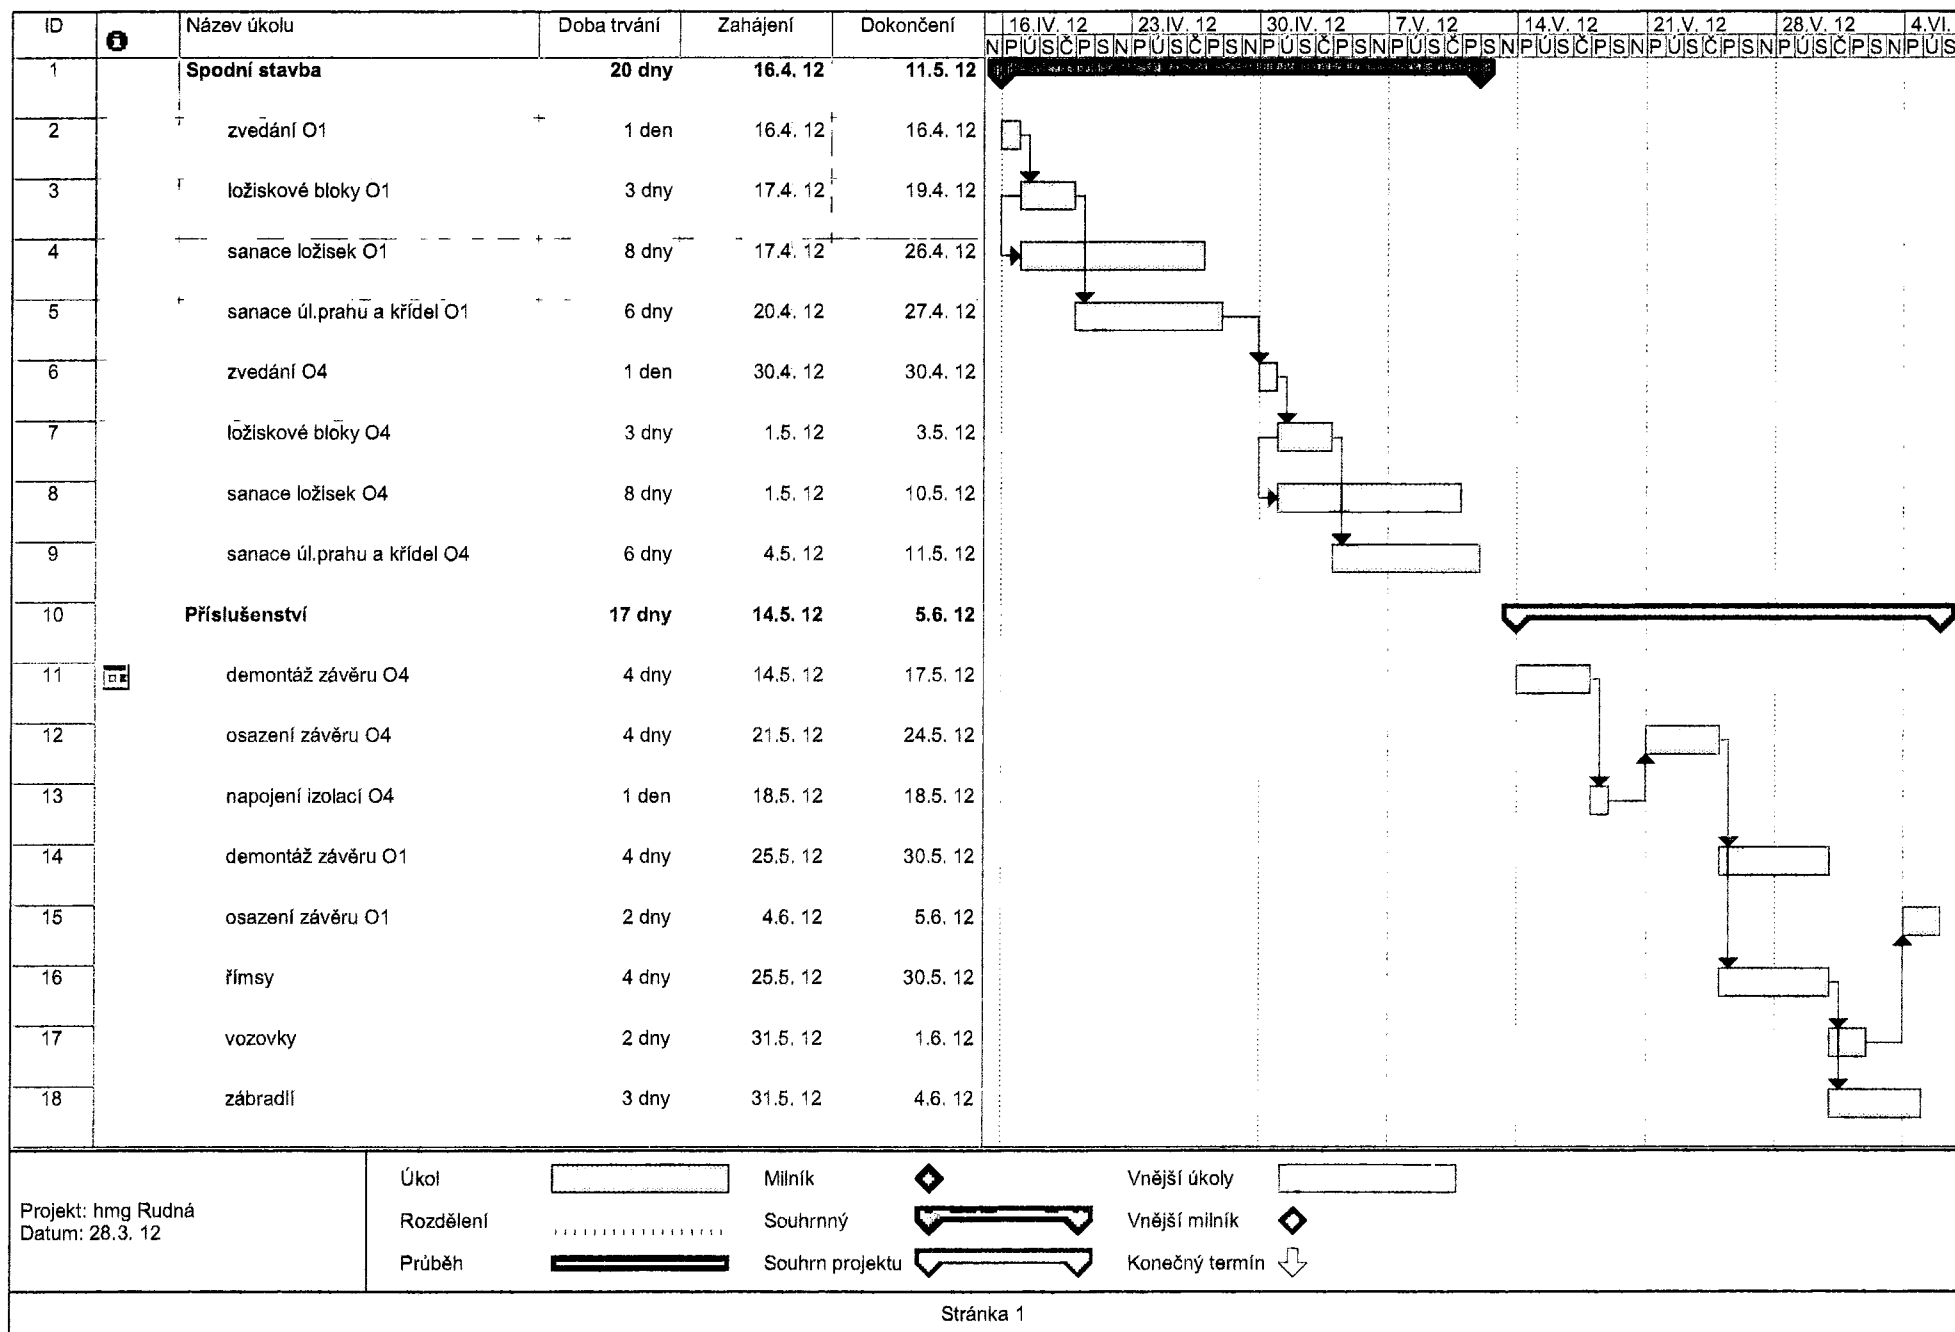



V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum zápisu: 1.března 1994

Obchodní firma: STRABAG a.s.

Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 608 38 744

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výroba betonu a obalovaných živičných směsí
- opravy silničních vozidel
- hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování
a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné
v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů,
výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů,
vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní
sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů
a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam
a studní, v ražení štol a tunelů)
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, -
mezinárodní příležitostná osobní
- výkon zeměměřických činností
- provádění trhacích a ohňostrojných prací
- výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup
a prodej výbušnin
- zámečnictví, nástrojářství
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva: Ing. Josef Krátký, dat.nar. 03.04.1950
Beroun - město, Kollárova 1748, PSČ 266 01
den vzniku členství v představenstvu: 1.ledna 2009

předseda představenstva: Ing. Jaroslav Katzer, dat.nar. 04.05.1952
Mníšek pod Brdy, V Lipkách 1072, PSČ 252 10
den vzniku funkce: 1.ledna 2009
den vzniku členství v představenstvu: 22.listopadu 2007

člen: Ing. Jarmila Považanová, dat.nar. 19.10.1962
Bratislava, Kaštielská 1/A, 82105
Slovenská republika
den vzniku členství v představenstvu: 31.května 2004

člen představenstva: Miroslav Božetický, dat.nar. 30.08.1961
Chrudim, V Tejnecku 604, PSČ 537 01
den vzniku členství v představenstvu: 1.ledna 2009

člen představenstva: Walter Egger, dat.nar. 23.01.1965
Seeboden, Treffling 71, 9871
Rakouská republika
den vzniku funkce: 9.ledna 2008

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. Vladimír Boršek, dat.nar. 18.11.1954
České Budějovice, Plavská 1977/5

Ing. František Šváb, dat.nar. 24.02.1953
Olomouc, Šubova 50

Ing. Josef Krátký, dat.nar. 03.04.1950
Beroun-město, Kollárova 1748, okres Beroun, PSČ 266 01

Ing. Radek Hradil, dat.nar. 02.02.1964
Uherské Hradiště-Mařatice, Okružní 660

Ing. Jiří Pechlát, dat.nar. 12.08.1954
Prachatice, Prachatice II, Kopretinová 945, PSČ 383 01

Ing. Jaroslav Katzer, dat.nar. 04.05.1952
Mníšek pod Brdy, V Lipkách 1072, PSČ 252 10

Alfred Johann Zwischenberger, dat.nar. 30.07.1954
9841 Winklern , Zwischenbergen 11
Rakouská republika
pobyt v ČR: Praha 4, Brabcova 2/1159

Walter Egger, dat.nar. 23.01.1965
Seeboden, Treffling 71, 9871
Rakouská republika

Ing. Renata Hamrská, dat.nar. 19.03.1961
Liberec, Liberec XXV - Vesec, Hvozdíkova 837, PSČ 460 01

Ing. Irena Matějčíková, dat.nar. 03.09.1955
Praha 4, Braník, Nad Lesním divadlem 1117/10, PSČ 140 00

Ing. Petr Čechal, dat.nar. 16.06.1955
Halámky 38, PSČ 387 06

Ing. Jarmila Považanová, dat.nar. 19.10.1962
Bratislava, Kaštielská 1/A, 82105
Slovenská republika

Ing. Ladislav Barger, dat.nar. 14.01.1952
Loděnice, Havířská 297

Miroslav Božetický, dat.nar. 30.08.1961
Chrudim, V Tejnecku 604, PSČ 537 01

Ing. Rostislav Krones, dat.nar. 08.05.1968
Ostrov nad Oslavou 247/6, PSČ 594 45

Ing. Jiří Jaroš, dat.nar. 31.01.1962
České Budějovice, Plachého 25, PSČ 370 01

Petr Kafka, dat.nar. 21.02.1962
Pardubice, JUDr. Karpaty 1623, PSČ 530 03

Ing. Pavel Ludvík, dat.nar. 18.05.1972
Hronov, Karoliny Světlé 949, PSČ 549 31

Ing. Jiří Dohnal, dat.nar. 11.01.1966
Tišnov, Havlíčkova 317, PSČ 666 01

Ing. Tomáš Hoza, dat.nar. 08.05.1969
Kroměříž, Purkyňova 749, PSČ 767 01

ing. Jiří Dynka, dat.nar. 25.04.1955
Praha 5, Pod Skalou 5, PSČ 150 00

ing. Tomáš Hajič, dat.nar. 09.11.1968
Praha 10, Hvozdnická 1049/6, PSČ 100 00

Ing. Jiří Horálek, dat.nar. 16.11.1964
Brno, Stránice, Ludvíka Poděště 77/16, PSČ 602 00

Ing. Juraj Hirner, dat.nar. 31.08.1963
Bratislava, Devínská Nová Ves, Slovinec 3, 84107
Slovenská republika

Ing. Jan Hýzl, dat.nar. 06.01.1976
Olomouc, Profesora Fuky 4, PSČ 779 00

Ing. Mgr. Alexander Holénia, dat.nar. 04.04.1976
Bratislava - Vajnory, Nad Jazierkom 9554/21, 831 07

Slovenská republika

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prkuru.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Ing. Fritz Oberlerchner, dat.nar. 16.06.1948
1130 Wien, Adolfstorgasse 6/4
Rakouská republika
den vzniku funkce: 15.května 2001
den vzniku členství v dozorčí radě: 15.května 2001

člen dozorčí rady: Zdeněk Ptačovský, dat.nar. 04.12.1953
Olomouc, Zelená 4
den vzniku členství v dozorčí radě: 21.června 2002

člen dozorčí rady: Mag. Hannes Truntschnig, dat.nar. 22.07.1956
Seeboden, Seehofstrasse 33, 9871
Rakouská republika
den vzniku členství v dozorčí radě: 20.června 2011

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs AG
9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstrasse 27
Rakouská republika

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál: 1 119 600 000,- Kč
Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

- Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.
- Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.
- Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.
- Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.
- Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle

198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

- Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

- Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Odštěpné závody:

Označení: STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo: Beroun, Lidická 802, PSČ 266 01

Předmět podnikání:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- výroba betonu a obalovaných živičných směsí
- opravy silničních vozidel
- montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení
- zámečnictví, nástrojářství
- pronájem bytových a nebytových prostor
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- výkon zeměměřických činností

vedoucí odštěpného závodu:: Ing. Josef Krátký,

dat.nar. 03.04.1950

Beroun-město, Kollárova 1748, okres Beroun, PSČ 266 01

Označení: STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo: České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 370 06

Předmět podnikání:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- výroba betonu a obalovaných živičných směsí
- opravy silničních vozidel
- zámečnictví, nástrojářství
- projektová činnost ve výstavbě
- pronájem bytových a nebytových prostor
- výkon zeměměřičských činností
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Vladimír Boršek,
dat.nar. 18.11.1954
České Budějovice, Plavská 1977/5

Označení: STRABAG a.s. odštěpný závod Brno

Sídlo: Brno, Tovární 3, okres Brno-město, PSČ 620 00

Předmět podnikání:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- výroba betonu a obalovaných živičných směsí
- opravy silničních vozidel
- pronájem bytových a nebytových prostor
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Vedoucí odštěpného závodu: Ing. Jan Hýzl, dat.nar. 06.01.1976
Olomouc, Profesora Fuky 4, PSČ 779 00

Označení: STRABAG a.s. odštěpný závod Ostrava

Sídlo: Ostrava - Svinov, Polanecká 827, PSČ 721 08

Předmět podnikání:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- výroba betonu a obalovaných živičných směsí
- opravy silničních vozidel
- pronájem nebytových a bytových prostor
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- výkon zeměměřičských činností
- provádění trhacích a ohňostrojných prací

vedoucí odštěpného závodu: Ing. František Šváb,
dat.nar. 24.02.1953
Olomouc, Šubova 50

Označení: STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské
stavitelství

Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Předmět podnikání:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- výroba betonu a obalovaných živičných směsí
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Vedoucí odštěpného závodu: Miroslav Božetický,
dat.nar. 30.08.1961
Chrudim, V Tejnecku 604, PSČ 537 01

Označení: STRABAG a.s. odštěpný závod Vysočina

Sídlo: Pelhřimov, Myslotínská 313, PSČ 393 01

Předmět podnikání:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- výroba betonu a obalovaných živičných směsí
- projektová činnost ve výstavbě
- pronájem bytových a nebytových prostor
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- výkon zeměměřických činností

vedoucí odštěpného závodu: ing. Tomáš Hajič, dat.nar. 09.11.1968
Praha 10, Hvozdnická 1049/6, PSČ 100 00

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **OU - 0196/2012**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 7 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Jana Doanová**

Obecní úřad Loděnice dne **10.02. 2012**

Podpis



Čestné prohlášení města

k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí stavebních a montážních prací podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

Město: Město Rudná
IČ: 00233773
Adresa: Masarykova 94, 252 19 Rudná

Statutární orgán

Jméno, příjmení, titul: Lubomír Kocman

Funkce: starosta města

Příloha (smlouvy/objednávky) č.

Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Příjemce tohoto plnění pořizuje plnění pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani a **neposkytuje tedy poskytovateli plnění svoje - DIČ.**

V Rudné dne 19.3.2012



.....
podpis

Město Rudná
Masarykova 94
252 19 Rudná ①
