



# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**Objednatel: Obec Malšovice**

Sídlo: Malšovice 6, PSČ 405 02

IČ: 00261548

Bankovní spojení: KB Děčín

Číslo účtu: 6027431/0100

Zastoupená: starostou obce – pan Jiří Krpálek

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

**Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.**

Sídlo: Dobrná 48, PSČ: 407 41, okr. Děčín

Statutární zástupce: Milan Hrdý

IČO: 254 75 819

DIČ: CZ25475819

Bankovní spojení: KB Děčín a.s.

Číslo účtu: 3929870287/0100

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatelem“ dále jen „Smluvní strany“

tuto

## smlouvu o dílo

### I.

#### Předmět díla

„Smluvní strany“ se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen jako „Smlouva“), na základě které se „Zhotovitel“ zavazuje realizovat dílo:

**„Malšovice-oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěší v Obci Malšovice“**

### II.

#### Místo plnění zhotovitele

k.ú. Malšovice u Děčína, p.p.č. 479/7



### III.

#### Doba provedení díla „Zhotovitelem“

1. Termín zahájení prací (převzetí staveniště): kdykoli od podpisu této „Smlouvy“.  
nejpozději: do 15.04. 2022
2. Doba realizace zakázky nesmí přesáhnout dobu šesti týdnů od dne zahájení prací (převzetí staveniště).

### IV.

#### Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této „Smlouvy“ byla stanovena dohodou obou „Smluvních stran“ ve výši:

|                     |                     |           |
|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 097 434,83</b> | <b>Kč</b> |
| <b>DPH ve výši</b>  | <b>230 461,31</b>   | <b>Kč</b> |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>1 327 896,14</b> | <b>Kč</b> |

2. „Zhotovitel“ rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této „Smlouvy“. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této „Smlouvy“.
3. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.
4. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady, tj. práce a dodávky neuvedené v projektové dokumentaci a „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr a jsou nutné pro realizaci díla, lze tyto provádět pouze v souladu s touto „Smlouvou“ a v souladu se zákonem. „Zhotovitel“ je povinen provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, a ocenit je podle jednotkových cen obsažených v „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr. Pokud takový postup ocenění není možný, ocenění je podle cen v daném místě a čase plnění obvyklých. Tyto práce mohou být „Zhotoviteli“ uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek „Objednatel“ a současně budou předem písemně odsouhlaseny formou písemného dodatku ke „Smlouvě“. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo ceny provedených prací, je „Zhotovitel“ oprávněn účtovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu.  
Veškeré práce, které „Zhotovitel“ případně provede nad rozsah předmětu plnění podle této „Smlouvy“ a u nichž nebudou splněny náležitosti a podmínky podle této „Smlouvy“, jdou k tíži „Zhotovitele“, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá „Zhotoviteli“ právo nárokovat zvýšení sjednané ceny díla dle této „Smlouvy“ nebo jinou úhradu vůči „Objednateli“ a má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
5. V případě, že některé práce a dodávky (položky rozpočtu), které jsou součástí díla dle této „Smlouvy“ a které byly obsahem projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, nebudou realizovány (nebo budou realizovány jiným způsobem), bude jejich cena z celkové ceny díla odečtena. Jedná se o práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu „Smlouvy“ ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného touto „Smlouvou“. Skutečnost výskytu těchto prací je „Zhotovitel“ povinen oznámit „Objednateli“ s předložením změnového listu. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této „Smlouvě“ bude upraven nový rozsah a cena díla.



## **V.**

### **Platební podmínky**

„Smluvní strany“ se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo.

1. Zálohová fakturace se provádět nebude.
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne doručení „Objednateli“, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet „Zhotovitele“. Před uskutečněním fakturací dále „Zhotovitel“ „Objednateli“ předá veškerou dokumentaci a přílohy dle nabídkového rozpočtu a předávacího protokolu. Tato „Smlouva“ vylučuje využití § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

## **VI.**

### **Technické podmínky**

Veškeré technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci a „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr.

## **VII.**

### **Další podmínky provádění díla**

1. „Zhotovitel“ je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývající z této „Smlouvy“, dle dokumentace a obecně platných právních předpisů.
2. „Zhotovitel“ je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.
3. „Zhotovitel“ může pro splnění této „Smlouvy“ využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.
4. „Zhotovitel“ odpovídá za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností a s ohledem na místo plnění zajistí bezpečnost práce na stavbě s přihlédnutím na přítomnost dětí.
5. Budou zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací nedocházelo k poškozování jiného majetku včetně povrchu přilehlých komunikací a k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem apod. V případě jakéhokoliv poškození dle výše uvedeného provede „Zhotovitel“ nápravu před uskutečněním fakturací.
6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání hotového díla „Objednateli“, jdou k tíži „Zhotovitele“.
7. „Zhotovitel“ prověří přítomnost inženýrských sítí. V případě jejich poškození přechází veškerá odpovědnost a úhrada nákladů na odstraňování škod na „Zhotovitele“.





8. „Zhotovitel“ pořídí v průběhu provádění díla fotodokumentaci (min. rozlišení 4 megapixels) v rozsahu min. 150 snímků, kterou „Objednateli“ předá v el. podobě na nosiči CD. Všechny zhotovené snímky budou opatřeny datem.

## **VIII.**

### **Předání a převzetí**

1. „Zhotovitel“ převezme stavbu a předá dokončené dílo protokolárně, což bude stvrzeno podpisy oprávněných osob obou „Smluvních stran“.
2. Za „Objednatele“ se předání díla zúčastní minimálně dva zástupci.
3. V případě, že „Objednatel“ odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit „Zhotoviteli“ důvody, pro které dílo nepřevzal.

## **IX.**

### **Vady díla a záruky za předmět plnění**

1. „Zhotovitel“ odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami.
2. „Zhotovitel“ poskytne „Objednateli“ na dokončené a kompletní dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne předání díla.
3. „Zhotovitel“ je zavázán odstraňovat vady díla a to na všech součástech plnění dle této „Smlouvy“, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

## **X.**

### **Odpovědnost za škodu**

1. Za vznik veškerých škod odpovídá až do převzetí díla „Zhotovitel“.
2. „Zhotovitel“ nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho dodavatelů na majetku „Objednatele“, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.

## **XI.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě, že „Zhotovitel“ nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. této smlouvy, uhradí „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý den prodlení do splnění tohoto závazku.
2. V případě prodlení „Zhotovitele“ s odstraněním vad v záruční době uhradí „Zhotovitel“ „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.



3. V případě prodlení „Objednatele“ s úhradou ceny díla (fakturou), která byla „Zhotovitelem“ řádně vyhotovena a „Objednateli“ doručena, uhradí „Objednatel“ „Zhotoviteli“ smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

## **XII. Závěrečná ustanovení**

1. Otázky výslovně neupravené touto „Smlouvou“ se řídí českým právním řádem.
2. „Objednatel“ si smluvně sjednal činnost technického dozoru kterým je: Jan Horák DiS. MBA, tel. 607 606 066.
3. Tuto „Smlouvu“ lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“.
4. Tato „Smlouva“ nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“. Tato „Smlouva“ je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obě „Smluvní strany“ obdrží po jednom.
5. „Smluvní strany“ prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato „Smlouva“ byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. „Zhotovitel“ rovněž potvrzuje převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této „Smlouvě“, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této „Smlouvy“ a podpisem stvrzuje, že jednoznačně pochopil zadání.
7. Tato „Smlouva“ byla schválena zastupitelstvem obce Malšovice usnesením č. 22/60/931 dne 07.02.2022.
8. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této „Smlouvy“ připojují „Smluvní strany“, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Přílohou a nedílnou součástí této „Smlouvy“ je:  
rozpočet  
situace  
předávací protokol

V Malšovicích dne: 09.02. 2022

V Dobkovicích dne: 15. 2. 2022

**Za „Objednatele“**  
starosta obce – Jiří Krpálek

.....  
podpis, razítko



**Za „Zhotovitele“**  
Jméno a příjmení  
Milan Hrdý

.....

podpis, razítko  
ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY  
HRDÝ MILAN s.r.o.  
407 41 DOBRNÁ 48

IČ: 25475819 DIČ: CZ25475819  
Tel: 412 525 062 Mobil: 602 193 283



## REKAPITULACE STAVBY

Kód 2021-12-08  
Stavba: Oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěší v Obci Malšovice

KSO  
Místo Malšovice

CC-CZ  
Datum 8. 12. 2021

Zadavatel  
Obec Malšovice

IC  
DIČ 00261548

Zhotovitel  
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IC  
DIČ 25475819  
CZ25475819

Projektant

IC  
DIČ

Zpracovatel

IC  
DIČ

Poznámka

### Cena bez DPH

1 097 434,83

|              |                   |                          |
|--------------|-------------------|--------------------------|
| DPH základní | Sazba daně 21 00% | Základ daně 1 097 434,83 |
| snižovaná    | 15 00%            | 0,00                     |

Výše daně  
230 461,31  
0,00

### Cena s DPH

v

CZK

1 327 896,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

- 5 - 01 - 2022

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY  
HRDÝ MILAN S.R.O.  
402 41 DUBOŘAN 48

IC 25475819 CZ25475819  
Tel 411 525 000 IČ 602 193 283

## Kod 2021-12-08

**Stavba:** Oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěší v Obci Mašovice

Misto: Malšovice

Datum 8. 12. 2021

Zadavatel                      Obec Malšovice

Projektant

Zhotovitel Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel

- 5 - 01-2022

9571

Zemské územné úradníštvo  
Hlavné mesto Bratislava  
402 412 806 / 402 412 808  
IC 222 222 222 / 222 222 222  
Tel 412 512 000, Nôd 602 193 283



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěši v Obci Malšovice

Objekt:

2021-029 - Rekonstrukce lávky pro pěši v obci Malšovice

Soupis:

## 01 - Rekonstrukce lávky

KSO:

Místo:

Malšovice

CC-CZ:

Datum:

8. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

00261548

DIČ:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ:

25475819

DIČ:

CZ25475819

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**767 991,34**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 767 991,34  | 21,00%     | 161 278,18 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**929 269,52**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



- 5 - 01 - 2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY

HRDÝ MILAN, S.R.O.

49 43 21 43 43

IČ 25475819

DIČ CZ25475819

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěší v Obci Malšovice  
Objekt: 2021-029 - Rekonstrukce lávky pro pěší v obci Malšovice  
Soupis:

### 01 - Rekonstrukce lávky

Místo: Malšovice  
Zadavatel: Obec Malšovice  
Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Datum: 8. 12. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                | <b>767 991,34</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 602 264,27        |
| 1 - Zemní práce                                | 9 714,63          |
| 5 - Komunikace pozemní                         | 42 687,71         |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 12 966,82         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 491 102,29        |
| 997 - Přesun sutě                              | 39 721,74         |
| 998 - Přesun hmot                              | 6 071,08          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 165 727,07        |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 6 063,91          |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 23 715,84         |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 135 947,32        |

- 5 -01- 2022

2021-029 - Rekonstrukce lávky pro pěší v Obci Malšovice  
Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.  
IC: 146 256 888  
Tel: 412 56 565, E-mail: 602 193 283

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěši v Obci Malšovice

Objekt:

2021-029 - Rekonstrukce lávky pro pěši v obci Malšovice

Soupis:

## 01 - Rekonstrukce lávky

Místo:

Malšovice

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód        | Popis                                                                      | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |            |                                                                            |        |          |              | <b>767 991,34</b> |
| D                             | HSV |            | Práce a dodávky HSV                                                        |        |          |              | <b>602 264,27</b> |
| D                             | 1   |            | Zemní práce                                                                |        |          |              | <b>9 714,63</b>   |
| 1                             | K   | 113106123  | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěši ručně            | m2     | 80,200   | 79,45        | 6 371,89          |
| 2                             | K   | 113107321  | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 mm      | m2     | 80,200   | 41,68        | 3 342,74          |
| D                             | 5   |            | Komunikace pozemní                                                         |        |          |              | <b>42 687,71</b>  |
| 3                             | K   | 573211113  | Nátěr hydroizolace pod litý asfalt                                         | m2     | 80,200   | 18,30        | 1 467,66          |
| 4                             | M   | 246172217  | nátěr penetrační hydroizolační membrána BAKOR 910 01                       | litru  | 20,000   | 39,00        | 780,00            |
| 5                             | M   | 246172228  | asfaltová emulze SS-1                                                      | kg     | 24,060   | 22,60        | 543,76            |
| 6                             | K   | 578132113  | Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu        | m2     | 80,200   | 483,87       | 38 806,37         |
| 7                             | K   | 578901111  | Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2                         | m2     | 80,200   | 13,59        | 1 089,92          |
| D                             | 6   |            | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                 |        |          |              | <b>12 966,82</b>  |
| 8                             | K   | 624635311  | Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 400mm2                         | m      | 11,440   | 139,54       | 1 596,34          |
| 9                             | M   | SKA 453835 | Tmel 11 FC                                                                 | balení | 9,600    | 120,00       | 1 152,00          |
| 10                            | K   | 628611141  | Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podklad + 2x ochranný OS-DII              | m2     | 32,914   | 310,46       | 10 218,48         |
| D                             | 9   |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                        |        |          |              | <b>491 102,29</b> |
| 11                            | K   | 985112111  | Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm                             | m2     | 2,428    | 256,04       | 621,67            |
| 12                            | K   | 985112112  | Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm                             | m2     | 7,283    | 371,49       | 2 705,56          |
| 13                            | K   | 985112113  | Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm                             | m2     | 14,564   | 498,74       | 7 263,65          |
| 14                            | K   | 985112132  | Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm             | m2     | 45,920   | 359,47       | 16 506,86         |
| 15                            | K   | 985112133  | Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 50 mm             | m2     | 45,920   | 487,60       | 22 390,59         |
| 16                            | K   | 985112192  | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru   | m2     | 23,074   | 206,57       | 4 766,40          |
| 17                            | K   | 985112193  | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě    | m2     | 23,074   | 38,39        | 885,81            |
| 18                            | K   | 985131111  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                   | m2     | 116,114  | 113,11       | 13 133,65         |
| 19                            | K   | 985311111  | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm                    | m2     | 24,274   | 735,08       | 17 843,33         |
| 20                            | K   | 985311113  | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm                    | m2     | 4,920    | 2 177,28     | 10 712,22         |
| 21                            | K   | 985311115  | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm                    | m2     | 34,114   | 3 615,24     | 123 330,30        |
| 22                            | K   | 985311313  | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm    | m2     | 41,000   | 2 283,10     | 93 607,10         |
| 23                            | K   | 985311315  | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm    | m2     | 41,000   | 3 714,32     | 152 287,12        |
| 24                            | K   | 985311911  | Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru | m2     | 24,274   | 548,91       | 13 324,24         |
| 25                            | K   | 985311912  | Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě  | m2     | 24,274   | 109,05       | 2 647,08          |
| 26                            | K   | 985324111  | Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)                                | m2     | 34,114   | 266,07       | 9 076,71          |
| D                             | 997 |            | Přesun sutě                                                                |        |          |              | <b>39 721,74</b>  |

1-800-368-7259  
 Fax: 602-933-6620  
 E-mail: [info@hazmat.com](mailto:info@hazmat.com)  
 Web: <http://www.hazmat.com>  
 Tel: 412-541-5222 Fax: 602-933-2833

94



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěši v Obci Malšovice

Objekt:

2021-029 - Rekonstrukce lávky pro pěši v obci Malšovice

Soupis:

**02 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Malšovice

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

00261548

DIČ:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ:

25475819

DIČ:

CZ25475819

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**39 500,00**

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená      | 39 500,00   | 21,00%     | 8 295,00  |
|              | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**47 795,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

- 5 - 01 - 2022

STANISLAV

2021

DIČ 48

IČ 25475819

11. 12. 2021 Kód 602 193 283

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěší v Obci Malšovice  
Objekt: 2021-029 - Rekonstrukce lávky pro pěší v obci Malšovice  
Soupis:

### 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Malšovice  
Zadavatel: Obec Malšovice  
Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Datum: 8. 12. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                 | <b>39 500,00</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 39 500,00        |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 7 500,00         |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 0,00             |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 17 000,00        |
| VRN6 - Územní vlivy                             | 0,00             |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 15 000,00        |

- 5 - 01 - 2022



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěši v Obci Malšovice

Objekt:

2021-029 - Rekonstrukce lávky pro pěší v obci Malšovice

## Soupis

## 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Misto:

Malšovice

Datum:

8. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                           |    |          |              | <b>39 500,00</b>  |
| D                             |     | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                               |    |          |              | 39 500,00         |
| D                             |     | VRN1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                  |    |          |              | 7 500,00          |
| 1                             | K   | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                   | Kč | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
| 2                             | K   | 013274000 | Pasportizace objektu před započítáním prací-mostní prohlídka, zpracování evidenčního/mostního listu lávky | Kč | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |
| D                             |     | VRN3      | Zařízení staveniště                                                                                       |    |          |              | 0,00              |
| 3                             | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                       | %  | 0,000    | 6 000,00     | 0,00              |
| D                             |     | VRN4      | Inženýrská činnost                                                                                        |    |          |              | 17 000,00         |
| 4                             | K   | 042903000 | Ostatní posudky-statické posouzení stávajícího stavu želez. lávky autorizovanou osobou                    | Kč | 1,000    | 12 000,00    | 12 000,00         |
| 5                             | K   | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost-zajištění vytyčení inženýrských sítí                                           | Kč | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
| D                             |     | VRN6      | Územní vlivy                                                                                              |    |          |              | 0,00              |
| 6                             | K   | 060001000 | Územní vlivy                                                                                              | %  | 0,000    | 2 000,00     | 0,00              |
| D                             |     | VRN7      | Provozní vlivy                                                                                            |    |          |              | 15 000,00         |
| 7                             | K   | 070001000 | Provozní vlivy                                                                                            | %  | 0,000    | 5 000,00     | 0,00              |
| 8                             | K   | 072103001 | Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy                                                 | Kč | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |

7-10-2000 11:56:32 AM

Số 7 và 8 năm 1943 NR 43

IC 264-1000 CZ5475819

Tel. 412 525 662 Mobil. 602 193 283

- 5 - 01. 1922

GKD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěši v Obci Malšovice

Objekt:

2021-024 - Rekonstrukce stávajícího chodníku a lávky pro pěši v obci Malšovice

Soupis:

## 01 - I. etapa - Rekonstrukce chodníku u zastávky

KSO:

Místo:

Malšovice

CC-CZ:

Datum:

8. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

00261548

DIČ:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ:

25475819

DIČ:

CZ25475819

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

### Cena bez DPH

258 943,49

DPH základní  
snižená

Základ daně

258 943,49

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

54 378,13

0,00

### Cena s DPH

v CZK

313 321,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

- 5 - 01 - 2022

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY

Hrdý Milan, s.r.o.

491 612 331 48

IČ 25475819

DIČ CZ25475819



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## Oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěši v Obci Malšovice

Objekt:

2021-024 - Rekonstrukce stávajícího chodníku a lávky pro pěši v obci Malšovice

## Soupis

### 01 - I. etapa - Rekonstrukce chodníku u zastávky

Misto:

## Malšovice

Datum.

8. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

258 943,49

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 258 943,49 |
| 1 - Zemní práce                         | 36 758,88  |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 4 641,77   |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 54 254,55  |
| 8 - Trubní vedení                       | 55 111,39  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 41 560,28  |
| 997 - Přesun sutě                       | 46 757,50  |
| 998 - Přesun hmot                       | 19 859,12  |

Tel 412 525 062 Mobil 082 193 283

- 5 - 01 - 2022

CGM

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěši v Obci Malšovice

Objekt:

2021-024 - Rekonstrukce stávajícího chodníku a lávky pro pěši v obci Malšovice

Soupis:

## 01 - I. etapa - Rekonstrukce chodníku u zastávky

Místo:

Malšovice

Datum

8. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>    |     |           |                                                                                                         |     |          |              | <b>258 943,49</b> |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |           |                                                                                                         |     |          |              | <b>258 943,49</b> |
| <b>D 1 Zemní práce</b>           |     |           |                                                                                                         |     |          |              | <b>36 758,88</b>  |
| 1                                | K   | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně                                         | m2  | 51,340   | 79,45        | 4 078,96          |
| 2                                | K   | 113107211 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2                                | m2  | 51,340   | 14,97        | 768,56            |
| 3                                | K   | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2                                | m2  | 51,340   | 35,26        | 1 810,25          |
| 4                                | K   | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2                                   | m2  | 6,750    | 90,18        | 608,72            |
| 5                                | K   | 113107343 | Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2                                             | m2  | 10,670   | 118,24       | 1 261,62          |
| 6                                | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                            | m   | 29,290   | 58,35        | 1 709,07          |
| 7                                | K   | 122151103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně | m3  | 15,402   | 100,00       | 1 540,20          |
| 8                                | K   | 131151100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně          | m3  | 8,500    | 236,00       | 2 006,00          |
| 9                                | K   | 132112112 | Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně             | m3  | 17,751   | 398,00       | 7 064,90          |
| 10                               | K   | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                   | m3  | 15,045   | 704,00       | 10 591,68         |
| 11                               | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                       | m3  | 7,728    | 205,88       | 1 591,04          |
| 12                               | M   | 58337303  | šterkopísek frakce 0/8                                                                                  | l   | 13,910   | 268,00       | 3 727,88          |
| <b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>  |     |           |                                                                                                         |     |          |              | <b>4 641,77</b>   |
| 13                               | K   | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                            | m3  | 3,478    | 1 334,61     | 4 641,77          |
| <b>D 5 Komunikace pozemní</b>    |     |           |                                                                                                         |     |          |              | <b>54 254,55</b>  |
| 14                               | K   | 564771111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 300 mm                                             | m2  | 51,340   | 225,00       | 11 551,50         |
| 15                               | K   | 564801112 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm                                                                       | m2  | 51,340   | 41,29        | 2 119,83          |
| 16                               | K   | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                      | m2  | 51,340   | 114,96       | 5 902,05          |
| 17                               | K   | 572331111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm                | m2  | 12,374   | 320,13       | 3 961,29          |
| 18                               | K   | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2                              | m2  | 51,340   | 266,93       | 13 704,19         |
| 19                               | M   | 59245018  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                     | m2  | 48,833   | 269,00       | 13 136,08         |
| 20                               | M   | 59245006  | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná                                         | m2  | 7,418    | 523,00       | 3 879,61          |
| <b>D 8 Trubní vedení</b>         |     |           |                                                                                                         |     |          |              | <b>55 111,39</b>  |
| 21                               | K   | 871265211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110                                   | m   | 27,600   | 160,61       | 4 432,84          |
| 22                               | K   | 890411811 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3                          | m3  | 3,000    | 3 798,58     | 11 395,74         |
| 23                               | K   | 895941111 | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                 | kus | 3,000    | 1 330,03     | 3 990,09          |
| 24                               | M   | 59223826  | vpust uliční skruž betonová 590x500x50mm                                                                | kus | 6,060    | 653,00       | 3 957,18          |
| 25                               | M   | 59223822  | vpust uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm                                                        | kus | 3,030    | 974,00       | 2 951,22          |
| 26                               | M   | 59223821  | vpust uliční prstenec betonový 180x660x100mm                                                            | kus | 3,030    | 574,00       | 1 739,22          |

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 27                                      | M   | 28661789  | koš kalový ocelový pro silniční vpust 425mm vč. madla                                                                                                  | kus | 3,000    | 579,00       | 1 737,00          |
| 28                                      | M   | 28661787  | mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec                                                                      | kus | 3,000    | 6 540,00     | 19 620,00         |
| 29                                      | K   | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže                                                                                    | kus | 3,000    | 1 352,81     | 4 058,43          |
| 30                                      | K   | 899623171 | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu                                                                     | m3  | 0,385    | 3 193,94     | 1 229,67          |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |           |                                                                                                                                                        |     |          |              | 41 560,28         |
| 31                                      | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                             | m   | 7,220    | 248,90       | 1 797,06          |
| 32                                      | M   | 59217023  | obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm                                                                                                            | m   | 7,581    | 166,00       | 1 258,45          |
| 33                                      | K   | 916431111 | Osazení zastávkového betonového obrubníku do betonového lože II 150 mm                                                                                 | m   | 22,570   | 265,00       | 5 981,05          |
| 34                                      | M   | 59217040  | obrubník betonový zastávkový náběhový                                                                                                                  | m   | 2,020    | 345,00       | 696,90            |
| 35                                      | M   | 59217041  | obrubník betonový zastávkový příčný                                                                                                                    | m   | 18,570   | 167,00       | 3 101,19          |
| 36                                      | M   | 59217042  | obrubník betonový zastávkový přechodový                                                                                                                | m   | 2,020    | 345,00       | 696,90            |
| 37                                      | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                         | m3  | 1,323    | 2 956,31     | 3 911,20          |
| 38                                      | K   | 919735113 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm                                                                                                        | m   | 36,000   | 128,38       | 4 621,68          |
| 39                                      | K   | 935932321 | Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm s roštem mřístkovým z litiny                                                              | m   | 5,500    | 3 544,70     | 19 495,85         |
| D 997 Přesun sutě                       |     |           |                                                                                                                                                        |     |          |              | 46 757,50         |
| 40                                      | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                          | t   | 72,527   | 239,23       | 17 350,63         |
| 41                                      | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                               | t   | 145,054  | 10,45        | 1 515,81          |
| 42                                      | K   | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                           | t   | 72,527   | 164,97       | 11 964,78         |
| 43                                      | K   | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01                                          | t   | 25,112   | 210,00       | 5 273,52          |
| 44                                      | K   | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t   | 55,248   | 180,00       | 9 944,64          |
| 45                                      | K   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t   | 3,372    | 210,00       | 708,12            |
| D 998 Přesun hmot                       |     |           |                                                                                                                                                        |     |          |              | 19 859,12         |
| 46                                      | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným                                                                                                 | t   | 101,826  | 195,03       | 19 859,12         |

ZEMNÍ PRÁCE  
 IČO 2541 525 01  
 407 41 000 48  
 IČ 2541 525 01  
 Tel 412 525 01, Mobil 602 193 283

*[Signature]*

- 5 - 01 - 2022

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěši v Obci Malšovice

Objekt:

2021-024 - Rekonstrukce stávajícího chodníku a lávky pro pěši v obci Malšovice

Soupis:

**02 - II.etapa - Rekonstrukce zbývajících částí chodníku**

KSO:

Místo: Malšovice

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

IČ:

00261548

DIČ:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ:

25475819

DIČ:

CZ25475819

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

5. 12. 2021  
ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY  
Hrdý Milan, s.r.o.  
Jižní 48  
IČ 25475819  
Tel: 412 525 042 Mobil: 602 193 283



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěší v Obci Malšovice

Objekt:

2021-024 - Rekonstrukce stávajícího chodníku a lávky pro pěší v obci Malšovice

Soupis:

**02 - II.etapa - Rekonstrukce zbývajících částí chodníku**

Místo:

Malšovice

Zadavatel:

Obec Malšovice

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Datum:

8. 12. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 0,00 |
| 1 - Zemní práce                         | 0,00 |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 0,00 |
| 8 - Trubní vedení                       | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě                       | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot                       | 0,00 |

- 5 - 01 - 2022

Zemní a dopravní stavby

Hrdý Milan, s.r.o.

502 001 000 000 000 000

IČ 257 000 000 000 000 000

Tel 412 526 000 000 000 000 193 283



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěši v Obci Mašovice

Objekt:

2021-024 - Rekonstrukce stávajícího chodníku a lávky pro pěši v obci Mašovice

Soupis:

## 02 - II.etapa - Rekonstrukce zbývajících částí chodníku

Místo:

Mašovice

Datum:

8. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Mašovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                   | MJ  | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                         |     |          |               | <b>0,00</b>       |
| <b>D HSX</b>                  |     |           | <b>Práce a dodávky HSX</b>                                                                              |     |          |               | <b>0,00</b>       |
| <b>D 1</b>                    |     |           | <b>Zemní práce</b>                                                                                      |     |          |               | <b>0,00</b>       |
| 1                             | K   | 113106144 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši strojně pl přes 50 m2                         | m2  | 273,750  | 0,00          | 0,00              |
| 2                             | K   | 113107211 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2                                | m2  | 273,750  | 0,00          | 0,00              |
| 3                             | K   | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2                                | m2  | 273,750  | 0,00          | 0,00              |
| 4                             | K   | 113107343 | Odstranění podkladu živiničného tl 150 mm strojně pl do 50 m2                                           | m2  | 24,825   | 0,00          | 0,00              |
| 5                             | K   | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                                      | m   | 29,000   | 0,00          | 0,00              |
| 6                             | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                             | m   | 136,500  | 0,00          | 0,00              |
| 7                             | K   | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových                                                                               | m   | 112,000  | 0,00          | 0,00              |
| 8                             | K   | 122151103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně | m3  | 54,750   | 0,00          | 0,00              |
| <b>D 5</b>                    |     |           | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                               |     |          |               | <b>0,00</b>       |
| 9                             | K   | 564771111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 300 mm                                             | m2  | 326,300  | 0,00          | 0,00              |
| 10                            | K   | 564801112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm                                                                       | m2  | 273,750  | 0,00          | 0,00              |
| 11                            | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                      | m2  | 273,750  | 0,00          | 0,00              |
| 12                            | K   | 572331111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm                | m2  | 24,825   | 0,00          | 0,00              |
| 13                            | K   | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2                              | m2  | 204,750  | 0,00          | 0,00              |
| 14                            | M   | 59245018  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                     | m2  | 225,225  | 0,00          | 0,00              |
| 15                            | K   | 596211211 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2                              | m2  | 69,000   | 0,00          | 0,00              |
| 16                            | M   | 59245020  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                     | m2  | 75,900   | 0,00          | 0,00              |
| <b>D 8</b>                    |     |           | <b>Trubní vedení</b>                                                                                    |     |          |               | <b>0,00</b>       |
| 17                            | K   | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                   | kus | 1,000    | 0,00          | 0,00              |
| <b>D 9</b>                    |     |           | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                              |     |          |               | <b>0,00</b>       |
| 18                            | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého              | m   | 136,500  | 0,00          | 0,00              |
| 19                            | M   | 59217023  | obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm                                                             | m   | 137,865  | 0,00          | 0,00              |
| 20                            | K   | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého             | m   | 29,000   | 0,00          | 0,00              |
| 21                            | M   | 59217029  | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                     | m   | 29,290   | 0,00          | 0,00              |
| 22                            | K   | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou                                 | m   | 112,000  | 0,00          | 0,00              |
| 23                            | M   | 59217003  | obrubník betonový zahradní 500x80x250mm                                                                 | m   | 113,120  | 0,00          | 0,00              |
| 24                            | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                          | m3  | 10,406   | 0,00          | 0,00              |
| 25                            | K   | 919735113 | Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 150 mm                                                       | m   | 165,500  | 0,00          | 0,00              |
| <b>D 997</b>                  |     |           | <b>Přesun sutě</b>                                                                                      |     |          |               | <b>0,00</b>       |
| 26                            | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                           | t   | 308,780  | 0,00          | 0,00              |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 27 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                               | t  | 617,560  | 0,00         | 0,00              |
| 28 | K   | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                           | t  | 308,780  | 0,00         | 0,00              |
| 29 | K   | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01                                          | t  | 111,958  | 0,00         | 0,00              |
| 30 | K   | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t  | 188,888  | 0,00         | 0,00              |
| 31 | K   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  | 7,845    | 0,00         | 0,00              |
| D  |     | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                            |    |          |              | 0,00              |
| 32 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                                                                  | t  | 425,439  | 0,00         | 0,00              |

- 5 - 01 - 2022

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěší v Obci Malšovice

Objekt:

2021-024 - Rekonstrukce stávajícího chodníku a lávky pro pěší v obci Malšovice

Soupis:

## 03 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Malšovice

Zadavatel:

Obec Malšovice

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2021

IČ:

00261548

DIČ:

IČ:

25475819

DIČ:

CZ25475819

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 000,00

DPH základní  
snižená

Základ daně  
31 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
6 510,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

37 510,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

5. 12. 2021  
ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY  
s.r.o.  
IČ: 25475819  
DIČ: CZ25475819  
Tel: 412 535 000 Mobil: 602 193 283

### Stavba

Objekt:

Soupis:

Misto:

## Malšovice

Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 31 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

31 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 000,00

## VRN6 - Územní vlivy

0,00

## VRN7 - Provozní vlivy

15 000,00

- 5 - 01 - 4342

OK 14

102

Tel 4123 193 283



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěši v Obci Malšovice

Objekt:

2021-024 - Rekonstrukce stávajícího chodníku a lávky pro pěši v obci Malšovice

Soupis:

## 03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Malšovice

Datum:

8. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Malšovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ  | Kód       | Popis                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |           |                                                                             |    |          |              | <b>31 000,00</b>  |
| D                             | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                 |    |          |              | 31 000,00         |
| D                             | VRN1 |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                    |    |          |              | 12 000,00         |
| 1                             | K    | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného provedení chodníků a lávky | Kč | 1,000    | 7 000,00     | 7 000,00          |
| 2                             | K    | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                     | Kč | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
| D                             | VRN3 |           | Zařízení staveniště                                                         |    |          |              | 0,00              |
| 3                             | K    | 030001000 | Zařízení staveniště                                                         | %  | 0,000    | 6 000,00     | 0,00              |
| D                             | VRN4 |           | Inženýrská činnost                                                          |    |          |              | 4 000,00          |
| 4                             | K    | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost-zajištění vytyčení inženýrských sítí             | Kč | 1,000    | 4 000,00     | 4 000,00          |
| D                             | VRN6 |           | Územní vlivy                                                                |    |          |              | 0,00              |
| 5                             | K    | 060001000 | Územní vlivy                                                                | %  | 0,000    | 2 000,00     | 0,00              |
| D                             | VRN7 |           | Provozní vlivy                                                              |    |          |              | 15 000,00         |
| 6                             | K    | 070001000 | Provozní vlivy                                                              | %  | 0,000    | 5 000,00     | 0,00              |
| 7                             | K    | 072103001 | Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II. a III. třídy                  | Kč | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |

- 5 - 01 - 102


2021

45

45

IC 2000

Tel. 412 525 111, 412 193 283

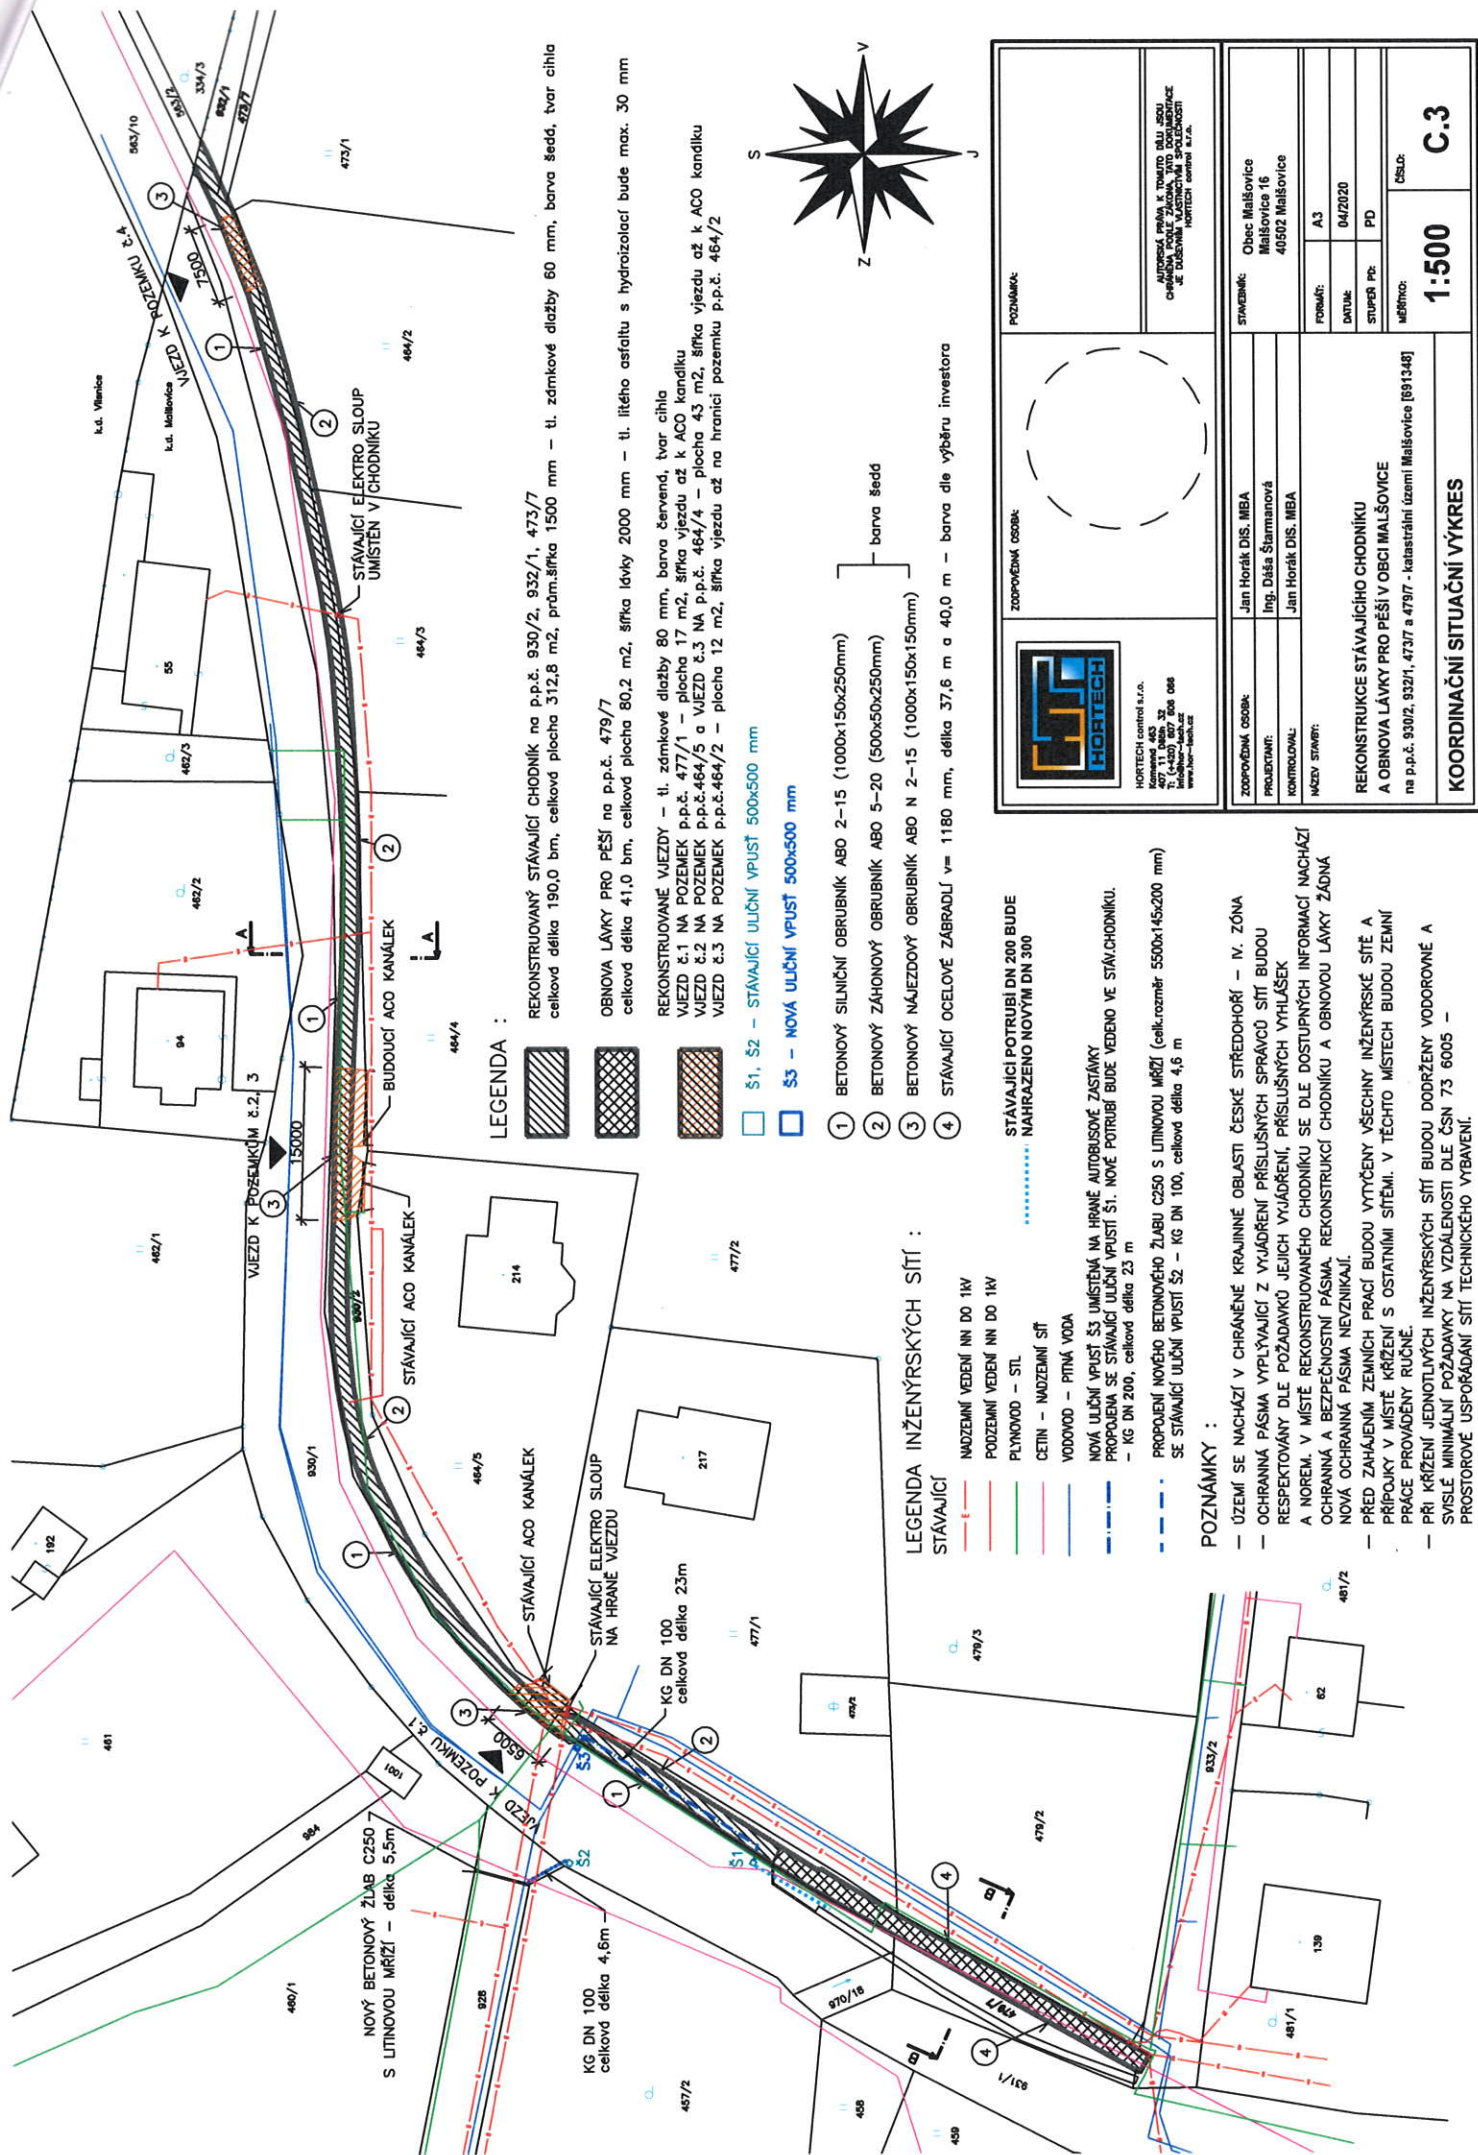

LEGENDA :

- REKONSTRUOVANÝ STÁVAJÍCÍ CHODNÍK na p.p.č. 930/2, 932/1, 473/7 celková délka 190,0 bm, celková plocha 312,8 m<sup>2</sup>, prům.šířka 1500 mm – tl. zámkové dlažby 60 mm, barva šedá, tvar cihla
- OBNOVA LÁVKY PRO PĚŠÍ na p.p.č. 479/7 celková délka 41,0 bm, celková plocha 80,2 m<sup>2</sup>, šířka lávky 2000 mm – tl. litého asfaltu s hydroizolací bude max. 30 mm
- REKONSTRUOVANÉ VJEZDY – tl. zámkové dlažby 80 mm, barva červená, tvar cihla
- VJEZD č.1 NA POZEMEK p.p.č. 477/1 – plocha 17 m<sup>2</sup>, šířka vjezdu až k ACO kandiálu
- VJEZD č.2 NA POZEMEK p.p.č.464/5 a VJEZD č.3 NA p.p.č. 464/4 – plocha 43 m<sup>2</sup>, šířka vjezdu až k ACO kandiálu
- VJEZD č.3 NA POZEMEK p.p.č.464/2 – plocha 12 m<sup>2</sup>, šířka vjezdu až na hranici pozemku p.p.č. 464/2
- Š1, Š2 – STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSŤ 500x500 mm
- Š3 – NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ 500x500 mm
- 1 BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK ABO 2–15 (1000x150x250mm)
- 2 BETONOVÝ ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK ABO 5–20 (500x50x250mm)
- 3 BETONOVÝ NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK ABO N 2–15 (1000x150x150mm)
- 4 STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁBRADÍ v= 1180 mm, délka 37,6 m a 40,0 m – barva dle výběru investora
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DN 200 BUDE NAHRAZENO NOVÝM DN 300
- STÁVAJÍCÍ
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV
- PLYNOVOD – STL
- CETIN – NADZEMNÍ SÍŤ
- VODOVOD – PRVNÍ VODA
- NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ Š3 UMÍSTĚNÁ NA HRANĚ AUTORIZOVANÉ ZASTÁVKY
- PROBLEEM SE STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSŤ Š1. NOVÉ POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STÁVAJÍCÍM.
- KG DN 200, celková délka 23 m
- PROPOJENÍ NOVOHO BETONOVÉHO ŽLABU Č250 S LITINOVOU MŘÍŽÍ (celk.rozměr 5500x145x200 mm)
- SE STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSŤ Š2 – KG DN 100, celková délka 4,5 m

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ :

- ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÉ STŘEDOHORÍ – IV. ZÓNA
- OCHRANNÁ PÁSMA VYPLYVAJÍCÍ Z VYJÁDŘENÍ PRÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ SÍŤI BUDOU RESPEKTOVÁNY DLE POŽADAVKŮ JEJICH VYJÁDŘENÍ, PŘÍSLUŠNÝCH VÝHLÁŠEK A NOREM. V MÍSTĚ REKONSTRUOVANÉHO CHODNÍKU SE DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ NACHÁZÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA. REKONSTRUKCI CHODNÍKU A OBNOVU LÁVKY ŽÁDNÁ NOVÁ OCHRANNÁ PÁSMA NEVZNIKAJÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTVOŘENY VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A PŘÍPOJKY V MÍSTĚ KRÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI. V TĚCHTO MÍSTĚCH BUDOU ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚNY RUČNĚ.
- PŘI KRÍŽENÍ JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ BUDOU DODRŽENY VODOROVNĚ A SVISLÉ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍŤI TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.

POZNÁMKY :

- ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÉ STŘEDOHORÍ – IV. ZÓNA
- OCHRANNÁ PÁSMA VYPLYVAJÍCÍ Z VYJÁDŘENÍ PRÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ SÍŤI BUDOU RESPEKTOVÁNY DLE POŽADAVKŮ JEJICH VYJÁDŘENÍ, PŘÍSLUŠNÝCH VÝHLÁŠEK A NOREM. V MÍSTĚ REKONSTRUOVANÉHO CHODNÍKU SE DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ NACHÁZÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA. REKONSTRUKCI CHODNÍKU A OBNOVU LÁVKY ŽÁDNÁ NOVÁ OCHRANNÁ PÁSMA NEVZNIKAJÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTVOŘENY VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A PŘÍPOJKY V MÍSTĚ KRÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI. V TĚCHTO MÍSTĚCH BUDOU ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚNY RUČNĚ.
- PŘI KRÍŽENÍ JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ BUDOU DODRŽENY VODOROVNĚ A SVISLÉ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍŤI TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.

|                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                             |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| POZNÁMKA:                                                                                                                                                   | ZOPROVĚDNÁ ODBĚH: |                                                                                                                                                             | POZNÁMKA: |  |
|                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                             |           |  |
| HORTTECH control s.r.o.<br>Kotvová 463/32<br>14300 Praha 4<br>IČ: 14300307<br>DIČ: CZ14300307<br>TEL: +420 226 008 008<br>E-MAIL: info@horttech.cz          |                   | ZOPROVĚDNÁ ODBĚH:                                                                                                                                           |           |  |
| STAVĚNÍ:                                                                                                                                                    |                   | STAVĚNÍ:                                                                                                                                                    |           |  |
| Obec Mašovice<br>Mašovice 16<br>40502 Mašovice                                                                                                              |                   | Obec Mašovice<br>Mašovice 16<br>40502 Mašovice                                                                                                              |           |  |
| PROJEKTOVÁ ODBĚH:                                                                                                                                           |                   | PROJEKTOVÁ ODBĚH:                                                                                                                                           |           |  |
| Ing. Diána Štármánová                                                                                                                                       |                   | Ing. Diána Štármánová                                                                                                                                       |           |  |
| KONTROLOVAL:                                                                                                                                                |                   | KONTROLOVAL:                                                                                                                                                |           |  |
| Jan Horák DiS. MBA                                                                                                                                          |                   | Jan Horák DiS. MBA                                                                                                                                          |           |  |
| NÁZEV STAVBY:                                                                                                                                               |                   | NÁZEV STAVBY:                                                                                                                                               |           |  |
| REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU<br>A OBNOVA LÁVKY PRO PĚŠÍ V OBCI MAŠOVICE<br>na p.p.č. 930/2, 932/1, 473/7 a 479/7 - katastrální území Mašovice [691348] |                   | REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU<br>A OBNOVA LÁVKY PRO PĚŠÍ V OBCI MAŠOVICE<br>na p.p.č. 930/2, 932/1, 473/7 a 479/7 - katastrální území Mašovice [691348] |           |  |
| FORMÁT:                                                                                                                                                     |                   | FORMÁT:                                                                                                                                                     |           |  |
| A3                                                                                                                                                          |                   | A3                                                                                                                                                          |           |  |
| DATUM:                                                                                                                                                      |                   | DATUM:                                                                                                                                                      |           |  |
| 04/2020                                                                                                                                                     |                   | 04/2020                                                                                                                                                     |           |  |
| STUPEŇ PR:                                                                                                                                                  |                   | STUPEŇ PR:                                                                                                                                                  |           |  |
| PD                                                                                                                                                          |                   | PD                                                                                                                                                          |           |  |
| MĚŘITEL:                                                                                                                                                    |                   | MĚŘITEL:                                                                                                                                                    |           |  |
| 1:500                                                                                                                                                       |                   | 1:500                                                                                                                                                       |           |  |
| C.3                                                                                                                                                         |                   | C.3                                                                                                                                                         |           |  |



**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL**  
STAVBY NEBO PROVEDENÝCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

**OBJEDNATEL:**

**ZHOTOVITEL:**

|                                                              |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obec Malšovice<br>Malšovice 6, 405 02, Děčín<br>IČ: 00261548 | Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.<br>Sídlo: Dobrná 48, PSČ: 407 41, okr. Děčín<br>Statutární zástupce: Milan Hrdý<br>IČO: 254 75 819<br>DIČ: CZ25475819 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Předmět plnění dle smlouvy o dílo:**

„Oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěší v Obci Malšovice“

**Termín převzetí staveniště (zahájení prací):**

K převzetí staveniště došlo na místě samém dne: .....2022

připomínky, námítky, stanoviska:.....

.....

za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek    podpis .....

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/: .....podpis .....

za technický dozor objednatel: Jan Horák, DiS. MBA    podpis .....

---

**Termín předání díla (předání dokončené stavby):**

dle smlouvy o dílo: .....2022

K předání díla došlo na místě samém dne: .....2022

připomínky, námítky, stanoviska: .....

.....

Práce byly provedeny v dobré kvalitě, bez viditelných závad a nedodělků a v rozsahu smlouvy o dílo.

**Při předání díla bylo Zhotovitelem Objednateli dále předáno:**

- 1) Prohlášení zhotovitele o kompletnosti a jakosti provedení díla.
- 2) Prohlášení o shodě na vybrané druhy materiálu.
- 3) Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů.
- 4) Fotodokumentace o průběhu stavby na CD.
- 5) Položkový rozpočet skutečně provedených prací a dodávek.

za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek    podpis .....

za Objednatele: místostarosta obce Malšovice pan .....    podpis .....

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/: .....podpis .....

za technický dozor objednatel: Jan Horák, DiS. MBA    podpis .....

Doba realizace díla se počítá ode dne následujícího po převzetí stavby. Protokol bude vyhotoven ve dvou provedeních z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
