

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku:

Úprava místní komunikace ve Chvalkovicích – nová MK

Číslo smlouvy: S18-033-0069

Článek I

Informace o smluvních stranách („Smluvní strany“)

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Chvalkovice
Sídlo:	Chvalkovice 61, 683 41 Bohdalice
Oprávněný zástupce:	Ladislav Horváth
Tel.:	517 358 645
E-mail:	ouchvalkovice@infos.cz
IČ:	00372293
Bankovní spojení:	ČNB a.s.
Číslo účtu:	94-7410731/0710

ZHOTOVITEL:

Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Tel.:	+420 545 220 006
E-mail:	office-brno@swietelsky.cz
IČ:	480 35 599
DIČ:	CZ480 35 599
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	212269343/0300
Oprávněný zástupce:	Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
ve věcech smluvních:	Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci
ve věcech technických:	Vít Sobotka, stavbyvedoucí, autorizovaná osoba Ing. Jan Lakomý, vedoucí stavby

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 1724 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

Smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“)

Základní ustanovení

- II.1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a vztahy z něj vyplývající, se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „ObčZ“), a je uzavírán v souladu s ust. § 1724 a násl. a ust. § 2586 a násl. ObčZ.
- II.2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení služeb a prací v rámci projektu Úpravy místních komunikací ve Chvalkovicích – nová MK v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
- II.3. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu prohlašují:
- (a) že údaje uvedené v Článku I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - (b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání, přičemž ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovil souhlas zadavatel dne 21.8.2017.
 - (c) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele "Úpravy místních komunikací ve Chvalkovicích – nová MK".
- II.4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, jakékoliv změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
- (a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany.
 - (b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - (c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
- II.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- II.6. Zhotovitel se zavazuje:
- (a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole,
 - (b) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla)

Článek II

Předmět smlouvy

- III.1. Předmětem díla je provedení stavební zakázky " Úpravy místních komunikací ve Chvalkovicích – nová MK " v rozsahu podle:
- (a) projektové dokumentace
 - (b) podmínek zadávacího řízení
 - (c) podmínek stanovených touto smlouvou o dílo
- III.2. Dokončením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, (např.: zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- III.3. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.

- III.4. Zhotovitel jako součást dodávky stavby zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením realizace stavby.
- (a) označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště informační tabuli s údaji:
o názvu stavby,
o názvu provádějící organizace, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; tabule musí být chráněna před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na ní uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby
 - (b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně BOZP dle platných předpisů,
- III.5. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace stavby:
- (a) zřízení zařízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,
 - (b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
 - (c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem, přilehlým k místu staveniště,
 - (d) zabezpečení přístupu a příjezdu ke stanovištím kontejnerů-nádob na komunální odpad;
 - (e) v případě jeho omezení projednání způsobu zajištění odvozu odpadu s Technickými službami,
 - (f) zajištění po celou dobu výstavby údržby a přemísťování přechodného dopravního značení a po dokončení stavby provedení zpětné demontáže a odvozu přechodného dopravního značení,
 - (g) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, po celou dobu výstavby,
 - (h) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, k měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace.
 - (i) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení,
 - (j) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - (k) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození, případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,
 - (l) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,
 - (m) průběžně koordinuje postup prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG, tak aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.
 - (n) Zhotovitel zodpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku ve správě objednatele a nájemců, způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousední nemovitosti je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.

- III.6. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti k přejímce stavby včetně doložení následujících dokladů objednateli k přejímacímu řízení:
- (a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
 - (b) zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - (c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - (d) předání dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 1 x v digitální podobě na CD nosiči.
 - (e) Součástí plnění je zakreslení změn do původní dokumentace
- III.7. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- III.8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 ObčZ.
- III.9. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele.
- III.10. Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu.
- III.11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 ObčZ.

Článek III

Vlastnictví k dílu

- IV.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- IV.2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
- IV.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku zahájení realizace do ukončení realizace nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek IV

Místo plnění

Místem plnění je k.ú. Chvalkovice.

Článek V

Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	21.8. 2017
Zahájení stavebních prací	22.8. 2017
Dokončení stavebních prací	31.10. 2017
Předání a převzetí stavby	6.11.2017
Počátek běhu záruční lhůty	6.11.2017
Vyklizení a vyčištění staveniště	6.11. 2017

Článek VI

Cena díla

VII.1. Cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.

Cena bez DPH	1 555 555,55
DPH ve výši 21%	326 666,67
Cena včetně DPH	1 882 222,22

VII.2. Cena, sjednaná v odstavci VII.1. této smlouvy, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.

VII.3. Cena podle odst. VII.1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby, předané objednatelem zhotoviteli a dále dle podmínek stanovených v Článku III. této smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě Zadávací dokumentace Část 3: Technické podmínky – projektová dokumentace, položkový rozpočet „slepý“

VII.4. Přílohu této smlouvy tvoří položkový rozpočet na stavbu včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr (Příloha č. 1 - položkový rozpočet stavby) (dále jen "položkový rozpočet").

VII.5. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří přílohu této smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. VII.1. této smlouvy a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

- VII.6. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ust. § 2614 ObčZ. snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace stavby. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.
- VII.7. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby. Zvýšení ceny lze provést přičtením nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně podle této smlouvy dodatkem k této smlouvě.
- Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno podle sborníků cen stavebních prací vydaných firmou URS Praha, a.s., Pražská 18, 102 00 Praha – Hostivař pro období, ve kterém mají být práce realizovány. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá dle mínění zhotovitele změna díla oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.
- VII.8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- VII.9. Objednatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy, bude řádně přiznána a odvedena příslušnému finančnímu úřadu.
- VII.10. Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., *Zákon o cenách*, a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty.

Článek VII

Platební podmínky

VIII.1. Zálohy objednatel neposkytuje.

Na předmět díla se sjednávají dílčí měsíční plnění v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení přejímacího řízení podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla.

VIII.2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

VIII.3. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 14 dnů od doručení faktury objednateli.

VIII.4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

VIII.5. Faktura včetně příloh bude zhotovitelem doručena objednateli ve dvou originálních vyhotoveních (stejnopisech).

VIII.6. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle § 29 odst. 1, písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Níže uvedené povinné údaje, stanovené právním předpisem, zhotovitel uvede takto:

- (a) označení plátce (objednatel):
Obec Chvalkovice
Chvalkovice 61, 683 41 Bohdalice
IČ: 00372293
- (b) název projektu, rozsah a předmět plnění:
- (c) odkaz na číslo uzavřené smlouvy (číslo objednatele)
- (d) bankovní spojení dle této smlouvy
- (e) označení zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis

VIII.7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené fakturě (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

VIII.8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.

Článek VIII

Součinnost objednatele

- IX.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti.
- IX.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

Článek IX

Kvalita prací a záruka za dílo

- X.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu díla, právním předpisům a závazným technickým normám.
- X.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě spolehlivosti ne horší než je uvedené v platných ČSN s tím, že se zavazuje ověřit spolehlivost a životnost navržených konstrukcí a materiálů.
- X.3. Zhotovitel je pojištěn na zodpovědnost za vadné plnění a škody.

Článek X

Staveniště

- XI.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací dle Článku VI. této smlouvy. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.
- XI.2. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.
- XI.3. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.
- XI.4. Zhotovitel se zavazuje uvést staveniště do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle Článku VI. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
- XI.5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- XI.6. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatel.
- XI.7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Při nedodržení tohoto závazku bude aplikováno ustanovení Článku XVI.3. této smlouvy.

Článek XI

Provádění díla

- XII.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
- XII.2. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby předá objednatel zhotoviteli před zahájením prací v počtu 1 paré.
- XII.3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- XII.4. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatel. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.
- XII.5. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo, a na kterou skládku byl odpad uložen.
- XII.6. Podle § 13 a § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných objednatelem orgánem finanční kontroly.
- XII.7. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.

Článek XII

Stavební deník

- XIII.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
- XIII.2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží.
- XIII.3. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou dohodou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací v souladu s Článkem XII.2. Dále tyto zápisy budou doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.
- XIII.4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. V případě přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zástupce objednatele je povinen připojit své stanovisko k důvodu přerušení práce na díle.
- XIII.5. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat:
- (a) základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - (b) identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - (c) přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - (d) seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - (e) seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - (f) zápis o předání a převzetí staveniště.
- XIII.6. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
- XIII.7. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- XIII.8. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
- XIII.9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- XIII.10. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
- XIII.11. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
- XIII.12. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Článek XIII

Předání a převzetí díla

- XIV.1. Objednatel je povinen převzít pouze dokončené dílo bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
- XIV.2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději v termínu předání a převzetí díla dle odst. VI. této smlouvy.
- XIV.3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
- (a) označení díla,
 - (b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - (c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - (d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - (e) prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
 - (f) datum a místo sepsání zápisu,
 - (g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - (h) seznam předané dokumentace,
 - (i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - (j) termín vyklizení staveniště,
 - (k) datum ukončení záruky na dílo.
- XIV.4. Součástí plnění je zakreslení změn do původní dokumentace
- XIV.5. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- XIV.6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Článek XIV

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

- XV.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění a dále standardům a podmínkám příslušné legislativy, zejména zákonu o SPP a jeho prováděcím předpisům.
- XV.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ.
- XV.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců.
- XV.4. Záruční doba začíná plynout v souladu s Článkem VI.
- XV.5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení (dále jen "oznámení o vadě"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této smlouvě.
- XV.6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 3 pracovních dnů od dodání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady bude mezi stranami sepsán zápis ohledně posouzení vady a termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“).

- XV.7. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne dodání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak.
- Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel má právo v zápise stanovit dřívější termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo má charakter havárie.
- XV.8. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla nebo termín odstranění dle Článku XI.7. této smlouvy, budou uplatněny příslušné sankční instrumenty dle Článku XII.2. této smlouvy.
- XV.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- XV.10. Zhotovitel poskytne objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

Článek XV

Smluvní pokuty

- XVI.1. Pro případ, že prodlení zhotovitele s předáním díla nebo prodlení zhotovitele s plněním díla, sjednává se ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- XVI.2. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
- XVI.3. V případě, že zhotovitel nedodrží provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- XVI.4. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na "vyklizení vyčištění staveniště" dle Článku VI. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- XVI.5. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti týkající se spolupůsobení při finanční kontrole a auditu, povinnosti archivace dokumentace v této smlouvě, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- XVI.6. Smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatel.
- XVI.7. Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele bude objednateli příslušným orgánem uložena sankce či jiná povinnost k zaplacení nebo krácení dotace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu v důsledku takového porušení podmínek vznikne.
- XVI.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- XVI.9. Pro případ prodlení s úhradou faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
- XVI.10. V případě podstatného porušení smlouvy stranou zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 20% z ceny díla.
- XVI.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl.
- XVI.12. Zánik závazku pozdním plněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- XVI.13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Sjednané smluvní pokuty nebrání uplatnění nároku na náhradu škody v celém jejím rozsahu.

XVI.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XVI.1. Při nedodržení smlouveného termínu úhrady platby zhotoviteli ve lhůtě splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z výše fakturované částky za každý započatý den prodlení.

XVI.2. V případě odstoupení od smlouvy stranou zhotovitele sjednává se v souladu s § 2001 a § 2005 odst. 2 ObčZ ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 20% z ceny díla. Ustanovení se neuplatní v případě, že zhotovitel od smlouvy odstoupí z důvodů zvlášť závažných porušení této smlouvy objednatelem.

XVI.3. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

Článek XVI

Zvláštní ujednání

XVII.1. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu v souladu s občanským zákoníkem, u zjevných vad včetně kompletnosti díla bezprostředně poté, co budou zjištěny.

XVII.2. Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí podle ObčZ jestliže je tato smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.

XVII.3. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody a bez předchozího upozornění či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, odejmout zhotoviteli práce a dodávky bez lhůty celkově nebo částečně, v případě, že:

- (a) práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě tak, že došlo k prodlení prací zhotovitele o více než 15 dnů
- (b) práce a činnosti zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům objednatele
- (c) dílo není realizováno v souladu s příslušnou legislativou, zejména zákonem o SPP a jeho prováděcími předpisy
- (d) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení
- (e) zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této smlouvy.

Článek XVII

Závěrečná ujednání

XVIII.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

XVIII.2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

XVIII.3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu protokolárně předaného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků.

XVIII.4. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

XVIII.5. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.

XVIII.6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

- XVIII.7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení.
- XVIII.8. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- XVIII.9. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu s ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
- XVIII.10. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 ObčZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- XVIII.11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- XVIII.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- XVIII.13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- XVIII.14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XVIII.15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
- XVIII.16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- (a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby
 - (b) Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů
 - (c) Příloha č. 3 - Časový harmonogram postupu prací

Chvalkovice dne24.8.2017.....


oprávněný zástupce zhotovitele

SWIETELSKÝ
stavební s.r.o.
edlepisný závod Dopravní stavby MOHAI A
CR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


oprávněný zástupce objednatele

OBEC
CHVALKOVICE
633 41 BOHDALICE
IČO 00372299

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tuto Smlouvu o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Chvalkovice na svém veřejném zasedání dne __21.8.2017__ usnesením č. 7 většinou hlasů všech členů zastupitelstva obce

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 20161009_2
 Úpravy místních komunikací ve Chvalkovicích - nová MK

Zadavatel :

IČO :
 DIČ :

Projektant :

IČO :
 DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		2,00	
01 Stavební část		1,00	1 500 248,99
VON Vedlejší a ostatní náklady		1,00	55 306,56
Celkem za stavbu			1 555 555,55

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	1 555 555,55
DPH 21 %	326 666,67
Celkem za stavbu s DPH	1 882 222,22

SWIETELSKÝ
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
 ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	133 852,80
2	Základy a zvláštní zakládání	56 234,00
4	Vodorovné konstrukce	2 000,00
5	Komunikace	919 493,70
8	Trubní vedení	66 500,00
91	Doplňující práce na komunikaci	145 298,00
99	Staveništní přesun hmot	147 483,65
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	29 386,84
VN	Vedlejší náklady	22 000,00
ON	Ostatní náklady	33 306,56
Cena celkem		1 555 555,55

Stavba :	20161009_2 Úpravy místních komunikací ve Chvalkovicích - nová MK	
Objekt :	01 Stavební část	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Stavební část

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	01	1 500 248,99
	Celkem objekt 01	1 500 248,99

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 500 248,99
DPH	21 %	315 052,29
Celkem za objekt s DPH		1 815 301,28

Rekapitulace soupisu 01 01

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	133 852,80
2	Základy a zvláštní zakládání	56 234,00
4	Vodorovné konstrukce	2 000,00
5	Komunikace	919 493,70
8	Trubní vedení	66 500,00
91	Doplňující práce na komunikaci	145 298,00
99	Staveništní přesun hmot	147 483,65
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	29 386,84
	Celkem soupis 01	1 500 248,99

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20161009_2	Úpravy místních komunikací ve Chvalkovicích - nová MK
O:	01	Stavební část
R:	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	Cen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				133 852,80		
1	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů							
	113107222R00	...v ploše jednotlivé přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm A : 561	m2	561,00000 561,00000	30,00	16 830,00	822-1	RTS
	121 10-11 Sejmutí omíčky							
		nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						
2	121101103R00	...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	89,60000	40,00	3 584,00	800-1	RTS
	122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice							
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-223 v hornině 3							
3	122202203R00	...přes 1 000 do 10 000 m3 1153,04*0,1	m3	115,30400 115,30400	100,00	11 530,40	800-1	RTS
	131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů							
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
4	131201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně vpustí : 4*1,0*1,0	m3	4,00000 4,00000	500,00	2 000,00	800-1	RTS
	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm							
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
5	132201211R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně přípojky vpustí : 4*5,0*1,0*2,0	m3	40,00000 40,00000	400,00	16 000,00	800-1	RTS
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
6	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	77,70000	90,00	6 993,00	800-1	RTS
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m							
	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	194,25000	4,00	777,00	800-1	RTS
	171 10-2 Uložení sypaniny do ztuhlých násypů dálnic a let							
		s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu,						

[illegible]

Díl:	2	Zaklady a zvláštní zakládání					56 234,00	
	211 97-1	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie v rýze nebo v zářezu se stěnami						
21	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 187*1,2	m2	224,40000	224,40000	20,00	4 488,00	800-2
22	2-PC01	Napojení drenáže do uliční vpusti	kpl	1,00000		3 500,00	3 500,00	Vlastní
	212 81	Trativody z flexibilních trubek						
	Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem přivraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.							
23	212810010RAC	...lože a obsyp štěrkopiskem, d 100 mm větev A : 187	m	187,00000		240,00	44 880,00	AP-HSV
24	67390503R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm	m2	224,40000		15,00	3 366,00	SPCM
Díl:	4	Vodorovné konstrukce					2 000,00	
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
25	451573111R00	...z písku a štěrkopisku do 65 mm 20,0*1,0*0,1	m3	2,00000	2,00000	1 000,00	2 000,00	827-1
Díl:	5	Komunikace					919 493,70	
26	564861111R00	564 8 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 200 mm 1098,2*1,05	m2	1 153,11000	1 153,11000	130,00	149 904,30	822-1
27	565151211RT3	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním ...v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm A : 1098,2 park. stání : -2*18,52	m2	1 061,16000	1 098,20000	218,00	231 332,88	822-1
28	573211111R00	573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1 061,16000		9,00	9 550,44	822-1
29	577142112R00	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy při s 1000 m2	m2	1 061,16000		200,00	212 232,00	822-1
	596 21-5	Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
30	596215021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	197,30000		55,00	10 851,50	822-1
31	596215040R00	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm 95,47+3,53	m2	99,00000		60,00	5 940,00	822-1
32	567132113R0x	Podklad ze šterku zpevněného cement. maltou ŠCM 1 tl.18 cm A : 1098,2	m2	1 098,20000		245,00	269 059,00	Vlastní

33	57311111R0x	Postřik živičný infiltr. + posyp, asfalt. 0,70 kg/m ²	m ²	1 061,16000	9,00	9 550,44	Vlastní
34	59245304Rx	Dlažba zámková 20/10/6 přírodní	m ²	197,30000	70,00	13 811,00	Vlastní
35	59248040Rx	Dlažba zámková 20/10/8 přírodní vjezdy : 69,85 park. stání : 12,81*2	m ²	95,47000	72,00	6 873,84	Vlastní
36	59248059R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch reliéfní; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m ²	25,62000	110,00	388,30	RTS
Díl:	8	Trubní vedení		3,53		66 500,00	
		871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ...DN 200 mm	m	20,00000	100,00	2 000,00	RTS
37	871353121R00	721 17-1 Potrubí z plastových trub ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150	m	20,00000	300,00	6 000,00	RTS
38	721176224R00	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 4*5		20,00000			
39	899331111R0x	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení/snížení poklopu	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	Vlastní
40	8-PC01	Napojení přípojky uliční vpusti DN 150 na kanalizaci, navrtání, manžeta Forshada	kus	4,00000	3 500,00	14 000,00	Vlastní
41	894411020RAF	894 41 Šachty z betonových dílců kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. 894 41-1 vpust' uliční z dílců DN 450	kus	4,00000	10 000,00	40 000,00	RTS
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				145 298,00	
		914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek					
42	914001121R00	...sloupek, do betonového základu a AL patky	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS
43	914001125R00	...značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt	kus	2,00000	500,00	1 000,00	RTS
44	917862111R00	917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	556,50000	110,00	61 215,00	RTS
45	PC101	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	kus	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
46	40444940 ARx	Značka dopravní IZ 5a	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
47	40444940.ARx1	Značka dopravní IZ 5b	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
48	404459534R	příslušenství k dopr. značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	4,00000	50,00	200,00	RTS
49	592171600R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 150,0 mm; barva přírodní	kus	157,00000	194,00	30 458,00	RTS
		nová kom. : 157		157,00000			

50	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva šedá chodník : 163	kus	191,50000	30,00	5 745,00	SPCM	RTS
51	59217472R	park. stání : 8,5*1+5,0*4 obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá nová kom. : 204	kus	163,00000 28,50000 204,00000 204,00000	200,00	40 800,00	SPCM	RTS
52	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá nová kom. : 2	kus	2,00000	345,00	690,00	SPCM	RTS
53	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá nová kom. : 2	kus	2,00000	345,00	690,00	SPCM	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				147 483,65		
	998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný							
54	998225111R00	vodorovně do 200 m ...jakékoliv délky objektu	t	1 474,83654	100,00	147 483,65	822-1	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				29 386,84		
55	979082219R00	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	830,13000	5,00	4 150,65	822-1	RTS
56	979083116R00	979 08-31 Vodorovné přemístění suti včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku do 5000 m	t	332,05500	75,00	24 904,13	800-6	RTS
57	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební suti	t	332,05500	1,00	332,06	801-3	RTS

Stavba :	20161009_2 Úpravy místních komunikací ve Chvalkovicích - nová MK	
Objekt :	VON Vedlejší a ostatní náklady	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **VON**
Vedlejší a ostatní náklady

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
VON	VON	55 306,56
	Celkem objekt VON	55 306,56

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	55 306,56
DPH	21 %	11 614,38
Celkem za objekt s DPH		66 920,94

Rekapitulace soupisu VON VON

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	22 000,00
ON	Ostatní náklady	33 306,56
	Celkem soupis VON	55 306,56

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20161009_2	Úpravy místních komunikací ve Chvalkovcích - nová MK
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
Díl:	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
	VN	Vedlejší náklady				22 000,00		
1	VN01	Vytýčení stavby	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
2	VN02	Vytýčení podzemních vedení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
3	VN03	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
4	VN04	Přechodné dopravní značení, ZUK	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				33 306,56		
5	ON01	Realizační dokumentace zhotovitele	kpl	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
6	ON02	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
7	ON03	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
8	ON04	Geometrický plán	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
9	ON05	Zkoušky únosnosti pláně a podkladních vrstev	kpl	1,00000	8 206,56	8 206,56		Vlastní

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ
Úpravy místních komunikací ve Chvalkovicích – nová MK		

Identifikace poddodavatele č. 1 :		
Název:		
Sídlo:		
Tel./fax:		
E-mail:		
IČ:		
DIČ:		
Spisová zn. v obch. rejstříku:		
Osoba oprávněná k jednání:		

Identifikace poddodavatele č. 2 :		
Název:		
Sídlo:		
Tel./fax:		
E-mail:		
IČ:		
DIČ:		
Spisová zn. v obch. rejstříku:		
Osoba oprávněná k jednání:		

Identifikace poddodavatele č. 3 :		
Název:		
Sídlo:		
Tel./fax:		
E-mail:		
IČ:		
DIČ:		
Spisová zn. v obch. rejstříku:		
Osoba oprávněná k jednání:		

Celkový objem subdodávek dle nabídky	%
--------------------------------------	---

Datum:

Podpis oprávněné osoby zhotovitele
Firemní razítko

SWIETELSKÝ
stavby s.r.o.
sídlo: závod Dopravní stavby MORAVA
602 00 Brno, Jahodová 60
tel. 460 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Příloha č. 3- Časový harmonogram postupu prací

ČASOVÝ HARMONOGRAM

„Úprava místní komunikace ve Chvalkovicích - nová MK“

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště :

21.8.2017

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací :

22.8.2017

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací :

31.10.2017

Předpokládaný termín předání a převzetí stavby (vč.vykliz.staveniště):

6.11.2017

Zadavatel:

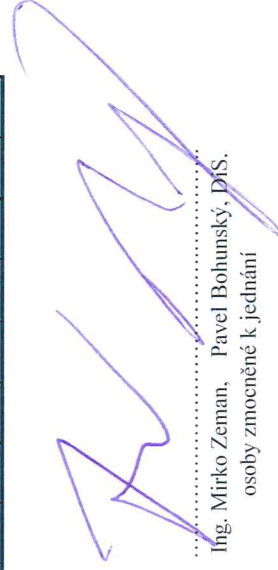
Obec Chvalkovice

Rok	2017											
Měsíc	VIII		IX			X			XI			
Týden	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Úprava místní komunikace ve Chvalkovicích - nová MK												
Objekt 01 - Stavební část												
Zemní práce												
Základy												
Vodorovné konstrukce												
Komunikace												
Trubní vedení												
Doplňující práce												
Objekt VON												

V Brně dne 8.8.2017

SWIEFELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
GR - 620 00 Brno, Jáhodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


Ing. Mirko Zeman, Pavel Bohunský, DiS.
osoby zmocněné k jednání

PLNÁ MOC

Společnost:

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

zastoupená: panem Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
nar. 24.11.1970, bytem Polní 7, 691 72 Klobouky u Brna
(zmocnitel)

uděluje tímto

panu **Ing. Mirko Zemanovi**, nar. 9.5.1971, bytem Na Příhoně 209, 678 01 Blansko, Klepačov

a panu **Pavlovi Bohunskému, DiS.**, nar. 23.8.1977, bytem Čejč 69, 696 14 Čejč

(zmocněncům)

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2018

V Brně dne 15.3.2017

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

Bc. Vladimír Lesovský
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

Ing. Mirko Zeman

Pavel Bohunský, DiS.

