

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích	Objednatel:	Město Mnichovice	IČ/DIČ:	00240478/
Druh stavby:	bezbariérové chodníky	Projektant:	Ing. Tomáš Rak	IČ/DIČ:	74156179/
Lokalita:	Město Mnichovice	Zhotovitel:	AVE Kolín s.r.o.	IČ/DIČ:	251 48 117/CZ 251 48 117
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	205
JKSO:	8287	Zpracoval:	Ing. Theodor Collino	Datum:	13.2.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 2 210 711,08	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		
	Montáž 2 759 969,09	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 46 472,56	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		
	Montáž 42 192,44	Vliv umístění stavby	Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 34 447,82		Ostatní 0,00		
	Montáž 75 352,18		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	591 524,44				
ZRN celkem	5 760 669,61	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	5 760 669,61
Základ 21%	5 760 669,61	DPH 21%	1 209 740,62	Celkem včetně DPH	6 970 410,23

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni.

V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů.

V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci.

Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

použitá soustava RTS, online na www.rts.cz

Handwritten signature

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích			Objednatel:	Město Mnichovice		
Druh stavby:	bezbarierové chodníky			Projektant:	Ing. Tomáš Rak		
Lokalita:	Město Mnichovice			Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení		
Zpracoval:	Ing. Theodor Collino			Zpracováno dne:	13.2.2017		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
SO101		Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích	2 190 348,24	2 734 849,50	4 925 197,74	3 284,12	
SO101	111	Odstanění křovin	170,23	4 529,77	4 700,00	0,01	
SO101	113	Odstanění vozovek a jiných zpevněných ploch a pc	0,00	298 799,27	298 799,27	785,60	
SO101	131	Hloubení JÁMY a JAMKY	0,00	9 631,44	9 631,44	0,00	
SO101	121	Odkopávky a prokopávky - ORNICE	5 399,24	66 959,30	72 358,54	0,03	
SO101	122	Odkopávky, prokopávky - ODKOPÁVKY	0,00	37 805,62	37 805,62	0,00	
SO101	132	Hloubení RÝHY	0,00	40 682,20	40 682,20	0,00	
SO101	162	Přemístění výkopku - ODVOZ A ULOŽENÍ NA SKL	0,00	151 796,70	151 796,70	0,00	
SO101	17	Konstrukce ze zemin	22 067,71	9 769,56	31 837,27	344,81	
SO101	181	SANACE a ÚPRAVY PLÁNĚ	97 049,93	28 321,66	125 371,59	385,43	
SO101	182	Úpravy svahů (svahování) a příkopových ploch	0,00	16 933,20	16 933,20	26,27	
SO101	184	STROMY	6 173,34	20 456,66	26 630,00	1,28	
SO101	279	Ostatní	0,00	143 198,00	143 198,00	103,96	
SO101	31	Zdi podpěrné a volné	15 303,98	9 105,84	24 409,82	5,25	
SO101	311	Zdi nosné	0,00	76 762,50	76 762,50	57,79	
SO101	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	872 036,08	101 583,07	973 619,15	295,47	
SO101	339	PALISÁDY	7 962,01	7 127,63	15 089,64	0,18	
SO101	348	Zábradlí (kromě schodišťových)	69 751,50	386 423,50	456 175,00	8,25	
SO101	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	3 040,16	703,84	3 744,00	7,77	
SO101	57	Kryty šterkových a živichých pozemních komunikac	269 465,61	158 124,51	427 590,12	186,33	
SO101	592	Dlažby zpevněných ploch - CHODNÍK	304 245,95	196 240,25	500 486,20	619,58	
SO101	711	Izolace proti vodě	46 472,56	22 029,71	68 502,27	0,85	
SO101	762	Konstrukce tesařské	0,00	12 640,80	12 640,80	4,60	
SO101	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	12 765,00	12 765,00	0,00	
SO101	87	Potrubi z trub - KANALIZACE	5 202,89	405,11	5 608,00	0,09	
SO101	895	Trubní vedení - VPUSTI	121 731,85	34 221,15	155 953,00	19,17	
SO101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	29 316,67	4 410,83	33 727,50	14,68	
SO101	914_SDZ	Dopravní značení - SVISLÉ	8 913,28	3 840,72	12 754,00	0,87	
SO101	915_VDZ	Dopravní značení - VODOROVNÉ	5 323,41	4 908,09	10 231,50	0,04	
SO101	916	OBRUBNÍKY a KRAJNÍKY	136 180,87	240 006,33	376 187,20	409,42	
SO101	919	Ostatní - ŘEZÁNÍ ASF. KRYTU	104 843,14	92 347,36	197 190,50	6,22	

SO101	979	Odvoz sutí	0,00	311 526,09	311 526,09	0,00
SO101	998	Přesun hmot	0,00	100 691,62	100 691,62	0,00
SO101	999VD	Ostatní položky	25 250,00	54 750,00	80 000,00	0,00
SO101	M999VD	Přesuny sloupů	34 447,82	75 352,18	109 800,00	0,16
SO102		Autobusový záliv	101 283,21	28 149,94	129 433,15	30,12
SO102	57	Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací	32 941,49	19 498,51	52 440,00	15,87
SO102	592	Dlažby zpevněných ploch - CHODNÍK	2 161,72	1 055,77	3 217,49	1,73
SO102	916	OBRUBNÍKY a KRAJNÍKY	66 180,00	6 150,00	72 330,00	12,52
SO102	998	Přesun hmot	0,00	1 445,66	1 445,66	0,00
SO103		Veřejné osvětlení	0,00	706 038,72	706 038,72	0,00
SO103	VO 001	Dodávky zařízení	0,00	240 580,00	240 580,00	0,00
SO103	VO 002	Materiál elektromontážní	0,00	138 906,40	138 906,40	0,00
SO103	VO 003	Materiál zemní+stavební	0,00	80 955,92	80 955,92	0,00
SO103	VO 004	Elektromontáže	0,00	73 474,00	73 474,00	0,00
SO103	VO 005	Zemní práce	0,00	164 390,40	164 390,40	0,00
SO103	VO 006	Ostatní náklady	0,00	3 032,00	3 032,00	0,00
SO103	VO 007	Revize	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00

Celkem:

5 760 669,61

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:				Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích				Doba výstavby:				Objednatel: Město Mnichovice			
Druh stavby:				bezbariérové chodníky				Začátek výstavby:				Projektant: Ing. Tomáš Rak			
Lokalita:				Město Mnichovice				Konec výstavby:				Zhotovitel: Na základě výběrového řízení			
JKSO:				8287				Zpracováno dne: 13.2.2017				Zpracoval: Ing. Theodor Collino			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Cenová soustava				
SO101 Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích				2 190 348,24 2 734 849,50 4 529,77 4 925 197,74 3 284,12							0,01				
SO101 111 Odstranění křovin											4 700,00				
1	SO101	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	100,000	39,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00 RTS II / 2015				
2	SO101	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	100,000	8,00	170,23	629,77	800,00	0,00	0,01 RTS II / 2015				
SO101 113 Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů											785,60				
3	SO101	965200012ASF	Bourání mazanin betonových a asfaltových ŽIVICE	m3	22,449	483,00	0,00	10 842,87	10 842,87	2,20	49,39 RTS II / 2015				
4	SO101	113151116TC	Fréz živců krytů, pruh do 75 cm,tl.7cm	m2	469,670	54,40	0,00	25 550,05	25 550,05	0,15	72,33 RTS II / 2015				
5	SO101	113151113TC	Fréz živců krytů, pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	939,350	27,80	0,00	26 113,93	26 113,93	0,09	82,66 RTS II / 2015				
6	SO101	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	49,388	304,60	0,00	15 043,58	15 043,58	0,00	0,00 RTS II / 2015				
7	SO101	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	204,420	188,90	0,00	38 614,94	38 614,94	0,00	0,00 RTS II / 2015				
8	SO101	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	639,290	31,70	0,00	20 265,49	20 265,49	0,55	351,61 RTS II / 2015				
9	SO101	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	149,660	40,00	0,00	5 986,40	5 986,40	0,66	98,78 RTS II / 2015				
10	SO101	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	450,385	80,00	0,00	36 030,80	36 030,80	0,00	0,00 RTS II / 2015				
11	SO101	113106121R00	Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	379,030	28,60	0,00	10 840,26	10 840,26	0,14	52,31 RTS II / 2015				
12	SO101	113202111R00	Výhrání obrub z krajníku nebo obrubníků stojatých	m	364,000	40,70	0,00	14 814,80	14 814,80	0,15	52,78 RTS II / 2015				
13	SO101	113204111R00	Výhrání obrub záhonových	m	364,000	24,10	0,00	8 772,40	8 772,40	0,04	14,56 RTS II / 2015				
14	SO101	965200012BET	Bourání mazanin betonových a asfaltových BETON	m3	5,085	589,00	0,00	2 995,07	2 995,07	2,20	11,19 RTS II / 2015				
15	SO101	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	130,836	301,00	0,00	39 381,64	39 381,64	0,00	0,00 RTS II / 2015				
16	SO101	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	589,270	73,90	0,00	43 547,05	43 547,05	0,00	0,00 RTS II / 2015				
SO101 131 Hloubení JAMKY a JAMKY											0,00				
17	SO101	131201201R00	Hloubení zapuštěných jam v hor.3 do 100 m3	m3	17,150	526,00	0,00	9 020,90	9 020,90	0,00	0,00 RTS II / 2015				
18	SO101	131201209R00	Příplatek za lepihost - Hloubení zápaží jam v hor.3	m3	17,150	35,60	0,00	610,54	610,54	0,00	0,00 RTS II / 2015				
SO101 121 Odkopávky a prokopávky - ORNICE				5 399,24 66 959,30 72 358,54							0,03				
19	SO101	121100001RAA	Sejmuti ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km	m3	297,003	70,40	0,00	20 909,01	20 909,01	0,00	0,00 RTS II / 2015				
20	SO101	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	297,003	27,80	0,00	8 256,68	8 256,68	0,00	0,00 RTS II / 2015				
21	SO101	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	816,500	34,70	0,00	28 332,55	28 332,55	0,00	0,01 RTS II / 2015				
22	SO101	180400010RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m2	816,500	18,20	5 399,24	9 461,06	14 860,30	0,00	0,02 RTS II / 2015				
SO101 122 Odkopávky, prokopávky - ODKOPÁVKY				0,00 37 805,62 37 805,62							0,00				
23	SO101	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	388,547	72,10	0,00	28 014,24	28 014,24	0,00	0,00 RTS II / 2015				
24	SO101	122202209R00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	388,547	25,20	0,00	9 791,38	9 791,38	0,00	0,00				
SO101 132 Hloubení RYHY											0,00				
25	SO101	132201110R00	Hloubení ryh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	61,340	373,00	0,00	22 879,82	22 879,82	0,00	0,00 RTS II / 2015				
26	SO101	132201119R00	Příplatek za lepihost - hloubení ryh 60 cm v hor.3	m3	61,340	157,00	0,00	9 630,38	9 630,38	0,00	0,00 RTS II / 2015				
27	SO101	1309000040RAD	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	4,000	2 043,00	0,00	8 172,00	8 172,00	0,00	0,00 RTS II / 2015				
SO101 162 Přemístění výkopku - ODVOZ A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU											0,00				
28	SO101	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m3	443,850	240,00	0,00	151 796,70	151 796,70	0,00	0,00 RTS II / 2015				
29	SO101	162100010RAC	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 km	m3	443,850	17,00	0,00	7 545,45	7 545,45	0,00	0,00 RTS II / 2015				
30	SO101	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	443,850	85,00	0,00	37 727,25	37 727,25	0,00	0,00 RTS II / 2015				
SO101 17 Konstrukce ze zemín				22 067,71 9 769,56 31 837,27							344,81				
31	SO101	171102102R00	Uložení sypaniny do násypů se zhutněním	m3	191,560	51,00	0,00	9 769,56	9 769,56	0,00	0,00 RTS II / 2015				
dodávka vhodné zeminy v samostatnou položkou															
32	SO101	50058331201	Stěr s příměsí jemné zeminy G3 G-F (zásep vhodnou zemínou)	t	344,808	64,00	22 067,71	0,00	22 067,71	1,00	344,81				
SO101 181 SANACE a ÚPRAVY PLANE				97 049,93 28 321,66 125 371,59							385,43				

33	SO101	564851111R00	Podklad ze šterkordit po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 165,270	97,00	97 049,93	15 981,26	113 031,19	0,33	385,41	RTS II / 2015
34	SO101	181201111R00	Uprava pláňe na násypch se zhutněním - ručně úprava pláňe	m2	1 542,550	8,00	0,00	12 340,40	12 340,40	0,00	0,02	RTS II / 2015
Úpravy svahů (svahování) a příkopových ploch												
35	SO101	182103232R00	Zpevnění svahu plítky výšky do 250 mm ve svahu přes 1:1 s výplní lomovým kamenem	m2	30,900	548,00	0,00	16 933,20	16 933,20	0,85	26,27	RTS II / 2015
36	SO101	182103232R00	STROMY	m2	6 173,34	20 456,66	26 630,00	26 630,00	26 630,00	1,28	0,02	RTS II / 2015
37	SO101	112100001TC	Kácení stromů včetně odstranění pařezů a odvozu a uložení na skládku	kus	5,000	412,00	31,39	2 028,61	2 060,00	0,00	0,02	RTS II / 2015
38	SO101	184807111R00	v ceně je zahrnutý i poplatek za odstranění pařezů a odvozu a uložení na skládku (ekologickou likvidaci)	m2	135,000	164,00	6 141,95	15 998,05	22 140,00	0,01	1,27	RTS II / 2015
39	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
40	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
41	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
42	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
43	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
44	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
45	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
46	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
47	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
48	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
49	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
50	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
51	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
52	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
53	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
54	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
55	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
56	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
57	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
58	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
59	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
60	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
61	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
62	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
63	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
64	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
65	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
66	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
67	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
68	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
69	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
70	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
71	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
72	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
73	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	135,000	18,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2015

zpěná montáž demontovaného oplocení									
SO101 87	Potrubi z trub - KANALIZACE								
74 SO101 871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	17,000	24,00	5 202,89	405,11	5 608,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
75 SO101 28611265 A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	3,716	1 399,35	5,200	0,00	5,200,00	0,03	0,00	RTS II / 2015
SO101 895	Trubní vedení - VPUSTI			121 731,85	34 221,15	155 953,00	19,17		
76 SO101 966800001	Výběrání stávajících uličních vjezdů včetně mříže a kalového koše, včetně naložení odvozu a uložení na skládku (ekologická likvidace)	13,000	1 520,00	0,00	19 760,00	19 760,00	0,28	3,64	
77 SO101 174100010RAE	Zásep jam, výh a šachet sypaninou	8,500	290,00	0,00	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
78 SO101 583319002	Kamenivo tříděné frakce 32/63	8,500	360,00	0,00	0,00	3 060,00	1,00	8,50	RTS II / 2015
79 SO101 89594111R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální	13,000	780,00	932,25	9 207,75	10 140,00	0,34	4,43	RTS II / 2015
80 SO101 59223864	TBV-Q 350/60/10a vyrovnávací prstenec	13,000	230,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,03	0,35	RTS II / 2015
81 SO101 5922386322	TBV-Q 450/450/3d kruhová středová s otvorem DN 200	4,000	500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,10	0,41	RTS II / 2015
82 SO101 592238510	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	4,000	730,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,07	0,29	RTS II / 2015
83 SO101 592 TBV-Q	VPUSTĚ ULIČNÍ BETON SKRUŽ STŘEDOVA TBV-Q 450/570/6d	13,000	1 890,00	58 590,00	0,00	58 590,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
84 SO101 89920111R00	Osažení mříží litinových s rámem do 50 kg	31,000	220,00	71,60	2 788,40	2 860,00	0,00	0,06	RTS II / 2015
85 SO101 55343927	C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	13,000	455,00	5 915,00	0,00	5 915,00	0,01	0,08	RTS II / 2015
86 SO101 55340394	Rám s mříží, zařízení 40 t	13,000	3 481,00	45 253,00	0,00	45 253,00	0,11	1,40	RTS II / 2015
SO101 91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			29 316,67	4 410,83	33 727,50	14,68		
87 SO101 91951121R00	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 600	2,000	1 699,00	2 270,00	1 128,00	3 398,00	1,32	2,64	RTS II / 2015
88 SO101 919 C30/37 XF4	Celo propustku z beton. C30/37 XF4	4,000	3 268,00	10 878,85	2 193,15	13 072,00	2,56	10,24	RTS II / 2015
89 SO101 91549121R00	Osažení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	13,000	200,00	1 510,32	1 089,68	2 600,00	0,08	1,07	RTS II / 2015
90 SO101 59245041	Dlažba zámková SLP s vodící liší bílá 20/20/6	5,330	2 750,00	14 657,50	0,00	14 657,50	0,14	0,73	RTS II / 2015
SO101 914 SDZ	Dopravní značení - SVISLE			8 913,28	3 840,72	12 754,00	0,87		
91 SO101 91400112R00	Osaz sloupku dopr. značky vč. bet. základu+Al patka	4,000	720,00	2 008,63	871,37	2 880,00	0,11	0,45	RTS II / 2015
92 SO101 404459509	Sloupek Fe pr. 70 pozinkovaný, l= 3500 mm	4,000	597,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
93 SO101 404459545	Víčko pr. 70	4,000	15,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
94 SO101 914993_DMTŽ	Demontáž STAVAJÍCÍ značky včetně UPEVNĚNOVADEL, uchování značky k dalšímu použití	6,000	320,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,07	0,40	RTS II / 2015
95 SO101 91400112R00	Osazení svíslé dopr. značky na sloup veřej. osvět.	4,000	292,00	565,95	602,05	1 168,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
96 SO101 SDZ - IJ4b	Značka dopravní info IJ4b, 500 - zastávka	2,000	492,00	984,00	0,00	984,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
97 SO101 91400112R00	Osazení svíslé dopr. značky na sloupek nebo konzolu	6,000	231,00	938,70	447,30	1 386,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
98 SO101 SDZ - IJ 4b	Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá	2,000	984,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
SO101 915 VZDZ	Dopravní značení - VODOROVNE			5 323,41	4 908,09	10 231,50	0,04		
99 SO101 91579112R00	Předznačení pro značení stopčár, zebra, nápisů	10,000	45,00	3,16	446,84	450,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
100 SO101 91572111R00	Vodorovné značení sřík barvou stopčár, zebra aid.	10,000	185,00	756,53	1 093,47	1 850,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
101 SO101 91579111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčár, zebra aid.	10,000	10,00	80,07	19,93	100,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
102 SO101 91579111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry vodič proužky	189,000	5,00	126,00	819,00	945,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
103 SO101 91571111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm sřík barvou	158,000	22,60	2 440,62	1 130,18	3 570,80	0,00	0,01	RTS II / 2015
104 SO101 91571211R00	Vodorovné značení proužků š. 25 cm sřík barvou	20,000	54,50	750,89	339,11	1 090,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
105 SO101 91571221R00	Vodorovné značení sříkanou barvou pruhů š. 50 cm	11,000	107,70	813,95	370,75	1 184,70	0,00	0,00	RTS II / 2015
106 SO101 91571911R00	Příplatek za reflex. úpravu vodičích čar 12 cm	158,000	6,00	318,57	629,43	948,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
107 SO101 91571921R00	Příplatek za reflex. úpravu vodičích proužků 25 cm	20,000	3,00	20,35	39,65	60,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
108 SO101 91571921R00	Příplatek za reflex. úpravu vodičích proužků 50 cm	11,000	3,00	13,27	19,73	33,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
SO101 916	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY			136 180,87	240 006,33	376 187,20	409,42		
109 SO101 56485111R00	Podklad ze šterkorditu po zhuštění tloušťky 15 cm	372,580	124,80	39 923,73	6 574,26	46 497,98	0,33	123,23	RTS II / 2015
podtyp pod obrubník									
110 SO101 91613121XF3	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu C20/25 XF3	862,850	168,00	0,00	144 958,80	144 958,80	0,15	129,43	
111 SO101 59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	814,969	64,00	52 158,02	0,00	52 158,02	0,08	65,20	RTS II / 2015
112 SO101 59217480	Obrubník silniční přechodový LP 1000/150/150-250	53,530	213,00	11 401,89	0,00	11 401,89	0,07	3,59	RTS II / 2015
113 SO101 59217468	Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	230,886	64,00	14 776,70	0,00	14 776,70	0,05	11,15	
114 SO101 91633112XF1	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu C12/16 XF1	627,470	141,00	0,00	88 473,27	88 473,27	0,10	62,75	
115 SO101 592173328	Obrubník zahradní ABO 9-20 1000/50/200 mm šedý	640,019	28,00	17 920,53	0,00	17 920,53	0,02	14,08	RTS II / 2015
SO101 919	Ostatní - REZANÍ ASF. KRYTU			104 843,14	92 347,36	197 190,50	6,22		
116 SO101 91973511R00	Rezáni stávajícího živého krytu tl. do 5 cm	1 714,700	25,00	23 500,01	19 367,49	42 867,50	0,00	0,02	RTS II / 2015
117 SO101 91973511R00	Rezáni stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	1 714,700	39,00	42 658,18	24 215,12	66 873,30	0,00	0,02	RTS II / 2015
118 SO101 91912233R00	Rezáni spár pro vytvoření komůrek š. 20 mm tl. 40 mm pro těsnící závluku v živém krytu	1 714,700	23,00	0,00	39 438,10	39 438,10	0,00	0,02	
119 SO101 59914111R00	Výplnění spár mezi panely živčnou závluku	1 714,700	28,00	38 684,94	9 326,66	48 011,60	0,00	6,17	RTS II / 2015
SO101 979	Odvoz sutí			0,00	311 528,09	311 526,09	0,00		
120 SO101 97908111R00	Odvoz sutí a výbor. hmot na skládku do 1 km	785,690	149,50	0,00	117 460,66	117 460,66	0,00	0,00	RTS II / 2015
121 SO101 97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	14 928,110	13,00	0,00	194 065,43	194 065,43	0,00	0,00	RTS II / 2015
SO101 998	Přesun hmot			0,00	100 691,62	100 691,62	0,00		
122 SO101 99822301R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	2 097,742	48,00	0,00	100 691,62	100 691,62	0,00	0,00	RTS II / 2015
SO101 999VD	Ostatní položky			25 250,00	54 750,00	80 000,00	0,00		
123 SO101 999_sitě	Vytváření stavby a sítě včetně zaměření skutečného stavu	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	

[illegible]

Poznámka: V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOOCENÝ dle technických parametrů.

V případě nahrazení materiálu / výrobku materiálem / výrobkem ROVNOOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci.

Při splnění technických vlastností a parametru ROVNOOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnuti rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

151	SO103	000579291	elkyzbroj stožárů kryt řady 721-724 IP20	ks	28 000	215,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	Firemni
152	SO103	000101209	kabel CYKY 4x10	m	934 000	85,00	0,00	79 390,00	0,00	0,00	Firemni
153	SO103	000192309	koncovka 1KV plast KSCZ4X16-25(4x10)	ks	29 000	132,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	Firemni
154	SO103	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	168 000	18,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	Firemni
155	SO103	000321505	roura korugovaná KF09110 pr. 110/94mm	m	25 000	31,00	0,00	775,00	0,00	0,00	Firemni
156	SO103	000321502	roura korugovaná KF09063 pr. 63/52mm	m	28 000	18,80	0,00	526,40	0,00	0,00	Firemni
157	SO103	000321500	trubka Novodur 250mm	m	28 000	678,00	0,00	18 984,00	0,00	0,00	Firemni
158	SO103	000295011	vedení FeZn pr. 10mm(0.63kg/m)	m	389 000	19,00	0,00	7 391,00	0,00	0,00	Firemni
159	SO103	000593281	výrobka sodík Master SON-T PIA plus E 70W 251045	ks	24 000	123,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	Firemni

Poznámka: V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOOCENÝ dle technických parametrů.

V případě nahrazení materiálu / výrobku materiálem / výrobkem ROVNOOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci.

Při splnění technických vlastností a parametru ROVNOOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnuti rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

160	SO103	000593283	Výrobka CDM-T 150W	ks	4 000	399,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	Firemni
-----	-------	-----------	--------------------	----	-------	--------	------	----------	------	------	---------

Poznámka: V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOOCENÝ dle technických parametrů.

V případě nahrazení materiálu / výrobku materiálem / výrobkem ROVNOOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci.

Při splnění technických vlastností a parametru ROVNOOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnuti rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

SO103	VO.003	Materiál zemní-stavební									0,00	80 955,92	80 955,92	0,00	0,00
161	SO103	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	52 360	295,00	0,00	15 446,20	0,00	0,00	Firemni				
162	SO103	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	748 000	2,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	Firemni				
163	SO103	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	100 000	2,00	0,00	200,00	0,00	0,00	Firemni				
164	SO103	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	5 000	295,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	Firemni				
165	SO103	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	100 000	2,00	0,00	200,00	0,00	0,00	Firemni				
166	SO103	000046134	beton B13.5	m3	21 280	1 874,00	0,00	39 878,72	0,00	0,00	Firemni				
167	SO103	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	28 000	795,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00	Firemni				

Poznámka: V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOOCENÝ dle technických parametrů.

V případě nahrazení materiálu / výrobku materiálem / výrobkem ROVNOOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci.

Při splnění technických vlastností a parametru ROVNOOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnuti rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

SO103	VO.004	Elektromontáže									0,00	73 474,00	73 474,00	0,00	0,00
168	SO103	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	24 000	880,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	Firemni				
169	SO103	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	1 000	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	Firemni				
170	SO103	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	4 000	300,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	Firemni				
171	SO103	210204204	elektrovýzbroj stožárů pro 4 okruhy	ks	28 000	215,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	Firemni				
172	SO103	210810013	kabel(-CYKY) volně uloží do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	934 000	22,00	0,00	20 548,00	0,00	0,00	Firemni				
173	SO103	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	168 000	14,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	Firemni				
174	SO103	210010125	trubka plast volně uložená do pr. 110mm	m	25 000	17,00	0,00	425,00	0,00	0,00	Firemni				
175	SO103	210010124	trubka plast volně uložená do pr. 75mm	m	28 000	13,00	0,00	364,00	0,00	0,00	Firemni				
176	SO103	210220002	uzemňov. vedení na povrchu uplná mříž FeZn pr. 10mm	m	389 000	25,00	0,00	9 725,00	0,00	0,00	Firemni				
177	SO103	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	24 000	315,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	Firemni				
178	SO103	210100641	koncovka 1KV staniční plast do 4x35	ks	29 000	20,00	0,00	580,00	0,00	0,00	Firemni				
179	SO103	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	4 000	315,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	Firemni				
180	SO103	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	5 000	288,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	Firemni				

Poznámka: V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOOCENÝ dle technických parametrů.

SO103	VO.005	Zemní práce									0,00	164 390,40	164 390,40	0,00	0,00
181	SO103	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	748 000	112,00	0,00	83 776,00	0,00	0,00	Firemni				
182	SO103	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	748 000	20,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	Firemni				
183	SO103	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	748 000	4,80	0,00	3 590,40	0,00	0,00	Firemni				
184	SO103	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	748 000	12,00	0,00	8 976,00	0,00	0,00	Firemni				
185	SO103	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	261 800	18,00	0,00	4 712,40	0,00	0,00	Firemni				
186	SO103	460200303	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.2	m	25 000	238,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	Firemni				
187	SO103	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	25 000	20,00	0,00	500,00	0,00	0,00	Firemni				
188	SO103	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	50 000	4,80	0,00	240,00	0,00	0,00	Firemni				
189	SO103	460560303	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3	m	25 000	22,00	0,00	550,00	0,00	0,00	Firemni				
190	SO103	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	25 000	18,00	0,00	450,00	0,00	0,00	Firemni				
191	SO103	460200263	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	50 000	208,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	Firemni				
192	SO103	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	50 000	20,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Firemni				
193	SO103	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Firemni				
194	SO103	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	25 000	18,00	0,00	450,00	0,00	0,00	Firemni				
195	SO103	460560263	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3	m	50 000	18,00	0,00	900,00	0,00	0,00	Firemni				
196	SO103	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	28 000	425,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	Firemni				

197	SO103 460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	m3	23,240	440,00	0,00	10 225,60	10 225,60	0,00	0,00	Firemní
198	SO103 460600001	odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku	m3	23,240	250,00	0,00	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00	Firemní
SO103 VO.006 Ostatní náklady											
199	SO103 218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	24,000	9,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	Firemní
200	SO103 218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,000	16,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	Firemní
201	SO103 218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	24,000	9,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	Firemní
202	SO103 218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,000	9,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	Firemní
203	SO103 219990011	výřezání inženýrských sítí	ks	1,000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	Firemní
204	SO103 219990011G	geodetické práce	ks	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	Firemní
SO103 VO 007 Revize											
205	SO103 217309012	vypracování zprávy VR/cena akce do 100 000 Kč	ks	1,000	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	Firemní
				Celkem:			5 760 669,61				

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vívem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.

V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů.


V případě nahrazení materiálu / výrobku materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci.

Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

použítá soustava RTS, online na www.rts.cz

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Myšlín

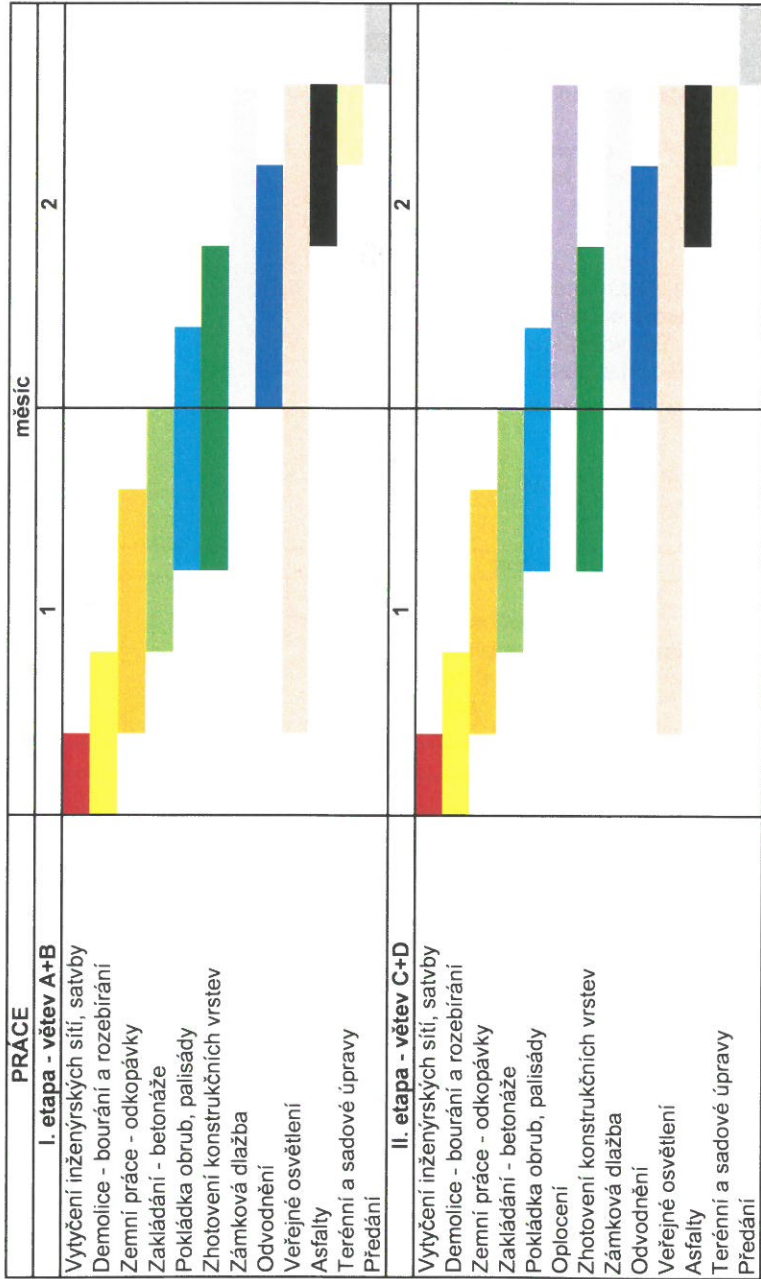

Dokončení stavby

- 1. etapa: nejpozději do 2 měsíců od předání staveniště
- 2. etapa: nejpozději do 2 měsíců od výzvy zadavatele

PLATEBNÍ HARMONOGRAM

	Cena bez DPH
práce provedené do konce 1. měsíce	824 100,00
práce provedené do konce 2. měsíce	904 100,00
práce provedené do konce 3. měsíce	1 716 234,00
práce provedené do konce 4. měsíce	2 316 235,61



Potvrzení o pojištění odpovědnosti za škodu a za výrobek	Public and Product Liability Certificate of Insurance
Toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy slouží pouze jako osvědčení o pojištění. Nedoplňuje, ani nemění pojistné krytí stanovené zmíněnou pojistnou smlouvou.	This English certificate is only a translation of the original wording. Nothing herein contained shall serve to alter, vary or waive the provisions of the below mentioned policy.
Tento pojistný certifikát je vystaven pro potřeby	Certificate for
to whom it may concern	
Pojistník	Policyholder
ANDELTA, a.s. <u>Seznam pojištěných osob:</u> AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o. AVE Kolín s.r.o. AVE Sběrné suroviny a.s. AVE Ústí nad Labem s.r.o. REKKA s.r.o. AVE Services s.r.o. AVE Kralupy s.r.o. Technické služby Beroun, s.r.o.; Beroun-Město, Viničná 910; IČ: 27132340 AVE Kladno s.r.o.; Kladno, Rozdělov, Smečenská 381; IČ: 25085221 ZDIBE, spol. s r.o.; Stašov 147; IČ: 61683507 Technické služby Slaný s.r.o.; Slaný, Nejtkova 1709; IČ: 62958437 SKS INVEST s.r.o. AVE Břeclav a.s. PETKA CZ, a.s. DOKOM FINAL s.r.o.	
Pojistitel	Insurer
XL Insurance Company SE Zweigniederlassung für Österreich Tuchlauben 3 1010 Vienna	
Číslo pojistné smlouvy	Policy Number
CZ00000877LI16A	
Rozsah krytí	Scope of Cover
Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu a za výrobek, kterou způsobil třetí osobě v důsledku výkonu pojištěné činnosti.	The insurance covers the cases of public and product liability of the insured for damage which it caused to a third person as a result of the insured business activity.
Územní omezení	Territorial scope of cover

Evropa včetně Turecka
Europe incl. Turkey

Limit plnění

Pro škody na zdraví a majetku pro každou pojistnou událost a během pojistného období

Limits of Indemnity

Bodily injury and property damage any one occurrence and in the annual aggregate

EUR 15.000.000,00

Spoluúčast**Deductible**

EUR 10.000,00

Pojistné období**Period of Insurance**

Počátek pojištění

Inception Date

12.11.2016

Zánik pojištění

Expiry Date

11.11.2017

Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou s automatickou prolongací podle článku IV. odst. 2 XL-GLPL 16
Policy is concluded for a definite period with automatic prolongation according to art. IV. 2, XL-GLPL 16

Podpis pojistitele**Signature of the insurer**

Místo, datum

Place, Date

XL Insurance Company SE
Zweigniederlassung für Österreich



Eduard Billovits
Country Manager Austria
& Central Eastern Europe

Vídeň, Vienna 14.11.2016


PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Název veřejné zakázky	Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Myšlín	
Název účastníka	AVE Kolín s.r.o.	
Sídlo	Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V.	
IČ/DIČ	251 48 117	CZ 251 48 117

Výše uvedený uchazeč tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené veřejné zakázky neplánuje využít poddodavatele, v opačném případě toto oznámí.

V Kolíně dne 31.5. 2017




Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Karel Sova
jednatelé společnosti
