

Smlouva o dílo

(dále též SOD),
uzavřená v souladu s ustanoveními §§ 2586 až 2635
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo SOD u Objednatele: 2/2022
Číslo SOD u Zhotovitele: 22/2022

Článek 1. Smluvní strany

Objednatel :

Obec Hradec-Nová Ves (dále též Objednatel)

Hradec-Nová Ves 12,790 84 Hradec-Nová Ves

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č.ú.: 188307417/ 0300

IČO: 00636011

DIČ: CZ00636011

Tel: +420 584 423 086

Datová schránka: a5xbky5

E-mail: starosta@hradec-novaves.cz

Zástupce ve věcech změny SOD: Pavel Stejskal, starosta, tel. + 420 777 638 568

Zástupce ve věcech realizace díla: Ing. Miroslav Šoltys, místostarosta, tel. + 420 777 638 572

Zhotovitel :

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (dále též Zhotovitel)

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, č.ú.: 250048-621/0100

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2102043465/2700

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Tel: +420 543 532 266

Datová schránka: j8pd5dg

E-mail: sendlerova@firesta.cz

Zástupce ve věcech změny SOD: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Zástupce ve věcech realizace díla: Ing. Tomáš Uwira, vedoucí střediska, tel. + 420 606 761 604

Článek 2. Předmět a místo plnění

02.01. Zhotovitel je povinen na základě této SOD provést pro Objednatele s potřebnou péčí dílo, tj. izolační práce v rozsahu nabídky Zhotovitele na veřejnou zakázku, která je přílohou č. 1 smlouvy.

02.02. Místem provádění díla je: stavba „Realizace přímo-pojížděné izolace mostu 1c-M1 přes řeku Bělou, Hradec-Nová Ves“

04.04. Splatnost platebních dokladů je **30 dnů** ode dne jejich odeslání na adresu Objednatele uvedenou ve SOD. V pochybnostech ohledně doručení se má za to, že platební doklad byl doručen třetí den ode dne jeho odeslání. Dnem úhrady platebního dokladu se rozumí den připsání částky k úhradě ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na platebním dokladu.

04.05. Zjistí-li Zhotovitel, že podklady pro uzavření SOD byly nepřesné nebo neúplné a tato skutečnost má vliv na rozsah plnění sjednaného dle SOD, Zhotoviteli vzniká nárok na určení zvýšení ceny, jestliže oznámí nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od SOD, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 20 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

Článek 5. Záruka

05.01. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou ve SOD a v projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a označeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

05.02. Záruční doba za dílo dle této SOD činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy dílo dle této SOD převezme Objednatel nebo dnem, kdy Objednatel bezdůvodně odmítne převzít dílo.

05.03. Dílo má vadu, neodpovídá-li SOD. Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace vady díla zahájit práce k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem.

05.04. Dojde-li k uplatnění oprávněné reklamace v záruční době, prodlužuje se sjednaná záruka za jakost díla o dobu ode dne doručení písemného oznámení reklamované vady Zhotoviteli do předání odstraněné vady díla.

05.05. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se Zhotovitelem společně a nerozdílně

- poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho, kdo nad dílem vykonával dozor,
- kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci,
- kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.

05.06. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady díla, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si Objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si Objednatel zvolil.

Článek 6. Provádění díla

06.01. Zhotovitel je povinen provést dílo dle SOD na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nevyplývá-li ze SOD nebo z povahy díla něco jiného, je zhotovitel oprávněn provést dílo před sjednanou dobou.

06.02. Zhotovitel je povinen provést dílo sám, a to buď osobně nebo prostřednictvím svých zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit částečně nebo v celém rozsahu provedení díla třetí osobu. Při provádění díla třetí osobou má Zhotovitel vůči Objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

06.03. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Je-li k provedení díla nutná součinnost Objednatele, určí mu Zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má Zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet Objednatele, anebo, upozornil-li na to Objednatele, odstoupit od smlouvy.

06.04. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od SOD, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení SOD a na úmysl Objednatele odstoupit od SOD byl Zhotovitel Objednatelem pro takový případ písemně upozorněn.

06.05. Zjistí-li Zhotovitel nevhodnost věcí nebo pokynů předaných mu Objednatelem k provedení díla, je povinen sdělit Objednateli, v čem spočívá nevhodnost a navrhnout Objednateli způsob řešení. Překáží-li nevhodná věc nebo pokyn v řádném provádění díla, Zhotovitel je oprávněn přerušit plnění až do výměny věci nebo změny pokynu; trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného pokynu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost byla zjištěna. Trvá-li Objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného pokynu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po Zhotovitelově upozornění, může Zhotovitel od SOD odstoupit.

06.06. Je-li k provedení díla nutné opatřit věc, která není předmětem plnění Zhotovitele dle SOD, je povinen tuto věc opatřit Objednatel. Neopatří-li Objednatel věc včas a neučiní-li tak ani na výzvu Zhotovitele v dodatečně přiměřené době, může věc opatřit Zhotovitel na účet Objednatele. Cenu věci a náklady účelně vynaložené s jejím opatřením Objednatel Zhotoviteli zaplatí bez zbytečného odkladu poté, co jej o placení Zhotovitel požádá.

06.07. V případě, že Objednatel uplatní požadavek na rozšíření rozsahu díla, je Zhotovitel povinen do pěti pracovních dnů od obdržení písemného požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny a navrhnout nový nebo upravený časový harmonogram provádění díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění. V případě požadavku na plnění, které není v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy dohodnut pro jednotlivé případy samostatně. V případě, že Objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je Zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat. Ceny obsažené v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele budou podkladem pro ocenění rozsahu díla, které nebude provedeno. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli 10 % z ceny té části díla, kterou nebude na základě požadavku Objednatele provedena.

06.08. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, vztahující se k provádění díla, jakož i všechny smluvní dokumenty.

06.09. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední vady díla stavební deník. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem je zejména datum, seznam pracovníků zhotovitele a jeho subdodavatelů účastnících na díle, počasí, popis prováděných činností, mimořádné události (např. pracovní úrazy, kolize s jinými zhotoviteli, pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení, oznámení nutnosti víceprací, oznámení o odstranění nedostatků zjištěných Objednatелеm nebo třetí osobou, předpřejímky a přejímky).

06.10. Objednatel je povinen podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisovat zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisovat požadavky Objednatele ve věci provádění díla.

06.11. Před zahájením plnění předá Objednatel Zhotoviteli písemně místo provádění díla prosté všech právních a faktických vad nebo práv třetí osoby a seznámí ho se specifickými místními podmínkami. Není-li místo plnění ve vlastnictví Objednatele, předá Objednatel Zhotoviteli rovněž povolení ke vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti.

06.12. Před zahájením plnění předá objednatel zhotoviteli platnou projektovou dokumentaci a kopii pravomocného stavebního povolení.

06.13. Objednatel zajistí koordinaci činností třetích subjektů v místě provádění díla tak, aby tyto subjekty neomezily průběh plnění poskytovaného zhotovitelem.

Článek 7. Předání a převzetí díla

07.01. Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně provedené dílo nejpozději v poslední den dohodnuté lhůty pro plnění. Zhotovitel je oprávněn předat objednateli řádně provedené i před uplynutím dohodnuté lhůty pro plnění. Objednatel je povinen provedené dílo převzít. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

07.02. Při předání díla Zhotovitel vyhotoví na základě přejímacího řízení zápis, který podepíší Zhotovitel a Objednatel. V tomto zápise Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá či nikoli. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, vykazuje-li dílo vady, za které nese Zhotovitel odpovědnost a které brání řádnému užívání díla. V případě zjištění vad díla v průběhu předávání díla je Objednatel povinen bezodkladně vyhotovit písemný seznam zjištěných vad a dohodnout se Zhotovitelem lhůty pro jejich odstranění.

07.03. Trvá-li provedení díla déle než jeden měsíc, je Zhotovitel oprávněn provést soupis plnění, provedeného za uplynulý měsíc a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen každý Zhotovitelem předložený soupis plnění dle předchozí věty zkontrolovat a vrátit jej zpět Zhotoviteli potvrzený do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem nebo v téže lhůtě vytknout písemně Zhotoviteli rozpor předloženého soupisu plnění se skutečností. Poruší-li Objednatel svoje povinnosti, uvedené v předchozí větě, platí domněnka, že plnění bylo v sepsaném rozsahu poskytnuto.

07.04. Způsob předvedení způsobilosti díla sloužit ke svému účelu musí být mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dohodnut, jinak platí domněnka, že dílo je dokončeno ke dni, ke kterému vyzval Zhotovitel Objednatele k jeho převzetí.

Náklady na sjednané předvedení způsobilosti díla sloužit ke svému účelu nejsou součástí ceny díla.

Článek 8. Smluvní pokuty

08.01. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost provést řádně a včas dílo (nebo jeho část), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny (bez DPH) řádně a včas neprovedeného díla (nebo jeho části).

08.02. Jeli objednatel v prodlení s placením splatných platebních dokladů, je povinen na výzvu zhotovitele zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení, nejvýše však 10 % z celkové ceny díla bez DPH.

08.03. Uplatněná smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.

Článek 9. Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody

09.01. Objednatel je od počátku plnění díla vlastníkem díla prováděného Zhotovitelem, je-li předmětem plnění díla stavba a tato stavba je umístěná na pozemku Objednatele, jinak je dílo ve vlastnictví Zhotovitele až do zániku závazku Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu díla.

09.02. Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na díle až do doby, kdy Zhotovitel umožní Objednateli nakládat s dílem.

Článek 10. Odstoupení od smlouvy

10.01. Zhotovitel nebo Objednatel může od SOD odstoupit pouze z důvodů a způsobem uvedených ve SOD nebo v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

10.02. Zhotovitel nebo Objednatel může odstoupit od SOD, jestliže

- na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurz,
- druhá smluvní strana vstoupila do likvidace.

Článek 11. Závěrečná ustanovení

11.01. Smluvní strany prohlašují, že si jednotlivá ustanovení této SOD, včetně jejich nedílných součástí, před jejím podpisem přečetly, že tuto SOD uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

11.02. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál, opatřený elektronickými podpisy.

11.03. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že všechny spory, vznikající z této SOD a v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle jeho Řádu a Pravidel, třemi rozhodci, když každá ze stran jmenuje jednoho rozhodce a stranami jmenovaní rozhodci vyberou předsedajícího rozhodce. Místní sudiště je Brno

11.04. Práva a povinnosti smluvních stran v této SOD výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů právního řádu České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

11.05. Vztahy smluvních stran dle této SOD se dále řídí: **platnými normami, přílohami**

Jako příloha :

1.Nabídka na veřejnou zakázku

V Hradci-Nové Vsi, dne

**Obec Hradec-Nová Ves
Pavel Stejskal
Starosta obce**

V Brně, dne

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

**Ing. Pavel Borek
člen představenstva**



NABÍDKA

na veřejnou zakázku

**„Realizace přímo-pojížděné izolace mostu
1c-M1 přes řeku Bělou, Hradec-Nová Ves“**

předkládá:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 68, okres Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Borek, člen představenstva, tel. 543 532 231, borek@firesta.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Tomáš Uwira, tel. 606 761 604, uwira@firesta.cz

Kontaktní osoba ve věci nabídky:

Mgr. Dana Procházková, tel. 543 532 212, prochazkova@firesta.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

Obchodní firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČ: 253 17 628 **DIČ:** CZ25317628
Bankovní spojení: KB Brno - město **č.ú.:** 250048-621/0100
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. **č.ú.:** 2102043465/2700
Telefon: + 420 543 532 231 **Fax:** + 420 543 532 232
E-mail: firesta@firesta.cz <http://www.firesta.cz>
Právní forma: Akciová společnost **Datová schránka č.:** j8pd5dg
Statutární orgán: Představenstvo akciové společnosti

Statutární orgán společnosti:

Jméno a příjmení	funkce	tel. spojení
Ivo Fišer	předseda představenstva	+ 420 543 532 330
Ing. Pavel Borek	člen představenstva	+ 420 543 532 230
Ing. Andrea Piro	člen představenstva	+ 420 543 532 440

Za společnost je oprávněn jednat každý člen představenstva. Společnost se zavazuje tak, že k nadepsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv z členů představenstva s označením jeho funkce

Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věci veřejné zakázky na základě plné moci :

Ing. Pavel Škrásek **obchodní ředitel** **+ 420 543 532 236**
skrasek@firesta.cz **+ 420 602 515 646**

Podrobnosti registrace: V Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144 Datum zápisu : 20.11.1996
Předmět podnikání: Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich, a jejich odstraňování
 Projektová činnost ve výstavbě

Základní kapitál:	51 000 000,- Kč		
Roční obrat v mil. Kč:	HR 2017/2018	HR 2018/2019	HR 2019/2020
(ze stavební činnosti)	2 196	2 650	3 116

Účetní závěrka za rok 2020/2021 včetně výroku auditora bude provedena podle zákona O účetnictví k datu 30.9.2020. Společnost přešla na režim hospodářského roku, který končí datem 31.3.2021.

Společnost vlastní tyto certifikáty a doklady:

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 Velký průkaz způsobilosti
 Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001
 Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016 (EMS)
 Certifikát OHSAS 18001:2008



KRYCÍ LIST – CENOVÁ NABÍDKA

Veřejná zakázka: „Realizace přímo-pojížděné izolace mostu 1c-M1 přes řeku Bělou, Hradec-Nová Ves“

Informace o zájemci:

Obchodní jméno	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
Sídlo	Mlýnská 68, 602 00 Brno
IČO	253 17 628
DIČ	CZ 253 17 628
Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144	
Jméno oprávněného zástupce k podpisu smlouvy	Ing. Pavel Borek, člen představenstva
Kontaktní osoba	Mgr. Dana Procházková, tel. 543 532 212, prochazkova@firesta.cz

Cena celkem bez DPH	393 322,90 Kč
DPH 21%	82 597,81 Kč
Cena celkem s DPH	475 920,71 Kč

Termín plnění: 04/2022-31.5.2022 dle klimatických podmínek
Záruka: 60 měsíců

V Brně dne 14.2.2022


Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 2144

Datum vzniku a zápisu:	20. listopadu 1996
Spisová značka:	B 2144 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo:	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Identifikační číslo:	253 17 628
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě činnost prováděná hornickým způsobem a projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 zákona č. 61/1988 Sb., písm. c) - práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), písm. f) - vrtání vrtů s délkou nad 30m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3, písm. i) - podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů a objemu větších než 300m krychlových horniny Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán - představenstvo:	
člen představenstva:	Ing. PAVEL BOREK, dat. nar. 21. března 1969 Seifertova 509/14, Lesná, 638 00 Brno Den vzniku členství: 20. dubna 2020
člen představenstva:	Ing. ANDREA PIRO, dat. nar. 29. ledna 1974 Jeřabinová 934/13, Staré Brno, 602 00 Brno Den vzniku členství: 20. dubna 2020
předseda představenstva:	IVO FIŠER, dat. nar. 12. září 1968 Rakovecká 1476/17c, Bystrc, 635 00 Brno Den vzniku funkce: 27. ledna 2021 Den vzniku členství: 20. dubna 2020
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Způsob jednání: Za společnost je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Společnost se zavazuje tak, že k nadepsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoli z členů představenstva s označením jeho funkce.
Dozorčí rada:	

předseda dozorčí rady:

Ing. DAGMAR ALKÉROVÁ, dat. nar. 8. května 1963
 Dolnopolní 635/97c, Maloměřice, 614 00 Brno
 Den vzniku funkce: 20. dubna 2020
 Den vzniku členství: 20. dubna 2020

člen dozorčí rady:

JUDr. ZDENĚK DAŇHEL, dat. nar. 20. dubna 1965
 Jižní svahy 581/35, Ivanovice, 621 00 Brno
 Den vzniku členství: 20. dubna 2020

člen dozorčí rady:

RENATA FIŠEROVÁ, dat. nar. 8. dubna 1970
 Rakovecká 1476/17c, Bystrc, 635 00 Brno
 Den vzniku členství: 20. dubna 2020

Počet členů:

3

Akcie:

100 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 510 000,- Kč
 Všechny akcie společnosti je možné zastavit pouze za předpokladu, že valná hromada udělí takovému zastavení akcií předchozí souhlas schválený 3/4 většinou hlasů všech akcionářů.

Základní kapitál:

51 000 000,- Kč
 Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 všechny akcie společnosti jsou převoditelné pouze za předpokladu, že valná hromada udělí takovému převodu předchozí souhlas schválený 3/4 většinou hlasů všech akcionářů
 upsaný základní kapitál byl splacen v plné výši tj. = 51.000.000,- Kč
 Rozhodnutím valné hromady společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. ze dne 01.04.2021 došlo k rozdělení společnosti odštěpením části jejího jmění podle § 243 odst. 1. písm. b) za 2. zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, sloučením s jednou existující společností, a to společností Panorama Dlouhá a.s., IČO 09938273, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, na níž přešla část jmění společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Odštěpné závody:**Odštěpný závod:**

Obchodní firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., organizační složka

Sídlo nebo umístění: Palackého 1108/105, Přívoz, 702 00 Ostrava

Předmět podnikání:

totožný s obchodní společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN STUPKA, dat. nar. 2. května 1971
 Podzimní 1246/52, Svinov, 721 00 Ostrava

Odštěpný závod:

Obchodní firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., organizační složka Plzeň

Sídlo nebo umístění: Chrást u Plzně, ul. Uhelná 541, PSČ 33003

Předmět podnikání:

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
silniční motorová doprava nákladní
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb
hubení plevelů přípravky, které nejsou klasifikovány jako jedy ve smyslu vl. nař. č. 192/1988 Sb.
ubytovací služby
činnost prováděná hornickým způsobem včetně projektování v rozsahu podle § 3 písm. e) - práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské službě

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. VLASTIMIL SCHOVAJSA, dat. nar. 11. července 1978
Ježovická 2674, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 14.02.2022 10:00:47

Obchodní firma: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

Adresa sídla: **Mlýnská 388/68, 602 00, Brno - Trnitá**

Identifikační číslo osoby: **25317628**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Andrea Piro (3)**

Vznik funkce: **19.04.2010**

Jméno a příjmení: **Ivo Fišer (4)**

Vznik funkce: **15.12.2000**

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Borek (5)**

Vznik funkce: **20.11.1996**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **20.11.1996**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Vladimír Fišer (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **20.11.1996**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Vladimír Fišer (1)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**

Druh živnosti: **Koncesovaná**

Vznik oprávnění: **26.11.1997**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Petr Mikel (2)**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna**

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Ubytovací služby
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 20.11.1996
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Ing. Vladimír Fišer (1)

Živnostenské oprávnění č. 5

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 12.12.2012
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Ing. Andrea Piro (3)

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Projektová činnost ve výstavbě

Adresa: Palackého 1108/105, 702 00, Ostrava - Přívoz
Identifikační číslo provozovny: 1001811763
Zahájení provozování dne: 01.12.2001

2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: Palackého 1108/105, 702 00, Ostrava - Přívoz
Identifikační číslo provozovny: 1001811763
Zahájení provozování dne: 01.12.2001
Název: Středisko Mosty
Adresa: Křížíkova 188/68, 612 00, Brno - Královo Pole
Identifikační číslo provozovny: 1001811771
Zahájení provozování dne: 01.03.2003

3. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Název: Středisko dopravy
Adresa: Brněnská 681, 664 42, Modřice
Identifikační číslo provozovny: 1001811780
Zahájení provozování dne: 30.03.1998

4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Ubytovací služby

Název: Středisko Mosty

Adresa: Křižíkova 188/68, 612 00, Brno - Královo Pole

Identifikační číslo provozovny: 1001811771

Zahájení provozování dne: 05.05.2005

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Ing. Vladimír Fišer (1)

Datum narození: 31.01.1941

Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Ing. Petr Mikel (2)

Datum narození: 28.04.1960

Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Ing. Andrea Piro (3)

Datum narození: 29.01.1974

Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Ivo Fišer (4)

Datum narození: 12.09.1968

Jméno a příjmení: Ing. Pavel Borek (5)

Datum narození: 21.03.1969

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/01
Stavba: Přímopojížděná izolace mostu ev. č. M1 Hradec-Nová Ves

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18. 1. 2022
Zadavatel:		IČ:	00636011
Obec Hradec-Nová Ves		DIČ:	CZ00636011
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			393 322,90
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	393 322,90	82 597,81
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			475 920,71

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/01

Stavba: Přímopojížděná izolace mostu ev. č. M1 Hradec-Nová Ves

Místo: Datum: 18. 1. 2022

Zadavatel: Obec Hradec-Nová Ves

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		393 322,90	475 920,71
2022/01	Přímopojížděná izolace mostu ev. č. M1 Hradec-Nová Ves	393 322,90	475 920,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přímopojžděná izolace mostu ev. č. M1 Hradec-Nová Ves

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Hradec-Nová Ves

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 1. 2022

IČ:

00636011

DIČ:

CZ00636011

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

393 322,90

DPH základní

snížená

Základ daně

393 322,90

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

82 597,81

0,00

Cena s DPH

v CZK

475 920,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přímopojížděná izolace mostu ev. č. M1 Hradec-Nová Ves

Místo:

Datum: 18. 1. 2022

Zadavatel:

Obec Hradec-Nová Ves

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

393 322,90

HSV - Práce a dodávky HSV

356 507,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

356 507,90

OST - Ostatní

26 815,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prímopojížděná izolace mostu ev. č. M1 Hradec-Nová Ves

Místo:

Datum: 18. 1. 2022

Zadavatel: Obec Hradec-Nová Ves

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

393 322,90

D HSV Práce a dodávky HSV

356 507,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

356 507,90

1	K	900990001	Broušení odvodňovacího úžlabí tl. do 2cm		28,530	800,00	22 824,00	
	vv		úžlabí					
	vv		0,5*28,53*2		28,530			
	vv		Součet		28,530			
2	K	900990002	Broušení/ brokování do 2 mm odvodňovacího úžlabí tl. do 2cm		131,422	250,00	32 855,50	
3	K	900990003	Prímopojížděná stěrková hydroizolace mostu toušťce 8-10mm (např. systém Tarco)	m2	131,422	2 200,00	289 128,40	
4	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	60,000	65,00	3 900,00	CS ÚRS 2022 01
5	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	60,000	130,00	7 800,00	CS ÚRS 2022 01

D OST Ostatní

26 815,00

6	K	OST01	Pronájem dopravního značení - komplet na 1 týden	den	7,000	1 045,00	7 315,00	
7	K	OST02	Montáž značení	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
8	K	OST03	Demontáž značení	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
9	K	OST04	Schválení projektu přechodného značení	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00


10	K	Pol21	Vedlejší a ostatní náklady se zhotovením díla (Zařízení staveniště, provoz, odstranění a ostatní práce pro zhotovení díla)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Vydaný pro firmu FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

Akce: Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
Investor: Správa železnic s.o., Stavební správa Západ
Objednatel: HOCHTIEF CZ a.s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Finanční objem prací dle SoD: 10 999 702 Kč bez DPH
Termín realizace: 07/2019 – 05/2020

Popis prací: firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se podílela na izolaci jedenácti stavebních objektů. Celková izolovaná plocha 12 289 m². Žlab kolejového lože je izolován systémem asfaltových pásů Paraelast Bridge ve dvou vrstvách na betonový podklad opatřený kotevním nátěrem Masterseal P 605. Ochrana izolace na stěnách žlabu je z geotextilie o plošné hmotnosti 1200g/m², která je přikotvená nerezovou pásovinou o celkové délce 2 440 bm. Detail dilatací o celkové délce 1 340 bm je zaizolovaný průtažným asfaltovým pásem Joint Neodyl + asfaltový provazec Cordon Neodyl. Na jednom stavebním objektu je na římsě použita pochozí stěrková izolace s protiskluzovou úpravou Tarco Qubik NTF o výměře 75 m².

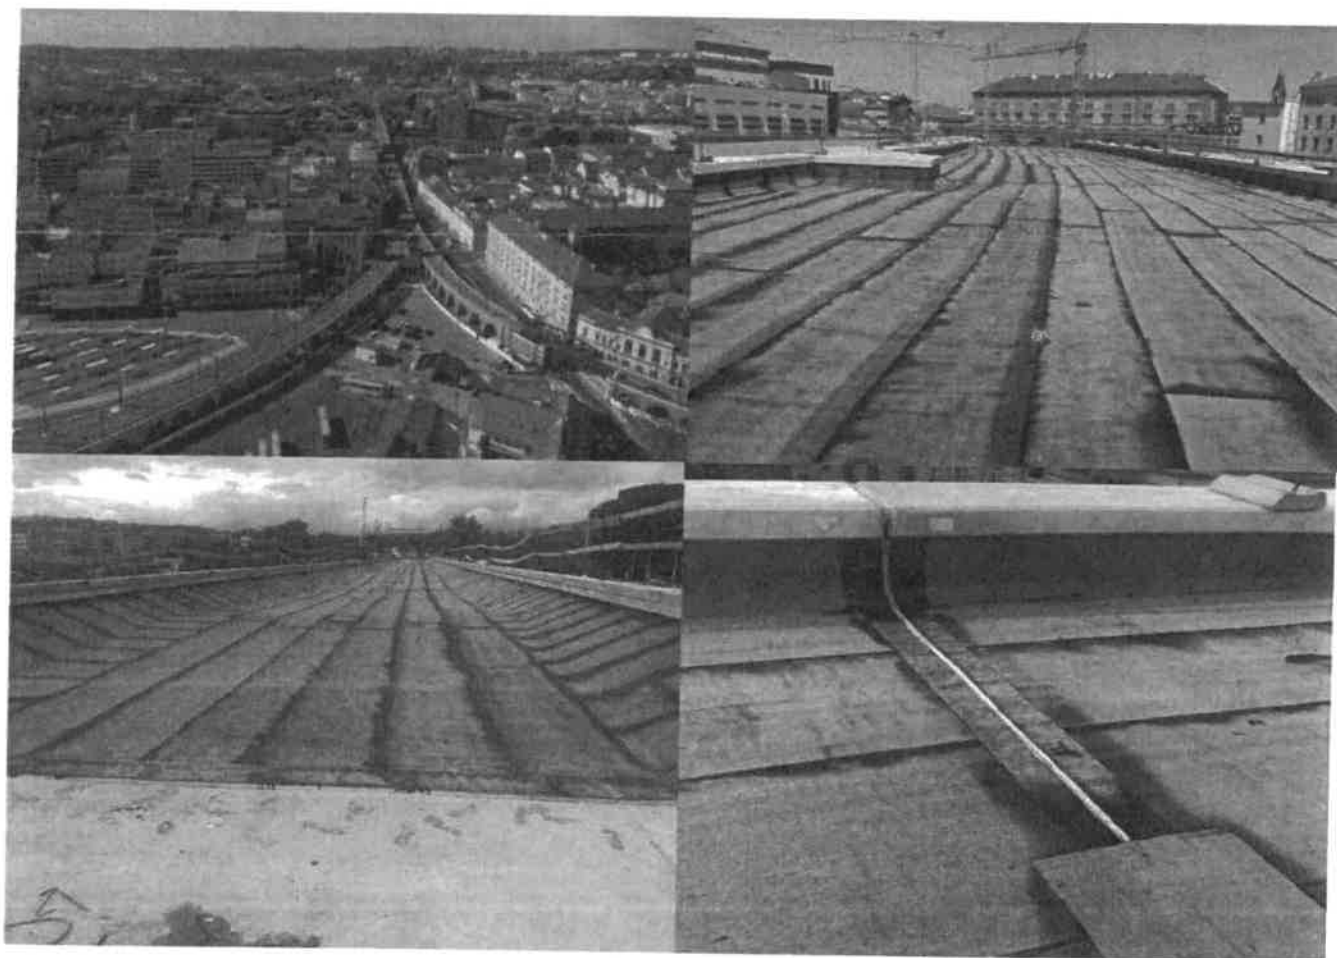

Izolace objektu provedené firmou FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. na výše uvedené stavbě byly provedeny **řádně, odborně a v dohodnutém termínu** dle požadavků objednatele ve výborné kvalitě, dle platných TKP a norem. Objednatel je spokojen s odborným přístupem zhotovitele.

Za HOCHTIEF CZ a.s. Ing. Martin Ředina MBA, ředitel stavby tel. +420.724 558 677



OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Vydáný pro firmu Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno


Akce: Most přes Balinku, SO 202, Velké Meziříčí

Investor: Město Velké Meziříčí
Radnická 29/1 594 13 Velké meziříčí

Objednatel: Mitrenga – stavby, spol. s.r.o.
Křižíkova 1566/19 612 00 Brno

Finanční objem prací: 401 323 Kč
Termín realizace: 10/2018

Popis prací: Firma Firesta a.s. se podílela na izolaci rubu opěr a mostovky. Plocha izolované mostovky je 160 m². Skladba izolačního systému pod vozovkou: obrokovaný betonový podklad, pečetící vrstva Masterseal P605, celoplošně natavený izolační pás Paraplast MA 55. Na chodnících je použitý systém přímopochozí izolace Tarco Qubik NTF o výměře 118 m².

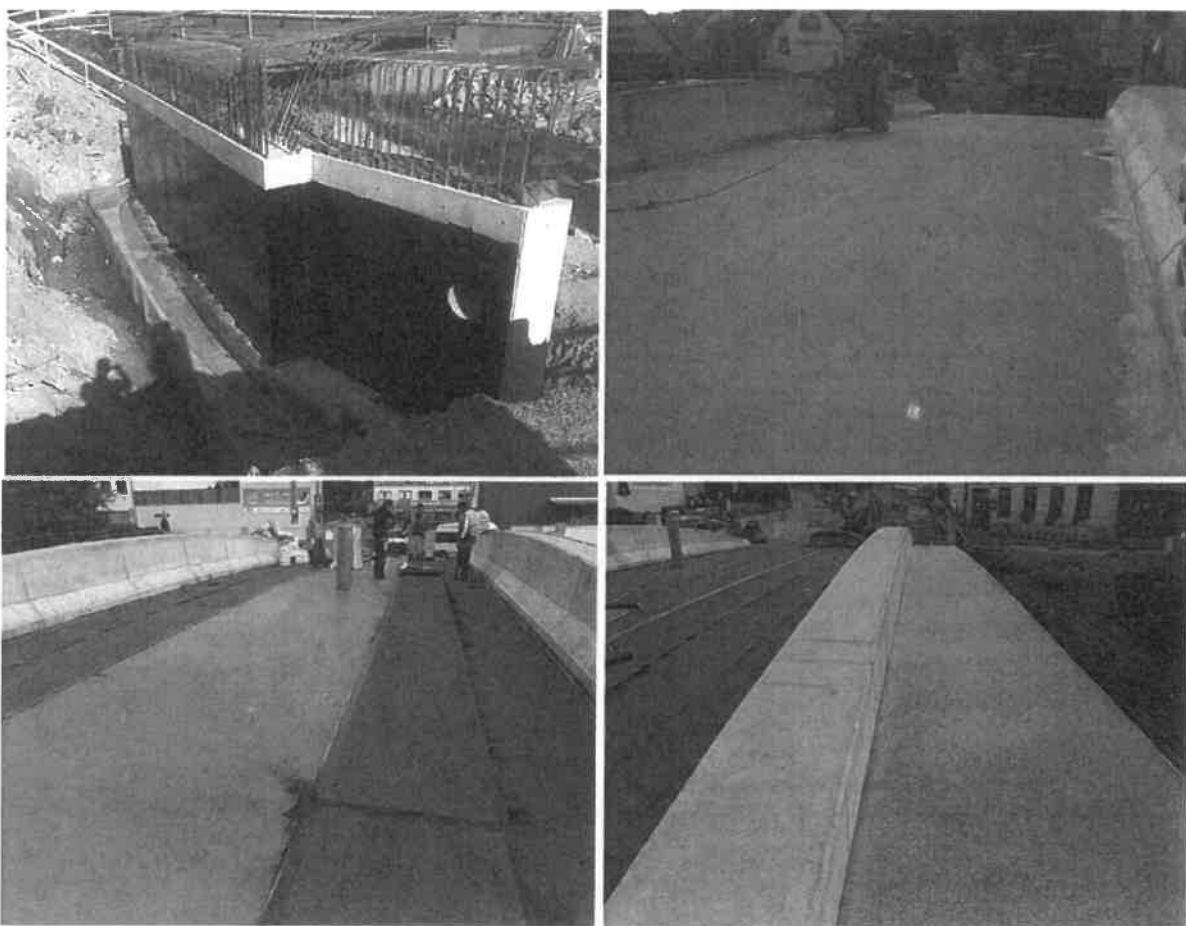

Izolace objektu provedené firmou FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. na výše uvedené stavbě byly provedeny **řádně, odborně a v dohodnutém termínu** dle požadavků objednatele ve výborné kvalitě, dle platných TKP a norem. Objednatel je spokojen s odborným přístupem zhotovitele.

Za Mitrenga – stavby, spol. s.r.o.

05 -02- 2019

Miroslav OTRUBA

606 087 747

MITRENGA

11

Mitrenga - stavby, spol. s r.o.
Křižíkova 1566/19, Brno 612 00
IČ: 26944022 DIČ: CZ26944022
e-mail: mitrenga@mitrenga.net, www.mitrenga.net

OSVĚDČENÍ O ŘÁDNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

vydaný pro firmu FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

Investor: SŽDC s.o.
Objednatel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zhotovitel izolace: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno
Stavba: Dálnice D11, stavba 1107 Smiřice – Jaroměř, SO 240 – železniční most nad přeložkou I/33 v km 44,179 trati Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem
Typ izolace: vodotěsná vrstva mostovky MASTERSEAL M 800 na přípravnou vrstvu MASTERSEAL P 684, vodotěsná vrstva rubů opěr a křídel z NAIP PARAEAST BRIDGE na přípravnou vrstvu PENETRAL ALP
Cena: 597 058,-Kč (bez DPH)
Termín realizace: červenec 2019 - říjen 2019

Popis prací:

Polyuretanová izolace byla nanášena na ocelovou konstrukci žlabu kolejového lože předem opatřenou základním protikorozním nátěrem ve skladbě: adhezivní můstek MASTERSEAL P 684, stříkaná izolace MASTERSEAL M 800 a ochranný nátěr proti UV záření MASTERSEAL TC 268 na stěnách žlabu kolejového lože. Na rubech opěr a křídel byla provedena izolace z NAIP ve skladbě: adhezivní nátěr PENETRAL ALP-M, pásová izolace PARAEAST BRIDGE a ochrana z geotextilie GEOFILTEX 63/120. Celkem bylo provedeno 292,5 m² polyuretanové izolace žlabu kolejového lože a 225,0 m² izolace z NAIP rubů opěr a křídel.



Vyjádření investora k provedeným pracem:

Stavební práce provedené firmou FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. na výše uvedené stavbě byly provedeny řádně, odborně a v dohodnutém termínu dle požadavků objednatele, dle TKP a platných norem a to ve velmi dobré kvalitě. Investor byl spokojen s odborným přístupem zhotovitele k výše uvedenému stavebnímu dílu.

Za objednatele: Ing. Oldřich Horáček, stavbyvedoucí, tel: 725 573 512, email: oldrich.horacek@porr.cz

11-12-2019

OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Vydaný pro firmu Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

Akce: Oprava přímopojížděné izolace mostu ev.č. 15234-1, Biskupice

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Finanční objem prací: 539 660 Kč
Termín realizace: 15-16.8. 2018

Popis prací: Firma Firesta a.s. se podílela na opravě stávající poškozené přímopojížděné izolace provedené v roce 1994. Příprava podkladu provedená frézováním a obrokováním. Nová přímopojížděná izolace je zhotovená systémem Tarco Qubik NTF o celkové výměře 173 m².



Izolace objektu provedené firmou FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. na výše uvedené stavbě byly provedeny řádně, odborně a v dohodnutém termínu dle požadavků objednatele ve výborné kvalitě, dle platných TKP a norem. Objednatel je spokojen s odborným přístupem zhotovitele.

Za KSÚSV Třebíč Petr Dokulil, inspektor mostů, mob. 604 434 626

09 -01- 2019

Dokulil
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 60090450
Odborný Tisk Třebíč, tel.: 568 839 811
Hrochova 1142, 674 02 Třebíč
